


- Werkvolgorde**
- Bestaande fundering schoon graven. Palen verklikken.
Stalen damwanden aanbrengen
Groutinjectie tpv schoorpalen
Obstakels verwijderen tpv houten damwanden
Houten damwand plaatsen
- Palen hoogbouw (verdiepte) aanbrengen (groutbassin tpv laagbouw deel)
Palen laagbouw aanbrengen
Palen laagbouw inmeten en doormeten
Plaatselijk ontgraven tot N.A.P. -1.25 tbv aanbrengen groutankers en gordingen
Aanbrengen en afspannen groutankers onder plintbebouwing
- Diepe ontgraving hoogbouw poer
Gewapend werkvloer tot aan damwand
Palen afbranden, wapenen, storten
Groutankers verwijderen
Damwand as J afbranden op hoogte
Poer wapenen en afstorten
EPS aanbrengen (zie advies We-boost)
Damwand verwijderen (of afbranden op hoogte)
- Houten damwand techniekruimte oost
Ontgraven NAP -1.8m
Storten keldervloer, kelderwandjes, kelderdek
Verwijderen houten damwand
- Aanbrengen ontlastsleuf + draglineschotten tpv as A
Diepe ontgraving laagbouwkelder
Palen snellen, opnieuw inmeten en doormeten
- Fundering en keldervloer storten
Groutankers verwijderen
Kelderwanden storten
Kelderdek storten
EPS aanbrengen (zie advies We-boost)
Aanvullen rondom
Damwanden verwijderen (of afbranden op hoogte)

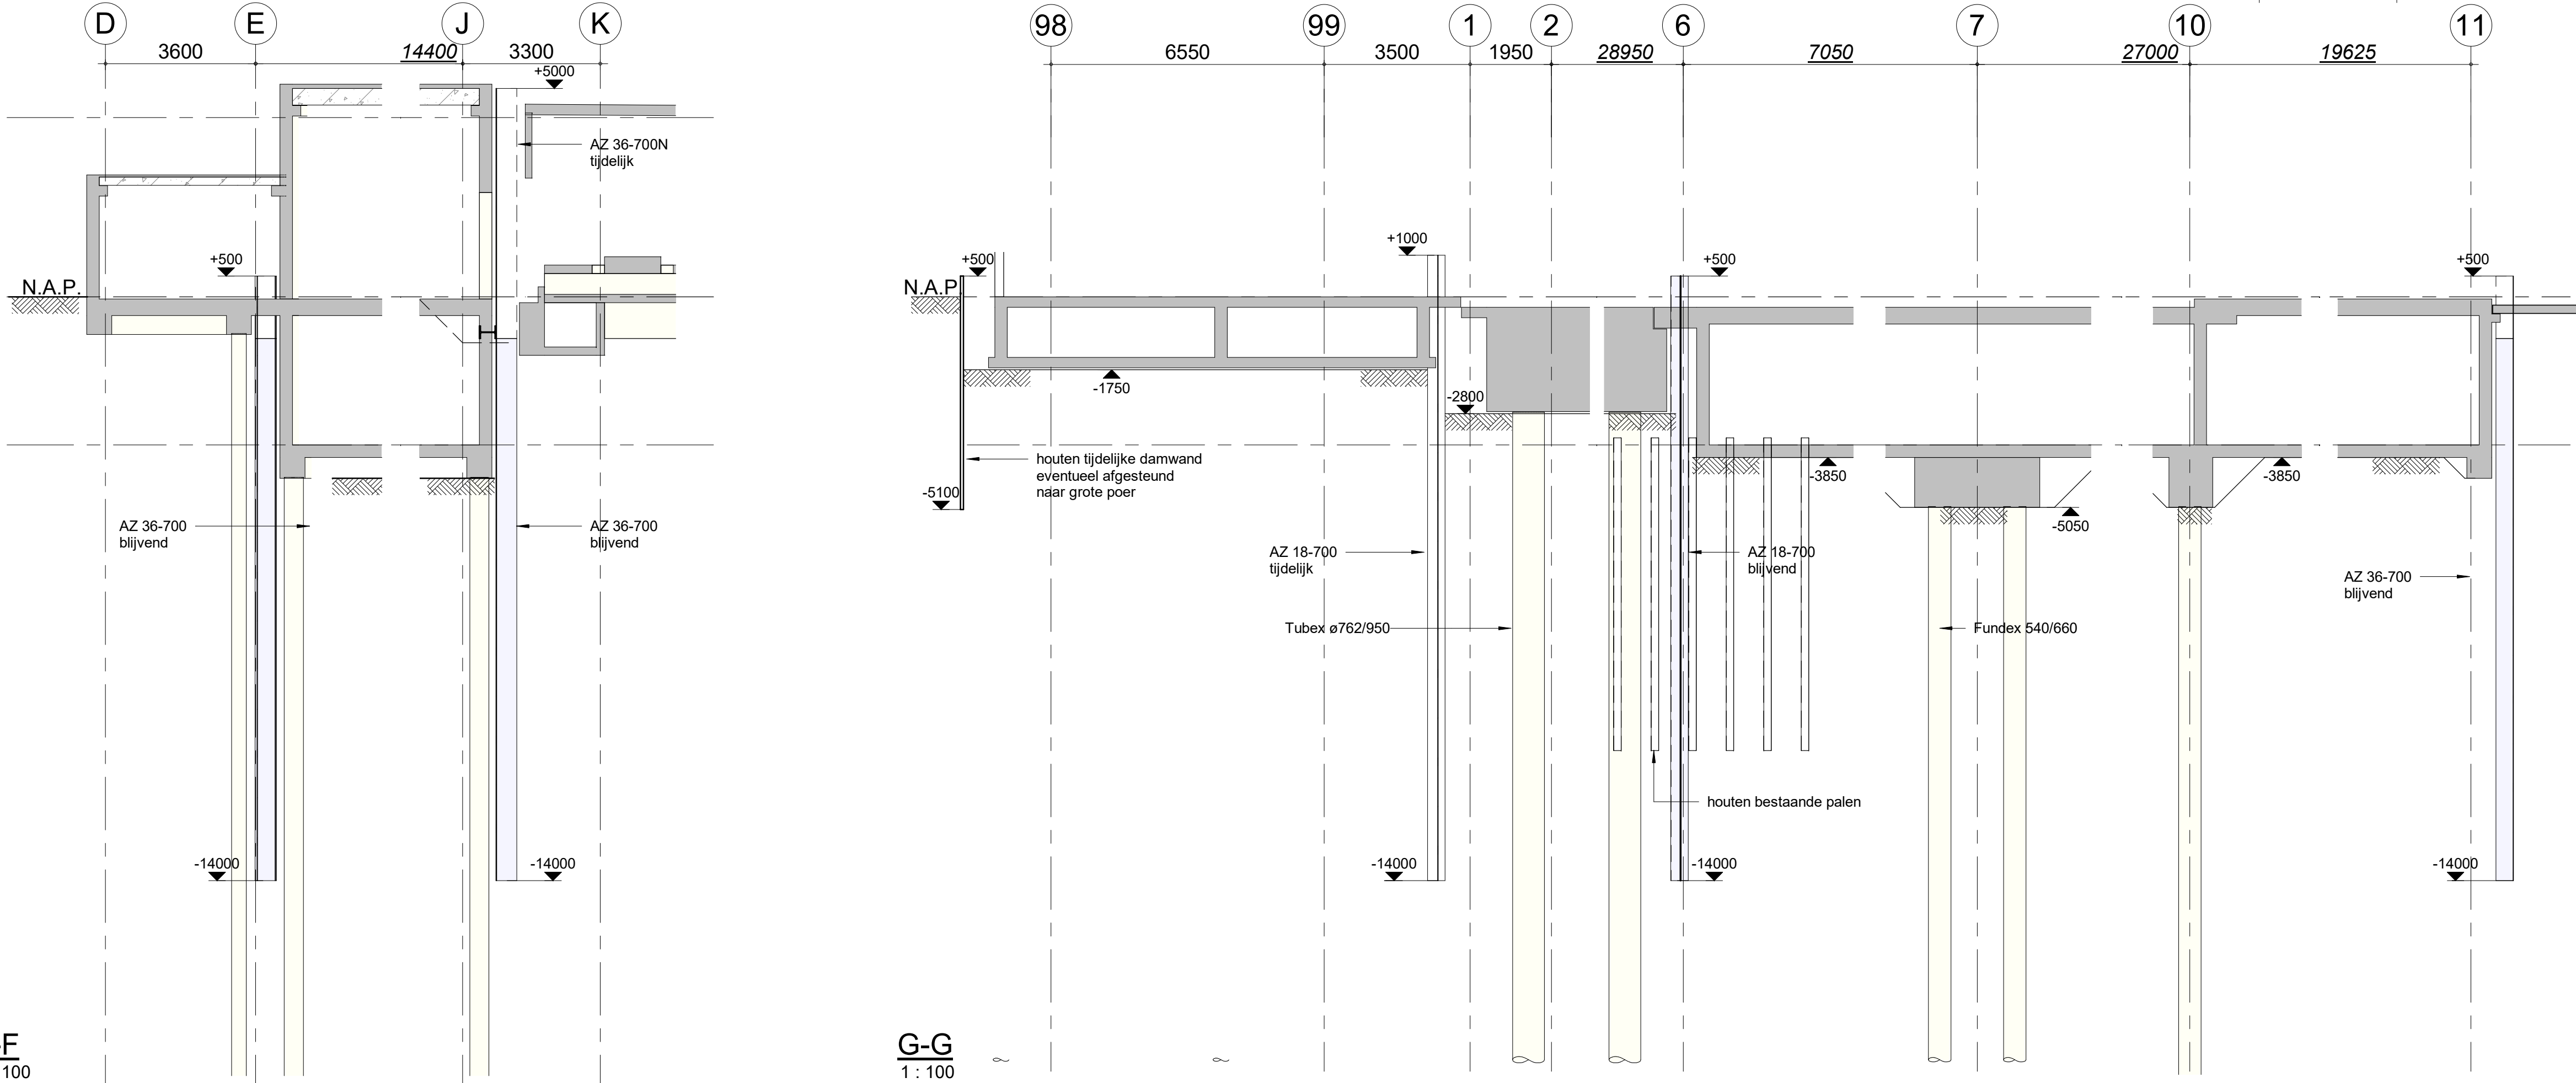

97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A B C D E F

J H G K F E D C B A

peil = +0,000 = b.k. afgewerkte begane grondvloer = N.A.P. + 0,000m

N

wijz.	datum	omschrijving wijziging	getekend	gecontroleerd
A	20-01-2023	wijzigen expeditie en kroon verwerkt	MPa	FSc
0	30-06-2022	eerste uitgave	MPa	JSc

project
TreeHouse Rotterdam

adres
Oudekerkeplein 42
Rotterdam

project nr
9464

omschrijving
Bouwput doorsneden

tekening nr	schaal	wijziging	fase	status	formaat
C-TO-BP-01	1:100	A	TO	definitief	A0

bam BAM Advies & Engineering
Remmenburg 12
Postbus 54
3980 CS Bunnik
030-6598933

Revt bestandsnaam : TRH-S-BWK-C-R21
