




Hoogheemraadschap van

**Rijnland**

## **Renovatie poldergemaal Ijpolder**

projectnummer: 91814

**(Ontwerp)Projectplan op basis  
van artikel 5.4 van de Waterwet**

| VASTSTELLING    | NAAM                                                                                                    | AFDELING/TEAM |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Afdelingshoofd: | C. De Booy                                                                                              | P&P           |
| Datum:          | 23 september 2013                                                                                       |               |
| Handtekening:   | <br>drs. C. De Booy |               |

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Samenvatting .....                                                             | 3  |
| 1. Inleiding .....                                                             | 4  |
| 1.1 Aanleiding en doel van het project .....                                   | 4  |
| 1.2 Waarom een projectplan? .....                                              | 4  |
| 1.3 Leeswijzer .....                                                           | 4  |
| 2. Gemaal IJpolder (huidige situatie) .....                                    | 5  |
| 2.1 Beschrijving gemaal en watersysteem .....                                  | 5  |
| 2.2 Vooronderzoek .....                                                        | 6  |
| 3. Nieuwbouw gemaal IJpolder .....                                             | 7  |
| 3.1 Nieuw ontwerp .....                                                        | 7  |
| 3.2 Capaciteit van het gemaal .....                                            | 7  |
| 3.3 Zichtlijnen .....                                                          | 7  |
| 4. Wijze van uitvoering .....                                                  | 8  |
| 4.1 Werkzaamheden .....                                                        | 8  |
| 4.2 Voorkomen van overlast .....                                               | 8  |
| 4.3 Eigendom en samenwerking .....                                             | 8  |
| 4.4 Vergunningen en ontheffingen .....                                         | 8  |
| 4.4.1 Omgevingsvergunning .....                                                | 8  |
| 4.4.2 Flora en Faunawet .....                                                  | 8  |
| 4.4.3 Archeologie en cultuurhistorie .....                                     | 9  |
| 4.5 Praktische afwikkeling .....                                               | 9  |
| 4.5.1 Kabels en leidingen .....                                                | 9  |
| 4.5.2 Financiën .....                                                          | 9  |
| 4.5.3 Beheer en onderhoud .....                                                | 9  |
| 4.5.4 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen ..... | 9  |
| 4.5.5 Globale planning .....                                                   | 9  |
| 5. Besluitvorming en procedure .....                                           | 10 |
| 5.1 Procedure projectplan .....                                                | 10 |
| 5.2 Mededelingen over de procedure in publicatie .....                         | 10 |
| 5.3 Communicatie .....                                                         | 10 |
| Bijlage          Ontwerptekening gemaal 13.59254 dd 31-7-2013 .....            | 11 |

## Samenvatting

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het beheer over de IJpolder. Deze polder wordt momenteel bemalen door het poldergemaal IJpolder. Het gemaal is verouderd en voldoet niet aan de eisen die het waterschap stelt aan poldergemalen.

Op basis van de huidige staat kan het gemaal worden gerenoveerd en is niet voor nieuwbouw gekozen. De grond onder het gemaal is momenteel in eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland, de afvoerleiding ligt in een perceel dat in eigendom is van de gemeente Amsterdam.

| Watergang/polder                                   | Kenmerk                       | Streefpeil                                                                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| IJpolder (bemalen)                                 | Peilvak GH-52.120.00          | vastpeil: NAP – 3,97 m <sup>1</sup>                                           |
| IJpolder (bemalen)                                 | Peilvak GH-52.120.01          | vastpeil: NAP – 3,32 m <sup>1</sup>                                           |
| IJpolder (bemalen)                                 | Peilvak GH-52.120.02          | vastpeil: NAP – 2,57 m <sup>1</sup>                                           |
| IJpolder slaat uit op: Kanaal Halfweg (boezempeil) | Watergangnummer 462-058-02080 | Winterpeil: NAP – 0,64 m <sup>1</sup><br>Zomerpeil: NAP – 0,61 m <sup>1</sup> |

**Figuur 1 Peilbeheer VGKP**

De IJpolder bestaat uit drie peilvakken met een totaal oppervlakte van ongeveer 13,5 ha. In totaal is een minimale capaciteit van 2,2 m<sup>3</sup>/min nodig. De huidige gemaalcapaciteit bedraagt nu 2,3 m<sup>3</sup>/min en is dus voldoende. De pomp is echter verouderd en wordt vervangen. Er wordt een nieuwe (dompel)pomp geplaatst.

Om de bemaling van de achterliggende polder te garanderen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

1. bovenbouw van het gemaal vervangen. De onderbouw van het gemaal kan naar verwachting worden hergebruikt;
2. plaatsen van betreedbare behuizing;
3. plaatsen van een hekwerk;
4. aanbrengen van terreinverharding;
5. nieuwe pomp aanbrengen (met criteria: visveilig en vuilongevoelig)
6. elektronica in het gemaal vernieuwen;
7. software compatibel maken voor Rijnland;
8. opruim- en baggerwerkzaamheden direct achter het gemaal.

## 1. Inleiding

### 1.1 Aanleiding en doel van het project

Het poldergemaal IJpolder aan de Kanaalweg in Halfweg is gebouwd in 1987 en in beheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gemaal is verouderd en voldoet niet aan alle eisen welke het hoogheemraadschap aan gemalen stelt. Het huidige gemaal is in voldoende technische staat wat betreft de civiele onderbouw. De uitstroom ligt deels net boven boezempeil en heeft een rooster en terugslagklep. Bij nieuwe poldergemalen worden de uitstroombelingen zodanig aangelegd dat ze onder water uitstromen. Dit is wenselijk in geval van een vorstsituatie.

Om het gemaal toekomstbestendig te maken en gelet op de technische staat (zoals de fundering) is gekozen om het gemaal te renoveren. Nieuwbouw van het gemaal zelf is niet aan de orde.

De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van het bestaande gemaal en het inrichten van het omliggende terrein. Bij de renovatie wordt alleen de bovenbouw van het gemaal vervangen. De onderbouw van het gemaal kan naar verwachting worden hergebruikt. Verder vinden enkele inrichtingswerkzaamheden aan het terrein plaats. Voor de werkzaamheden is het kappen/ snoeien van bomen niet nodig.

Na afronding van de renovatie:

- voldoet het gemaal aan de Arbo- en veiligheidseisen;
- is het gemaal bereikbaar doch afgesloten voor onbevoegden;
- is de elektronica en software gelijk aan de standaarden van Hoogheemraadschap van Rijnland;
- kan hierdoor de bemalingcontinuïteit van het gebied worden gegarandeerd.

Wateroverlast treedt na de renovatie van dit poldergemaal (en net zoals in de huidige situatie) alleen op in uitzonderlijke situaties, als er zo veel neerslag valt dat het buiten de resultaatverplichting van Rijnland valt. In die gevallen stelt Rijnland het calamiteitenplan in werking en heeft Rijnland op dat moment een inspanningsverplichting.

### 1.2 Waarom een projectplan?

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.

Het renoveren van het gemaal wordt uitgevoerd in het kader van bestendig beheer en onderhoud en het opnieuw inrichten van het terrein wordt uitgevoerd in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling.

Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste te bevatten:

- een beschrijving van het betrokken werk;
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd;
- alsmede een beschrijving van de consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen.

Dit plan geeft ingelanden de mogelijkheid om bezwaar te maken of zienswijzen in te dienen op de voorgenomen plannen van Rijnland. Dit plan behoeft geen inspraakprocedure. Na vaststelling van het projectplan kunnen ingelanden beroep aantekenen bij de rechtbank. Voor de procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

### 1.3 Leeswijzer


Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van aanpassingen aan een waterregulerend kunstwerk, de secundaire waterkering en een toevoerwatergang welke binnen de formele verantwoordelijkheden en het bestaande beleid van Rijnland vallen.

- Hoofdstuk 1 behandelt de aanleiding van dit projectplan en de doelstelling van het project.
- In hoofdstuk 2 worden de locatie en het project beschreven inclusief de documenten waarop dit projectplan is gebaseerd.
- In hoofdstuk 3 worden de inrichtingsmaatregelen beschreven.
- Hoofdstuk 4 gaat in op de wijze van uitvoering en komt de praktische afwikkeling van de uitvoering aan de orde.
- Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het projectplan vast te stellen.

## 2 Gemaal IJpolder (huidige situatie)

### 2.1 Beschrijving gemaal en watersysteem

De renovatie van het poldergemaal wordt aan de Kanaalweg in Halfweg (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) uitgevoerd (zie Figuur 1A). Het gemaal is afgebeeld in figuur 1B. De grond onder het gemaal is in eigendom van de het Hoogheemraadschap van Rijnland; de grond onder de uitstroombleiding is in eigendom van de gemeente Amsterdam.

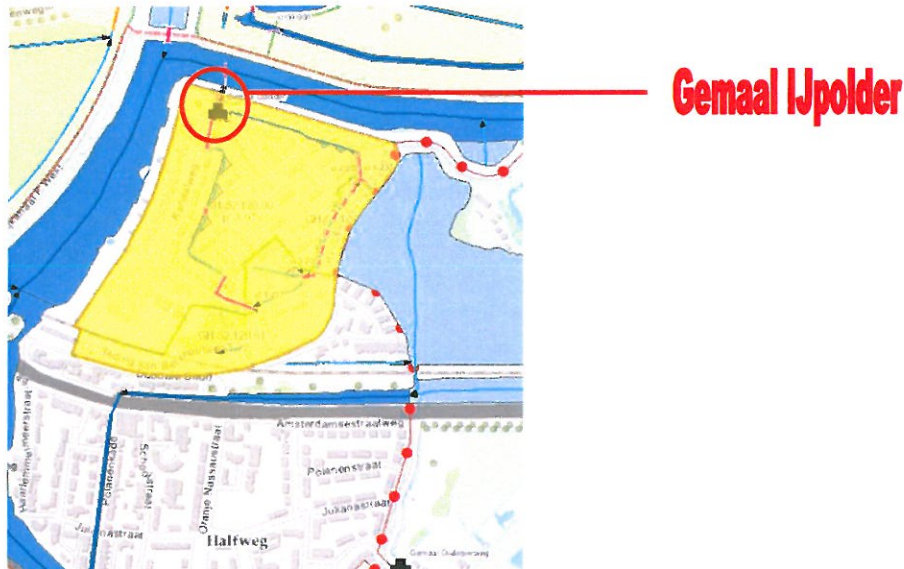

Figuur 1A Ligging polder en poldergemaal IJpolder



Figuur 1B Foto poldergemaal IJpolder, huidige situatie.

De IJpolder bestaat uit drie peilvakken met een totaal oppervlakte van ongeveer 13,5 ha. De huidige gemaalcapaciteit bedraagt nu 2,2 m<sup>3</sup>/min. De huidige pomp is verouderd en er wordt een nieuwe (dompel)pomp beoogd. Gemaal IJpolder slaat uit op Kanaal Halfweg ten noorden van het gemaal. In figuur 2 is het peilbeheer van de polder weergegeven.

| Watergang/polder                                   | Kenmerk                       | Streefpeil                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| IJpolder (bemalen)                                 | Peilvak GH-52 120.00          | vastpeil: NAP – 3,97 m <sup>1</sup>                                                         |
| IJpolder                                           | Peilvak GH-52 120.01          | vastpeil: NAP – 3,32 m <sup>1</sup>                                                         |
| IJpolder                                           | Peilvak GH-52 120.02          | vastpeil: NAP – 2,57 m <sup>1</sup>                                                         |
| IJpolder slaat uit op: Kanaal Halfweg (boezempeil) | Watergangnummer 462-058-02080 | Winterpeil: NAP – 0,64 m <sup>1</sup><br>Zomerpeil: NAP – 0,61 m <sup>1</sup>               |
| Peilverschil tussen gemaal en boezem               |                               | t.o.v. winterpeil: NAP – 3,33 m <sup>1</sup><br>t.o.v. zomerpeil: NAP – 3,36 m <sup>1</sup> |

Figuur 2 Peilbeheer IJpolder

## 2.2 Vooronderzoek

De volgende onderzoeken worden uitgevoerd ten behoeve van de beoogde maatregelen.

| Onderzoek                                                              | Status onderzoek                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Geotechnisch onderzoek en milieukundig onderzoek (bodem en waterbodem) | Nog niet uitgevoerd                                  |
| Asbestinventarisatie                                                   | Nog niet uitgevoerd                                  |
| Flora en Fauna onderzoek                                               | Nog niet uitgevoerd                                  |
| Niet gesprongen explosieven                                            | Nog niet uitgevoerd                                  |
| Cultuurhistorisch onderzoek (archeologische waarden)                   | Niet noodzakelijk; zie toelichting.                  |
| Onderzoek kabels en leidingen                                          | Uitgevoerd: kenmerk aanvraag 12O013474_1; 28-03-2012 |

**Figuur 3 Vooronderzoeken**

### Geotechnisch onderzoek en milieukundig (water)bodemonderzoek

Op de toekomstige bouwlocatie wordt onderzoek uitgevoerd naar de bodem en waterbodem. Dit onderzoek heeft tot doel de fysische en civieltechnische kwaliteit van de bodem vast te stellen. Ook de waterbodem wordt milieuhygiënisch onderzocht. Hierbij wordt de kwaliteit van de baggerspecie vastgesteld om te bepalen welke toepassings- en verwerkingsmogelijkheden er zijn. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.

### Asbestinventarisatie

Het gemaal en bijbehorende onderdelen worden geïnventariseerd op aanwezigheid van asbest. Doel is om de risico's van asbest op mens en omgeving te voorkomen bij een aanpassing of sloop van gemalen.

### Flora en Fauna onderzoek

Flora en fauna onderzoek heeft tot doel de evt. aanwezige planten- en diersoorten te beschermen door ze in kaart te brengen. In een voorfase wordt via een quick scan de risico's op het aantreffen bepaald en worden de effecten van de maatregelen op de soorten in kaart gebracht.

### Niet gesprongen explosieven

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven is niet verplicht maar heeft wel degelijk nut bij werkzaamheden waarbij het risico op het aantreffen van explosieven aanwezig is. In overleg met bevoegd gezag wordt bepaald of veldonderzoek noodzakelijk is. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.

### Cultuurhistorisch onderzoek

In de Beleidsnota Archeologie is door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aangegeven dat op de locatie van het gemaal geen archeologisch onderzoek nodig is. De verwachting is dat hier geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Door de provincie zijn geen monumenten of archeologische waarden aangeduid. Hierdoor acht het Hoogheemraadschap van Rijnland het uitvoeren van archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.


### Onderzoek kabels en leidingen

Door middel van een KLIC-melding met kenmerk 12O013474\_1 (datum 28/03/2012) is bekend welke kabels en leidingen op de locatie liggen. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in overleg met de eigenaren van de relevante kabels en leidingen maatregelen getroffen waardoor geen schade aan deze kabels en leidingen kan worden veroorzaakt.

### 3 Nieuwbouw gemaal IJpolder

#### 3.1 Nieuw ontwerp

Gemaal IJpolder is in 1987 gebouwd en inmiddels is het gemaal verouderd. Ook voldoet het gemaal niet aan alle eisen die het Hoogheemraadschap aan haar poldergemalen stelt. Om die redenen wordt het gemaal gerenoveerd. De realisatie en eventueel het ontwerp van het gemaal wordt uitbesteed aan een contractpartij. Via een bestek of technische vraagspecificatie wordt de aannemer een aantal criteria meegegeven waaraan het gemaal moet voldoen. In de bijlage van dit projectplan is een tekening opgenomen van het beoogde ontwerp van het gemaal.

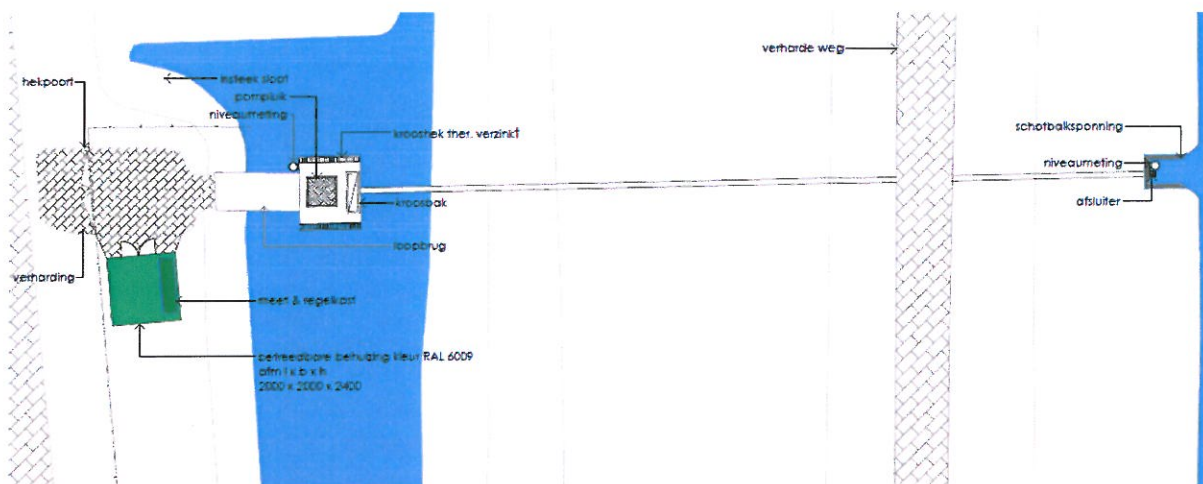

Figuur 4 Ontwerp van het gemaal

De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van het bestaande gemaal en het inrichten van het omliggende terrein. Voor de werkzaamheden is het kappen/ snoeien van bomen niet nodig. Het gemaal dient af te voeren op de boezem, Kanaal Halfweg, gelegen aan de noordzijde van de polder. Het gerenoveerde gemaal borgt de bedrijfszekerheid. Het aangepaste gemaal is Arbo-proof.

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Huidige capaciteit            | 2,3 m <sup>3</sup> /min                                       |
| Minimaal benodigde capaciteit | 2,2 m <sup>3</sup> /min                                       |
| Peil in bemalen peilvak       | NAP - 3,97 m <sup>1</sup>                                     |
| Boezempeil                    | Winterpeil: NAP - 0,64 m <sup>1</sup> , zomerpeil: NAP - 0,61 |
| Type gemaal                   | Pomp voorzien van schroefcentrifugaalwaaier of gelijkwaardig  |
| Vismigratie                   | Visvriendelijk i.e. niet viswerend                            |
| Waterkerende functie          | Terugslagklep en afsluiter (reeds aanwezig)                   |
| Krooshek                      | Ja                                                            |

Figuur 5 Renovatie gemaal IJpolder

#### 3.2 Capaciteit van het gemaal

De capaciteit van het nieuwe poldergemaal is gebaseerd op een genormaliseerde afvoer van verhard oppervlak in stedelijk gebied. Deze norm bedraagt een afvoer van 1,5m<sup>3</sup>/min/10 ha. De IJpolder is in totaal 13,5 ha groot en er is een capaciteit van 2,2 m<sup>3</sup>/min nodig.

#### 3.3 Zichtlijnen

Het nieuwe gemaal bestaat voor het zicht uit een behuizing met daarin de schakelkast, een pompluik en een kroosbak. De behuizing heeft een hoogte van ongeveer 2,4m. De feitelijke pompen worden in de pomput in de instroomconstructie geplaatst. De instroom- en uitstroomvoorzieningen zijn vanaf de oever zichtbaar, maar belemmeren geen uitzicht. In de bijlage van dit projectplan is een ontwerp-tekening opgenomen waarop de beoogde nieuwbouw is weergegeven.

## 4 Wijze van uitvoering

### 4.1 Werkzaamheden

De werkzaamheden in het projectgebied betreffen o.a. opruimingswerk, baggerwerk (alleen direct achter het gemaal), grondwerkzaamheden (lokaal ontgraven van watergangen), verplaatsing en het betreedbaar maken van de bovenbouw, aanbrengen verharding/cultuurtechnische werkzaamheden en bijbehorende werkzaamheden.

Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de instroomvoorziening van het gemaal. Hiervoor wordt een betonnen constructie aangebracht bij de instroom. De constructie verkleint de watergang en is kleiner dan 30 m<sup>2</sup>. Om deze reden is conform het beleid van het hoogheemraadschap compensatie niet nodig.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt kortstondig een deel van de watergang afgedamd om de werkzaamheden uit te voeren. Het oppervlaktewater dat bemalen wordt om dit werkgedeelte droog te houden wordt op dezelfde watergang geloosd. De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat geen knelpunten worden verwacht in de waterhuishouding. De aan- en afvoer wordt gedurende de werkzaamheden gewaarborgd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer.

Om de bemaling van de achterliggende polder te garanderen en de breikbaarheid van het gemaal te verbeteren zijn de volgende werkzaamheden beoogd:

2. bovenbouw van het gemaal vervangen. De onderbouw van het gemaal kan naar verwachting worden hergebruikt;
3. plaatsen van betreedbare behuizing;
4. plaatsen van een hekwerk;
5. aanbrengen van terreinverharding;
6. nieuwe pomp aanbrengen (met criteria: veilig en vuilongevoelig)
7. elektronica in het gemaal vernieuwen;
8. software compatibel maken voor Rijnland;
9. opruim- en baggerwerkzaamheden direct achter het gemaal.

### 4.2 Voorkomen van overlast

De werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de openbare ruimte. Dat wil zeggen dat er getracht wordt zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken. Hierbij kan worden gedacht aan geluidsoverlast of wegafzettingen. Gedurende de werkzaamheden wordt met deze hinder rekening gehouden en geprobeerd tot een minimum te beperken.

### 4.3 Eigendom en samenwerking

Het terrein en de gronden onder het huidige gemaal zijn in eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De persleiding richting de uitstroomvoorziening en de 'uitstroomvoorziening' liggen op grond van de gemeente Amsterdam. Volgens de Waterwet, artikel 5.23, lid 1, zijn grondeigenaren (in deze het hoogheemraadschap en de gemeente Amsterdam) gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan een waterstaatswerk (als een gemaal) te gedogen als dit maar tenminste 48 uur van te voren (schriftelijk) aan hen wordt meegedeeld. Met de gemeente worden de werkzaamheden afgestemd en tevens worden benodigde vergunningen aangevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden.

### 4.4 Vergunningen en ontheffingen

#### 4.4.1 Omgevingsvergunning

Voor de werkzaamheden (slopen en bouwen van het gemaal) is een omgevingsvergunning (onderdeel aanlegvergunning) nodig. Deze wordt aangevraagd bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

#### 4.4.2 Flora en Faunawet

Nieuwbouw van het gemaal en de daartoe behorende werkzaamheden kunnen effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Voorafgaand aan de aanbesteding wordt een quickscan uitgevoerd om te bepalen welke soorten voorkomen en welke effecten de werkzaamheden hebben op deze soorten. Zodoende kan worden vastgesteld of extra onderzoek naar flora en fauna nodig is.

Een van de criteria is dat gewerkt gaat worden volgens het werkprotocol van het hoogheemraadschap waardoor schadelijke effecten aan de beschermde soorten van de flora- en faunawet worden voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de werkprotocollen Flora- en Faunawet van Rijnland. Bij de fasering van de werkzaamheden wordt geborgd dat verstoring van broedvogels niet plaatsvindt.

In figuur 6 wordt per onderdeel van de werkzaamheden in het projectgebied het betreffende werkprotocol aangegeven.

| Werkzaamheden                                       | Werkprotocol                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| slopen gedeelte bestaande gemaal (m.u.v. onderbouw) | werkprotocol 10 (sloop van gebouwen en kunstwerken)                                        |
| dempen watergang                                    | werkprotocol 12 (afdammen dempen of vergraven watergangen)                                 |
| renoveren gemaal                                    | werkprotocol 11 (bouwactiviteiten)                                                         |
| realisatie persleiding                              | werkprotocol 9 (verwijderen van bovengrond/graven)                                         |
| opschonen/baggeren bestaande watergang              | werkprotocol 2 en 3 Schonen van het natte profiel en baggeren van bodems en herprofilering |

**Figuur 6: Toe te passen werkprotocollen**

Bij alle werkzaamheden moet, indien gewerkt gaat worden tussen 16 maart en 1 september het werkterrein gecontroleerd worden op nesten van vogels (maximaal 1 week voor start van werkzaamheden) door een terzake kundige. Als een watergang geheel of gedeeltelijk drooggezet moet worden om de werkzaamheden uit te voeren, dient de bouwkuip afgevisd te worden door een terzake kundige, voordat de bouwkuip wordt drooggemalen.

#### 4.4.3 Archeologie en cultuurhistorie

In de Beleidsnota Archeologie is door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aangegeven dat op de locatie van het gemaal geen archeologisch onderzoek nodig is. De verwachting is dat hier geen archeologische waarden aanwezig zijn.

Door de provincie zijn geen monumenten of archeologisch waarden aangeduid. Hierdoor acht het Hoogheemraadschap van Rijnland het uitvoeren van archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

## 4.5 Praktische afwikkeling

#### 4.5.1 Kabels en leidingen

Door middel van een KLIC-melding is bekend welke kabels en leidingen op de locatie liggen. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in overleg met de eigenaren van de relevante kabels en leidingen maatregelen getroffen waardoor geen schade aan deze kabels en leidingen kan worden veroorzaakt.

#### 4.5.2 Financiën

De kosten voor de omschreven watersysteemoptimalisatie beschreven in dit plan komen voor rekening van Rijnland.

#### 4.5.3 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de hoofdwatgangen en het poldergemaal worden ondergebracht bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

#### 4.5.4 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen

De gronden onder het gemaal zijn eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De grond onder de persleiding naar de uitstroomb voorziening en de uitstrookvoorziening zelf is in eigendom van de gemeente Amsterdam. Indien noodzakelijk worden afspraken gemaakt t.a.v. compensatie.

#### 4.5.5 Globale planning

De uitvoering van de werkzaamheden starten nadat afstemming met ingelanden heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden kunnen starten nadat dit projectplan is vastgesteld en daarnaast de overige benodigde vergunningen verkregen zijn. Tevens dient rekening te worden gehouden met de invloeden op de flora en fauna; bv. geen werkzaamheden gedurende het broedseizoen.

De verwachting is dat medio 2014 de werkzaamheden uitgevoerd worden.

## 5 Besluitvorming en procedure

### 5.1 Procedure projectplan

De procedure welke gevolgd wordt voor dit projectplan is de reguliere (korte) procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De verloop van de procedure is als volgt:

- Het projectplan wordt direct vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
- Het besluit wordt gepubliceerd en daarmee begint de termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar.
- Indien van toepassing volgt de bezwaarschriftenprocedure, de bezwaren worden behandeld door de bezwaarschriftencommissie van Rijnland.
- Bij bezwaren wordt het besluit van het dagelijkse bestuur van Rijnland heroverwogen.
- Indien van toepassing volgt een beroepprocedure bij de rechtbank conform 7.1.a. Awb. Dit alleen indien er bezwaar tegen het besluit gemaakt is.

Inwerkingtreding: Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door digitale publicatie in het Waterschapsblad, op het internet te raadplegen via <http://www.rijnland.net/>.

### 5.2 Mededelingen over de procedure in publicatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit (het ontwerp-projectplan) bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de maatregel(en) en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Dit verzoek kan worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het projectplan worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### 5.3 Communicatie

Het werk is en wordt afgestemd met de direct betrokken grondeigenaren/gebruikers.

**Bijlage      Ontwerptekening gemaal 13.59254 dd 31-7-2013**
