




Hoogheemraadschap van
Rijnland

**Projectplan poldergemaal
Slaaghmolen**

projectnummer: 91853

**Projectplan op basis van artikel
5.4 van de Waterwet**

VASTSTELLING	NAAM	AFDELING/TEAM
Afdelingshoofd:	C. De Booy	P&P
Datum:	26 september 2013	
Handtekening:		

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting	3
1 Inleiding	4
1.1 Aanleiding en doel van het project	4
1.2 Waarom een projectplan?	4
1.3 Leeswijzer	4
2 Gemaal Slaaghmolen (huidige situatie)	5
2.1 Slaaghpolder	5
2.2 Watersysteem en poldergemaal Slaaghmolen	5
2.3 Vooronderzoek	5
3 Nieuwbouw gemaal Slaaghmolen	7
3.1 Knelpunten	7
3.2 Nieuw ontwerp	7
3.2.1 Korte omschrijving opbouw	7
3.2.2 Capaciteit van het gemaal	7
3.2.3 Zichtlijnen	7
4 Wijze van uitvoering	8
4.1 Werkzaamheden	8
4.2 Voorkomen van overlast	8
4.3 Eigendom en samenwerking	8
4.4 Vergunningen en ontheffingen	8
4.4.1 Omgevingsvergunning	8
4.4.2 Flora en Faunawet	8
4.4.3 Archeologie en cultuurhistorie	9
4.4.4 Waterbodemonderzoek	9
4.5 Praktische afwikkeling	9
4.5.1 Kabels en leidingen	9
4.5.2 Financiën	9
4.5.3 Beheer en onderhoud	9
4.5.4 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen	9
4.5.5 Globale planning	9
5 Besluitvorming en procedure	10
5.1 Procedure projectplan	10
5.2 Mededelingen over de procedure in publicatie	10
5.3 Communicatie	10
Bijlage Overzichtstekening met kenmerk 407 4C36 022 011	11

Samenvatting

Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt het beheer over het poldergemaal Slaagmolen over van de gemeente Leiden. De Slaagpolder Oost wordt momenteel bemaald door het gemaal Slaagmolen. Dit gemaal is verouderd en voldoet niet aan de eisen die het waterschap stelt aan poldergemalen.

Op basis van de huidige staat van het gemaal is renovatie niet aan de orde en is nieuwbouw gewenst. Het gemaal wordt daarom geamoveerd en in directe nabijheid nieuw gebouwd. De grond onder het gemaal is momenteel in eigendom van de gemeente Leiden.

Watergang/polder	Kenmerk	Streefpeil
Slaagpolder Oost	Peilvak RL-10	Vast peil: NAP - 1,92 m ¹
Hoogwatervoorzieningen Slaagpolder Oost (peilafwijking)	Peilvak RL-10-HW01 Peilvak RL-10-HW02 Peilvak RL-10-HW03	
Onderbemaling FC Roodenburg	Peilvak OB-55	Vast peil: NAP - 2,12 m ¹
Slaaghsloot (boezempel)	Watergangnummer 453-058-01183	Winterpeil: NAP - 0,64 m ¹ Zomerpeil: NAP - 0,61 m ¹
Peilverschil tussen polder en boezem		t.o.v. winterpeil: NAP - 1,28 m ¹ t.o.v. zomerpeil: NAP - 1,31 m ¹

Figuur 1 Peilbeheer polder Slaagmolen Oost

De polder Slaagmolen Oost bestaat uit één peilvak en vier peilafwijkingen. Het heeft een oppervlakte van 55,78 ha. De huidige gemaalcapaciteit bedraagt nu 2,6 m³/min. De polder krijgt bij nieuwbouw een minimale capaciteit van 9,2 m³/min. De huidige capaciteit is niet voldoende.

Om de bemaling van de achterliggende polder te garanderen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de functionaliteit van het gemaal:

- slopen van het oude gemaal;
- herstellen van de kade bij het gesloopte gemaal;
- aanbrengen terreinverlichting (middels een lichtmast);
- aanbrengen hekwerk van ca. 1m¹ hoog;
- verbreden van de aanvoersloot;
- aanleggen van een persleiding;
- aanbrengen van terreinverharding t.b.v. de bereikbaarheid van het gemaal;
- plaatsen van betreedbare behuizing;
- nieuwe pomp aanbrengen (met criteria: visvriendelijk en vuilongevoelig);
- instroomvoorziening realiseren in de oever voorzien van o.a. krooshek, slibschot en oeverbescherming;
- uitstroomvoorziening realiseren in de oever voorzien van o.a. een uitstroombak, terugslagklep en slibschot;
- indien nodig een bemaling aanbrengen voor aanleg van de in- en uitstroomvoorziening;
- opschonen en eventueel baggeren van het oppervlaktewater ter plaatse van de in- en uitstroomvoorziening.

In dit projectplan leest u uitgebreid over de werkzaamheden van het hoogheemraadschap.

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel van het project

Het poldergemaal Slaaghmolen is gebouwd in 1963 en gereviseerd in 1982. Het verouderde gemaal is in beheer van de gemeente Leiden. De gemeente draagt het gemaal over aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het gemaal voldoet niet aan de voorwaarden die het hoogheemraadschap stelt. Het gemaal voldoet niet aan de Arbo-wetgeving en de elektronica en software is niet conform de standaard van het hoogheemraadschap.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat het huidige poldergemaal amoveren en nieuwbouw van het gemaal realiseren. De kade nabij het huidige gemaal en ter plaatse van het nieuwe gemaal moet worden hersteld. Door deze maatregel worden de volgende doelen gerealiseerd:

- Bedrijfszekerheid van de bemaling;
- Voldoen aan de huidige wet- en regelgeving (onder andere ARBO wetgeving);
- Verbetering van de bereikbaarheid;

Na realisatie van dit project kan de bemalingcontinuïteit van het gebied worden gegarandeerd. Wateroverlast treedt na de bouw van het gemaal alleen op in uitzonderlijke situaties, als er zo veel neerslag valt dat het buiten de resultaatverplichting van Rijnland valt. In die gevallen stelt Rijnland het calamiteitenplan in werking en heeft Rijnland op dat moment een inspanningsverplichting.

1.2 Waarom een projectplan?

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.

Het renoveren van het gemaal wordt uitgevoerd in het kader van bestendig beheer en onderhoud en het opnieuw inrichten van het terrein wordt uitgevoerd in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling.

Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste te bevatten:

- een beschrijving van het betrokken werk
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd
- alsmede een beschrijving van de consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen

Dit plan geeft ingelanden de mogelijkheid om bezwaar te maken of zienswijzen in te dienen op de voorgenomen plannen van Rijnland. Dit plan heeft geen inspraakprocedure. Na vaststelling van het projectplan kunnen ingelanden beroep aantekenen bij de rechtbank. Voor de procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

1.3 Leeswijzer


Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van aanpassingen aan een waterregulerend kunstwerk, de secundaire waterkering en een toevoerwatergang welke binnen de formele verantwoordelijkheden en het bestaande beleid van Rijnland vallen.

- Hoofdstuk 1 behandelt de aanleiding van dit projectplan en de doelstelling van het project.
- In hoofdstuk 2 worden de locatie en het project beschreven inclusief de documenten waarop dit projectplan is gebaseerd.
- In hoofdstuk 3 worden de inrichtingsmaatregelen beschreven.
- Hoofdstuk 4 gaat in op de wijze van uitvoering en komt de praktische afwikkeling van de uitvoering aan de orde.
- Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het projectplan vast te stellen.

2 Gemaal Slaaghmolen (huidige situatie)

2.1 Slaaghpolder

De Slaaghpolder ligt in het zuidelijk deel van de Slaaghwijk in de gemeente Leiden. De polder wordt gevoed vanuit de boezems Zijl, Haarlemmer Treksloot en Slaaghsloot. Ook wordt een deel van de polder gevoed door water uit het peilgebied Nieuw Leyden II. De polder wordt begrensd door het spoortraject (NW), de Haarlemmer Trek Vaart (boezemwater, W), de Zijl (O) en de provinciale weg N445 (Z).

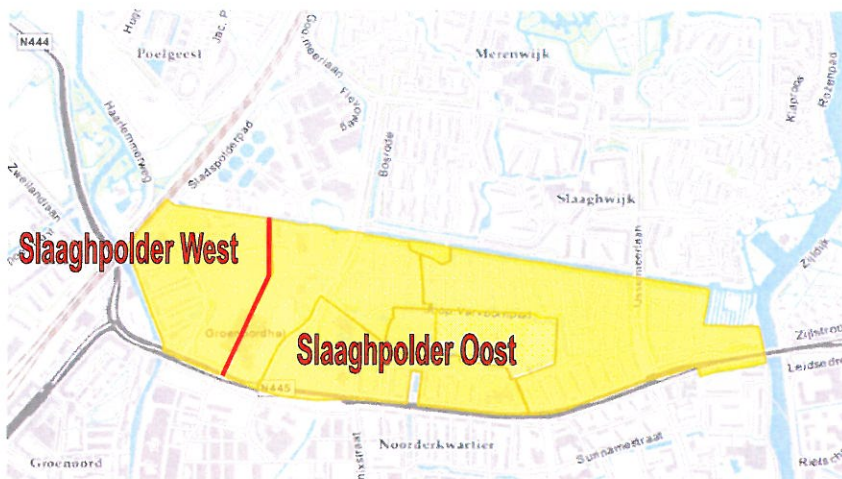

Figuur 2 Indicatieve ligging van de Slaaghpolder in Leiden

2.2 Watersysteem en poldergemaal Slaaghmolen

De huidige polder bestaat uit 2 peilgebieden en 5 peilafwijkingen. Een van de afwijkingen betreft het voetbalterrein van FC Roodenburg, de overige afwijkingen betreffen hoogwatervoorzieningen. Het gemaal Slaaghmolen bemaalt het oostelijk deel van de polder en heeft een huidige capaciteit van 2,6 m³/min. Het huidige gemaal bevindt zich in een 'tuinthuisje' naast de Stadsmolen en slaat uit op de Slaaghsloot. Via het terrein van de Stadsmolen is het gemaal te bereiken. De grond onder het gemaal is in eigendom van gemeente Leiden.

In figuur 3 is het peilbeheer van het watersysteem van Slaaghpolder Oost weergegeven.

Watergang/polder	Kenmerk	Streefpeil
Slaaghpolder Oost	Peilvak RL-10	Vast peil: NAP – 1.92 m ¹
Hoogwatervoorzieningen Slaaghpolder Oost (peilafwijking)	Peilvakken RL-10-HW01, RL-10-HW02 en RL-10-HW03	
Onderbemaling FC Roodenburg	Peilvak OB-55	Vast peil: NAP – 2.12 m ¹
Slaaghsloot (boezempelig)	Watergangnummer 453-058-01183	Winterpeil: NAP – 0.64 m ¹ Zomerpeil: NAP – 0.61 m ¹
Peilverschil tussen polder en boezem		t.o.v. winterpeil: NAP – 1.28 m ¹ t.o.v. zomerpeil: NAP – 1.31 m ¹

Figuur 3 Peilbeheer Slaaghpolder Oost

2.3 Vooronderzoek

De volgende onderzoeken zijn of worden uitgevoerd ten behoeve van de beoogde maatregelen:

Onderzoek	Status onderzoek
Geotechnisch onderzoek en milieukundig onderzoek	Uitgevoerd: Rapportage grondmechanisch onderzoek en bouwput advies 5 poldergemalen regio Leiden; RPS 31-05-2013
Asbestinventarisatie	Uitgevoerd; Asbestinventarisatie type A; RPS 23-05-2013
Flora en Fauna onderzoek	(Nog) Niet uitgevoerd
Niet gesprongen explosieven	(Nog) Niet uitgevoerd
Cultuurhistorisch onderzoek (archeologische waarden)	Niet noodzakelijk, zie toelichting
Waterbodemonderzoek	Reeds uitgevoerd: Verkennend (waterbodemonderzoek) vijf gemaallocaties in Leiden; RPS 24-05-2013
Onderzoek kabels en leidingen	Reeds uitgevoerd: kenmerk aanvraag 13O008440_1; 22-05-2013

Figuur 4 Vooronderzoek

Geotechnisch onderzoek en milieukundig onderzoek

Op de toekomstige bouwlocatie wordt een grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft tot doel de fysische en civieltechnische kwaliteit van de bodem vast te stellen. Met de verkregen informatie kan worden bepaald tot welke diepten een evt. bouwput gegraven kan worden zonder dat hierbij risico's optreden.

Uit het onderzoek blijkt dat het plaatsen van een damwand nodig is om de bouwput voldoende te beschermen. Geadviseerd wordt om een damwand tot 5,50m beneden NAP te plaatsen zodat tot 4m beneden NAP gebouwd kan worden. Hierbij wordt aangenomen dat bronbemaling niet nodig is.

Asbestinventarisatie

Het gemaal en bijbehorende onderdelen worden geïnventariseerd op aanwezigheid van asbest. Doel is om de risico's van asbest op mens en omgeving te voorkomen bij een aanpassing of sloop van gemalen.

De rapportage van het uitgevoerde asbestonderzoek geeft aan dat geen asbestmaterialen aanwezig zijn.

Flora en Fauna onderzoek

Flora en fauna onderzoek heeft tot doel de evt. aanwezige planten- en diersoorten te beschermen door ze in kaart te brengen. In een voorfase wordt via een quick scan de risico's op het aantreffen bepaald en worden de effecten van de maatregelen op de soorten in kaart gebracht.

Indien volgens de door het hoogheemraadschap vastgestelde werkprotocollen ingevolge de gedragscode Flora en Fauna wetgeving wordt gewerkt is op de locatie veelal geen aanvullend onderzoek nodig. Wel moet bij alle werkzaamheden, indien gewerkt gaat worden tussen 16 maart en 1 september het werkterrein gecontroleerd worden op nesten van vogels (maximaal 1 week voor start van werkzaamheden) door een deskundige. Als een watergang geheel of gedeeltelijk drooggezet moet worden om de werkzaamheden uit te voeren, dient de bouwkuip afgevestigd te worden door een ter zake kundige, voordat de bouwkuip wordt drooggemalen.

Niet gesprongen explosieven

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven is niet verplicht maar heeft wel degelijk nut bij werkzaamheden waarbij het risico op het aantreffen van explosieven aanwezig is. In overleg met bevoegd gezag wordt bepaald of veldonderzoek noodzakelijk is.

Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.

Cultuurhistorisch onderzoek

Het gebied is door de gemeente Leiden niet aangeduid als archeologisch waardevol. Het gemaal staat in een gebied dat door de Provincie is aangegeven als een gebied met een 'redelijke tot grote kans op archeologische sporen'. Het volgende wordt daarom geconcludeerd: indien bij de nieuwbouw van het gemaal een bouwput wordt aangelegd is het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek niet noodzakelijk. Er is wel een kans dat er archeologische waarden worden aangetroffen. Als dit laatste het geval is zal nader archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Archeologisch onderzoek is derhalve niet nodig.

Waterbodemonderzoek

De waterbodem ter plaatse van de voorgenomen nieuwbouw locaties is geclassificeerd als verspreidbaar op aangrenzend perceel (cf. BBK toetsing verspreidbaarheid op aangrenzend perceel). De baggerspecie wordt verder geclassificeerd als klasse B (toepasbaarheid in oppervlaktewater) en klasse Industrie (toepasbaarheid op landbodem).

Onderzoek kabels en leidingen

Door middel van een KLIC-melding met kenmerk 13O008440_1 (datum 22/02/2013) is bekend welke kabels en leidingen op de locatie liggen. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in overleg met de eigenaren van de relevante kabels en leidingen maatregelen getroffen waardoor geen schade aan deze kabels en leidingen kan worden veroorzaakt.

4 Wijze van uitvoering

4.1 Werkzaamheden

Voor de aanleg van de in- en uitstroomvoorzieningen worden enkele kleinschalige graafwerkzaamheden uitgevoerd in de oever en de watergang. De watergang wordt hiervoor mogelijk tijdelijk drooggezet. Dit betekent dat het werkgedeelte wordt afgedamd en dat het water in de bouwput wordt bemalen op de watergang. Zodoende kan in den droge worden gewerkt. De behuizing wordt aangebracht op een te storten betonvloer. Voor de werkzaamheden worden geen bomen gekapt.

Om de bemaling van de achterliggende polder te garanderen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de functionaliteit van het gemaal:

- slopen van het oude gemaal;
- herstellen van de kade bij het gesloopte gemaal;
- aanbrengen terreinverlichting via lichtmast;
- aanbrengen hekwerk van ca. 1m¹ hoog;
- verbreden van de aanvoersloot;
- aanleggen van een persleiding;
- aanbrengen van terreinverharding t.b.v. de bereikbaarheid van het gemaal;
- plaatsen van betreedbare behuizing;
- nieuwe pomp aanbrengen (met criteria: visvriendelijk en vuilongevoelig);
- instroomvoorziening realiseren in de oever voorzien van o.a. krooshek, slibschot en oeversbeschermer;
- uitstroomvoorziening realiseren in de oever voorzien van o.a. een uitstroombak, terugslagklep en slibschot;
- indien nodig een bemaling aanbrengen voor aanleg van de in- en uitstroomvoorziening;
- opschonen en eventueel baggeren van het oppervlaktewater ter plaatse van de in- en uitstroomvoorziening.

4.2 Voorkomen van overlast

De werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de openbare ruimte. Dat wil zeggen dat er getracht wordt zo min mogelijk overlast voor de omgeving te veroorzaken. Hierbij kan worden gedacht aan geluidsoverlast of wegafzettingen. Het surplus aan geluid voor de nieuwbouw van het gemaal leiden mogelijk tot geluidshinder voor de omgeving. Omdat het terrein vanaf het fietspad langs de Gooimeerlaan bereikt wordt zijn tijdelijke wegafzettingen niet nodig, maar kan het (fiets)verkeer wel hinder ondervinden van de werkzaamheden. Gedurende de werkzaamheden wordt met deze hinder rekening gehouden en geprobeerd tot een minimum te beperken.

4.3 Eigendom en samenwerking

Het terrein en de gronden onder het huidige gemaal zijn in eigendom van gemeente Leiden. Volgens de Waterwet, artikel 5.23, lid 1, zijn grondeigenaren (in deze het hoogheemraadschap) gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan een waterstaatswerk (als een gemaal) te gedogen als dit maar tenminste 48 uur van te voren (schriftelijk) aan hen wordt medegedeeld.

Met de gemeente worden de werkzaamheden afgestemd en tevens worden benodigde vergunningen aangevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden.

4.4 Vergunningen en ontheffingen

4.4.1 Omgevingsvergunning

Voor de werkzaamheden is mogelijk een omgevingsvergunning nodig welke (indien noodzakelijk) wordt aangevraagd bij de gemeente Leiden.

4.4.2 Flora en Faunawet

Nieuwbouw van het gemaal en de daartoe behorende werkzaamheden kunnen effecten hebben op de aanwezige beschermde soorten. Een van de criteria is dat gewerkt gaat worden volgens het werkprotocol van het hoogheemraadschap waardoor schadelijke effecten aan de beschermde soorten van de flora- en faunawet worden voorkomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de werkprotocollen Flora- en Faunawet van Rijnland. Bij de fasering van de werkzaamheden wordt geborgd dat verstoring van broedvogels niet plaatsvindt. In figuur 6 wordt per onderdeel van de werkzaamheden in het projectgebied het betreffende werkprotocol aangegeven.

Werkzaamheden	Werkprotocol
slopen bestaande gemaal	werkprotocol 10 (sloop van gebouwen en kunstwerken)
realiseren gemaal	werkprotocol 11 (bouwactiviteiten)
realisatie persleiding	werkprotocol 9 (verwijderen van bovengrond/graven)
opschonen/baggeren bestaande watergang	werkprotocol 2 en 3 Schonen van het natte profiel en baggeren van bodems en herprofilering

Figuur 6: Toe te passen werkprotocollen

Bij alle werkzaamheden moet, indien gewerkt gaat worden tussen 16 maart en 1 september het werkterrein gecontroleerd worden op nesten van vogels (maximaal 1 week voor start van werkzaamheden) door een terzake kundige. Als een watergang geheel of gedeeltelijk drooggezet moet worden om de werkzaamheden uit te voeren, dient de bouwkuip afgevestigd te worden door een terzake kundige, voordat de bouwkuip wordt drooggemalen.

4.4.3 Archeologie en cultuurhistorie

Het gebied is door de gemeente Leiden niet aangeduid als archeologisch waardevol. Het gemaal staat in een gebied dat door provincie is aangegeven als een gebied met een 'redelijke tot grote kans op archeologische sporen'. Het volgende wordt daarom geconcludeerd: indien bij de nieuwbouw van het gemaal een bouwput wordt aangelegd, is het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek niet noodzakelijk. Er is wel een kans dat er archeologische waarden worden aangetroffen. Als dit laatste het geval is zal nader archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Archeologisch onderzoek is derhalve niet nodig.

4.4.4 Waterbodemonderzoek

De waterbodem ter plaatse van de voorgenomen nieuwbouw locaties is geclassificeerd als verspreidbaar op aangrenzend perceel (cf. BBK toetsing verspreidbaarheid op aangrenzend perceel). Bij de werkzaamheden wordt de baggerspecie op de kant afgezet, er wordt geen specie afgevoerd.

4.5 Praktische afwikkeling

4.5.1 Kabels en leidingen

Door middel van een KLIC-melding is bekend welke kabels en leidingen op de locatie liggen. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in overleg met de eigenaren van de relevante kabels en leidingen maatregelen getroffen waardoor geen schade aan deze kabels en leidingen kan worden veroorzaakt.

4.5.2 Financiën

De kosten voor de omschreven watersysteemoptimalisatie beschreven in dit plan komen voor rekening van Rijnland en de gemeente Leiden.

4.5.3 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de (toekomstige) hoofdwatertangen en het poldergemaal in deze hoofdwatertangen worden ondergebracht bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Hiervoor wordt de legger aangepast, dit vindt via een ander proces plaats en valt daarmee buiten de scope van dit projectplan.

4.5.4 Consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen

De gronden onder het gemaal zijn eigendom van gemeente Leiden. Indien noodzakelijk worden afspraken gemaakt t.a.v. compensatie.

4.5.5 Globale planning

De uitvoering van de werkzaamheden starten nadat afstemming met ingelanden heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden kunnen starten nadat dit projectplan is vastgesteld en daarnaast de overige benodigde vergunningen verkregen zijn. Tevens dient rekening te worden gehouden met de invloeden op de flora en fauna; bv. geen werkzaamheden gedurende het broedseizoen.

De verwachting is dat medio 2014 de werkzaamheden uitgevoerd worden.

5 Besluitvorming en procedure

5.1 Procedure projectplan

De procedure welke gevolgd wordt voor dit projectplan is de reguliere (korte) procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De verloop van de procedure is als volgt:

- Het projectplan wordt direct vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
- Het besluit wordt gepubliceerd en daarmee begint de termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar.
- Indien van toepassing volgt de bezwaarschriftenprocedure, de bezwaren worden behandeld door de bezwaarschriftencommissie van Rijnland.
- Bij bezwaren wordt het besluit van het dagelijkse bestuur van Rijnland heroverwogen.
- Indien van toepassing volgt een beroepprocedure bij de rechtbank conform 7.1.a. Awb. Dit alleen indien er bezwaar tegen het besluit gemaakt is.

Inwerkingtreding: Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door digitale publicatie in het Waterschapsblad, op het internet te raadplegen via <http://www.rijnland.net/>.

5.2 Mededelingen over de procedure in publicatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit (het ontwerp-projectplan) bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de maatregel(en) en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Dit verzoek kan worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het projectplan worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

5.3 Communicatie

Het werk is en wordt afgestemd met de direct betrokken grondeigenaren/gebruikers.

Bijlage Overzichtstekening met kenmerk 407 4C36 022 011
