

Projectplan waterberging Landgoed Alerdinck II

Onderdeel van Programma 'Ruimte om te leven met Water'



Opsteller: Waterschap Groot Salland
Dokter van Thienenweg 1
8025 AL Zwolle

Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet en de Inspraakverordening Waterschap Groot Salland het onderhavige projectplan in ontwerp vast te stellen.

Zwolle, 13 november 2012

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Groot Salland

de secretaris

de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

ir. H.H.G. Dijk

LEESWIJZER

Het projectplan Alerdinck II bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV (bijlagen) bevat vooral toelichtend kaartmateriaal en dwarsprofielen.

In droge perioden wordt vanuit het Overijssels Kanaal Lemelerveld – Zwolle water aangevoerd om deze watergang op peil te houden. De totale lengte van de her in te richten watergang is 800 m1. Het achterliggende stroomgebied is ca. 340 ha groot.

3. Uit te voeren onderdelen

Met de geplande werken wordt invulling gegeven aan de KRW-opgaven en aan de opgaven vanuit WB21, en Waternood. Langs de her in te richten watergang wordt uitvoering gegeven aan de Beheer en Onderhoud Visie watergangen 2050.

Binnen het stroomgebied van deze watergang is nog wel een resterende opgave voor het op orde krijgen van het watersysteem in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water (bui eens per 10 jaar water binnen de boord). Dit betekent dat in de toekomst nog extra maatregelen nodig zijn, vooral met betrekking tot realiseren van waterberging en eventueel ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water. In het hier gepresenteerde aan te pakken tracé zullen in de toekomst geen aanvullende ingrepen plaatsvinden. Tegelijk met de aanleg/wijziging van de waterstaatswerken voorziet het projectplan ook in een 'opknopbeurt' van de Oude Zeedijk. De Oude Zeedijk is geen waterstaatswerk in de zin van de waterwet.

Het voorgenumen project bestaat uit de volgende (per beleidsopgave gerubriceerde) onderdelen:

1. WB21 / Waternood
 - a. De aanleg van circa 1,1 ha waterberging;
 - b. Het realiseren van waterberging door het geheel dan wel gedeeltelijk afgraven van de onderhoudspaden;
 - c. Het realiseren van waterberging, ca. 0,4 ha, door het afgraven van een strook bosgrond;
2. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
 - a. Taluds vergraven (800 m natuurvriendelijke oever);
 - b. Aanleggen van plaatselijke verdiepingen voor vis (voor overwintering);
3. GGOR
 - a. Het waterbeheer in normale omstandigheden is vastgesteld volgens GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime). De her in te richten watergang ligt in een gebied met wisselende bestemmingen, landbouw en natuur. Het is peil is hierop afgestemd.
4. Visie beheer en onderhoud watergangen 2050
 - a. Onderhoud, beheer en inrichting passen binnen de kaders van de Beheer- en onderhoudsvisie watergangen 2050.
5. Beleid Cultuurhistorische objecten
 - a. Binnen dit project wordt de begroeiing onder de 'monumentale' bomen ter weerszijden van de laan op de Oude Zeedijk verwijderd. Hierdoor valt dit karakteristieke historisch object meer op in het landschap.
6. Recreatief medegebruik
 - a. Er worden langs de her in te richten watergang geen mogelijkheden geboden voor recreatief medegebruik.
 - b. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de nabij gelegen Oude Zeedijk. Door deze werkzaamheden worden de landschappelijke waarden en de recreatie op het opengestelde landgoed versterkt.
7. Kunstwerken
 - a. De oude bestaande stuw wordt verwijderd en er wordt een nieuwe stuw geplaatst. Deze stuw komt ca. 200 m1 stroomafwaards zodat de waterberging minder diep

afgegraven hoeft te worden. Ook worden er binnen dit project enkele duikers gelegd om het toekomstige onderhoud met breedspoormachines uit te kunnen voeren.

b.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij de bestaande watergang. Op de kaart in bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de locatie van alle maatregelen.

Aan de oostzijde van de watergang wordt de onderhoudsroute gerealiseerd. Aan de andere zijde komt een flauw talud, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare ruimte (dit talud zal variëren tussen 1:2 en maximaal 1:10). Het flauwe talud biedt meer ruimte voor waterberging en begroeiing in het natte profiel en is gunstig voor de oeverstabiliteit.

In onderstaande tekst wordt nader ingegaan op de uit te voeren onderdelen.

Bergingspercelen:

Het perceel aan de Armjagersdijk en de taluds aan de westzijde worden benut voor de aanleg van waterberging. Deze waterbergingen met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,5 ha, worden aangelegd om tijdens piekafvoeren tijdelijk het overtollige water te kunnen opvangen. Door niet dieper af te graven dan zomerpeil of Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) wordt voorkomen dat de waterberging drainerend gaat werken. De vrijkomende grond wordt op het landgoed afgezet. In totaal wordt circa 6.500 m³ ontgraven.

Met de aanleg van deze bergingen wordt invulling gegeven aan een deel van de bergingsopgave voor het gebied dat direct afwatert op de zijtak van de Kolkwetering. De totale bergingsopgave voor het stroomgebied om het gebied WaterNoodproof te maken is 5 ha. In de komende jaren is aanleg van meer ruimte voor water binnen het stroomgebied (minimaal 3,5 ha) nog noodzakelijk.

Natuuroevers/waterbergingen:

De natuuroevers, ca. 0,4 ha., worden onder flauwe hellingen, afhankelijk van de beschikbare ruimte aangelegd. De natuurvriendelijke oever die wordt gerealiseerd op het bestaande bosperceel, moet zo worden afgegraven dat er weer bos gevormd wordt. Dit vanwege regelgeving in de Boswet.

De waterberging van ca. 1.1 ha. krijgt een dubbelfunctie. Naast waterberging wordt dit perceel zo ingericht dat zich hier nieuwe natuur kan ontwikkelen die voldoet aan de uitgangspunten van het beleid van de provincie.

Plaatsen stuw

In de her in te richten watergang bevindt zich een oude stuw. Deze stuw wordt verwijderd en ca. 200 m1 stroomafwaards wordt een nieuwe stuw geplaatst. Hierdoor hoeft de waterberging minder diep afgegraven te worden.

Kunstwerken

In de huidige situatie liggen er dammen met duikers in de hoofdwatgang. Ook in de zijwatgangen die afwateren op de hoofdwatgang zijn diverse dammen met duikers aanwezig. Nabij de te plaatsen stuw worden de dammen met duikers zo gelegd dat de zijwatgangen (kavelsloten) benedenstrooms van de nieuw te plaatsen stuw (oude peil) afwateren. In totaal gaat het om 3 dammen met duiker in de onderhoudsroute. Deze zijn op de tekening aangegeven. De lengte van de bovenbreedte wordt ca. 6 m1, het betreft duikers van PVC met een diameter van rond 315 mm1.

Twee van de duikers worden aangebracht benedenstrooms van de stuw om de bestaande kavelsloten af te laten wateren op het oude, benedenstroomse, peil. De andere duiker wordt aangelegd in de bermsloot van de Grote Hagenweg, aan de oostzijde van de watergang.

De duiker onder de Grote Hagenweg wordt in noordelijke richting verlengd om de verkeersveiligheid te verhogen. Ook dit staat op de tekening aangegeven.

Daar waar voor de onderhoudsroute gebruik wordt gemaakt van dammen en duikers komt de onderhoudsplicht voor de constructie van de dam met duiker bij het waterschap te liggen. De zorg voor watervoerendheid van de dam met duiker komt bij de aanliggende eigenaar te liggen.

De vergunninghouder wordt hierover door het waterschap geïnformeerd.

Recreatieve voorzieningen:

Binnen het beleid Cultuurhistorische Objecten van het waterschap wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de nabij gelegen Oude Zeedijk. Door deze werkzaamheden worden de landschappelijke waarden en de recreatie op het opengestelde landgoed versterkt. Over de oude zeedijk ligt de Armjagersdijk, deze is nu reeds voor wandelaars en fietsers toegankelijk. De hooggelegen Armjagersdijk loopt langs de waterberging. De werkzaamheden bestaan uit het aan weerszijden verwijderen van de begroeiing onder de 'monumentale' bomen op Oude Zeedijk.

Andere mogelijkheden voor recreatief medegebruik doen zich in dit project niet voor.

4. Beschikbaarheid gronden

Het project wordt uitgevoerd op de gronden die in eigendom zijn en blijven van het Landgoed Alerdinck II. Hierover is met het landgoed overeenstemming bereikt. In de toekomst zal in het stroomgebied van de onderhavige zijtak van de Kolkwetering wel aanvullende verwerving plaatsvinden voor de realisatie van de resterende wateropgaven.

5. Effecten van het plan

De voorgenomen maatregelen zullen bijdragen aan een verbetering van de biologische waterkwaliteit en het tegengaan van wateroverlast. Door het creëren van natuurvriendelijke oevers met ondiep water en door de vispassages ontstaat er meer diversiteit in de vegetatie. Hierdoor ontstaat een beter leefgebied voor vis wat direct bijdraagt aan het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water.

Langs de randen van een agrarische perceel wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. Op de kadastrale grens wordt een raster geplaatst en voor beheer overgedragen aan de aangelegen eigenaar. Tussen (nieuwe) insteek en raster blijft een zone van minimaal 30 cm. in oorspronkelijke staat.

De beschikbaarheid van ruimte om water te bergen betekent dat in tijden van wateroverlast een deel van het water geborgen kan worden in de geplande bergingen. Wateroverlast wordt daarmee sterk verminderd en tegelijkertijd wordt water zoveel mogelijk vastgehouden in het gebied. Dit heeft als neveneffect, maar niet onbelangrijk, dat de verdroging wordt tegengegaan.

De huidige plannen realiseren een deel van de benodigde opgave voor dit stroomgebied. De wateropgave om inundatie tegen te gaan is nog niet volledig ingevuld, het betreft ongeveer 1,5 ha van de in totaal 5 ha die nodig is voor een veilig en robuust watersysteem. De overige 3,5 ha zal elders in het stroomgebied ingevuld worden.

6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij de bestaande watergang tussen het Overijssels Kanaal en de Grote Hagenweg te Laag Zuthem. In onderstaande tekst wordt, voor zover nodig, per onderdeel ingegaan op de praktische aspecten rond de uitvoering.

Natuuroevers/waterbergingen:

Het perceel aan de oostzijde van de Armjagersdijk en de taluds aan de oostzijde van het bosperceel worden benut voor de aanleg van waterberging. De strook bos langs de watergang wordt voorafgaand aan de graafwerkzaamheden in opdracht van het landgoed gekapt. De beide percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,5 ha. De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met een rupskraan. De vrijkomende grond wordt afgevoerd met dumpers en gebruikt om lage percelen op het landgoed te verbeteren. In totaal wordt circa 6.500 m³ ontgraven en vervoerd. Tijdens het transport moet schade aan wegen en percelen voorkomen worden.

Nieuwe stuw:

In de her in te richten watergang bevindt zich een oude stuw. Deze stuw verkeert in een slechte staat en wordt binnen dit project vervangen. Vooraf wordt middels een bronbemaling de bouwput droog gemaakt. De prefab stuw en de vistrap worden op een werkvloer geplaatst. Daarna wordt de betonvoorziening aangebracht om uitspoeling te voorkomen. Belangrijk aspect tijdens de uitvoering is de afvoer van water tijdens de uitvoering te waarborgen. Hiervoor wordt een omleiding rond de bouwput aangebracht.

7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

De natuurontwikkeling voor de KRW doelen geeft wat meer ruige natuur. Er wordt gestuurd op de ontwikkeling van de vegetatie door het beheer en onderhoud en door de wijze van inrichting zodat de invloed op de naastgelegen percelen beperkt blijft. De frequentie van het maaibeheer kan tijdelijk opgevoerd worden om nadelige effecten voor de percelen te beperken indien blijkt dat dit nodig is. Ook bij het onderhoud van het bergingsperceel wordt rekening gehouden met de doelstellingen van de dubbelfunctie waterberging / nieuwe natuur. Een beschrijving van het beheer- en onderhoudsplan is opgenomen in hoofdstuk 8.

Het Waterschap heeft de nodige ervaring met het uitvoeren van soortgelijke projecten. Door de uitvoering van het werk wordt er geen schade voor derden verwacht.

Overlast tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk beperkt, maar kan niet helemaal door het treffen van maatregelen worden voorkomen. Eventuele uitvoeringsschade aan eigendommen van derden (rijsporen, gewasderving, enz.) wordt vergoed. In de voorbereiding heeft er, maar ook in de uitvoering zal er, veel overleg plaatsvinden met het landgoed.

Vanuit de Flora- en faunawet bestaat de eis dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Het waterschap werkt met de Gedragscode Flora en faunawet voor Waterschappen en levert zo een maximale inspanning om de bestaande natuur te beschermen.

7.1 Financieel nadeel

Als een belanghebbende door dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding

worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening Nadeelcompensatie Waterschap Groot Salland.

8. Legger, beheer en onderhoud

8.1 Legger

Na de realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van de oppervlaktewaterlichamen.

8.2 Beheer en onderhoud

In deze paragraaf worden de streefbeelden en de wijze van beheer en onderhoud van de heringerichte watergang en de waterberging beschreven.

In de bijgevoegde onderhoudstabel is per onderdeel het onderhoudsbeeld, de onderhoudsmaatregel en de bijbehorende onderhoudsfrequentie opgenomen.

Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd conform de "Beheer- en Onderhoudsvisie watergangen 2050" van het waterschap. Dit is te raadplegen op de website van het waterschap:

<http://www.wgs.nl/loket/beleid/beheer/> .

Na uitvoering van dit plan worden het doorstroomprofiel, de waterberging en de natuurvriendelijke oevers door het waterschap onderhouden.

Watergang:

Het stroomprofiel wordt 1 tot 2 keer per jaar onderhouden. Het onderhoud van de vergraven watergang wordt uitgevoerd met rijdend materieel. Het maaisel wordt neergelegd op de onderhoudsroute op basis van beperkt medegebruik met nadeelcompensatie. De vergraven (stabielere) oever langs het landbouwperceel wordt 1 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt neergelegd op de onderhoudsroute op basis van beperkt medegebruik met nadeelcompensatie.

Het landgoed Alerdinck II blijft eigenaar van de onderhoudsroute. Het landgoed heeft in overleg met het waterschap gekozen voor optie B uit de "Beheer- en Onderhoudsvisie watergangen 2050" van het waterschap.

Natuurvriendelijke oever:

De natuurvriendelijke oever ter hoogte van het bosperceel heeft het streefbeeld broekbos met struieel en worden niet onderhouden. De natuurvriendelijke oever ter hoogte van de waterberging wordt 1 keer in de 5 jaar gemaaid. Dit maaisel wordt afgevoerd.

Waterberging:

De waterberging heeft het streefbeeld kruidenrijk grasland en wordt 1 keer per jaar gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd.

Wel moet vermeld worden dat aard en omvang van toekomstige begroeiing in de watergang en de natuurvriendelijke oevers niet vooraf voor 100% vast staat. Wanneer zich andere ontwikkelingen voordoen dan verwacht moet in overleg met het landgoed opnieuw gekeken worden naar de streefbeelden en de bijbehorende onderhoudsfrequenties, welke daardoor kunnen wijzigen.

Eventuele wijzigingen in onderhoudsfrequenties van de natuurvriendelijke oevers zullen na overleg met het landgoed worden toegepast.

Het onderhoud aan de waterberging wordt door of namens het waterschap uitgevoerd. Het maaisel uit de bergingen wordt afgevoerd door het waterschap.

Ook voor de waterbergingen geldt dat aard en omvang van toekomstige begroeiing niet vooraf voor 100% vast staat. Wanneer zich andere ontwikkelingen voordoen dan verwacht moet opnieuw gekeken worden naar de streefbeelden en de bijbehorende onderhoudsfrequenties (deze kan zowel hoger of lager komen te liggen).

9. Samenwerking

Het plan is opgesteld in samenwerking met het landgoed Alerdinck II. De betrokken grondeigenaren nabij de watergang zijn op de hoogte gebracht van de uit te voeren maatregelen. Het projectplan is getoetst aan het Landschaps Ontwikkelingen Plan (LOP) Salland.

DEEL II VERANTWOORDING

1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Waterwet

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken.

Het voorliggend projectplan is opgesteld binnen de kaders van de Waterwet die in 2009 van kracht is geworden. De toepassing van de Waterwet is gericht op (artikel 2.1 van de Waterwet):

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Ad a. Voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Waterschap Groot Salland heeft zijn beleid gericht op het voorkomen en waar nodig het beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Dit is vastgelegd in het Waterbeheersplan 2010-2015, vastgesteld op 26 november 2009 door het algemeen bestuur van het waterschap en medio december door de provincie Overijssel goedgekeurd.

Binnen dit project is voorzien in de aanleg van een berging, naast enkele verruimingen van het stroombed in combinatie met de realisatie van een natuurvriendelijke oever. De totale omvang van de aanvullende berging buiten het huidige stroombed bedraagt ca. 1,5 ha. Het ontwerp van de natuurvriendelijke oevers is zo ingevuld dat er geen nadelige effecten optreden voor de waterdoorvoer of de waterbergingscapaciteit.

Het toenemen van de vegetatie is wel een doel van dit project en in de praktijk kan dit een nadelig effect hebben op de afvoercapaciteit door het verhogen van de weerstand. In het beheer- en onderhoudsplan is hier rekening mee gehouden. De begroeiing zal niet zo toenemen dat de benodigde afvoercapaciteit in gevaar komt. De geprojecteerde berging zal functioneel blijven. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf beheer en onderhoud.

Doelstelling is het realiseren van een duurzaam en veerkrachtig ingericht watersysteem, dat de geldende landbouw- en natuurfunctie ondersteunt door middel van gewenst grondwater- en oppervlaktewaterregime (GGOR). Er is geen aanpassing van het peil voorzien, behalve dat de nieuwe stuw 200 m1 stroomafwaarts wordt geplaatst. Effecten op het grondwater in de omgeving blijven gelijk, mede doordat de bergingen niet dieper dan het zomerpeil aangelegd worden. Bij normale waterstanden zullen de bergingen droogvallen, ze voeren ook geen extra kwel af.

b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

In het Waterbeheerplan 2010 – 2015 zijn maatregelen opgenomen voor verbetering van de waterkwaliteit. De gepresenteerde maatregelen zijn er op gericht de leefomstandigheden hiervoor te verbeteren en de inliggende stuw vispasseerbaar te maken.

c. Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem

Bij het opstellen van het plan samen met het landgoed is gekeken naar de verschillende belangen binnen het gebied. Het integrale plan is een optimale mix van landbouwkundige-, waterbeheer inrichtingsmaatregelen en natuurontwikkeling.

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet:

De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstelling van de Waterwet.

2. Verantwoording op basis van beleid

2.1 Toets beleid waterschap

De voorgenomen inrichtingsmaatregelen zijn een rechtsreeks resultaat van de afspraken in het waterbeheerplan van Waterschap Groot Salland. In de periode 2002 – 2009 zijn in Nederland op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), wateren aangewezen die bepalend zijn voor het watersysteem. In het in 2009 vastgestelde waterbeheerplan zijn maatregelen benoemd voor het bereiken van de bijbehorende ecologische doelen. Met het uitvoeren van dit projectplan wordt hieraan uitvoering gegeven.

De waterberging is een invulling van de doelstellingen binnen het beleid voor WB21 en NBW. De bergingen voorzien in een gedeeltelijke invulling van de totale opgave.

De resterende opgave (3,5 van de 5 ha) zal in een later stadium in een ander deel van het stroomgebied gerealiseerd moeten worden. Deze resterende opgave blijft dus staan.

Tevens is er voorzien in het groot onderhoud van de cultuurhistorische Oude Zeedijk die evenwijdig aan het plangebied loopt. Dit past binnen het in 2008 vastgestelde beleid Cultuurhistorische Objecten.

2.2 Planologische inpassing

De aan te leggen natuurvriendelijke oevers passen in het bestaande bestemmingsplan. Het betreft geen wijziging van de functie en sluit aan bij de huidige functie van het oppervlaktewater in dit gebied.

De aanleg van de waterberging vindt plaats op (voormalige) landbouwgrond. Deze gronden krijgen een nieuwe aanvullende bestemming, namelijk waterberging en natuurontwikkeling. Hiervoor moet een wijziging van het lokale bestemmingsplan plaatsvinden. Deze nevenfunctie wordt toegevoegd aan de bestaande functie van landbouw of natuur. Hiervoor moet een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden.

3. Verantwoording van de keuzes in het project

De watergang waar de werken worden uitgevoerd is een zijtak van de Kolkwetering. Door uitvoering van dit plan kan tijdens hoge afvoersituaties het water tijdig geborgen worden. Een ander doel van dit plan is het verbeteren van de waterkwaliteitsdoelen zoals door het waterschap is vastgesteld voor de Kolkwetering binnen de normen van de Kaderrichtlijn Water, voor zover het gaat om ecologische waterkwaliteit.

De chemische waterkwaliteit wordt met deze maatregelen niet rechtstreeks verbeterd, hoewel de plantengroei voor een deel voedingsstoffen uit het water zal afvangen. Naast het opnieuw inrichten van deze watergang zal het beheer en onderhoud aangepast worden. Planten en dieren kunnen zich verder ontwikkelen. Het onderhoud is erop gericht dat de afvoerfunctie van het watersysteem gehandhaafd blijft.

Waterberging

De belangrijkste reden om waterberging aan te leggen is het creëren van voldoende veerkracht in het systeem om gevolgen van extreme neerslag (buien zoals ze eens in de tien jaar voorkomen), mede als gevolg van de klimaatverandering, in het systeem op te kunnen vangen (conform huidige situatie). Dit moet gebeuren bij voorkeur zodanig dat er geen schade optreedt voor andere gebruiksfuncties zoals wonen of landbouw. Binnen dit project is er voor gekozen om laaggelegen percelen te verlagen en in te zetten als meebewegende berging. Op het moment dat de waterstand als gevolg van neerslag gaat stijgen, zal dit gebied zich vullen. Daarnaast worden er stroken naast de watergang verlaagd waar extra water geborgen kan worden. Deze maatregelen zorgen er samen voor dat benedenstrooms minder water in één keer aankomt en problemen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Recreatief medegebruik

Er worden langs de herin te richten watergang geen mogelijkheden geboden voor recreatief medegebruik. Binnen het beleid Cultuurhistorische Objecten van het waterschap wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de nabij gelegen Oude Zeedijk. Door deze werkzaamheden worden de landschappelijke waarden en de recreatie op het opengestelde landgoed versterkt. Over de oude zeedijk ligt de Armjagersdijk, deze is voor wandelaars toegankelijk. De hooggelegen Armjagersdijk loopt langs de waterberging.

4. Benodigde vergunningen en meldingen

Aanvullend op dit projectplan zijn de volgende vergunningen nodig:

- Melding ontgrondingen provincie Overijssel
- Wijzigen van het bestemmingsplan gemeente Raalte. De verwachting is dat dit geen problemen met zich meebrengt.

DEEL III RECHTSBESCHERMING (PROCEDURE)

1. Procedure

Uitgebreide procedure conform afdeling 3.4 AWB

Zienswijze

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen.

Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken (vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep instellen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad (Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle) onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening


Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar of beroep indient gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van Sector bestuursrecht van de rechtbank Zwolle-Lelystad (Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle). Daarbij moet een kopie van het bezwaar of beroepschrift worden overlegd. U kunt het verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

DEEL IV BIJLAGEN

- overzichtstekening
- Onderhoudstabel

Bijlage 1. Overzichtstekening

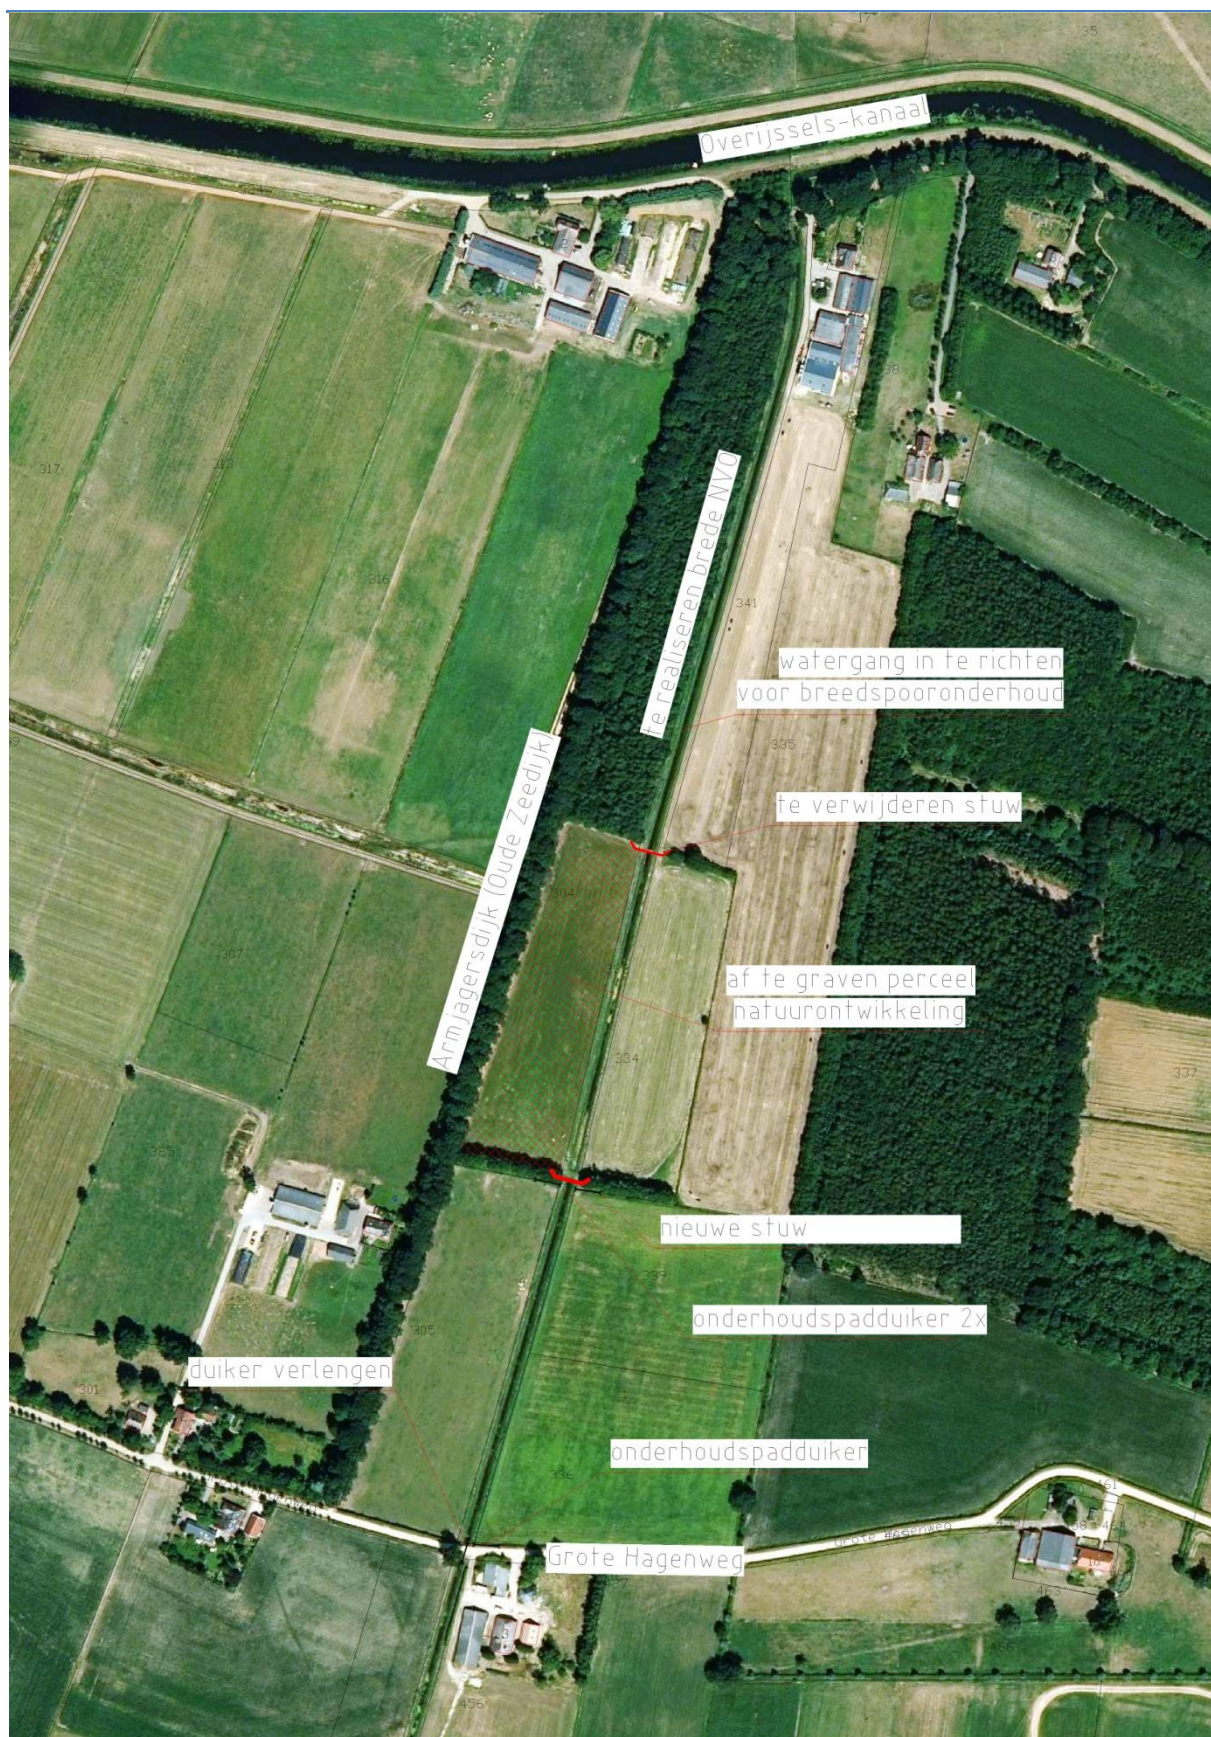

Bijlage 2: Tabel onderhoudsstreefbeelden

In de tabel staan de onderhoudsmaatregelen weergegeven per onderdeel.

Den alerdinck II

Onderdeel/Maaironde	Onderhoudsbeeld	Onderhoudsmaatregel	Frequentie	Methode	Periode
Onderhoudsroute door het land					
Watergang	Een droog talud + een natte oever met een hoge begroeiing	Maaien doorstroomprofiel en 1 natte en droge oever	2x per jaar	Rijdend	1 juni tot 1 november
Natuurvriendelijke oever	Moerasruigte t.h.v. waterberging Struweel/Bos t.h.v bosperceel	Maaien geen onderhoud	1 keer per 5 jaar	Rijdend	1 november-1 februari
Berging	Kruidenrijk grasland	Maaien berging + afvoeren maaisel	Jaarlijks	Rijdend	15 juli tot 15 september
Vispassage	schoon	controleren en schoonmaken	Maandelijkse controle		Februari t/m juni
