

# Projectplan

## ‘Dijkverbetering Mandjeswaard en Polder de Pieper’

---

2015-1275



Opsteller: Waterschap Groot Salland  
Doctor van Thienenweg 1  
8025 AL Zwolle  
Datum: 18-02-2015  
Status: definitief

Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan

Zwolle, 10 maart 2015


Het dagelijks bestuur van het Waterschap Groot Salland

de secretaris

de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

ir. H.H.G. Dijk



## Leeswijzer

Het projectplan “Dijkverbetering Mandjeswaard en Polder de Pieper” bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

## Inhoud

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Leeswijzer.....                                                                                                           | 3  |
| DEEL I PROJECTBESCHRIJVING.....                                                                                           | 5  |
| 1. Aanleiding en doel.....                                                                                                | 5  |
| 2. Ligging en begrenzing plangebied.....                                                                                  | 5  |
| 3. Uit te voeren werkzaamheden.....                                                                                       | 7  |
| 4. Beschikbaarheid gronden.....                                                                                           | 11 |
| 5. Effecten van het plan .....                                                                                            | 11 |
| 6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd.....                                                                       | 12 |
| 7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of het beperken van nadelige gevolgen..... | 12 |
| 8. Legger, beheer en onderhoud.....                                                                                       | 12 |
| DEEL II VERANTWOORDING .....                                                                                              | 13 |
| 1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving .....                                                                  | 13 |
| 2. Verantwoording op basis van beleid.....                                                                                | 14 |
| 3. Verantwoording van de keuzen in het project.....                                                                       | 14 |
| 4. Benodigde vergunningen en meldingen .....                                                                              | 14 |
| DEEL III RECHTSBESCHERMING.....                                                                                           | 15 |
| 1.1 Bezwaar.....                                                                                                          | 15 |
| 1.2 Beroep.....                                                                                                           | 15 |
| 1.3 Crisis- en herstelwet.....                                                                                            | 15 |
| 1.4 Verzoek om voorlopige voorziening.....                                                                                | 15 |
| DEEL IV BIJLAGEN                                                                                                          |    |
| Bijlage 1: Overzichtskaart                                                                                                |    |
| Bijlage 2: Nadere analyse veiligheidsprobleem en versterkingsopgave                                                       |    |

## **DEEL I PROJECTBESCHRIJVING**

### **1. Aanleiding en doel**

In samenwerking met de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en de provincie Overijssel is onder de regie van Waterschap Groot Salland het actieprogramma Waterveiligheid Kampereilanden tot stand gekomen. Dit actieprogramma komt voort uit de verkenningsfase Waterveiligheid Kampereilanden en is onderdeel van het uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta. Het actieprogramma omschrijft een samenhangend pakket van projectvoorstellen.

Eén van deze projectvoorstellen betreft de Dijkverbetering Goot, Ganzendiep en Zuiderzeepolder (projectvoorstel 1).

De regionale waterkeringen langs de Goot, het Ganzendiep en de Zuiderzeepolder zijn getoetst aan de door de Provincie Overijssel gestelde norm (2012). De regionale waterkeringen dienen te voldoen aan een inundatiefrequentie 1/500 per jaar.

#### **1.1 Resultaten n.a.v. toetsronde**

Delen van de kering zijn afgekeurd op o.a. bekleding, microstabiliteit, piping en hoogte. Aanvankelijk betrof dit in totaal een lengte van ca. 5.200 m aan regionale waterkeringen die niet aan de norm zou voldoen. Dit zou ook het geval zijn bij 8 kunstwerken: afgetoetst op piping.

Uit de nadere analyse van het veiligheidsprobleem, uitgevoerd in 2013, zijn de aannames die zijn gehanteerd in de toetsing gecontroleerd. De analyse heeft de opgaaf aanmerkelijk verkleind.

Op basis van de nadere analyse heeft veldonderzoek plaatsgevonden. In dit veldonderzoek zijn de na de nadere analyse nog afgetoetste delen en kunstwerken gezamenlijk met een beheerder waterkering bezocht en is van deze locaties een hoogtemeting gedaan. De verzamelde gegevens zijn als input gebruikt voor de herberekening. Hieruit blijkt dat een hoogtetekort aanwezig is tussen 0,01m en 0,15 meter over een totale lengte van totaal 350 meter.

Na de verfijning van de analyse kan de scope worden vastgesteld. De scope van dit project is de dijkverbetering (hoogtetekort 0,1 t/m 0,15 meter) over een totale lengte van ca. 350 meter.

Tevens zijn de kunstwerken opnieuw doorgerekend op onderloopsheid, achterloopsheid, combinatie onder- en achterloopsheid en Heave. Vanuit deze berekeningen blijkt dat de kunstwerken voldoen aan de gestelde norm en geen onderdeel uitmaken van de opgaaf.

### **2. Ligging en begrenzing plangebied**

Dit project maakt onderdeel uit van de totale dijkverbeteringsopgave voor de regionale keringen rondom de Kampereilanden. Het betreft nu de dijkverbeteringen van de afgekeurde regionale dijklichamen langs de Goot en Veneriete (Mandjeswaard respectievelijk Polder de Pieper).

Er is gekozen om deze dijkverbetering afzonderlijk en versneld uit te voeren: de koppeling met de dijkverbetering langs het Zwarte Meer en het (deels) inzetten van de oude Zuiderzeekeringen (project 4: Gebiedsproces en ontwikkeling meerlaagsveiligheid buitenpolders) zou naar verwachting tot een latere start van de uitvoering leiden. Dit omdat het Gebiedsproces en ontwikkeling meerlaagsveiligheid buitenpolders (project 4) een andere planning heeft en omdat voor dijkverbetering nabij het Zwarte Meer andere procedures gelden voor dijkverbetering in relatie tot de Natura 2000-regelgeving.

Om de regionale keringen langs de Goot en Veneriete, gelegen in de gemeente Kampen respectievelijk gemeente Zwartewaterland, te laten voldoen aan de door de provincie Overijssel gestelde norm, dient op de volgende locaties het hoogtetekort opgelost te worden:

| Locatie                             | hm                    | veiligheidsprobleem                                |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Polder Mandjeswaard langs de Goot   | 102-1.0 – 102-1.2     | Hoogtetekort 0,01 – 0,12m<br>Stabiliteit bekleding |
| Polder de Pieper langs de Veneriete | 103-5.025 – 103-5.175 | Hoogtetekort 0,02 – 0,15m<br>Stabiliteit bekleding |

De overzichtskaart (bijlage 1) geeft de locatie van bovengenoemde dijkvakken weer.



### 3. Uit te voeren werkzaamheden

De regionale waterkeringen rondom de Mandjeswaard en Polder de Pieper dienen in 2015 te voldoen aan een inundatiefrequentie van eens in de 500 jaar. Daartoe worden de relevante delen van de waterkeringen langs de Goot en het Veneriete normconform verbeterd.

De uit te voeren werkzaamheden bij een normconforme verbetering houden hoofdzakelijk in dat de bestaande regionale waterkeringen op de in hoofdstuk 2 benoemde locaties en lengte worden opgehoogd totdat zij voldoen aan de in 2012 door de provincie Overijssel vastgestelde norm e.e.a. in verband met de waterveiligheid van het achterliggend gebied.

#### 3.1 Mandjeswaard 102-1.075 – 102-1.275


Een normconforme verbetering van het dijklichaam ter plaatse van dijkvak 102-1.075 – 102-1.275 (Mandjeswaard, zie afbeelding 3-1) houdt in dat deze opgehoogd dient te worden tot een hoogte van NAP+1,50 m. hierbij is rekening gehouden met een overhoogte van 0,05 meter i.v.m. zetting van de opgebrachte laag.




afbeelding 3-1: Situatie verbetering Mandjeswaard

De dijkverbetering (ophoging) dient te worden uitgevoerd met klei met erosiebestendigheidscategorie 2. De ophoging dient binnenwaarts van de huidige buitenkruin plaats te vinden, waarbij de huidige binnen- en buitenwaartse taludhellingen (1:5) en de huidige kruinbreedte (2,5 m) worden aangehouden. Na het aanbrengen van de ophoging dient de waterkering geheel met het graszaadmengsel D2 te worden ingezaaid

In afbeelding 3-2 is de dwarsdoorsnede van deze normconforme verbetering schematisch weergegeven. In afbeelding 3-3 het bovenaanzicht

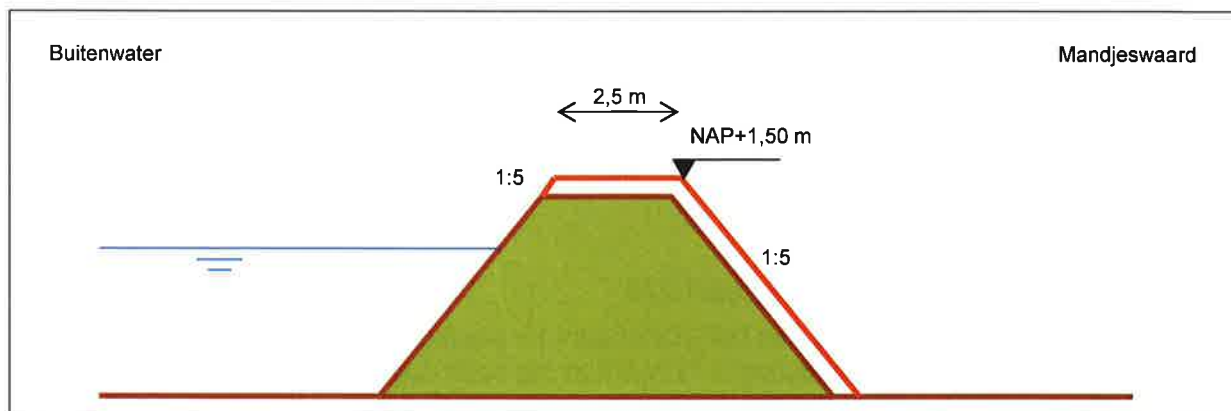

afbeelding 3-2: Schematische weergave verbetering waterkering Mandjeswaard (niet op schaal)

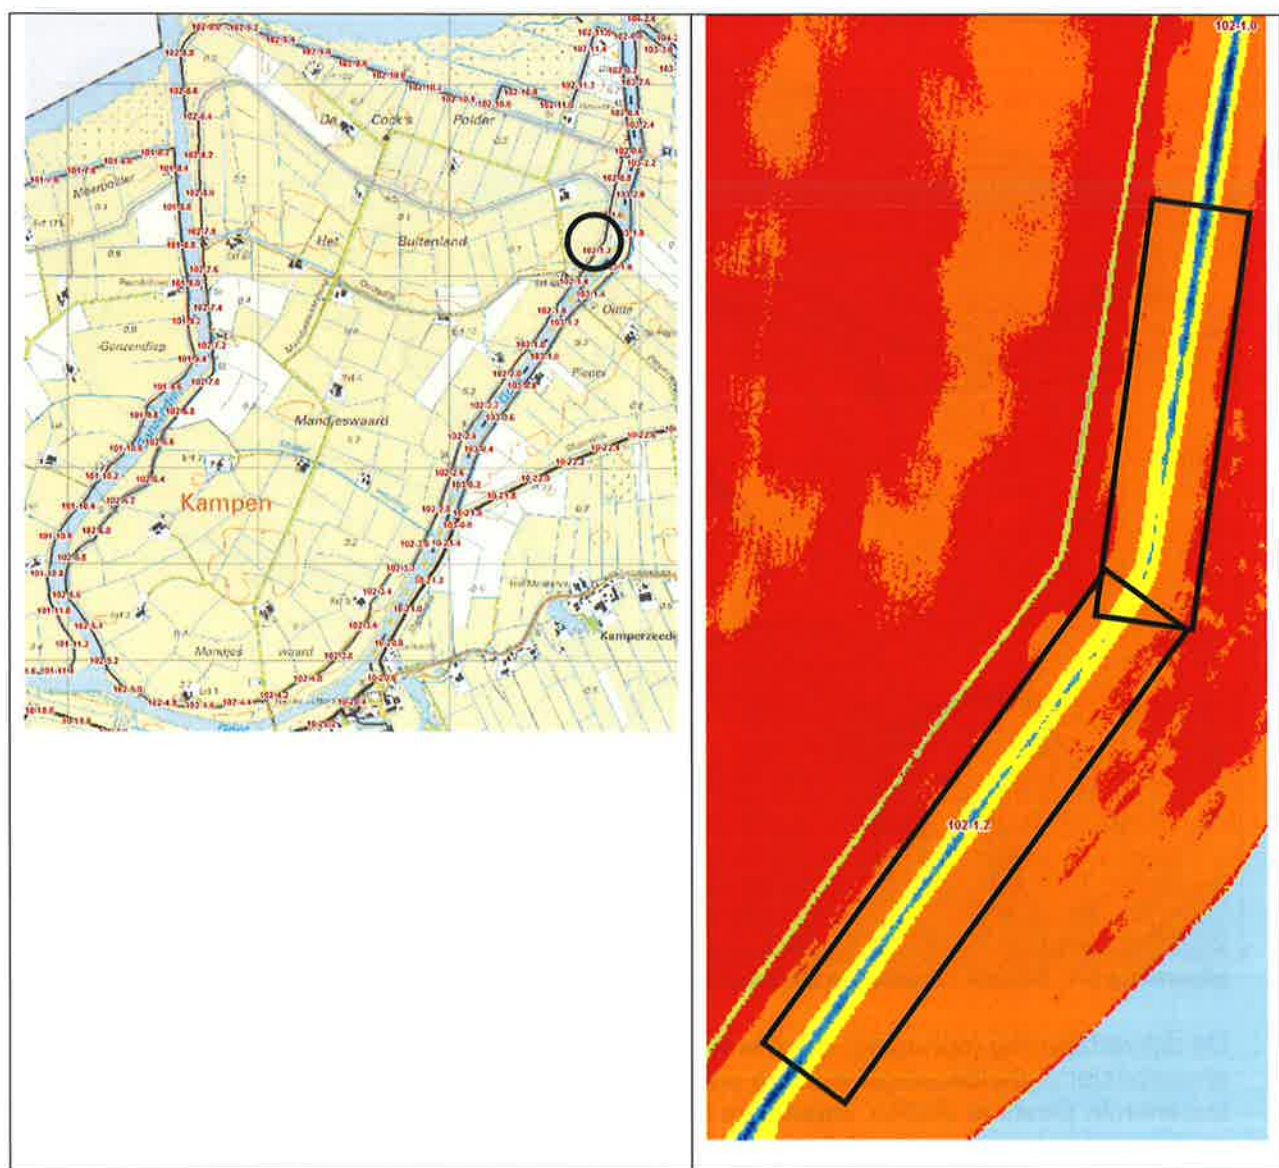

afbeelding 3-3: Locatie verbetering waterkering Mandjeswaard (dijkvak 102-1.075 – 102-1.275 )



### 3.2 De Pieper 103-5.025 – 103-5.175


Een normconforme verbetering van het dijklichaam ter plaatse van dijkvak 103-5.025 – 103-5.175 (polder De Pieper, afbeelding 3-4) houdt in dat deze opgehoogd dient te worden tot een hoogte van NAP+1,55 m. Hierbij is rekening gehouden met een overhoogte van 0,05 meter i.v.m. zetting van de opgebrachte laag.




afbeelding 3-4: Situatie verbetering Polder de Pieper

De dijkverbetering (ophoging) dient te worden uitgevoerd met klei met erosiebestendigheidscategorie 2. De ophoging dient binnenwaarts van de huidige buitenkruin plaats te vinden, waarbij de huidige binnen- en buitenwaartse taludhellingen (1:4) en de huidige kruinbreedte (2,5 m) worden aangehouden. Na het aanbrengen van de ophoging dient de waterkering geheel met het graszaadmengsel D2 te worden ingezaaid

In afbeelding 3-5 is deze normconforme verbetering schematisch weergegeven. In afbeelding 3-3 het bovenaanzicht

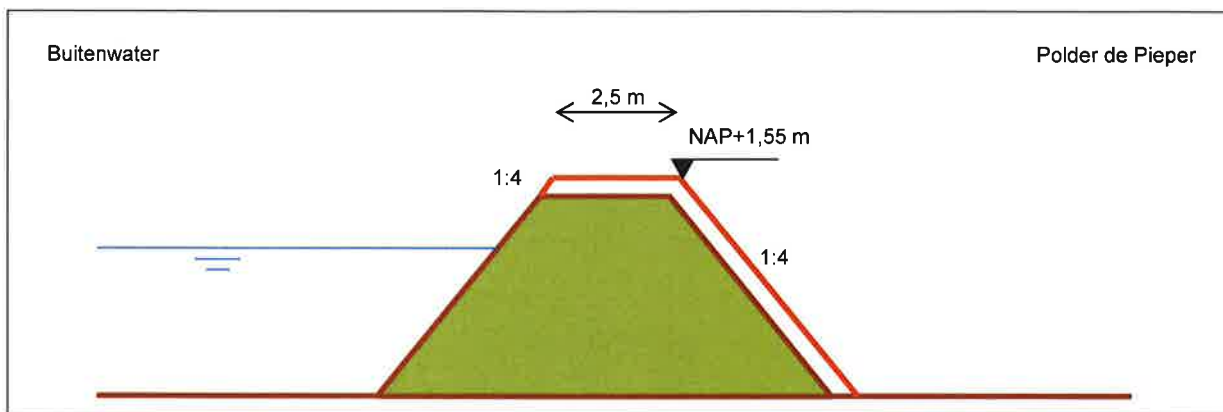

afbeelding 3-5: Schematische weergave verbetering waterkering Polder de Pieper (niet op schaal)

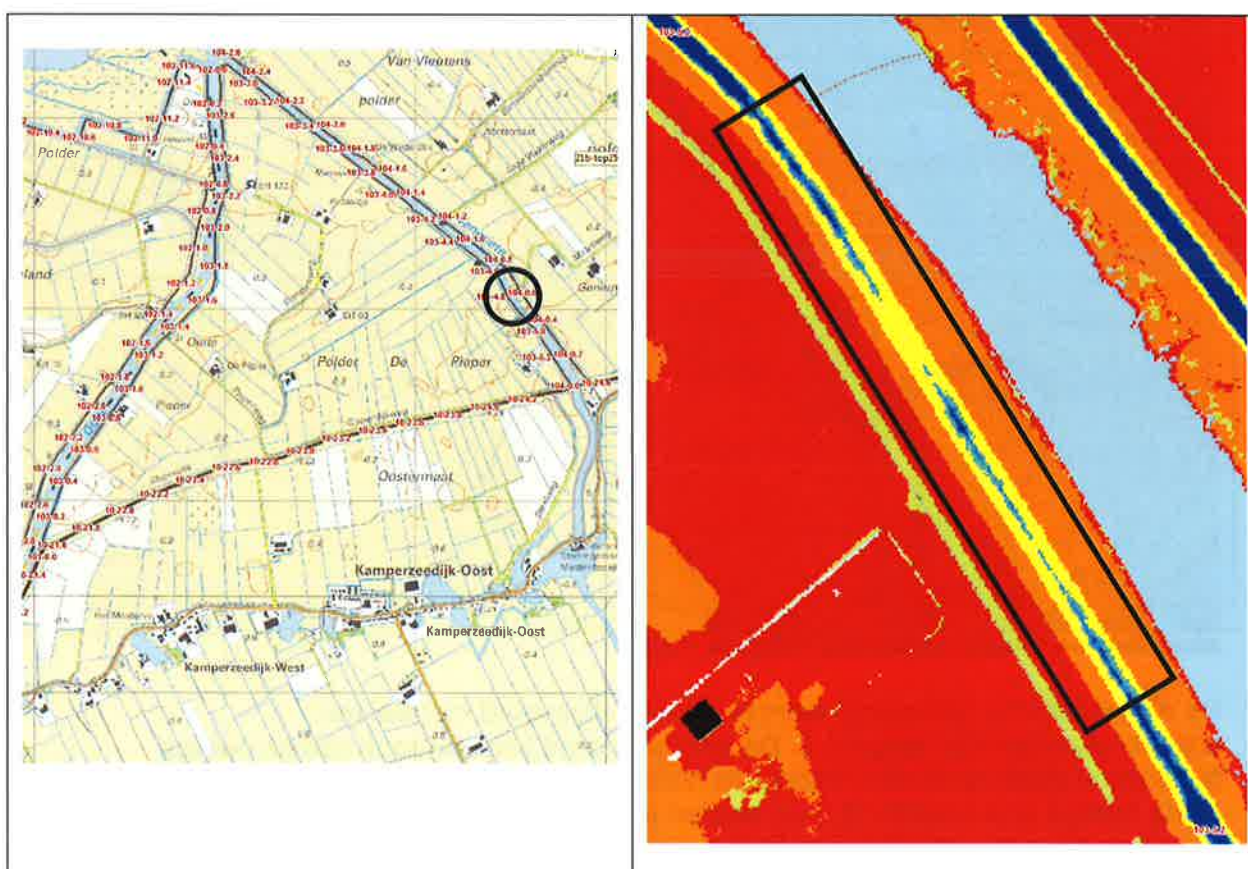

afbeelding 3-3: Locatie verbetering waterkering Polder de Pieper (dijkvak 103-5.025 – 103-5.175)

### 3.3 Berekeningen

De berekening van de versterkingsopgave is weergegeven in het rapport "Nadere analyse veiligheidsprobleem en versterkingsopgave". Het rapport is als bijlage 2 bijgevoegd bij dit projectplan.

De berekening van de benodigde ophoging bij een normconforme verbetering in relatie tot de relevante faalmechanismen hoogte en stabiliteit bekleding is weergegeven in onderstaande afbeeldingen.



| Hoogte (HT) |        |         |             |      |           |           |
|-------------|--------|---------|-------------|------|-----------|-----------|
| dwp         | hkr    | hkr,min | hkr-hkr,min |      |           |           |
|             | m +NAP | m +NAP  | m           |      |           |           |
| 102M        | 11     | 1,50    | 1,45        | 0,05 | VOLDOENDE | Goot      |
| 102M        | 12     | 1,50    | 1,45        | 0,05 | VOLDOENDE | Goot      |
| 103P        | 47     | 1,55    | 1,50        | 0,05 | VOLDOENDE | Veneriete |

afbeelding 3-3: Beoordeling hoogte op basis van nieuwe kruinhoogte

| Stabiliteit bekleding (STBK)                |    |           |             |      |                  |              |                         |             |                                           |                     |                  |      |            |
|---------------------------------------------|----|-----------|-------------|------|------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------|------------|
| Berekening golfparameters met Bretschneider |    |           |             |      |                  |              |                         |             |                                           |                     |                  |      |            |
|                                             |    | Toetspeil | waterdiepte | u10  | g                | strijklengte | significante golfhoogte | piekperiode | Erosiebestendigheid conform WGS-onderzoek | helling buitentalud | eenvoudige regel |      |            |
| dwp                                         |    |           | m           | m/s  | m/s <sup>2</sup> | m            | H1/3 [m]                | Tp [s]      |                                           | 1:x                 | hk               | q    | q<1 l/m/s? |
| 102M                                        | 11 | 1,45      | 3,45        | 15,2 | 9,81             | 125          | 0,17                    | 1,43        | voldoende                                 | 5                   | 0,05             | 0,79 | VOLDOET    |
| 102M                                        | 12 | 1,45      | 3,45        | 14,8 | 9,81             | 140          | 0,17                    | 1,45        | voldoende                                 | 5                   | 0,05             | 0,89 | VOLDOET    |
| 103P                                        | 47 | 1,50      | 3,49        | 16,1 | 9,81             | 60           | 0,13                    | 1,24        | voldoende                                 | 4                   | 0,05             | 0,33 | VOLDOET    |

afbeelding 3-4: Beoordeling stabiliteit bekleding op basis van nieuwe kruinhoogte

Gezien de marge in de stabiliteit van de betreffende waterkeringen, is een beoordeling van de overige faalmechanismen bij deze geringe ophoging niet relevant.

De uit te voeren werkzaamheden houden hoofdzakelijk in, dat de bestaande regionale waterkeringen op de in hoofdstuk 2 benoemde locaties en lengte wordt opgehoogd tot de in 2012 door de provincie Overijssel vastgestelde norm e.e.a. in verband met de waterveiligheid van het achterliggend gebied.

#### 4. Beschikbaarheid gronden

De dijkverbetering vindt plaats op dijkvakken in de dijkring 102 en 103.

Dijkvak 102-1.0 – 102-1.2 is in eigendom van Kampereiland Vastgoed NV, Koornmarkt 26 8261 XJ Kampen en is in gebruik door H.J. de Munnik, Mandjeswaardweg 13 8267 AW Kampen.

Dijkvak 103-5.025 – 103-5.175 is in eigendom van het Waterschap Groot Salland en wordt verpacht aan zorgboerderij De Pieperhoeve V.O.F. Slaperdijkweg 1, 8281 PL Genemuiden.

Voor de dijkverbetering is geen grondaankoop nodig. Eigenaar en gebruikers verlenen medewerking.

#### 5. Effecten van het plan

De voorgenen maatregelen verbeteren de waterveiligheid van Kampereilanden. Door de ophoging van benoemde dijkvakken, voldoen de regionale keringen Kampereilanden aan de gestelde norm zoals deze is vastgesteld door de provincie Overijssel.

Door toedoen van de dijkverbetering, kan tijdelijk geen (agrarisch) gebruik worden gemaakt van de betreffende dijkvakken. Nadat de graszode weer voldoende is aangegroeid kunnen de dijkvakken weer in gebruik worden genomen, binnen de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden.

De minimale ophoging leidt niet tot negatieve effecten in de vorm van verlies van uitzicht.

## 6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Vooraf aan de ophoging wordt de bestaande zode kapot gefreesd. Na het frezen van de zode wordt een ophoging van klei aangebracht, die samen met de gefreesde zode in het geheel wordt doorgefreesd en onder profiel wordt gebracht. De aansluiting van het talud met het maaiveld wordt glooiend aangelegd zonder knikpunt. Vervolgens wordt het geheel ingezaaid met graszaad D2.

Afhankelijk van de uitvoeringsperiode (voor gesloten seizoen of na gesloten seizoen) wordt een bekramming aangebracht, die het uitspoelen van de vers opgebrachte laag voorkomt.

## 7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of het beperken van nadelige gevolgen.

### 7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Dit plan genereert geen nadelige gevolgen die beperkt dienen te worden.

### 7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het gesloten seizoen. Dit houdt in dat tijdens het stormseizoen, de regionale keringen op hoogte blijven en waterveiligheid waarborgen.

Mochten de werkzaamheden nog voor het gesloten seizoen uitgevoerd worden, dan wordt een bekramming aangebracht om uitspoeling van de vers aangebrachte kleilaag te voorkomen.

### 7.3 Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is financiële schade voorzien door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van gronden voor agrarisch. De gewasschade wordt financieel gecompenseerd. Vergoeding vindt plaats op basis van het grondbeleid 2.0 d.d. 1 juli 2014.

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit andere schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Groot Salland.

## 8. Legger, beheer en onderhoud

### 8.1 Legger

Na realisatie van het projectplan wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger.

### 8.2 Beheer en onderhoud

Dijkvak 102-1.0 – 102-1.2 is in eigendom van Kampereiland Vastgoed NV, Koornmarkt 26 8261 XJ Kampen en is in gebruik door H.J. de Munnik, Mandjeswaardweg 13 8267 AW Kampen. Na de dijkverbetering wijzigt dit niet.

Dijkvak 103-5.025 – 103-5.175, gelegen langs Veneriete in polder de Pieper, is in eigendom van het waterschap Groot Salland. Het dijkvak wordt verpacht aan zorgboerderij De Pieperhoeve V.O.F. Slaperdijkweg 1, 8281 PL Genemuiden. Beheer en onderhoud wordt uitgevoerd conform de pachtovereenkomst 2013-9996. Na de dijkverbetering wijzigt dit niet.

## DEEL II VERANTWOORDING

### 1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1)."

#### 1.1 Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het beleid van Waterschap Groot Salland is gericht op het voorkomen en waar nodig het beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Dit is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015, vastgesteld op 26 november 2009 door het algemeen bestuur van het waterschap en medio december door de provincie Overijssel goedgekeurd.

In de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2013 is opgenomen dat de Overijsselse waterschappen de genormeerde regionale keringen toetsen en indien nodig verbeteren. In 2010 is door Gedeputeerde Staten (GS) besloten dat de keringen in 2015 op orde moeten zijn. Ambtelijk is met de provincie afgestemd dat de keringen op verschillende manieren aan de norm kunnen voldoen: Voor een deel van de afgekeurde waterkeringen is dijkverbetering noodzakelijk en voor een aantal knelpunten volstaan beheermaatregelen om aan de norm te voldoen.

In de periode 2010-2012 zijn de regionale keringen in het beheergebied van WGS voor de eerste keer volledig getoetst. De opgave is vervolgens nader onderzocht en aangescherpt in de verlengde toetsing in de periode 2012-2014.

Het op hoogte brengen van 350 meter dijkvak heeft als effect dat de regionale keringen langs de Goot, Ganzendiep en Zuiderzeepolder voldoen aan de door de provincie vastgestelde waterveiligheidseisen met een inundatiefrequentie van eens in de 500 per jaar.

#### 1.2 Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit het Watersysteem

De chemische- en ecologische kwaliteit van het watersysteem wordt niet beïnvloed door dit project. De materialen die gebruikt worden zijn standaard materialen die bij de waterbouw worden toegepast. Deze materialen gaan geen verbindingen aan met het water waardoor de chemische kwaliteit kan worden aangetast.

#### 1.3 Vervulling van de maatschappelijke functies door watersystemen

Door te voldoen aan de door de provincie vastgestelde veiligheidsnorm, wordt bijgedragen aan het waarborgen van de bewoonbaarheid van het gebied.



## 2. Verantwoording op basis van beleid

### 2.1 Toets beleid waterschap

Het beleid van het waterschap zoals opgenomen in het Waterbeheerplan komt grotendeels voort uit de wettelijke taak en verplichting van het waterschap (Waterschapswet Regelement voor het Waterschap Groot Salland en de Waterwet). De provincie Overijssel stelt de veiligheidsnormen. De randvoorwaarden voor regionale keringen zijn vastgesteld, waarbij een waterstand gekeerd moet kunnen worden die voorkomt met een kans van 1/500 per jaar.

De doelstelling van het waterbeheerplan voor waterkeringen betreft het realiseren en handhaven van het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Waterschap Groot Salland toetst periodiek de regionale keringen of deze aan de gestelde norm voldoen. Uit de verijning van de toetsronde is gebleken dat de regionale kering langs de Goot, Ganzendiep en Zuiderzeepolder over een lengte van 350 meter niet voldoet aan de gestelde waterveiligheidsnorm.

Met de uitvoering van dit projectplan wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het waterbeheerplan van waterschap Groot-Salland. In het waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Groot Salland zijn de beleidsopgaven vastgelegd.

## 3. Verantwoording van de keuzen in het project

### 3.1 Dijkverbetering

De dijkverbetering beperkt zich tot op hoogte brengen van twee dijkvakken met een ophoging van 0,01 – 0,15 meter.

| Locatie                             | hm                    | veiligheidsprobleem                                |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Polder Mandjeswaard langs de Goot   | 102-1.0 – 102-1.2     | Hoogtetekort 0,01 – 0,12m<br>Stabiliteit bekleding |
| Polder de Pieper langs de Veneriete | 103-5.025 – 103-5.175 | Hoogtetekort 0,02 – 0,15m<br>Stabiliteit bekleding |

Gezien de geringe opgave, in zowel lengte als hoogte, zijn alternatieven niet onderzocht. De dijkverbetering vindt plaats door het toevoegen van klei om zodoende de normconforme hoogte te creëren.

De door de provincie Overijssel vastgesteld normhoogte is berekend. De rapportage “nadere analyse veiligheidsprobleem en versterkingsopgave” is als bijlage 2 toegevoegd.

## 4. Benodigde vergunningen en meldingen

Voor de realisatie van het project zijn geen vergunningen of meldingen benodigd.

## **DEEL III RECHTSBESCHERMING**

### **1.1 Bezwaar**

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap zijn ingediend.

### **1.2 Beroep**

Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle) onder overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Tegen de uitspraak van de rechtbank staat vervolgens hoger beroep open bij de Raad van State

### **1.3 Crisis- en herstelwet**

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

### **1.4 Verzoek om voorlopige voorziening**

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt of beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Overijssel (Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle). Daarbij moet een kopie van het bezwaar- of beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


Zie voor het digitaal indienen van zo'n verzoek onder "Beroep".

## **DEEL IV BIJLAGEN**

## Bijlage 1: Overzichtskaart





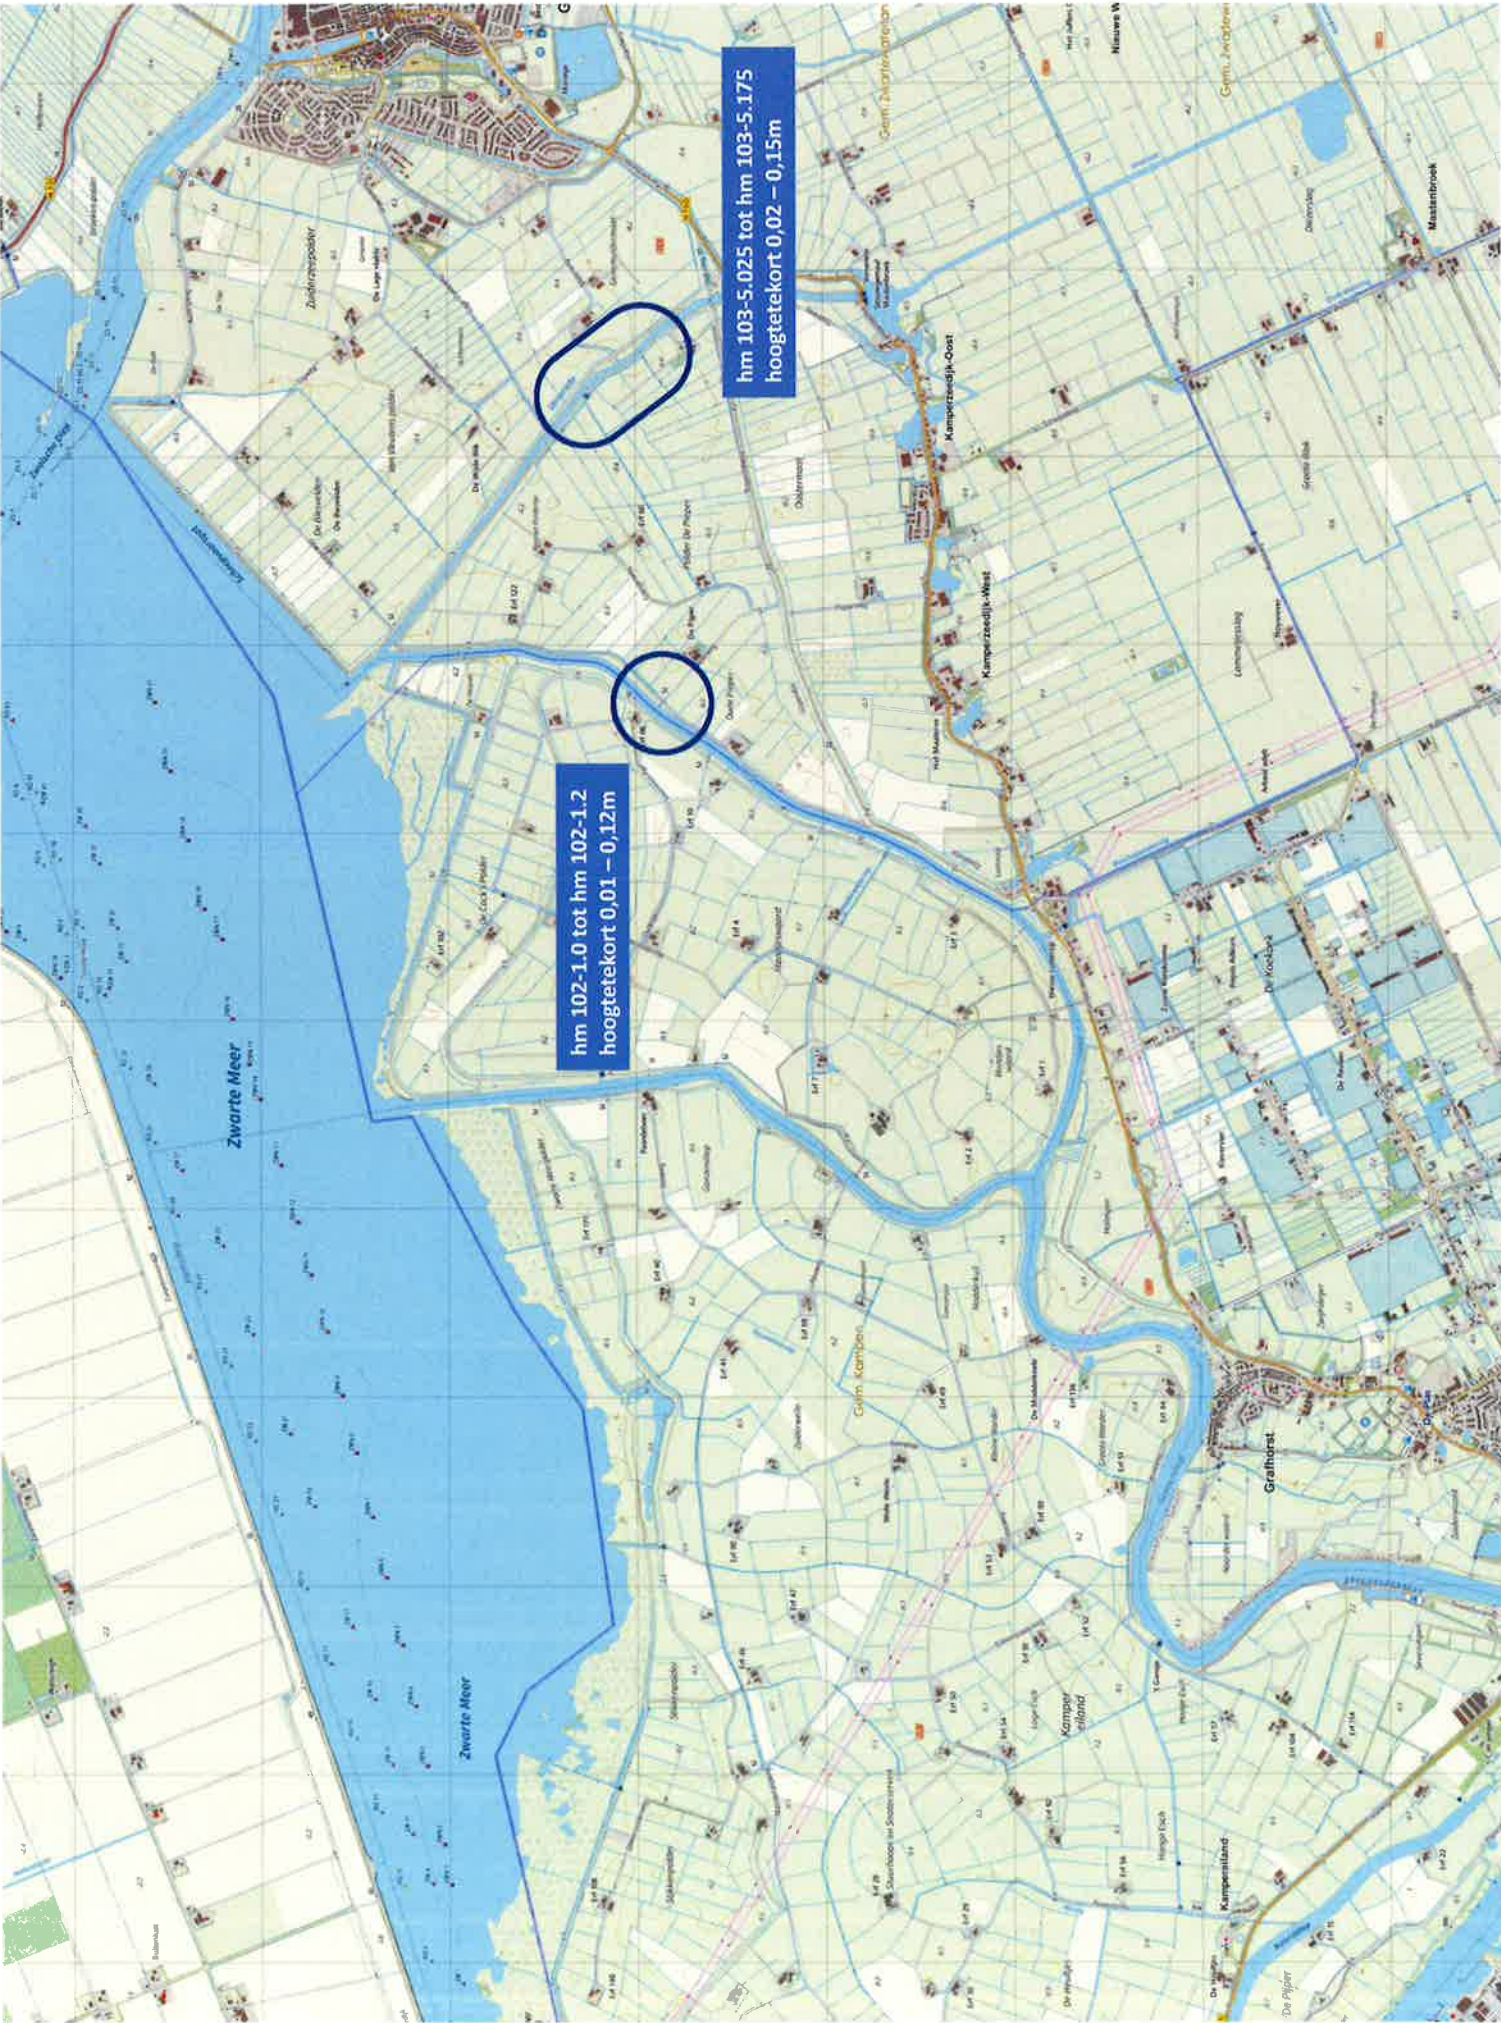

hm 102-1.0 tot hm 102-1.2  
hoogtekort 0,01 – 0,12m

hm 103-5.025 tot hm 103-5.175  
hoogtekort 0,02 – 0,15m

