



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Projectplan aanleg duiker Halve Raak te Boskoop

projectnummer: 99862

**op basis van artikel 5.4
van de Waterwet**

Inhoudsopgave

0. Samenvatting	3
1. Inleiding en leeswijzer	4
2. Projectomschrijving (wat gaan we doen)	5
2.1 Aanleiding en doel van het project.....	5
2.2 Wat is een projectplan?.....	6
2.3 Inhoud en omvang van het project	6
3. Beleidskader (waarom gaan we het doen)	8
4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)	9
4.1 Uitgevoerde onderzoeken	9
4.2 Uitgangspunten.....	9
4.2.1 Planning.....	9
4.2.2 Aanbesteding.....	9
4.2.3 Randvoorwaarden	9
4.2.4 Legger	11
4.3 Realisatie	11
4.4 Samenwerking	12
4.5 Graven en dempen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4.6 Onderhoud	12
5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten (wat merken ingelanden van het project)	13
5.1 Impact op de omgeving	13
5.2 Beperking nadelige effecten.....	13
5.3 Nadeelcompensatie	13
6. Besluitvormingsprocedure	14
7. Bijlagen	15
1. Tekeningen	16
2. Tabel met GIS-code.....	17

0. Samenvatting

In het kader van het Watergebiedsplan Greenport Boskoop worden maatregelen voorbereid om (het functioneren van) het watersysteem in Boskoop en omgeving op orde te brengen en te verbeteren. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor beheer en het oppervlaktewaterpeil in zijn beheergebied, zowel in tijden van neerslagoverschot als in tijden van droogte.

De doorstroom in de Gouwepolder is momenteel niet optimaal. De wegen in de Gouwepolder doorsnijden het watersysteem. Er zijn in het noorden van de polder maar enkele verbindingen onder de wegen door waardoor het water maar beperkte mogelijkheden heeft om naar het gemaal Brans te stromen. Hierdoor kan het niet snel genoeg naar het gemaal stromen en loopt het peil op.

Door een aantal overige watergangen met elkaar te verbinden middels nieuwe duikerverbindingen bij de kruisende wegen worden er meer mogelijkheden gecreëerd voor het water om naar het gemaal te stromen. Hierdoor nemen de debieten af in met name de watergangen in de omgeving van het gemaal, dit vermindert de opstuwing van het waterpeil.

De nieuwe duiker onder de Halve raak is een van de locaties in de Gouwepolder waar een nieuwe verbinding wordt gecreëerd. Door de aanleg van een duiker wordt de doorstroom in de polder verbeterd.

1. Inleiding en leeswijzer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna "Rijnland") is verantwoordelijk voor het beheer van watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan uit het wijzigen of aanleggen van waterstaatswerken. De wijziging waarop dit projectplan betrekking heeft, bestaat uit de aanleg van een duiker onder de Halve Raak te Boskoop. Dit project betreft een maatregel uit het maatregelenpakket voor Watergebiedsplan Greenport Boskoop.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de aanleiding van het projectplan en de doelstelling van het project uiteengezet. Dit hoofdstuk geeft een globaal beeld van de projectlocatie, met informatie die relevant is voor de gekozen maatregelen. In hoofdstuk 3 zijn de beleidskaders van het project beknopt beschreven.


In hoofdstuk 4 wordt de uitvoering van het project beschreven inclusief de documenten waarop dit projectplan is gebaseerd. Daarnaast wordt ingegaan op het proces wat door Rijnland zal worden doorlopen tot en met de uitvoering en op de manier waarop het werk gerealiseerd gaat worden. Tevens wordt het huidig en toekomstig beheer en onderhoud van het projectgebied beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de mogelijke effecten van het project voor alle betrokken partijen. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de procedure die wordt gevolgd om het projectplan vast te stellen. In hoofdstuk 7 worden de bijlagen bij dit projectplan beschreven.

2. Projectomschrijving (wat gaan we doen)

2.1 Aanleiding en doel van het project

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Reden voor dit project is dat het watersysteem in het plangebied van Watergebiedsplan Greenport Boskoop (figuur 2.1) niet op orde is, wat voor overlast zorgt voor de ingelanden en het beheer en onderhoud voor Rijnland bemoeilijkt. In het gebied is sprake van diverse hydraulische knelpunten in het watersysteem. Voor het oplossen van de knelpunten is in de planfase van het watergebiedsplan een variantenstudie (Variantenstudie Watergebiedsplan Greenport regio Boskoop, HH van Rijnland, september 2015, corsa nummer 13.65300 (<https://www.rijnland.net/plannen/downloads-plannen/variantenstudie-wgp-greenport-boskoop.pdf>) uitgevoerd waaruit een voorkeursvariant met een maatregelenpakket is voortgekomen.

In 2013 is het maatregelenpakket voor Watergebiedsplan Greenport Boskoop vastgesteld door het algemeen bestuur van Rijnland. Dit is een plan op hoofdlijnen dat nu wordt uitgewerkt tot concrete maatregelen.

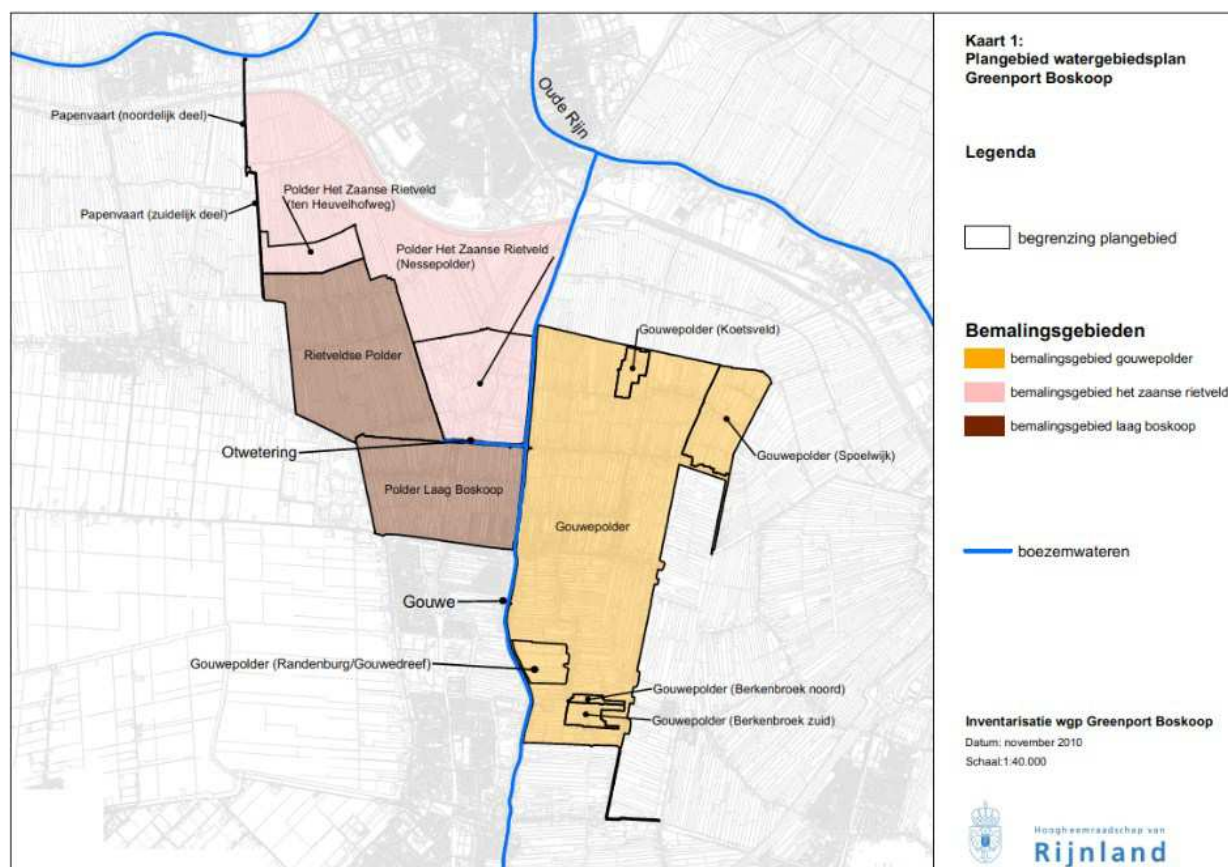

Figuur 2.1: Plangebied Watergebiedsplan Greenport Boskoop

Rijnland is bezig met de voorbereiding en uitvoering van maatregelen uit het Watergebiedsplan Greenport Boskoop voor de Gouwepolder. Eén van de maatregelen voor de Gouwepolder uit het Watergebiedsplan is het aanleggen van een nieuwe duikerverbinding onder de Halve Raak om de doorstroom naar het gemaal Brans in de Gouwepolder te verbeteren.

Door de aanleg van een nieuwe duiker onder de Halve Raak wordt een extra route gecreëerd voor het water om naar het gemaal te stromen. Hierdoor vermindert de opstuwung van het waterpeil in de Gouwepolder en functioneert het watersysteem beter door een verbeterde verdeling van het af te voeren water over de verschillende afvoerroutes. De globale ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 2.2. In paragraaf 2.3 is in meer detail ingegaan op de maatregel.



Figuur 2.2: Globale ligging nieuw aan te leggen duiker onder Halve Raak (gele cirkel) (bron: legger wateren, Rijnland).

2.2 Wat is een projectplan?

In het kader van dit project is Rijnland van plan om een nieuwe duiker aan te leggen onder de Halve Raak te Boskoop. Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van waterstaatswerken zoals bijvoorbeeld watergangen, peilscheidingen of duikers een projectplan vastgesteld te worden. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste het volgende te bevatten:

- een beschrijving van het betrokken werk
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd en
- een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

2.3 Inhoud en omvang van het project

De maatregel uit het Watergebiedsplan Greenport Boskoop ter hoogte van de Halve Raak in Boskoop betreft het aanleggen van een nieuwe duikerverbinding. Op de figuur 3.1 is de locatie van de nieuwe duiker weergegeven. Op de bestekstekening (Definitief Ontwerp) in de bijlage is de locatie exact weergegeven.

De duiker komt te liggen in Gouwepolder, onder de rijbaan van de Halve Raak in Boskoop, tussen de percelen met huisnummers 64 en 66 (figuur 3.1). De gemeente Alphen aan den Rijn is wegbeheerder van de Halve Raak. In de bestaande situatie is er geen verbinding tussen de overige watergangen aan beide zijden van de Halve Raak.

De doorstroom in de Gouwepolder is momenteel niet optimaal. De wegen in de Gouwepolder doorsnijden het watersysteem. Er zijn in het noorden van de polder maar enkele verbindingen onderdoor de wegen waardoor het water maar beperkte mogelijkheden heeft om naar het gemaal Brans te stromen. Hierdoor kan het niet snel genoeg bij het gemaal komen en loopt het peil op.

Om deze reden is het plaatsen van een nieuwe duiker noodzakelijk. De nieuwe duiker betreft een constructie met stalen damwanden met betonnen bodem en dek met een inwendige afmeting van 1,40 m bij 3,65 m. Deze afmeting is bepaald aan de hand van een hydrologische studie door Rijnland. Na de plaatsing van de nieuwe duiker dient de watergang aan beide zijden van de Halve Raak, op dit moment aangeduid als 'overige watergang' opgewaard te worden tot een hoofdwatgang. De opwaardering van de watergang is geen onderdeel van dit projectplan, voor deze maatregel wordt apart een projectplan opgesteld.



Figuur 2.3: Locatie nieuw aan te leggen duiker onder Halve Raak

Beleidskader (waarom gaan we het doen)

Vanuit de Nederlandse en Europese overheid worden steeds meer eisen gesteld aan watersystemen en het waterbeheer. Om aan deze eisen te kunnen beantwoorden is een instrument nodig waarmee de verschillende opgaven voor een gebied, de kansen en knelpunten, in hun samenhang kunnen worden bekeken. Het watergebiedsplan is het instrument dat het Hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor wil gebruiken.

Een watergebiedsplan is een integraal waterhuishoudingsplan voor een bepaald gebied. Hierin wordt onderzocht en bepaald hoe de inrichting en het beheer van dat gebied geoptimaliseerd kan worden. Aan de orde komen (de relatie tussen) het grond- en oppervlaktewater, de waterkwantiteit en – kwaliteit en ecologie. Ook wordt rekening gehouden met de gebruiksfuncties van het gebied, zoals landbouw, natuur en bebouwing. De eisen die de Nederlandse en Europese overheid stelt aan het watersysteem vormen hiervoor de kaders (o.a. de Europese Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water). De maatregelen uit het Watergebiedsplan Nieuwkoop opgenomen in dit projectplan hebben met name betrekking op het oplossen van knelpunten vanuit de NBW wateropave.

Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Onderhavig plan draagt primair bij aan de doelstelling tot het voorkomen van wateroverlast door het creëren van extra verbinding in het watersysteem middels de aanleg van een duiker.

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Met de aanleg van een nieuwe duiker wordt een nieuwe verbinding in de Gouwepolder gecreëerd en de afvoercapaciteit verbeterd. Het werk heeft geen gevolgen voor de vigerende oppervlaktewaterpeilen of peilgebiedsgrenzen, deze blijven ongewijzigd.

b. Chemische en ecologische kwaliteit

Het werk heeft geen gevolgen voor de chemische of ecologische oppervlaktewaterkwaliteit, deze blijven ongewijzigd.

c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

De aan- en afvoerfunctie van de watergang waarin de duiker onder de Halve Raak komt te liggen wordt niet belemmerd door de werkzaamheden, na uitvoering van de maatregelen zal deze verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk vanaf openbaar gebied uitgevoerd. De aanleg van de duiker heeft een effect op de opstuwing en afvoercapaciteit in de gehele Gouwepolder: deze verbeterd. Hiervan profiteren ook de andere aangelanden in de polder.

3. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)

Op de bestekstekening (Definitief Ontwerp) in bijlage 1 is de locatie van de maatregel weergegeven. Daarnaast is een principe profiel van de duiker weergegeven.

De werkzaamheden omvatten met name grondverzet (graven en aanvullen), het aanleggen van de duiker en het opbreken en terug aanleggen van de weg.

3.1 Uitgevoerde onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:

- grondonderzoek d.d. 13 april 2016 door Lankelma Adviesbureau met kenmerk 16.18943 waarin is onderzocht wat de geotechnische bodemopbouw is.
- funderingsadvies d.d. 13 juli 2016 door Antea Group met kenmerk 20160713-404815 waarin geadviseerd welke fundering toegepast kan worden.
- bodemonderzoek d.d. 14 juli 2016, door Antea Group met kenmerk 0404815.01, waarin is onderzocht wat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is en hoe dit in relatie staat met de werkzaamheden.
- flora- en faunaonderzoek d.d. 8 februari 2016 door Antea Group met kenmerk 404815 waarin is onderzocht wat de effecten zijn voor het gebied en de soortbescherming in het plangebied.
- explosieven onderzoek d.d. 26 april 2016 . door T&A Survey B.V. met kenmerk GPR5862, waarin is onderzocht waar zich niet-gesprongen explosieven zouden kunnen bevinden.
- Klic- oriëntatiemelding is uitgevoerd d.d. 27 januari 2016, waarin is onderzocht waar kabels en leidingen aanwezig zijn.

De uitkomsten van deze onderzoeken worden tijdens de uitvoer in acht genomen.

3.2 Uitgangspunten

3.2.1 Planning

De planning voor uitvoeringswerkzaamheden is nog niet exact bekend. Het streven voor de uitvoeringswerkzaamheden is om medio februari 2017 te starten met de aanleg van de duiker onder de Halve Raak. De planning voor de start van het werk is met name afhankelijk van de procedures rondom dit projectplan en de aanbesteding. Tijdsduur van de uitvoering is circa 14 weken.

3.2.2 Aanbesteding

Het werk wordt in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland uitgevoerd door een nog te selecteren uitvoerende marktpartij (aannemer).

3.2.3 Randvoorwaarden

Omgevingsvergunning

Voor de aanleg van de nieuwe duiker wordt een omgevingsvergunning voor het 'uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden' aangevraagd.

Melding besluit lozen buiten inrichtingen

Op grond van artikel 3.11 van het besluit lozen inrichtingen dient een melding te worden gedaan voor de aanleg van een duiker. Bij de melding dient een werkplan toegevoegd te zijn waarin aangegeven is op welke manier zoveel mogelijk te voorkomen is dat het oppervlaktewater ten gevolge van de werkzaamheden verontreinigd raakt. In dit werk is de aannemer verantwoordelijk voor het opleveren van een werkplan.

Melding besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.

Graafmelding

Graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond.

Keur

Vanuit de Keur- en uitvoeringsregels van Rijnland gelden regels voor de in dit projectplan opgenomen werkzaamheden. Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. De Uitvoeringsregels kan een zorgplicht, een Algemene regel en een Beleidsregel bevatten.

- De zorgplicht geldt voor eenvoudige werkzaamheden met weinig risico.
- In de Algemene regel staan voorwaarden voor activiteiten met een beperkt risico.
- In de Beleidsregel staan voorwaarden voor activiteiten met een groter risico.

Onderstaand zijn de uitvoerings- en beleidsregels opgenomen die van toepassing zijn op het project.

Uitvoeringsregel 4: (Dam met) duiker

Deze uitvoeringsregel is van toepassing op het aanleggen van de duiker. Het betreft hier een overige watergang en de duiker is korter dan 15 meter. Hiermee voldoet de aanleg van de duiker aan Uitvoeringsregel 4.3. artikel 4. Op grond van Uitvoeringsregel 4.3. artikel 4 lid 3 is het hier toegestaan om de duiker met minder dan 1/3 lucht te leggen. De diameter van de duiker is voldoende gedimensioneerd.

Uitvoeringsregel 5: Graven van oppervlaktewater

Het graven valt onder uitvoeringsregel 5 "Graven van oppervlaktewater". De uitvoering moet voldoen aan de voorschriften van artikel 5.3.

Kabels en Leidingen

Ten behoeve van het project is een Klic-orientatiemelding uitgevoerd om de ligging van de kabels en leidingen te onderzoeken. De resultaten van de KLIC-melding zijn weergegeven in figuur 4.1, welke de aanwezige kabels en leidingen binnen het plangebied weergeeft. Uit de KLIC-melding blijkt dat parallel aan de Halve Raak de volgende leidingen aanwezig zijn:

- Middenspanning (Liander)
- Laagspanning (Liander)
- Gas lage druk (Liander)
- Laagspanning (Gemeente Alphen aan de Rijn)
- Riool onder druk (Gemeente Alphen aan de Rijn)
- Data transport (KPN)
- Water (Oasen)

Daarnaast ligt er een data transport lijn, van KPN, onder de Halve Raak en in de watergang. In overleg met kabels en leiding beheerders is er inmiddels ruimte gemaakt voor de nieuwe duiker door het verleggen van de kabels en leidingen.



Figuur 4.1: KLIC-melding Halve Raak (bron: Kadaster, 27-01-2016).

3.2.4 Legger

Na de realisatie van het werk dienen de gewijzigde en nieuwe waterstaatwerken te worden vastgelegd in de legger van Rijnland. De (gewijzigde) ligging, vorm, afmetingen en constructie van de waterstaatswerken met de daarbij behorende beschermingszones, onderhoudsplichten en onderhoudsverplichtingen worden in de legger nader gedetailleerd. De wijziging van de legger kent een aparte procedure.

3.3 Realisatie

De exacte uitvoeringswijze wordt door de nog te selecteren aannemer in overleg met Rijnland bepaald. De werkzaamheden vinden plaats vanaf openbaar terrein en vanaf land. Om de nieuwe duiker te plaatsen, dient eerst het bovengelegen materiaal verwijderd te worden. Dit materiaal bestaat uit asfalt, de fundering van de weg en grond. De duiker wordt vervolgens gerealiseerd middels plaatsing van damwanden en betonnen bodem en bovendeck. Na aanbrengen van de duiker wordt de weg met fundatie aangebracht.

Vooraf aan de werkzaamheden wordt contact opgenomen met de direct omliggende omwonenden om de planning en preciezere werkzaamheden toe te lichten. In de planning wordt rekening gehouden met de drukke periode voor de boomteelt. Het streven is overlast als gevolg van afsluiting van wegen zo veel mogelijk te beperken. De uitvoering van deze maatregel met de diverse andere maatregelen binnen de Gouwepolder wordt daarom ook planning technisch op elkaar afgestemd.

Om spoorvorming en schade aan particuliere percelen te voorkomen wordt het werk vanaf openbaar terrein uitgevoerd en in een periode waarin schade zoveel mogelijk kan worden uitgesloten of worden op de locatie rijplaten toegepast. De exacte wijze van uitvoeren wordt nog afgestemd met de omliggende terreineigenaren.

3.4 Samenwerking

Het plan om een duiker te realiseren in de Halve Raak is afgestemd met de omliggende perceeleigenaren en de gemeente Alphen aan de Rijn middels keukentafelgesprekken, overleggen en informatieavonden. Alvorens de werkzaamheden beginnen zal er opnieuw contact gezocht worden met de direct omliggende bewoners. Tijdens de uitvoering zal het hoogheemraadschap verantwoordelijk blijven voor het omgevingsmanagement. Uitvoering van de werkzaamheden gebeurt via de nog te selecteren aannemer. Met de aannemer wordt een contract afgesloten waarin afspraken staan ten aanzien van het afstemmen met de omgeving.

3.5 Onderhoud

Rijnland is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de primaire watergangen en kunstwerken (waaronder de nieuwe duiker). De eigenaren van de percelen langs deze watergangen zijn wel verantwoordelijk voor het onderhouden van de oevers, aanwezige beschoeiing en hebben een ontvangstplicht voor het slootvuil (onder ander overtollige waterplanten, takken en baggerspecie).

Voor de overige watergangen geldt dat in het landelijk gebied de eigenaren van de aan het water grenzende percelen, de zogenaamde aangelanden, de onderhoudsplichtigen van deze watergangen zijn.

De duiker Halve Raak is gelegen in een weg van gemeente Alphen aan den Rijn. Na realisatie van de duiker komt deze duiker in eigendom en beheer van de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft uitgebreid inspraak gehad in de ontwerpeisen van de duiker.

4. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten

De realisatie van het project heeft naar verwachting geen of slechts tijdelijke invloed op de omgeving. Bij de uitvoering van de werkzaamheden en de aanleg van het waterstaatswerk worden belangen van derden in het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten zo veel als mogelijke beperkt.

4.1 Impact op de omgeving

De uitvoering van het project zorgt in de openbare ruimte voor overlast. Te denken valt aan een tijdelijke afsluiting van de weg (toegestaan tot 1 maart, daarna uitsluitend gedeeltelijk), voor de uitvoeringswerkzaamheden. Daarnaast zijn er vervoersbewegingen voor de aan- en afvoer van materialen.

De werkzaamheden worden voorafgaand aan de uitvoering afgestemd met de direct omwonenden en de gemeente Alphen aan den Rijn, op deze wijze worden bewoners en belanghebbenden tijdig geïnformeerd.

Daarnaast wordt in overleg met de omliggende terreineigenaren beperkingen gesteld aan het gebruik van eigendommen om mogelijke schade, gevaarlijke situaties en overlast zo veel als mogelijk te voorkomen.

4.2 Beperking nadelige effecten

Teneinde nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken wordt rekening gehouden met diverse belangen.

- In een vroeg stadium is de uitvoering van het project afgestemd met de gemeente Alphen aan de Rijn en de omgeving. Omwonenden zijn door middel van informatieavonden (december 2015 en juli 2016) geïnformeerd. Daarnaast zijn er keukentafelgesprekken gevoerd met de direct omwonenden.
- Schade aan aanwezige beschermde flora en fauna wordt voorkomen door te werken volgens de 'gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen' en daarop gebaseerde werkprotocollen van Rijnland. In die werkprotocollen flora- en faunawet staat hoe in de praktijk moet worden omgegaan met de Flora- en Faunawet en de daarin opgenomen zorgplicht. Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de uitvoering. Alle daarin beschreven maatregelen zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor beschermde flora en fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet nodig is.
- Er zal overdag worden gewerkt en niet in het weekend of tijdens feestdagen.
- Om de ontsluiting van de Gouwepolder en achterliggend gebied op voldoende niveau te houden mag de Halve Raak na 1 maart niet geheel worden afgesloten voor verkeer. Er dient tenminste één rijstrook beschikbaar te blijven voor al het verkeer. De datum van 1 maart is aangehouden in overleg met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, in verband met de drukte in de periode na 1 maart in de boomteeltsector.
- Bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij trillingen kunnen voorkomen moet aan de geldende normering worden voldaan, zoals opgenomen in contractstukken met de aannemer.

4.3 Nadeelcompensatie

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie van dit project staat het een ieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte

procedure in behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek wordt deze beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de geleden schade.

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. Rijnland zal hierbij aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde nadeelcompensatierichtlijnen.

5. Besluitvormingsprocedure

Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is voorbereid door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het verloop van de procedure op grond van titel 4.1 ziet er als volgt uit:

Dit projectplan is namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. De vaststelling van dit projectplan is bekendgemaakt in het digitale Waterschapsblad. Het projectplan is in werking getreden na deze bekendmaking. Vervolgens kan gedurende een periode van zes weken door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend tegen het projectplan bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. Indien bezwaar wordt ingediend volgt een bezwaarschriftenprocedure die uitmondt in een heroverweging van het projectplan door het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Uit deze heroverweging volgt een gegrond- of een ongegrondverklaring van het bezwaar. Tegen een beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechtbank Den Haag.

6. Bijlagen

1. Tekeningen duiker Halve Raak (DO)
2. Tabel met GIS codes watergangen

Bijlage 1 Tekeningen

Deze bijlage omvat de volgende tekeningen:

- Definitief Ontwerp Duiker Halve Raak

Tabel met GIS-code

Object	GIS-code
Duiker	- nieuw
Watergang	241-058-01414
Watergang	241-058-01760
