

**PROJECTPLAN WATERCOMPENSATIE
PARALLELWEG HEIDEWEG-OOST TE
GIESSENBURG** (vastgesteld)
ex art. 5.4 Waterwet¹

Datum: 16 mei 2017
Kenmerk: 2017013301
Onderwerp: Watercompensatie Heideweg-Oost te Giessenburg

Zienswijze:

Belanghebbenden en ingezetenen van het waterschap kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit ontwerpbesluit hun zienswijze over dit ontwerp kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN, Tiel. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de heer J.E. H. Bakker, 0344-649486

1. Projectbeschrijving

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Het plan dient tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, evenals een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, aldus artikel 5.4, lid 2, Waterwet.

1.1. Algemeen


Het wegdek van de parallelweg Heideweg-Oost te Giessenburg dat over een lengte van ongeveer 800m tussen twee watergangen door loopt, vertoont op meerdere plaatsen ernstige schade. Deze schade wordt veroorzaakt door een instabiele ondergrond, boomwortels en zware belasting door motorvoertuigen. Wij zullen daarom in de zomer van dit jaar maatregelen treffen om de schades te repareren.

1.2. Maatregelen

Een van de maatregelen is het plaatsen van een houten beschoeiing op de plaatsen waar het weglichaam het smalste is. Omdat de beschoeiing op de waterlijn van A-watergangen zal worden aangebracht, is geringe watercompensatie binnen 2 peilgebieden (OVW-059P en OVW-061P) noodzakelijk.

Gebied 1 bestaat een oppervlakte van 70 m² en bevindt zich ter hoogte van perceel GSBK140K. De bestaande watergang wordt hier verbreed tot ongeveer 7,30 m over een lengte van ongeveer 40 meter

Gebied 2 bestaat uit een verbreding van de watergang, zuidelijk van het fietspad Heideweg, over een lengte van ongeveer 60 meter, ter hoogte van perceel GSBK170G.

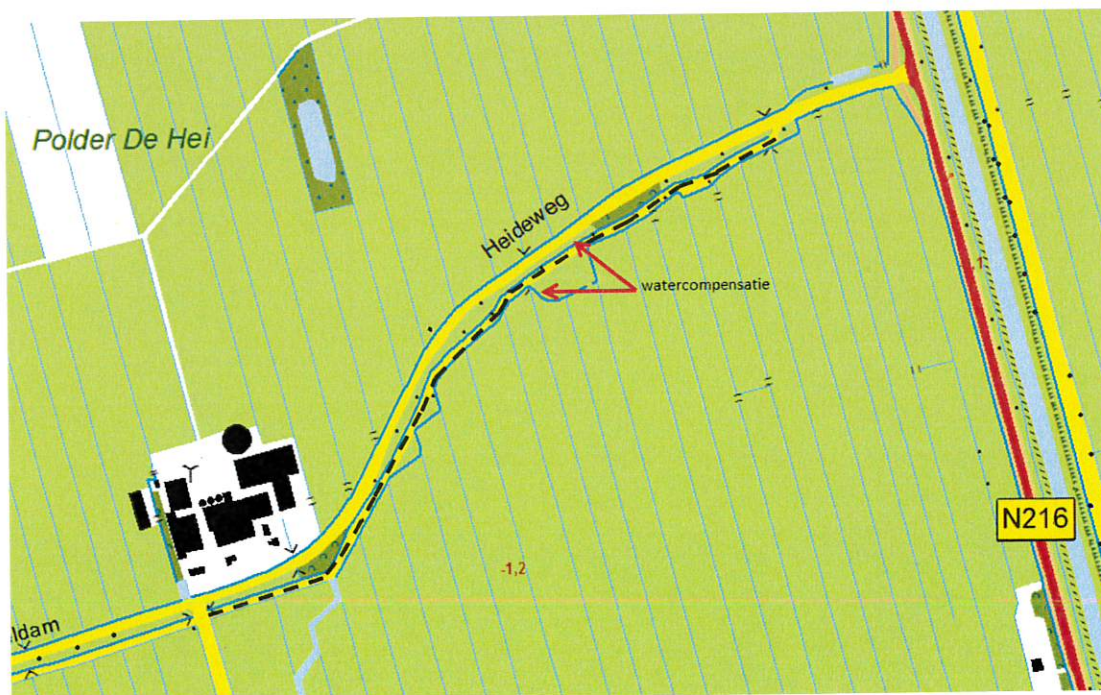

Projectplan onderhoud parallelweg Heideweg-Oost te Giessenburg

1.3. *Werkwijze*

De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. Fase 1 bestaat uit het aanbrengen van de beschoeiing, fase 2 betreft het graven van de compensatiestroken en het aanvullen van de beschoeiing, en fase 3 betreft de reconstructie van het wegdek.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- a) het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals flora- en faunascan, bodemonderzoek, asfaltonderzoek, kappen van bomen en dergelijke.
- b) het kort maaien van de taluds aan beide zijden van het pad, en perceel GSBK170G.
- c) het plaatsen/verwijderen van verkeersmaatregelen op kruising Heideweg en Vierendeelweg.
- d) het uitzetten en plaatsen van de beschoeiing, inclusief aan en afvoer van materieel, conform tekening 1610-011a
- e) het uitzetten en graven van de watercompensatie conform tekening 1610-011b
- f) het mechanisch frezen van twee lagen asfaltverharding
- g) het mechanisch aanbrengen van twee nieuwe lagen asfalt (AC11 surf, AC16 bind)
- h) het aanvullen van de berm
- i) Afrondende werkzaamheden.

2. **Toetsing Waterwet**

2a. Algemeen

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Watercompensatie:

Binnen het werkgebied zal ongeveer 223 m² wateroppervlakte gedempt worden. Over een lengte van 42 m¹ en 61 m¹ zal zowel ter plaatse van perceel 140, als perceel 170 de bestaande watergang verbreedt worden, wat resulteert in 236 m² nieuw wateroppervlak.

2b. Chemische en ecologische kwaliteit

Grondverzet

De kwaliteit van de te ontgraven grond is op basis van de bodemkwaliteitskaart gesteld op achtergrondwaarde en wordt aangemerkt als onverdacht. De grond wordt binnen het werkvak toegepast.

Baggerspecie

Ter plaatse van de compensatie bevindt zich bagger in de watergang, de kwaliteit hiervan is van dusdanige kwaliteit dat hiervoor geen extra maatregelen noodzakelijk zijn.

Wet Natuurbescherming

Volgens de Nationale Database Flora en Fauna komen ter plaatse van de te graven watercompensatie diverse vogels en vleermuizen voor, maar zijn er geen waarnemingen van beschermende vissen of amfibieën bekend. Door het uitvoeren van een quickscan wordt de huidige situatie in kaart gebracht en zo nodig worden bijzondere locaties gemarkeerd. Tijdens de uitvoering zal rekening gehouden worden met de gemarkeerde locaties en zal er in één richting worden gewerkt, zodat dieren kunnen vluchten.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

De watergangen waarin de compensaties plaats vinden, bevindt zich buiten een Natura-2000 gebied en zijn niet aangewezen als drinkwaterbeschermingszone of specifieke zwemwaterlocatie. Wel spelen deze watergangen een rol in de waterhuishouding van peilgebied OVW-058P en peilgebied OVW-061P en de agrarische watervoorziening van de omliggende percelen.

De noordelijke watercompensatie wordt gerealiseerd door het deels afgraven van perceel GSBK140G, wat hiermee met 70 m2 wordt verkleind. Dit perceel is eigendom van het waterschap en, omdat dit perceel als zijberm wordt gebruikt, wordt er geen rekening gehouden met een huurder.

De watercompensatie aan de zuidkant zal worden gerealiseerd door het deels afgraven van perceel GSBK170G, wat hiermee met 162 m2 wordt verkleind. Dit perceel is eigendom van het waterschap en hier zit geen huurovereenkomst op. Omliggende perceeleigenaren worden per brief geïnformeerd over de maatregelen.

2d. Conclusie

De eindconclusie is dat er geen nadelige gevolgen te verwachten zijn. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

3. Beheer en onderhoud

De parallelweg en beschoeiingen worden beheerd door team Wegbeheer. De berm is de verantwoordelijkheid van team Beheer & Onderhoud. Met hen is overeenstemming bereikt betreffende dit projectplan.

4. Procedure

Het projectplan is op grond van de Inspraakverordening van het waterschap voorbereid via de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat eerst het ontwerp van het projectplan ter inzage is gelegd, waarop belanghebbenden en inwoners gedurende een termijn van zes weken geen zienswijze hebben geven. Het projectplan kan dan definitief vastgesteld worden door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Het ontwerp-projectplan en dit vastgestelde projectplan worden beiden bekendgemaakt.

5. Contactpersoon

De heer J.E.H. Bakker (06 52 08 34 70) en de heer J.D. van Straten (06 18 63 91 23) treden in dit project namens Waterschap Rivierenland op als contactpersonen.

Namens:

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,

het hoofd van de afdeling Weg-en Waterbouw:


ir. J.M. van Bavel
