

Projectplan

Essche Stroom Uilenbroek



Essche Stroom Uilenbroek

Rapportage: Dit projectplan is opgesteld ten aanzien van de Waterwet. Voor wijzigingen aan waterstaatswerken zijn watersysteembeheerder verplicht om een projectplan opstellen.

Auteurs:

H. Koekkoek
M. de Wit
A. de Glopper
G. van Wijk

Projectleider
Assistent projectleider
Ecoloog
Hydroloog

Versie:

ontwerp-projectplan

Kenmerk:

Z49859/I52394

Datum:

3 mei 2018

Inhoud

	Leeswijzer	1	
1	INLEIDING		1
	1.1	Aanleiding en doel	1
	1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
2	BESCHRIJVING EN EFFECTEN VAN DE WIJZIGING/AANLEG WATERSTAATSWERKEN		3
	2.1	Waterstaatswerk	3
	2.2	Beschikbaarheid gronden	3
	2.3	Effecten van het plan	3
	2.4	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	3
	2.5	Beheer en onderhoud	4
	2.6	Samenwerking	4
3	VERANTWOORDING OP BASIS VAN WET- EN REGELGEVING		5
	3.1	Waterwet	5
	3.2	Beleidsregel drainage	5
	3.2.1	Onderbouwing hydrologische effecten	6
	3.2.2	Ecologische effecten	8
	3.3	Wet natuurbescherming	9
	3.4	Archeologie	9
	3.5	Niet gesprongen explosieven	10
	3.6	Provinciaal beleid	10
	3.7	Ontgrondingverordening	10
	3.8	Gemeentelijk beleid	10
4	UITVOERING & BEHEER		11
	4.1	Wijze van uitvoering	11
	4.1.1	Afwijkingsmogelijkheden in de uitvoering.	11
	4.1.2	Vergunbaarheid en bijbehorende uitvoeringsvoorwaarden	11
	4.2	Legger	11
5	JURIDISCHE PROCEDURE		12

Deel 1: Uilenbroek

Leeswijzer

Het voorliggende projectplan bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel 2 geeft een toelichting op de vraag waarom dit werk wordt uitgevoerd en is daarmee de onderbouwing van het plan. Deel 3 geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures en deel 4 bevat tekeningen, rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.


1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

Waterschap de Dommel wil in de komende jaren de Essche Stroom en het beekdal tussen de Nemer bij Haaren en stuw bij Esch herinrichten. De beek voldoet op hier niet aan de Kaderrichtlijn Water (hierna KRW) doelen. Door meanders aan te leggen en het profiel van de Essche Stroom te verkleinen kan invulling geven worden aan de KRW opgave. Echter om het doel te verwezenlijken moet er voldoende ruimte gecreëerd worden, zowel voor de meanders als voor de bijbehorende overstroming.

Waterschap De Dommel heeft een overeenkomst gesloten met ontbindende voorwaarde om ca. 8 hectare grond direct aan de Essche Stroom te verwerven en 3 ha van Brabants Landschap pachtvrij te maken. Het deel direct langs de Essche Stroom (ca 2 ha) is primair nodig om zowel de Essche Stroom als het natuurnetwerk te kunnen (her)inrichten. Het overige deel (hoger gelegen) is nodig om te ruilen met agrarische grond aangrenzend aan de Essche Stroom, eveneens met als doel om ingericht te kunnen worden. Zodoende kan een traject van minimaal 1300 meter beschikbaar gesteld worden voor bovengenoemde herinrichtingsmaatregelen.

Onderdeel van dit plan (en de overeenkomst) is aanleg van (peilgestuurde) drainage op een gedeelte van perceel BTL00L786, zie figuur 1. Dit projectplan geeft invulling aan de onderbouwing voor het toepassen van de drainage, en de hydrologische en ecologische “plus” die gerealiseerd kan worden.

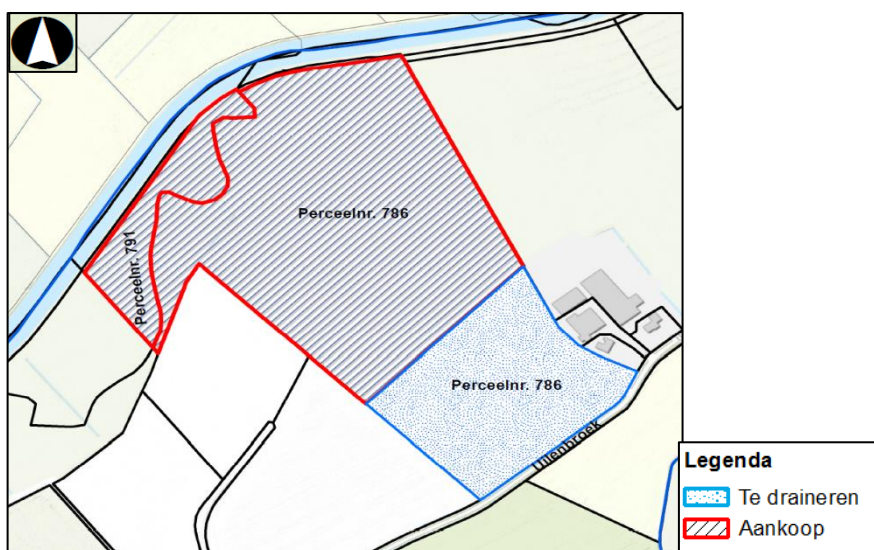

Figuur 1: Te verwerven en te draingeren perceel.


1.2

Ligging en begrenzing plangebied

De perceel die geheel of deels verworven worden ligt aan de noord kant van de Uilenbroek te Boxtel. Aan de zuidzijde grenzen de percelen aan de Essche Stroom. In figuur 2 wordt het plangebied getoond incl. de percelen van Brabants Landschap die verpacht worden en de toekomstig meanderende Essche Stroom.

Kadastrale kenmerken te verwerven percelen:

- Perceelnummer: 791
Administratief oppervlakte: 11575 m²
Sectie: L
Gemeente: Boxtel
- Perceelnummer: 786
Administratief oppervlakte: 111200 m²
Sectie: L
Gemeente: Boxtel

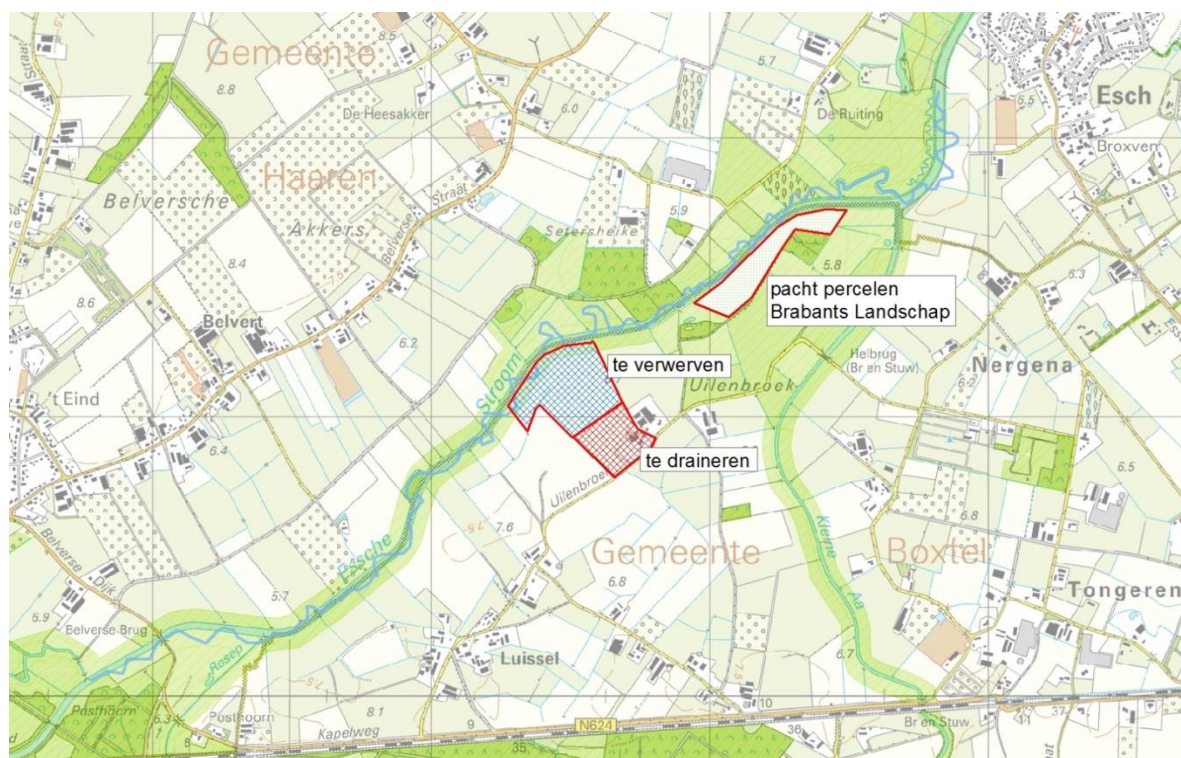

Figuur 2: Ligging percelen in gebied Essche Stroom (NNB in groene arcering en indicatieve nieuwe loop van de Essche Stroom)

2 BESCHRIJVING EN EFFECTEN VAN DE WIJZIGING/AANLEG WATERSTAATSWERKEN


2.1 Waterstaatswerk

Dit project omvat de volgende werkzaamheden (zie figuur 3):

- Aanleg cq herstel van de steilrand en ophogen aan de rand van het beekdal
- Aanleg peilgestuurde drainage op 50cm –maaiveld.

Niet-waterstaatswerken:

- Verwijderen semi-verharding in toegangspad

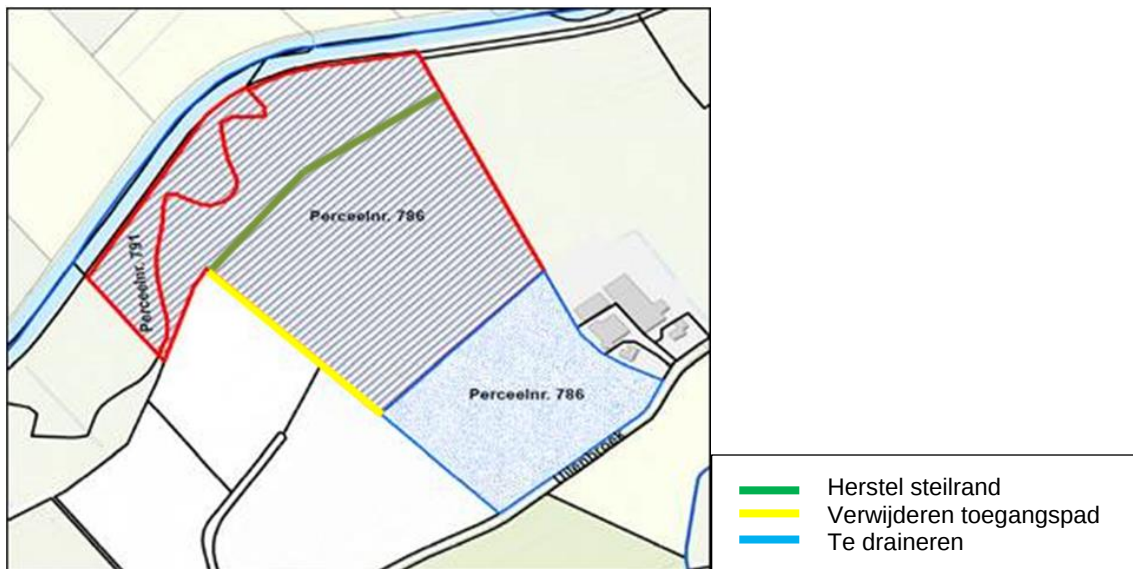

Figuur 3: Topografische impressie van de maatregelen.

2.2 Beschikbaarheid gronden

De gronden waarop de maatregelen plaatsvinden zijn in eigendom van één particuliere eigenaar. Middels een overeenkomst wordt het waterschap eigenaar van een deel van de gronden. Brabants Landschap is eigenaar en verpachter van ca 3 ha, welke middels een overeenkomst pachtvrij gemaakt worden.

2.3 Effecten van het plan

Het voorliggende plan maakt een robuuste en klimaatbestendige inrichting van de Essche Stroom en omliggende gronden mogelijk. Er wordt ruimte gecreëerd voor overstroming en vernatting. De steilrand zorgt voor een duidelijkere scheiding van lage en hoge(re) gronden en draagt bij aan de landschappelijke, ecologische en hydrologische structuren van de Essche Stroom. De uitstraling van met name de vernatting op de landbouwgrond (perceel L786, die niet in eigendom komt van het waterschap) wordt met (peilgestuurde) drainage opgevangen.

De drainage heeft geen verslechtering tot gevolg van de hydrologische situatie ter plaatse van de natte natuur parel Uilenbroek.

2.4 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

De aannemer(s) die de werkzaamheden gaat (gaan) uitvoeren, bepaalt de werkmethode en volgorde van uitvoering.

Het graafwerk wordt uitgevoerd met hydraulische graafmachines. De aanleg van de steilrand wordt met een gesloten grondbalans uitgevoerd en omvat het lokaal herprofiëren en accentueren van de overgang van relatief hoge naar lage grond. De drainage zal middels een sleufloze methode worden aangebracht.

2.5 Beheer en onderhoud

Waterschap de Dommel wordt eigenaar en beheerder van het in hoofdstuk 1 aangegeven gedeelte van perceel L786 en L791. Het waterschap zal de gronden gebruiken voor haar eigen doelen langs de Essche Stroom. Tot verdere herinrichting volgt zullen de gronden die binnen de NNB vallen middels (tijdelijke) natuurschap verpacht worden. De landbouwgrond zal in gebruik blijven, danwel kortlopend verpacht worden vooruitlopend op herverkaveling ten behoeven van herinrichting van het beekdal.

De eigenaar van perceel L786 is en blijft beheerder van zijn perceelgedeelte inclusief de aangelegde drainage en watergang(en) overeenkomstig de Keur.

2.6 Samenwerking

De werkzaamheden in dit projectplan worden in overleg tussen het waterschap, de eigenaar van L786 en L791 en Brabants Landschap uitgevoerd

Deel 2 Verantwoording

3 VERANTWOORDING OP BASIS VAN WET- EN REGELGEVING

3.1 Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
- c. en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Dit projectplan maakt aankoop van 8 ha landbouwgrond mogelijk die wordt ingezet om een robuust en klimaatbestendig beekdal in te richten. Naast ruimte voor water, wordt met de aanleg van drainage wateroverlast beperkt en tegelijkertijd zal de Essche Stroom zich na herinrichting (van het gehele beekdal) ontwikkelen tot een natuurlijke waterloop . De steilrand zorgt voor een betere afbakening van de lage delen van het beekdal in vaak voorkomende overstromingssituaties. Het beekdal van de Essche Stroom kende veel hoogteverschillen. Bij de ruilverkaveling in de jaren 60 van de vorige eeuw en later door schaalvergroting zijn die verschillen genivelleerd. Tevens draagt de rand bij aan de landschappelijke, ecologische en hydrologische structuren van het beekdal van de Essche Stroom.

3.2 Beleidsregel drainage

In de beleidsregel drainage, onderdeel van de beleidsregels waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van waterschap de Dommel is het gebied (perceel L791 en L786) aangeduid als “beekdal” en “attentiegebied”.

Beekdalen:

Drainage binnen de beekdalen wordt niet toegestaan, tenzij de combinatie van maatregelen cumulatief bijdraagt aan het bereiken van waterhuishoudkundige condities van de natuurdoelen in de beekdalen (hydrologische plus). Een verbijzondering hiervan is een compensatiemaatregel als gevolg van natschade door een vernattingsmaatregel binnen de EHS. Als deze effecten neutraal of negatief zijn, zal de vergunning geweigerd worden.

Attentiegebied:

Aanleg van drainage (vergunningverlening) is slechts mogelijk indien de cumulatieve effecten van de maatregelen in de attentiegebieden niet leiden tot een significant negatief effect op de beschermde gebieden waterhuishouding. Hierbij wordt getoetst op minimaal een stand-still op de rand van de natte natuurparel.

Middels dit projectplan wordt drainage toegestaan. De combinatie van het beschikbaar komen van lage gronden in het beekdal door aankoop en pachtvrij maken én hoge(re) gronden voor ruiling zijn de basis voor het bereiken van de waterhuishoudkundige condities van de natuurdoelen in het beekdal.

De verwachting is dat door herinrichting van de Essche Stroom het beekdal gemiddeld behoorlijk natter wordt. Bovendien neemt de overstromingsfrequentie fors toe. De herinrichting is nodig om te voldoen aan de KRW, inrichting NNB en Natte Natuurparel opgaven. Om de verwachte vernatting van dit perceel tegen te gaan strekt de maatregel om drainage toe te staan. De drainage heeft geen (negatief) effect op (de rand van) de natte natuurparel. Er wordt voldaan aan het stand-still beginsel.

3.2.1 Onderbouwing hydrologische effecten


Hieronder wordt ingegaan op de hydrologische effecten van de aanleg van drainage.

Drainagediepte

Er wordt peilgestuurde drainage toegestaan op 3,2 ha van perceel L786, met een maximale ontwateringsdiepte van 50 cm. Bij het bepalen van de maximale drainagediepte is gebruik gemaakt van locatiekenmerken. Er wordt onderscheid gemaakt naar drie verschillende locatiekenmerken waaraan een weging wordt gekoppeld: afstand tot de Natte Natuur Parel (NNP), ontwateringsdiepte en GVG. De gewogen som van de locatiekenmerken bepaalt uiteindelijk de maximale drainagediepte. Aan de noordoostkant is het perceel begrensd door een greppel die een diepte heeft van ca 60 cm, waar op afwatering kan plaatsvinden.

Hoogteligging en grondwaterstanden

In figuur 4 is een hoogtekarte weergegeven op basis van het AHN2. Daarin zijn extra hoogtepunten aangegeven om het maaiveldreliëf nauwkeuriger aan te geven. Ook is de locatie van peilbuis B45C1077 aangegeven.

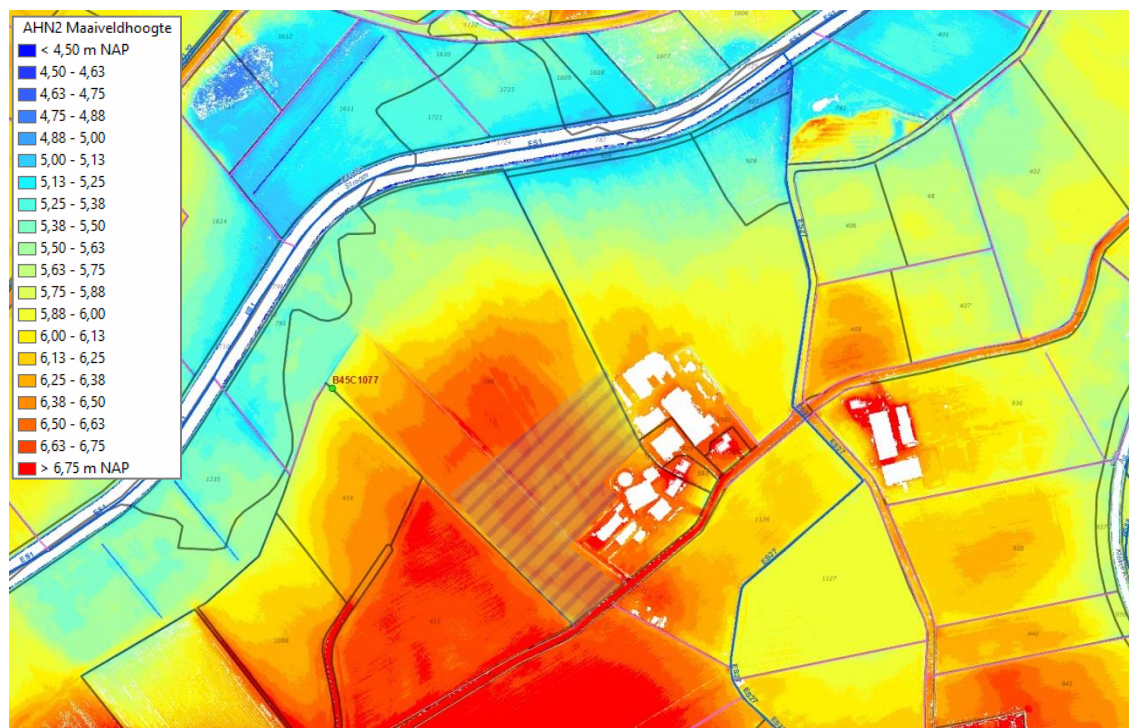


Figuur 4: Hoogteligging perceel L786 en omgeving

Aan de rand van het perceel 786 wordt vanaf september 2011 de grondwaterstand gemeten (zie B45C1077 in figuur 4). In figuur 5 is het verloop weergegeven (delen van 2014 en 2015 zijn niet goed bemeten) evenals de maaiveldhoogte van het hoger gelegen deel waar drainage wenst wordt.

De gemeten grondwaterstanden fluctueren van ca. 4.5 m NAP (zomermaanden) tot 5.9 m NAP (wintermaanden). Het perceel zoals aangegeven in figuur 1 en 2 ligt op de flank van de beek. Door opbolling zullen de absolute grondwaterstanden in het te draineren perceel hoger zijn dan ter hoogte van de bemeten locatie, maar doordat het perceel hoger ligt zullen de grondwaterstanden verder onder maaiveld staan.

De momenten waarop de grondwaterstand relatief dicht onder het maaiveld staat is vaak van korte duur en treden beperkt op in de wintermaanden. Verwacht wordt dat de effectieve werking van de drainage zich voornamelijk zal voordoen op enkele kortstondige momenten in de wintermaanden en dan alleen lokaal op het gedraineerde perceel.

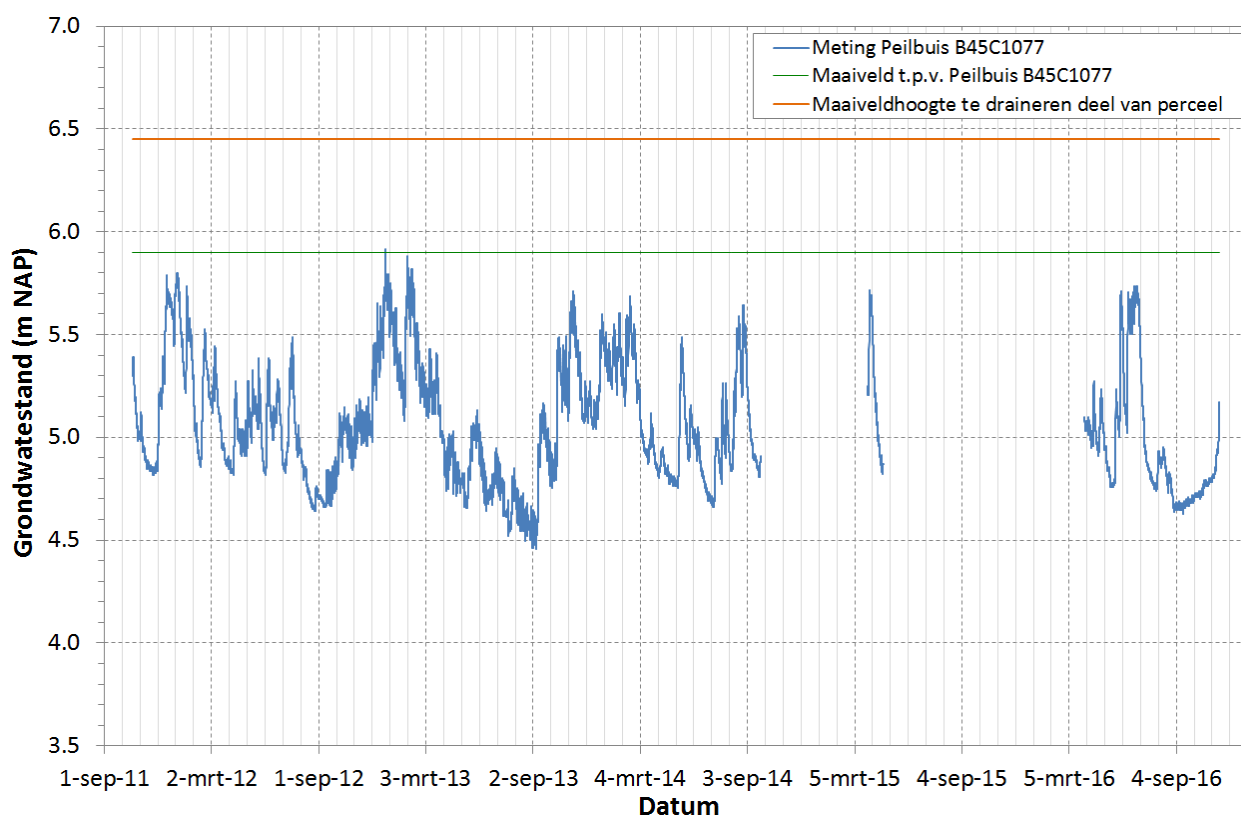

Figuur 5: Grondwaterstand in relatie tot de tijd van perceel 786.

Waterstanden Essche Stroom

De Essche Stroom werkt drainerend voor perceel L786. De waterstand in de zomer en winter hebben ter hoogte van het perceel een gemiddelde hoogte van ca. 4.40 m NAP. Op basis van (concept) ontwerpberekeningen zou dit met enkele centimeters kunnen toenemen als beekherstelmaatregelen uitgevoerd worden (vernatting onder normale omstandigheden).

In de huidige toestand bereikt de waterstand eens per jaar een hoogte van ca. 4.70 m NAP. Deze waterstand kan toenemen tot ca. 5.50 m NAP als beekherstel toegepast zou worden. (vernatting onder extremere omstandigheden). Deze hogere waterstand komt door overstroming van het lage maaiveld langs de beek tot aan de (steil)rand van het beekdal en daarmee dichterbij het te draineren percelen

Het verschil tussen waterstanden in de huidige situatie en bij beekherstel laat zien dat de waterstanden zullen toenemen in geval beekherstel wordt toegepast. Bij de hogere afvoeren zal er relatief meer toename zijn van de waterstanden. De drainage zal, temeer in de toekomstige situatie, als compensatie dienen voor vernatting.

Ontwateringsdiepte van het gebied

De ontwateringsdiepte van een gebied bepaalt in hoeverre een (oppervlakkig) aan te brengen buisdrainage een negatieve invloed uitoefent op de waterhuishouding. Met andere woorden; bij een diepe ontwatering heeft de agrarische bedrijfsvoering op de bovenlaag nauwelijks invloed op de waterhuishouding. In de nabije omgeving van het perceel is de ontwateringsdiepte reeds 60 tot 90 cm.

- Geschatte GHG ca. 20 cm - mv
- Geschatte GVG ca. 60 cm - mv
- Geschatte GLG ca. 150 cm - mv

De verwachting is dat door de herinrichting van het beekdal de grondwaterstanden gemiddeld hoger worden.

Afstand tot de NNP:

De grens van de Natte Natuurparel en het Natuurnetwerk ligt op een afstand van ca. 230 meter. Op die afstand ligt momenteel geen ingerichte Natte Natuurparel (met een vastgestelde GGOR). Grote delen zijn nog in landbouwkundig gebruik. De zone is in de huidige situatie beperkt ingericht en enkele percelen zijn in eigendom van een terreinbeheerder (BL)

3.2.2 Ecologische effecten

Kaderrichtlijnwater

Door verwerving van L786 en L791 en het pacht vrijmaken van L780 wordt het mogelijk om 1300m van Essche Stroom en het beekdal natuurlijk en klimaat robuust in te richten. Dit houdt in: hogere stroomsnelheden, meer variantie in de beekmorfologie, grotere inundatie-oppervlakte tijdens extremere situaties. Dit kan alleen gerealiseerd worden indien er voldoende ruimte gecreëerd wordt voor de beek. Indien het traject van 1300m beschikbaar komt voor herinrichting draagt dit in grote mate bij aan het halen van de KRW doelen. Het toepassen van peilgestuurde drainage op het perceel L786 heeft verder geen nadelige gevolgen voor de KRW doelstelling.

Effect op ambitiebeheertypen

Het deel van het perceel waar de drainage gepland is maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant (hierna NNB). In de directe omgeving zijn vrijwel alle NNB gronden nog niet ingericht als natuur, maar zijn nog landbouwgrond. In de toekomstige situatie kan door de herinrichting van de 1300m beek en beekdal de NNB en bijhorende ambitiebeheertypen (gelegen langs de beek) gerealiseerd worden. Het gaat hierbij om de ambitiebeheertypen rivier en beekbegeleidend bos, nat kruiden en faunarijk grasland en nat ruigteveld.

Het te draineren perceel ligt beduidend hoger dan de NNB percelen. Dit geldt ook voor het noordoostelijk gelegen ambitiebeheertype Kruiden- en faunarijk grasland. Dit type heeft in het voorjaar een gewenste grondwaterstand van ten hoogste 46cm onder maaiveld, maar liever dieper. De aanleg van drainage op 40-50cm diepte heeft geen effect op de toekomstige realisatie van dit ambitiebeheertype. Zie figuur 4 voor de hoogtekaart en figuur 6 A en B voor de ambitiebeheertype.



Figuur 6: A. ambitiebeheertypen (gewenste situatie). Groen is Kruiden en faunarijk. B. huidige natuurbeheertypen. Vrijwel alle percelen nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting (roze).

3.3 Wet natuurbescherming

Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient zekerheid te worden geboden omtrent het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van soorten. Het plangebied zelf maakt geen deel uit van Natura 2000 gebieden. Negatieve (storings)effecten met een uitstraling Natura 2000 gebieden in de omgeving (Kampina en Oisterwijkse vennen en bossen) treden niet op. In 2010 en 2014 is het gebied onderzocht op flora en fauna (Natuurbalans, *flora en fauna onderzoek Essche Stroom*, 2010, 2014). Hieruit blijkt dat het herinrichtingsgebied van de Essche Stroom en het plangebied in het bijzonder enkel agrarisch gebied betreft zonder enige betekenis voor flora en fauna. Het plan heeft dan ook geen negatief effect op beschermde soorten. Door de (toekomstige) herinrichting neemt de betekenis voor planten en dieren toe en is vestiging van meer en zeldzamere planten en dieren te verwachten.

3.4 Archeologie


Voor de werkzaamheden is geen verstoring van archeologische waarden te verwachten. Op basis van het advies van de archeoloog is verder onderzoek niet nodig.

3.5 Niet gesprongen explosieven

De graafwerkzaamheden voor aanleg van de steilrand zijn beperkt van diepte, ca 20cm, en binnen de aanwezige bouwvoor. Dit is binnen de regulier agrarisch bewerkte diepte. De kans op aantreffen van niet gesprongen explosieven wordt zeer klein geacht.

3.6 Provinciaal beleid

Uit figuur 8 blijkt dat het te verwerven en te draingeren perceel ligt in de aanduiding 'boringsvrije zone' en 'Reservering Waterberging'. De Verordening ruimte 2014 Noord-Brabant bevat in hoofdzaak algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen van bestemmingsplannen en het verlenen van omgevingsvergunningen waarbij afgeweken wordt van bestemmingsplannen.

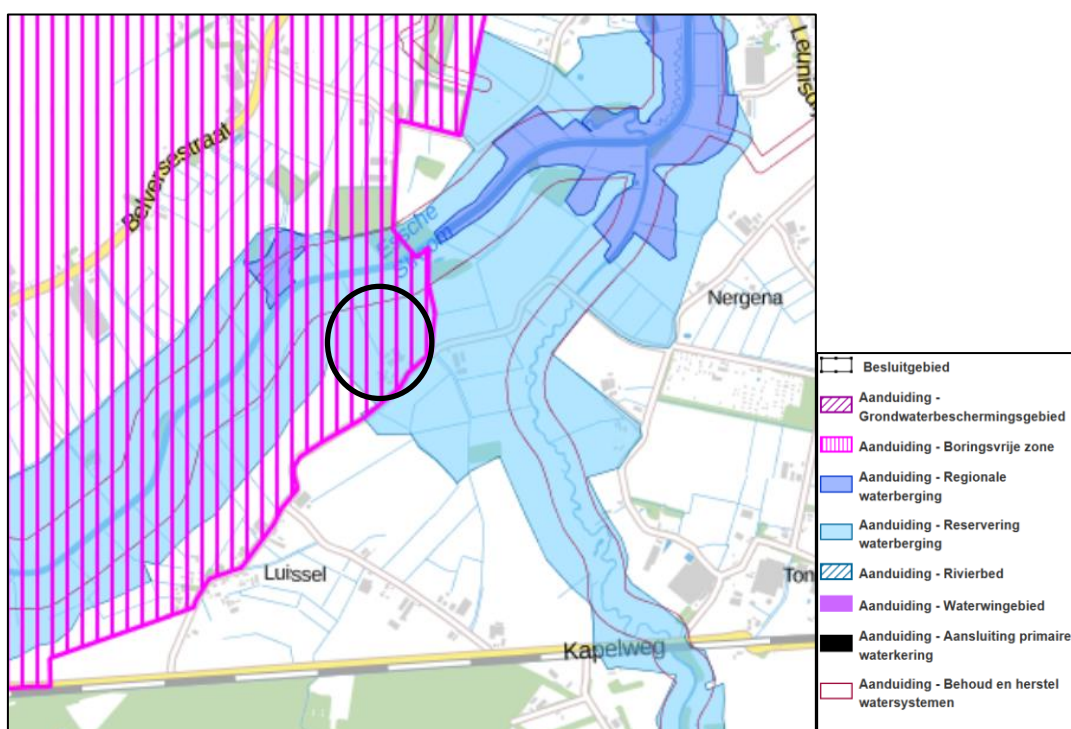

Figuur 7: Verordening ruimte 2014, thema water. Zwarte cirkel illustreert het plangebied (Ruimtelijke plannen Noord-Brabant 2016).

3.7 Ontgrondingverordening

Voor het aanleggen van de steilrand wordt over een lengte van 220m en een breedte van 9m ca 20cm (gemiddeld 10cm) bouwvoor afgegraven. Dit valt onder de absolute vrijstellingen van de verordening.

3.8 Gemeentelijk beleid

De voorgenen activiteiten passen binnen de bestemmingen. Wel dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

4 UITVOERING & BEHEER

4.1 Wijze van uitvoering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitvoering van de werken en de voor de uitvoering van de maatregelen benodigde vergunningen en ontheffingen. Ook is aangegeven welke maatregelen het waterschap bij de uitvoering zal treffen om nadelige gevolgen voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

4.1.1 Afwijkingsmogelijkheden in de uitvoering.

De maten en locatie getoond op de maatregelenkaart (bijlage 4) dienen als basis voor de verdere uitwerking van het projectplan tot een bestek. In het bestek wordt de exacte maatvoering uitgewerkt. Dat wil zeggen dat het ontwerp verder wordt gedetailleerd. Het is aannemelijk dat tijdens deze detaillering beperkt afgeweken wordt van het voorliggende ontwerp, zoals beschreven is in hoofdstuk 3. Ook tijdens de uitvoering kunnen afwijkingen ontstaan. Echter deze afwijkingen zijn van ondergeschikte aard en doen geen afbreuk aan de functionele, hydrologische eisen van de waterstaatswerken en leiden niet tot andere dan in dit plan omschreven effecten op de omgeving.

4.1.2 Vergunbaarheid en bijbehorende uitvoeringsvoorwaarden

Er is een omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen van drainage, het pad verwijderen en het aanleggen van de steilrand. Voor het graafwerk ten behoeve van de steilrand is slechts een beperkte oppervlakte gemoeid waarmee de activiteit onder de absolute vrijstellingen van artikel 9 valt.

Tabel 1 geeft een overzicht van benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen waarmee de uitvoering van het project van doen heeft. De voorwaarden die het bevoegd gezag en/of eigenaren zullen koppelen aan de vergunning, ontheffingen of toestemming neemt het waterschap op in het bestek.

Tabel 1: Benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen,

Activiteit	Procedure/Juridische basis	Bevoegd gezag
Aanlegactiviteiten draineren, graven en ophogen	Omgevingsvergunning	Gemeente Boxtel

4.2 Legger

Het waterschap zal de in dat jaar gerealiseerde waterstaatswerken inmeten en optekenen op revisietekeningen. Vervolgens legt het waterschap de maten of de functionele eisen in de legger vast.

DEEL 3: Rechtsbescherming

5

JURIDISCHE PROCEDURE

Zienswijzen

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het waterschap plaatst een advertentie en/of stelt direct belanghebbenden persoonlijk op de hoogte van de inhoud van het plan. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Het plan is te raadplegen op: <http://www.waterschappedommel.nl/gvop>

Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen hun zienswijze op de waterstaatswerken in dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend.

Uitsluitend degenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen het definitief vastgestelde projectplan beroep instellen.

Beroep

Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden en ingezetenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen.

Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank in 's-Hertogenbosch. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Op de vaststelling van een projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden worden verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het plan niet uitvoeren totdat de rechter op het beroep heeft beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.
