



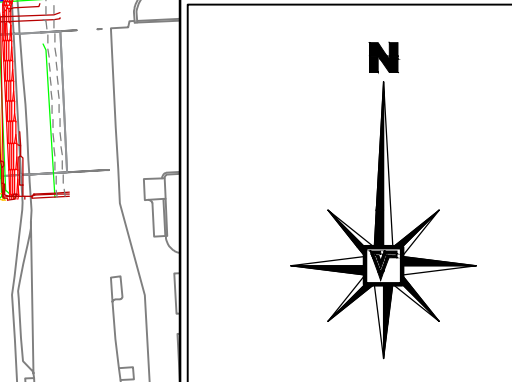


Voorbereidingsfase van de bouw van de brug.

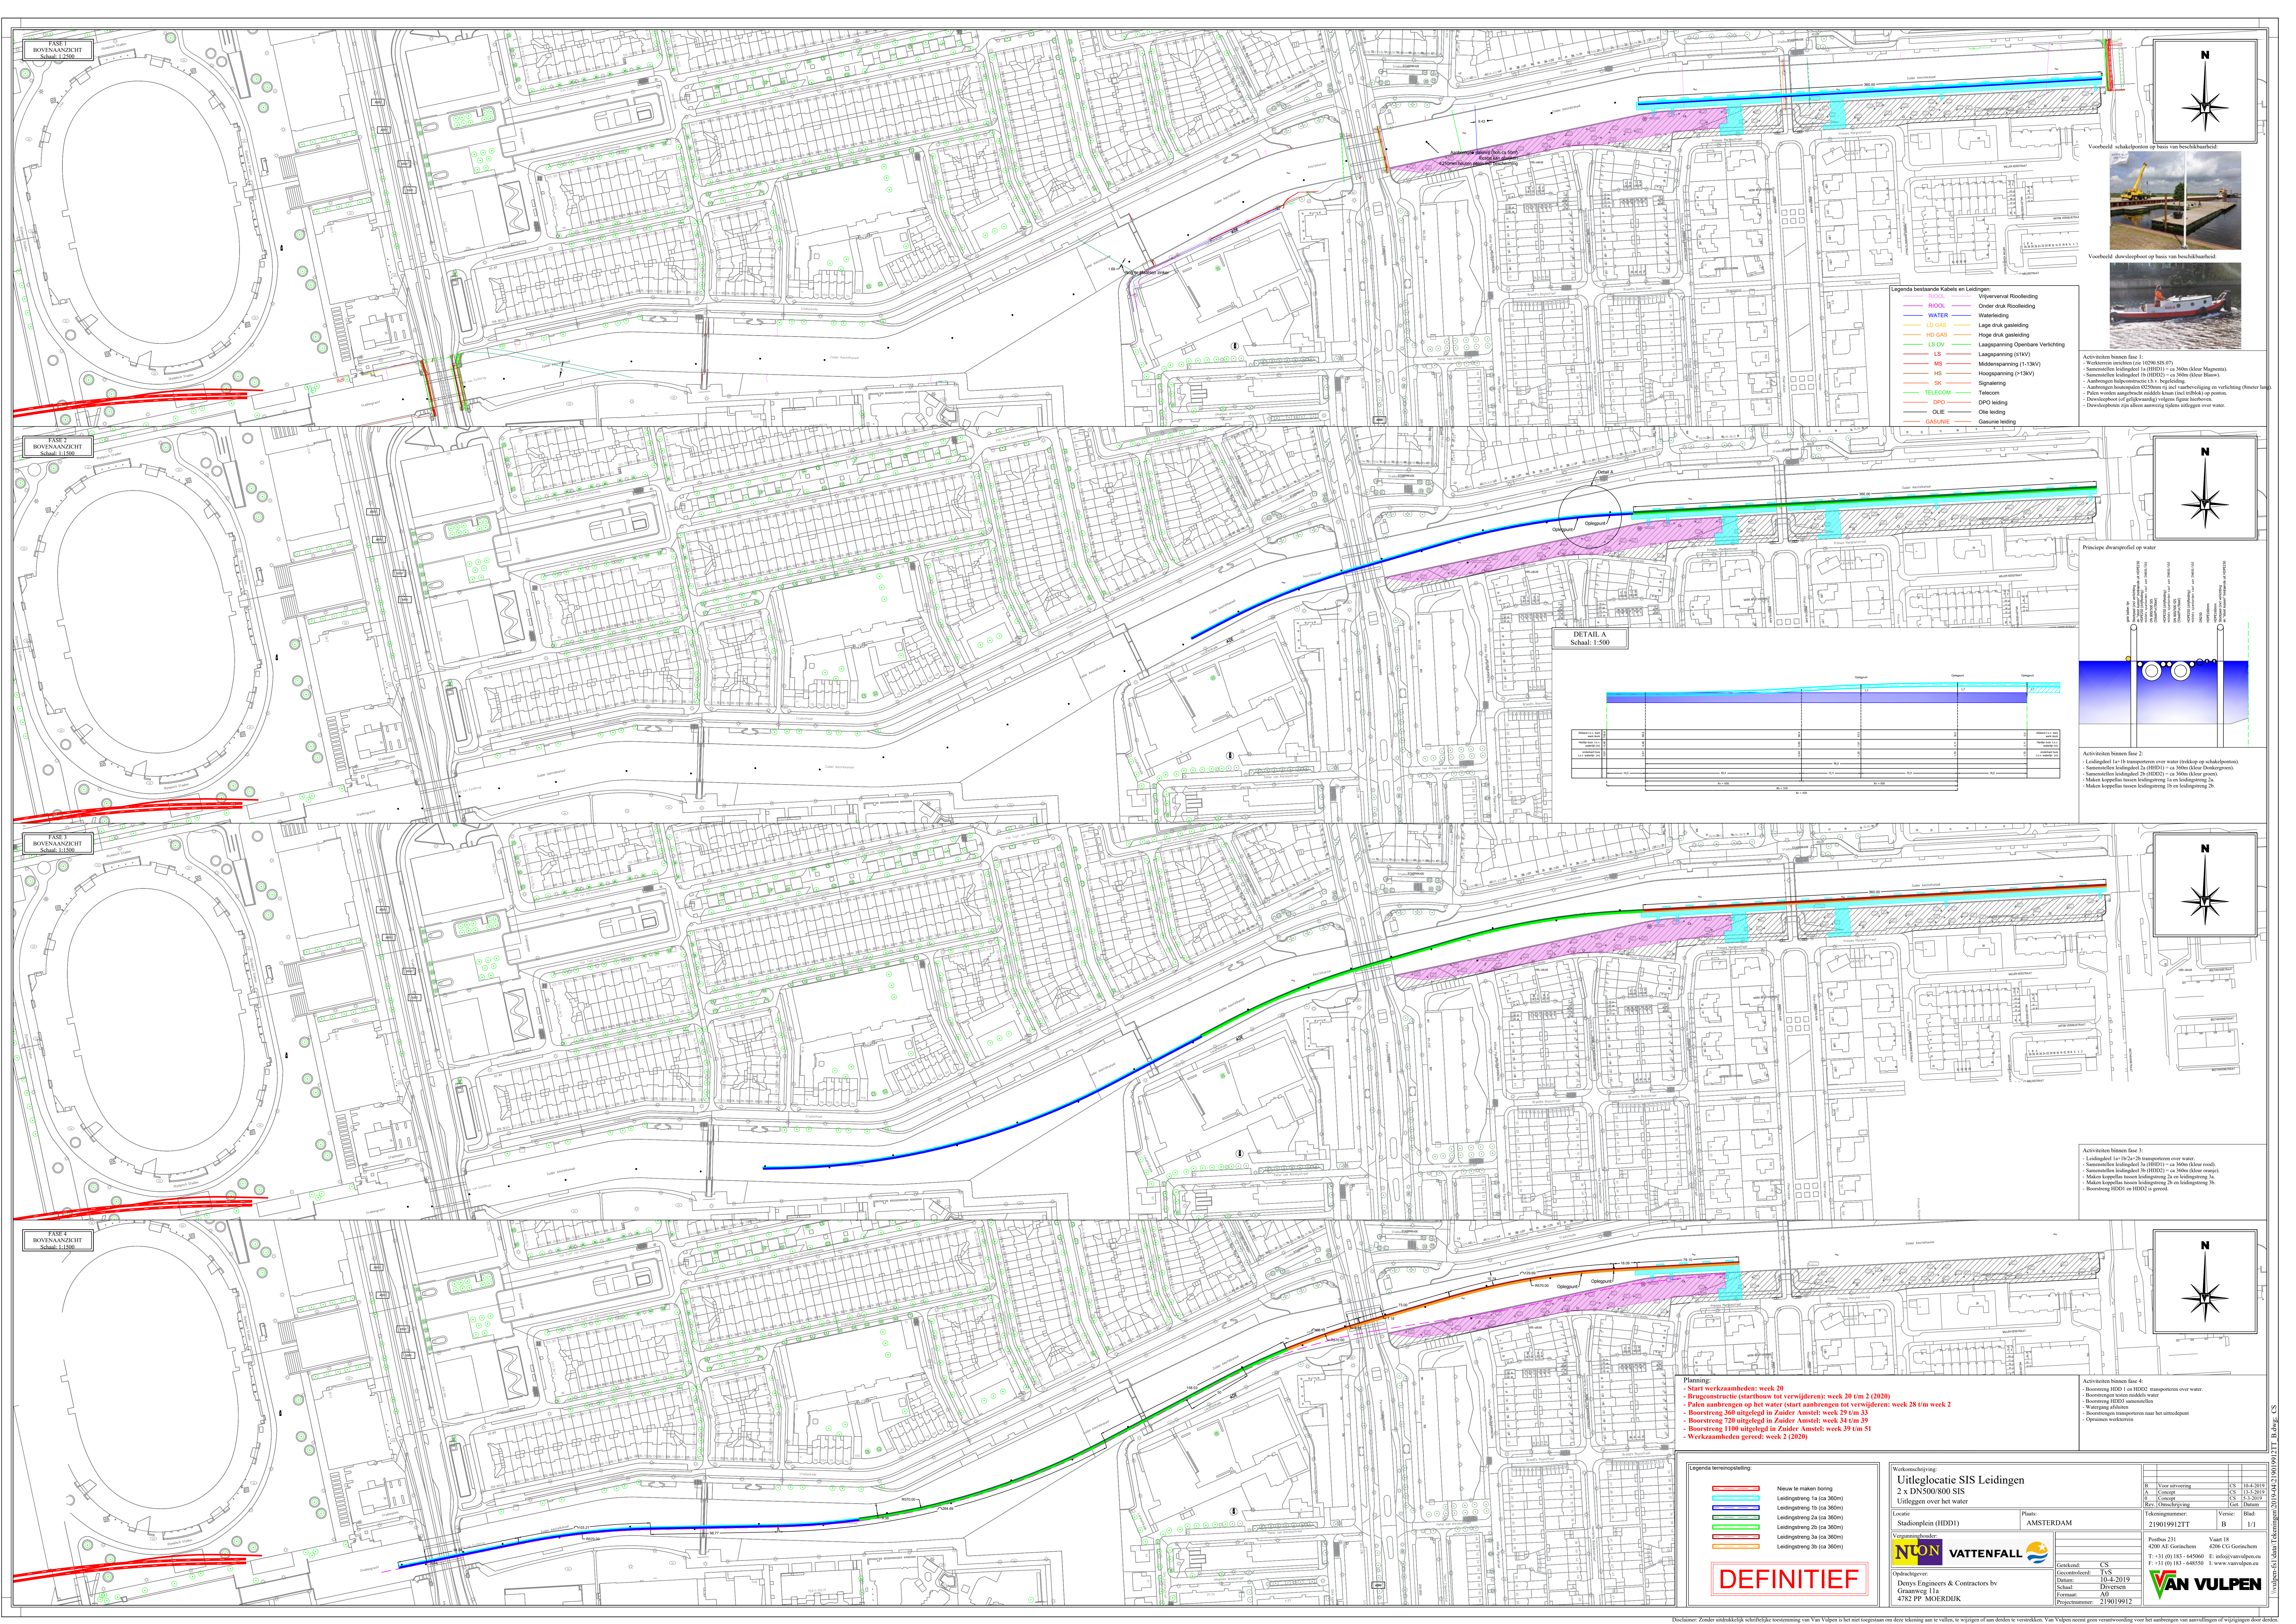


Voorbereidingsfase van de bouw van de brug.

Activiteiten binnen fase 1:
- Werkzaamheden in de kanaal (ca. 100m x 10m)
- Samenstellen leidingsnet 1a (HDD1) + ca. 30m (kleur groen)
- Samenstellen leidingsnet 1b (HDD2) + ca. 30m (kleur blauw)
- Aanbrengen leidingsnet 1c (HDD3) + ca. 30m (kleur rood)
- Aanbrengen leidingsnet 1d (HDD4) + ca. 30m (kleur paars)
- Pijlen worden aangebracht middels kraan (indien nodig) op gevent
- Deelplan van het gebied wordt afgelezen op de tekening
- Deelplan van het gebied wordt afgelezen op de tekening

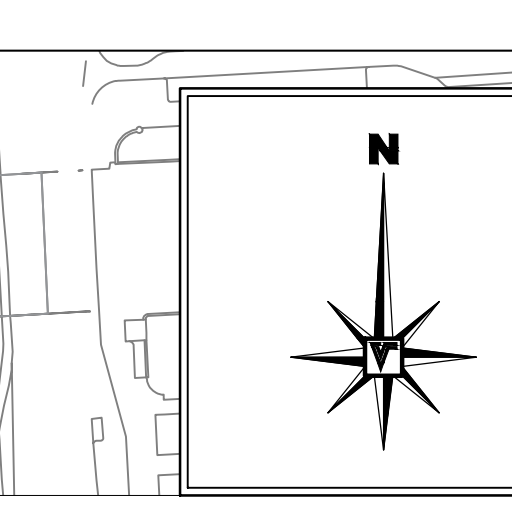


Principe dwarsprofiel op water

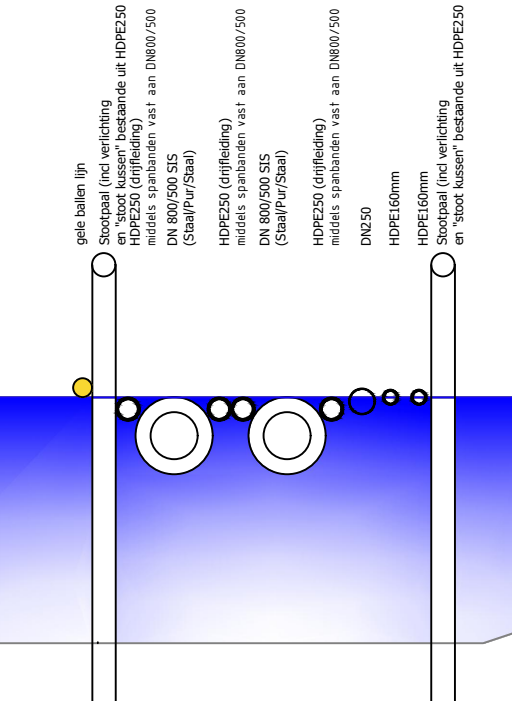


Principe dwarsprofiel op water

Activiteiten binnen fase 2:
- Leidingen 1a tot 1d transporteren over water (teekop op schakelputten)
- Samenstellen leidingsnet 2a (HDD1) + ca. 30m (kleur groen)
- Samenstellen leidingsnet 2b (HDD2) + ca. 30m (kleur blauw)
- Samenstellen leidingsnet 2c (HDD3) + ca. 30m (kleur rood)
- Samenstellen leidingsnet 2d (HDD4) + ca. 30m (kleur paars)
- Pijlen worden aangebracht middels kraan (indien nodig) op gevent
- Deelplan van het gebied wordt afgelezen op de tekening
- Deelplan van het gebied wordt afgelezen op de tekening

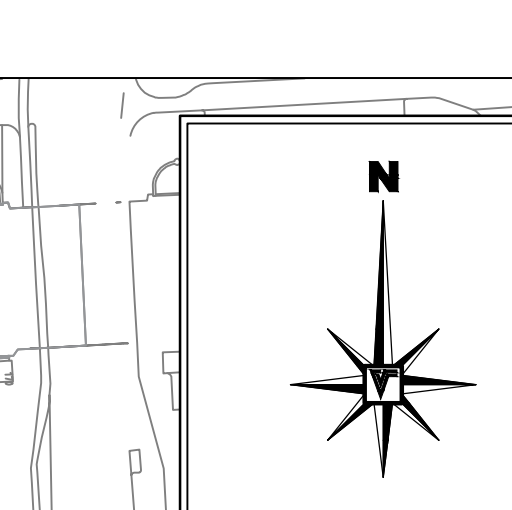


Principe dwarsprofiel op water

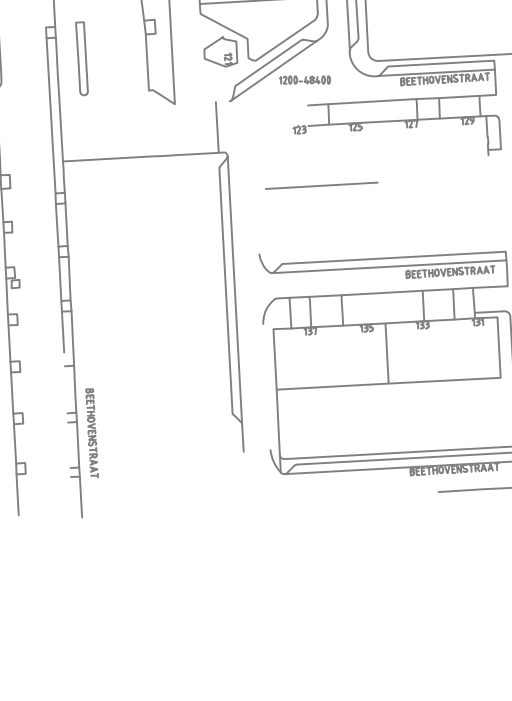


Principe dwarsprofiel op water

Activiteiten binnen fase 3:
- Leidingen 1a tot 1d transporteren over water
- Samenstellen leidingsnet 3a (HDD1) + ca. 30m (kleur groen)
- Samenstellen leidingsnet 3b (HDD2) + ca. 30m (kleur blauw)
- Samenstellen leidingsnet 3c (HDD3) + ca. 30m (kleur rood)
- Samenstellen leidingsnet 3d (HDD4) + ca. 30m (kleur paars)
- Pijlen worden aangebracht middels kraan (indien nodig) op gevent
- Deelplan van het gebied wordt afgelezen op de tekening
- Deelplan van het gebied wordt afgelezen op de tekening

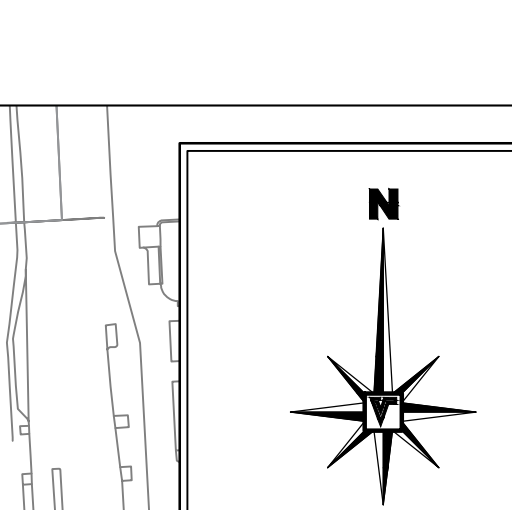

Principe dwarsprofiel op water

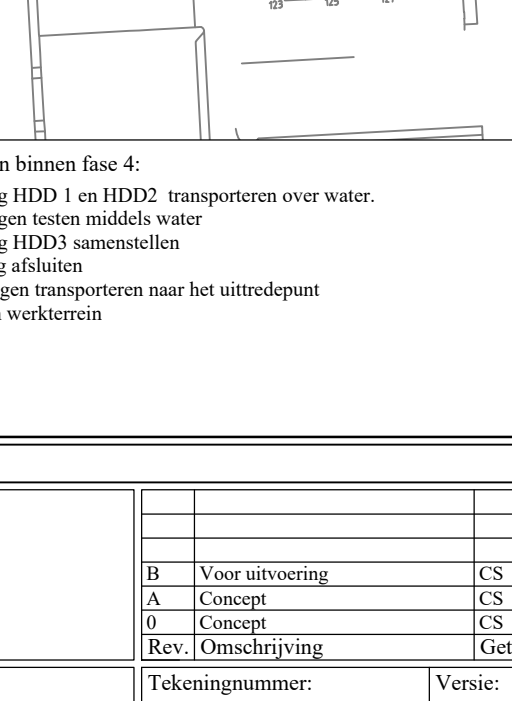

Principe dwarsprofiel op water

Activiteiten binnen fase 4:
- Leidingen 1a tot 1d transporteren over water
- Samenstellen leidingsnet 4a (HDD1) + ca. 30m (kleur groen)
- Samenstellen leidingsnet 4b (HDD2) + ca. 30m (kleur blauw)
- Samenstellen leidingsnet 4c (HDD3) + ca. 30m (kleur rood)
- Samenstellen leidingsnet 4d (HDD4) + ca. 30m (kleur paars)
- Pijlen worden aangebracht middels kraan (indien nodig) op gevent
- Deelplan van het gebied wordt afgelezen op de tekening
- Deelplan van het gebied wordt afgelezen op de tekening

Principe dwarsprofiel op water

Planning:
- Start werkzaamheden: week 20
- Brugconstructie (startbouw tot verwijderen): week 20 t/m 2 (2020)
- Pijlen aanbrengen op het water (start aanbrengen tot verwijderen): week 28 t/m week 2
- Boorstreng 360 uitgelegd in Zuidoost-Amstel: week 29 t/m 31
- Boorstreng 720 uitgelegd in Zuidoost-Amstel: week 34 t/m 39
- Boorstreng 1100 uitgelegd in Zuidoost-Amstel: week 39 t/m 51
- Werkzaamheden gereed: week 2 (2020)

Legenda terreinopstelling:
- Nieuw te maken boring
- Leidingstang 1a (ca. 30m)
- Leidingstang 1b (ca. 30m)
- Leidingstang 2a (ca. 30m)
- Leidingstang 2b (ca. 30m)
- Leidingstang 3a (ca. 30m)
- Leidingstang 3b (ca. 30m)

DEFINITIEF

Werkomschrijving:
Uitleglocatie SIS Leiden
2 x DN500/800 SIS
Uitleggen over het water
Locatie: Stadplein (HDD1)
Plots: AMSTERDAM
Verantwoordelijke: NTON VATTENFALL
Opdrachtgever: Dens Engineers & Contractors bv
Geraadpleegd: CS
Datum: 10-4-2019
Schakel: DIVERSCH
Formaat: A0
Projectnummer: 219019912
Tekeningsnummer: 219019912TT
Versie: B
Blad: 1/1
Postbus 2311 Vianen 18
4200 AE Gorinchem 4206 CG Gorinchem
T: +31 (0) 183 - 645060 E: info@vianen.nl
F: +31 (0) 183 - 645550 E: www.vianen.nl
VAN VULPEN
