



Projectplan Waterwet

No-Regret maatregelen regionale keringen
Groningen; deelgebied A2

projectnr. 343811
revisie 0
9 oktober 2018

auteur(s)

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

Inhoud

blz.

1	No-Regret Groningen deelgebied A2.....	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschikbaarheid gronden.....	2
1.4	Effecten van het plan	2
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	2
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	5
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>5</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>5</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>5</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud	5
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>5</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>5</i>
1.8	Samenwerking	5
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	5
1.10	Verantwoording op basis van beleid	6
1.11	Verantwoording van de keuzen in het project	6
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen	6
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	6
2.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan.....	6
2.2	Procedure	6
3	Rechtsbescherming	7

1 No-Regret Groningen deelgebied A2

1.1 Aanleiding en doel

Waterschap Noorderzijvest heeft binnen haar beheergebied onder andere de verantwoordelijkheid voor de waterkeringen. Daaronder valt ook een aantal regionale waterkeringen in en om de stad Groningen. Voor zover de veiligheid van deze keringen op dit moment onvoldoende is, gaat het waterschap maatregelen nemen om dit te verbeteren. Daarbij gaat het met name om de aspecten hoogte en/of stabiliteit.

Dit projectplan omvat een deel van de te nemen maatregelen in en om de stad Groningen, te weten maatregelen in de gemeente Groningen. Concreet betreft het de maatregelen binnen het deelgebied:

- A2 (Reitdiep)

NB: Gegevens in de bijlagen betreffende overige onderdelen / deelgebieden kunnen worden genegeerd.

De te nemen maatregelen vormen een samenhangend geheel en betreffen een relatief compact projectgebied.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De ligging van alle deelgebieden en projectonderdelen binnen No-Regret Groningen zijn aangegeven in de eerstvolgende figuur. Het projectonderdeel waarom het gaat in dit projectplan, is geaccentueerd.

1.3 Beschikbaarheid gronden

Voor het deelgebied A2 worden onder meer werkzaamheden uitgevoerd op grondgebied van de gemeente Groningen. Dit is met de gemeente afgestemd.

1.4 Effecten van het plan

De te nemen maatregelen brengen de waterkerende functies van de te verbeteren keringen weer op het vereiste veiligheidsniveau. Voor de te nemen maatregelen wordt uitgegaan van een beoogde levensduur en instandhoudingstermijn van 50 jaar.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Eenzijds worden waar dat nodig is maatregelen genomen die de keringen op de vereiste hoogte brengen. Daarbij gaat het in dit geval om het ophogen van de bestaande kade langs het Reitdiep. Daarbij wordt uitgegaan van een aanleghoogte van NAP +2,20m. Deze hoogte is vastgesteld bij definitief ontwerp d.d. 16 december 2016 met kenmerk SWNL0197497 hoofdstuk 4.2. (resultaat berekeningen zie tabel 4.1)

Ophoging van de kade vindt plaats vanaf landzijde.

In een deel van de op te hogen kade bevindt zich een fietspad/voetpad van de gemeente Groningen. Daar waar nodig zal deze verharding worden verwijderd en eenzelfde verharding worden aangebracht op een aanleghoogte van NAP +2,20 m.

Zoals uit de tekeningen blijkt zal het bestaande maaiveld aan weerszijden van het huidige fietspad niet worden verlaagd en is de kering geborgd.

Uitzondering is dwarsprofiel 18. Om de kering te borgen tijdens uitvoering zal daar waar nodig (om de huidige kerende hoogte in stand te houden) op voorhand aan waterzijde grond worden aangebracht tot huidig maaiveld niveau



Tabel 4-1 Aanleghoogte afgekeurde kadevakken (HT)

Deelgebied	Hoogte eis [m t.o.v. NAP]	Bodemdaling holoceen [m]	Zetting* [m]	Aanleghoogte [m t.o.v. NAP]
A1	+2,00	0,10	0,10	+2,20
A2	+2,00	0,10	0,10	+2,20
B4	+2,00	0,10	0,10	+2,20
B8	+2,00	0,10	0,10	+2,20
C1	+1,80	0	n.t.b.	>+1,80
C2	+1,80	0	n.t.b.	>+1,80
D9	+1,80	0	0,05	+1,85
D10	+2,00	0,10	0,10	+2,20
E2	+2,00	0,05	0,04	+2,15
E4	+1,80	0,00	0,05	+1,85
F1	+2,00	0,30	0,42	+2,15**
F2	+1,80	0	0	+1,80
F3w	+1,50	0,30	n.t.b.	>+1,50
F4	+1,80	0	0	+1,80
F5o	+2,00	0,30	0,20	+2,40
F5w	+1,50	0,30	n.t.b.	>+1,50
G3	+2,00	0,30	0,20	+2,15

*Berekende zettingen voor de aanleghoogte zijn naar boven afgerond op tientallen.

**Omdat de naastgelegen boordvoorziening is berekend op een maximale kruinhoogte van NAP +2,15 m is de aanleghoogte begrensd.

1.5.1 Nutsbedrijven

In de overleggen en mailwisselingen met de nutsbedrijven, Enexis, Waterbedrijf Groningen, KPN, Ziggo zijn de volgende afspraken gemaakt:

Enexis:

Nabij Plantaanbrug (tekening 343811-T060-ONT-L01 d.d. 6-12-2018) zal indien nodig een verlengspindel op een bestaande afsluiter moeten worden gebracht. Dit is een zeer kleine ingreep en wordt tijdens de uitvoering in overleg met Enexis uitgevoerd. Verder zijn geen knelpunten gesignaleerd.


KPN en Ziggo

KPN en Ziggo hebben geen knelpunten op voorhand gesignaleerd.

Waterbedrijf Groningen

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal contact worden opgenomen over mogelijk te nemen voorzorgsmaatregelen (eventuele bescherming tijdens transport).

Verder geen knelpunten gesignaleerd.

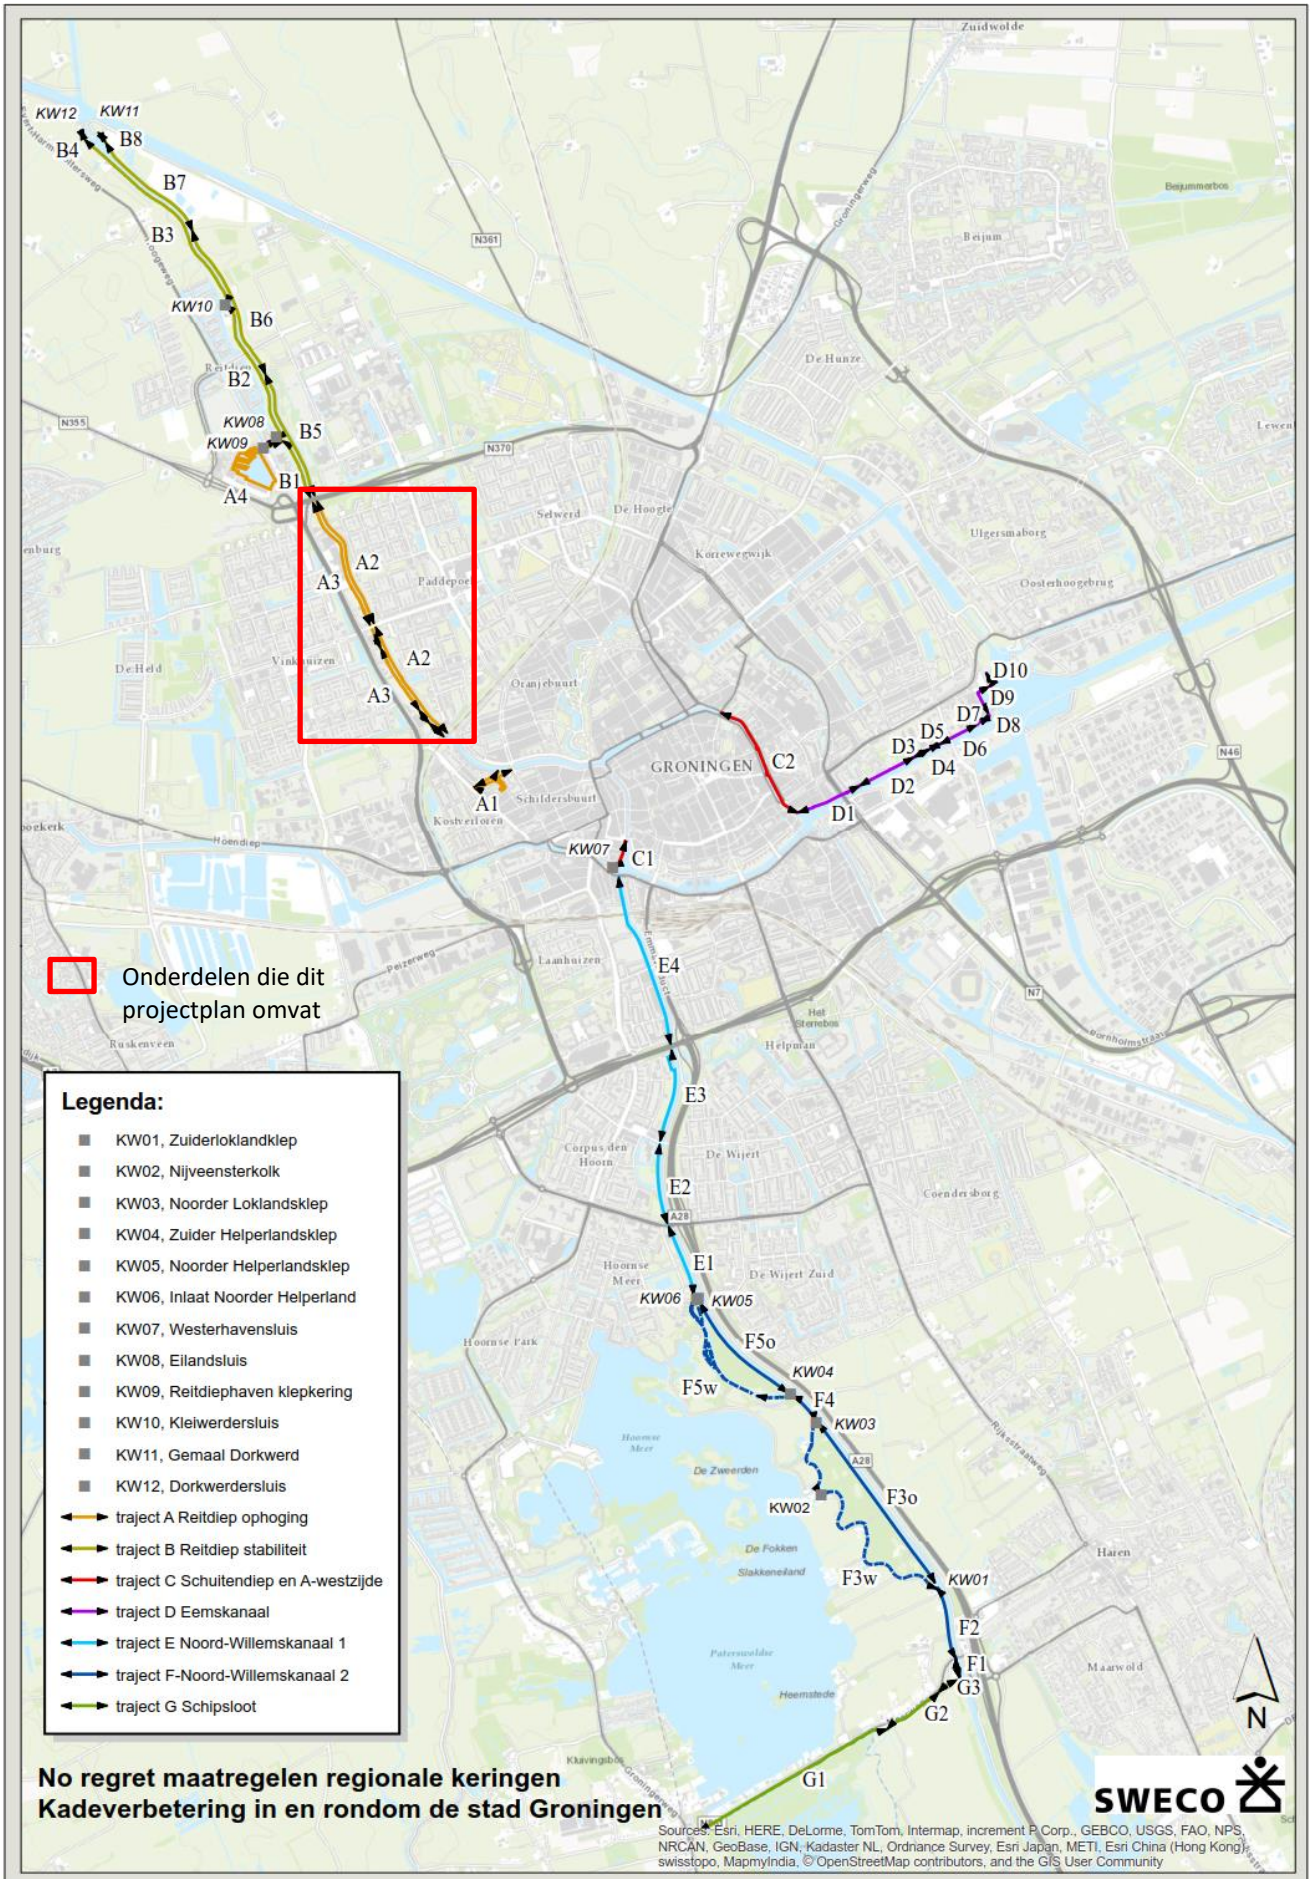

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

1.6.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan*

Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar onder meer bodemsamenstelling, archeologie, flora en fauna en explosieven. De bevindingen uit deze onderzoeken zijn in acht genomen bij de planuitwerking. Bij de maatregelen is er geen sprake van diepgravende werkzaamheden.

Vooraf zal worden geïnventariseerd op de aanwezigheid van plantensoorten van de Rode lijst. Voor zover aanwezig, zullen deze voorafgaand aan de uitvoering worden uitgestoken en verplant.

1.6.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

Bij werkzaamheden binnen het broedseizoen wordt vooraf geïnventariseerd op de aanwezigheid van nestelende vogels. Ook voor het overige worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de gedragscode Flora en Faunawet voor waterschappen.

1.6.3 *Nadeelcompensatie*

Er is ten aanzien van de te nemen maatregelen geen nadeelcompensatie aan de orde.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 *Legger*

Na afloop van de werkzaamheden wordt de nieuwe situatie ingemeten en wordt de legger van waterlopen en de legger van regionale waterkeringen hierop aangepast.

1.7.2 *Beheer en onderhoud*

Het toekomstige beheer en onderhoud van de betreffende kaden wijkt niet af van de huidige situatie.

1.8 Samenwerking

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk door een aannemer in opdracht van het waterschap uitgevoerd. Projectmatige samenwerking met derden is niet aan de orde.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De aanleiding voor de versterking van diverse kaden in en rond Groningen, is het feit dat uit berekeningen is gebleken dat de kaden niet overal voldoen aan de huidige veiligheidsnormen ten aanzien van de parameters stabiliteit, hoogte of piping. Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van het achterliggende gebied en is op basis daarvan gehouden maatregelen te treffen om de kaden te laten voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen.



1.10 Verantwoording op basis van beleid

Alleen een toets aan het beleid van het waterschap is aan de orde. Het waterschap is voor wat betreft het waterbeheer en droge voeten verantwoordelijk voor de veiligheid van het beheergebied waarbinnen de maatregelen worden genomen.

1.11 Verantwoording van de keuzen in het project

De maatregelen betreffen in hoofdzaak verbetering van de stabiliteit en/of verhoging van de waterkering. Waar dat aan de orde is, zijn er keuzen gemaakt op basis van meerdere varianten. Deze varianten zijn onder meer ingegeven door ruimtelijke (on)mogelijkheden en/of wensen van andere gebiedsbeheerders en/of omwonenden. Waar voldoende ruimte is, ligt bijvoorbeeld realisatie voor de hand door verbreding en/of verhoging van de aanwezige kade. Voor een andere deel is vanwege de beperkte ruimte gekozen voor toepassing van een stabiliserende keerwand.

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen

Niet van toepassing.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.



Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit projectplan.

- 01 Overzicht bijlagen
- 02 Overzichtskaart No-Regret
- 03 Maatregelen; kaart situatie
- 04 Maatregelen; dwarsprofielen
- 05 Onderzoek bodem; gebied No-Regret
- ~~06 Onderzoek bodem; locatie~~
- 07 Onderzoek archeologie; gebied No-Regret
- ~~08 Onderzoek archeologie; locatie~~
- 09 Onderzoek explosieven; gebied No-Regret
- 10 Onderzoek geotechniek; gebied No-Regret
- ~~11 Onderzoek geotechniek; locatie~~
- 12 Onderzoek natuur; gebied No-Regret
- ~~13 Onderzoek natuur; locatie~~
