

Ontwerp- Projectplan Waterwet Verbetering waterhuishouding 'Tull en 't Waal'

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden



Inspraakperiode: 7 januari 2019 tot 18 februari 2019

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Afdeling Waterbeheer
Arjan Koerhuis / Luuk Massop

Inhoud

Inhoud	2
Voornemen.....	3
Leeswijzer	3
Deel I – Verbetering waterhuishouding ‘Tull en ’t Waal’	4
1.1 Aanleiding en doel.....	4
1.2 Ligging en begrenzing plangebied	5
1.3 Beschrijving van de gewenste situatie	5
1.4 Beschikbaarheid gronden.....	6
1.5 Locaties en maatregelen	7
1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd	7
1.7 Effecten van het plan.....	7
1.8 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	8
1.9 Legger, beheer en onderhoud	9
1.10 Communicatie.....	9
Deel II - Verantwoording	10
2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	10
2.2 Verantwoording op basis van beleid	10
2.3 Benodigde vergunningen en ontheffingen	11
Deel III - Rechtsbescherming	12
3.1 Procedure	12
Ontwerp-projectplan.....	12
Vaststelling definitieve projectplan	12
Beroep na vaststelling definitieve projectplan.....	12
Voorlopige voorziening.....	12
Nadeelcompensatie	12
Deel IV. – Bijlagen	13

Voornemen

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is voornemens, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet in verband met artikel 4 van de Delegatieregeling HDSR, het voorliggend ontwerp-projectplan ten behoeve van de verbetering van de waterbeheersing in het gebied 'Tull en 't Waal' op het Eiland van Schalkwijk vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit ontwerp-projectplan.

Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het ontwerp-projectplan een beschrijving van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Het ontwerp-projectplan gaat vergezeld van een opsomming van de benodigde vergunningen en meldingen voor de voorgenomen activiteiten op grond van de geldende wettelijke kaders.

Leeswijzer

Het ontwerp-projectplan 'verbetering waterhuishouding Tull en 't Waal' bestaat uit 4 delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV (de bijlagen) bevat een overzichtskaart met dwarsprofielen.

Deel I – Verbetering waterhuishouding ‘Tull en ’t Waal’

1.1 Aanleiding en doel

Aanleiding

Het waterschap wil op het Eiland van Schalkwijk een duurzaam en klimaat-robuust watersysteem voor nu en de toekomst realiseren. Met deze koers als vertrekpunt is het “Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk” opgesteld. Dit plan is op 18 januari 2015 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Na uitvoering van het plan is het watersysteem op orde.

In het plan zijn maatregelen opgenomen om de waterbeheersing op orde te krijgen. Een van de vastgestelde maatregelen is maatregel 28 ‘Osnabrugge – Waalseweg’. Gemaal Waalseweg is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Daarnaast hebben belanghebbenden binnen het gebied wensen ten aanzien van de onttrekking van water en het dempen van watergangen.

Doel

Het waterschap wil, in samenhang en samenspraak met de ontwikkelingen en wensen in het gebied, een duurzame oplossing voor waterknelpunten.

Het nieuwe gemaal wordt nabij het Inundatiekanaal gepositioneerd. Hierdoor kan overtollig water rechtstreeks op de boezem worden uitgemalen en wordt wateroverlast op de Waalsewetering voorkomen. Het gemaal is voldoende groot om, onder extreme omstandigheden, wateroverlast te voorkomen in de gebieden die onder vrij verval lozen op het Inundatiekanaal.

In de Waalsewetering wordt een opvoergemaal geplaatst om het hoger gelegen gebied in droge tijden van water te voorzien.


De primaire watergang wordt deels verlegd. Hierdoor is de vereiste verbreding eenvoudiger en goedkoper te realiseren en neemt de duikerlengte in het primaire tracé aanzienlijk af.

In het plangebied is een onderbemaling aanwezig welke door middel van een stuw kan lozen op het maalpand van het nieuwe gemaal. De onderbemalingsinstallatie kan hierdoor komen te vervallen.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt nabij de Molenbuurt op het Eiland van Schalkwijk in de gemeente Houten. Het deelgebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Waalseweg, aan de westzijde door de Blasenburgseweg, aan de zuidzijde door de Lekdijk en aan de oostzijde door de Lange Uitweg.

Het plangebied is ca. 70 hectare groot.

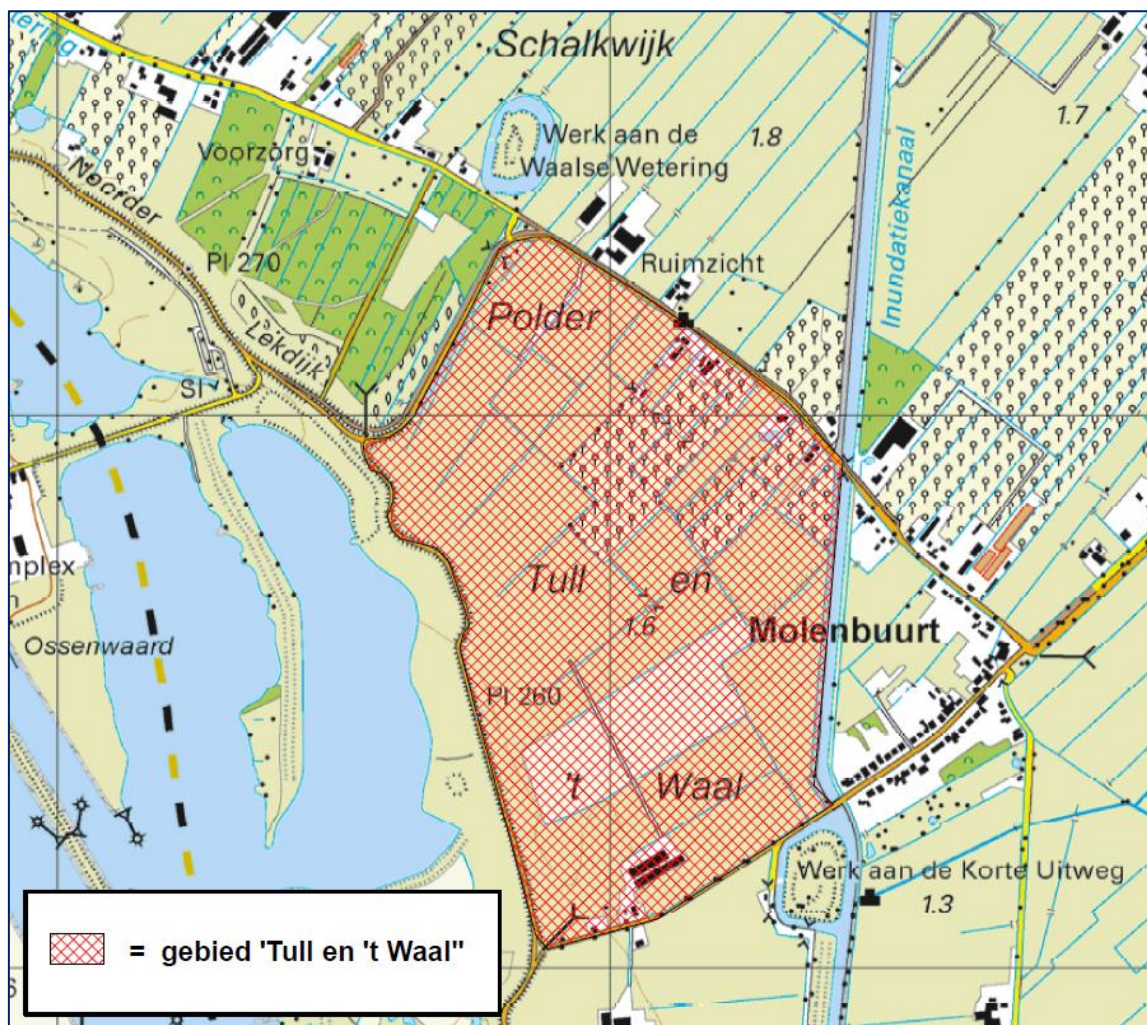

Figuur 1. begrenzing projectgebied 'Tull en 't Waal'

1.3 Beschrijving van de gewenste situatie

Na uitvoering van de werkzaamheden is er een nieuw gemaal nabij het Inundatiekanaal geplaatst. Dit gemaal heeft voldoende capaciteit om waterbezwaar in het gebied Tull en 't Waal te voorkomen. Langs de Waalseweg is een opvoergemaal met geautomatiseerde inlaat geplaatst. Met dit gemaal kan in droge tijden water vanuit het Inundatiekanaal op de Waalsewetering worden gepompt. Met de inlaat kan water vanuit het Inundatiekanaal in het gebied Tull en 't Waal worden ingelaten. In het gebied Tull en 't Waal ligt een primaire watergang met voldoende capaciteit. Alle duikers in het primaire watergang zijn voldoende groot en de primaire watergang is goed bereikbaar voor het onderhoud. De particuliere onderbemaling binnen het gebied wordt opgeheven.

Plaatsen nieuwe gemalen

Nabij het inundatiekanaal en langs de Waalseweg wordt een nieuw gemaal geplaatst. Dit gemaal heeft een capaciteit van 15 m³/min. Het gemaal wordt uitgevoerd met een visvriendelijke en geluidsarme schroefpomp. Het gemaal wordt opgenomen in een betonnen put die onder het maaiveld wordt aangebracht. Op de put wordt een elektrakast geplaatst waarin de elektrische installatie wordt ondergebracht.

Aanbrengen stuw

In het plangebied is een onderbemaling aanwezig. Deze onderbemaling komt te vervallen. Nabij het inundatiekanaal wordt een stuw geplaatst. Via deze stuw kan overtollig water vanuit de (voormalige) onderbemaling worden afgevoerd naar het gemaal.

Verbreden en graven watergangen

De te verbreden primaire watergang krijgt het onderstaande profiel.

- waterdiepte: 0,80 meter,
- bodembreedte 1,0 meter,
- talud: 1 op 1 meter / 1 op 1,5

Dit profiel resulteert in de zomersituatie in een breedte op waterpeil van 2.0 meter.

Vervangen duikers / aanbrengen duikers

In het te verbreden tracé zijn dammen met duikers aanwezig. Deze dammen zijn noodzakelijk voor de ontsluiting van de aangrenzende (agrarische) percelen. Naast het verbreden van de watergang is het noodzakelijk om te kleine duikers te vergroten zodat deze geen belemmering vormen voor de aanvoer van voldoende water. Duikers die constructief niet meer voldoen, volledig onder water liggen of kleiner zijn dan Ø1000 mm worden vervangen. De duikers in het nieuwe tracé verkrijgen een diameter van minimaal Ø1000 mm.

1.4 Beschikbaarheid gronden

Voor het nieuwe tracé wordt overwegend gebruik gemaakt van aanwezige watergangen. Deze watergangen worden verbreed tot het vereiste minimale profiel. De werkzaamheden vinden plaats op de gronden van meerdere eigenaren. Een deel van de vervallen primaire watergang wordt gedempt.

Alle perceeleigenaren en gebruikers zijn persoonlijk benaderd. Het waterschap hanteert het uitgangspunt om de werkzaamheden in goed overleg, op een minnelijke wijze uit te voeren. De eigenaren worden gecompenseerd voor het grondverlies. In een aantal gevallen wordt het eigendom van de vervallen primaire watergang overgedragen aan de aangrenzende eigenaren. De hoogte van de schadeloosstelling wordt vastgesteld door een beëdigd taxateur. Daarnaast zijn rij- en werkstroken nodig om het werk te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt getracht om schade (gewas- en structuurschade en schade aan verhardingen) zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nodig worden rijplaten aangebracht en gewasschade, die niet is te voorkomen, wordt vergoed.

Voor een goed werkend systeem is het van belang dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het waterschap overwegen om de gedoogplicht in te zetten. Bij de gedoogplicht worden gronden niet onteigend, maar moeten eigenaren en gebruikers bepaalde waterbeheeractiviteiten gedogen of dulden. De gedoogplicht is opgenomen in de Waterwet.

1.5 Locaties en maatregelen

De uit te voeren werkzaamheden en de afmeting van de te verbreden watergangen zijn weergegeven in bijlage A.

Uit te voeren werkzaamheden:

- Verwijderen gemaal "Osnabrugge".
- Aanbrengen één afvoergemaal nabij het inundatiekanaal (gemaal Inundatiekanaal).
- Aanbrengen één opvoergemaal in de Waalsewetering (gemaal Waalseweg).
- Aanbrengen één geautomatiseerde inlaat in de Waalsewetering.
- Aanbrengen van een handbediende stuw
- Aanbrengen van één geautomatiseerde stuw nabij gemaal Inundatiekanaal.
- Aanbrengen en vergroten van duikers.
- Aanbrengen van peilscheidingsdammen.
- Aanbrengen van dammen met duikers.
- Graven van watergangen.
- Demping van watergangen.

1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd

Op basis van het inrichtingsplan en de afspraken met de grondeigenaar maakt het waterschap een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer(s) technisch uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen.

Het werk wordt op gronden van derden uitgevoerd. In overleg met de eigenaar worden de werkzaamheden besproken en wordt de beste wijze van uitvoering bepaald. Een belangrijke voorwaarde is dat de waterafvoer gewaarborgd blijft en de negatieve gevolgen voor de natuur zo minimaal mogelijk zijn. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de gevolgen voor de fruitteelt te beperken. Naar verwachting neemt het werk enkele maanden in beslag. De uitvoering zal naar verwachting medio 2019 starten. Het streven is om alle werkzaamheden in 2019 te hebben uitgevoerd.

1.7 Effecten van het plan

1.7.1 Positieve effecten

Waterhuishouding

Na uitvoering van de werkzaamheden is de waterbeheersing in het gebied Tull en 't Waal op orde. De gemalen en inlaten hebben de vereiste capaciteit om voldoende water te kunnen af- en aanvoeren. Hierdoor kunnen de vastgestelde peilen op een adequate wijze worden gehanteerd. Verder is het watersysteem zodanig gedimensioneerd dat op een verantwoorde wijze en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten het onderhoud kan worden uitgevoerd.

Flora en Fauna

Na uitvoering van de werkzaamheden is er per saldo meer oppervlaktewater aanwezig dat als verblijfplaats en migratieroute kan dienen voor de flora en fauna.

1.7.2 Negatieve effecten

Voor de verbreding van de watergangen is grond nodig van de aangrenzende eigenaren. Op één locatie is het noodzakelijk dat hiervoor een rij fruitbomen wordt verwijderd.

1.7.3 Tijdelijke negatieve effecten (tijdens de uitvoering)

Flora en Fauna

Tijdens de uitvoering worden watergangen gegraven en opgeschoond, watergangen gedempt en dammen met duikers en gronddammen aangebracht. Hierdoor worden de aanwezige natuurwaarden verstoord.

Bouwwerkzaamheden / Verkeer en transport

Om de gemalen en stuwen te plaatsen zijn graafwerkzaamheden nodig en worden damwandschermen getrild. De gemalen en stuwen bestaan uit betonnen elementen die worden aangevoerd en met een telekraan worden geplaatst. De watergangen worden verbreed met hydraulische graafmachines en de vrijkomende grond wordt vervoerd door middel van vrachtwagens en/of trekkers met dumpers. Daarnaast worden de duikers in een aantal dammen vergroot en worden gronddammen aangebracht. Deze werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Er wordt gewerkt volgens de wettelijk geldende bepalingen. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden overdag en op werkdagen uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd op de agrarische percelen. Er wordt getracht om deze overlast te beperken door de werkzaamheden af te stemmen met de eigenaar en gebruikers en er getracht om de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het groeiseizoen uit te voeren. Structuurschade wordt voorkomen door rijplaten toe te passen of de schade na afloop te herstellen. Het uitgangspunt is dat de percelen en infrastructuur (toegangspaden, ontsluitingsdammen e.d.) in een goede staat worden opgeleverd.

1.8 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

1.8.1 Beperken nadelige effecten van het plan

Met de eigenaren en gebruikers zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop zijn worden gecompenseerd voor het grondverlies. Deze compensatie geschiedt door een financiële schadeloosstelling, maar ook door het dempen van (delen van) watergangen met de vrijkomende grond, en de overdracht van het kadastraal eigendom van het waterschap.

1.8.2 Beperken nadelige effecten tijdens de uitvoering

Flora en fauna

Zoals gebruikelijk gaan we zorgvuldig om met de natuurwaarde en wordt conform de gedragscode gewerkt. Het is aannemelijk dat binnen het plangebied beschermde soorten aanwezig zijn. Er wordt een natuurtoets uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de aanwezige beschermde soorten die verstoord worden tijdens de uitvoering. Nadat dit bekend is wordt een werkwijze bepaald waarbij de impact op de flora- en fauna zo beperkt mogelijk is. De werkwijze wordt verankerd in een Ecologisch Werkplan waarin wordt voorgeschreven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Als blijkt dat er toch beschermde soorten verstoord worden door de werkzaamheden, wordt een ontheffing van de Natuurbeschermingswet aangevraagd.

Watersysteem

Tijdens de uitvoering worden mogelijk delen van watergangen droog gezet. De tijdspanne is dermate gering dat dit geen significant effect zal hebben op de grondwaterstand. Deze werkzaamheden worden uitgesteld als het droogzetten, door neerslag, wateroverlast tot gevolg heeft.

1.8.3 Beperken financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

1.9 Legger, beheer en onderhoud

Legger

De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de watergangen en kunstwerken als gevolg van dit project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het waterschap. De legger is in het kader van de Waterwet en de Waterschapswet opgesteld. De Legger Oppervlaktewateren bestaat uit kaarten en teksten. In de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van de waterstaatswerken.

Beheer en onderhoud

Door het uitvoeren van de werkzaamheden worden de verplichtingen ten aanzien van het beheer- en onderhoud gewijzigd. Het nieuwe te verbreden tracé krijgt de status 'primaire watergang' en een deel van het huidige primaire stelsel komt te vervallen en krijgt de status 'tertiaire watergang'. Na het gereedkomen van het project wordt het waterschap verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de toekomstige primaire watergangen en de aangrenzende eigenaren worden onderhoudsplichtig voor de watergangen waarvan de primaire status vervalt. De aangrenzende eigenaren zijn (en blijven) verantwoordelijk voor het onderhoud van de scheislotten.

Het waterschap wordt onderhoudsplichtig voor alle peil-regulerende kunstwerken, waaronder de gemalen, stuwen en inlaten.

Een aantal duikers in dammen wordt vergroot. De duikers worden door, en op kosten van het waterschap aangebracht. Hierbij wordt de dam in de originele staat hersteld. Na oplevering van de dam wordt de percee-eigenaar onderhoudsplichtig voor het toekomstig constructief onderhoud. Vanwege de primaire status is/wordt het waterschap onderhoudsplichtig voor het doorstroomprofiel van de duikers.

Na realisatie van de maatregelen in dit plan zullen de gerealiseerde kunstwerken worden ingemeten en opgenomen worden in het beheerregister. De wijzigingen in het watersysteem worden verwerkt in de eerstvolgende leggerwijziging.

Samenwerking / aanvullende wensen

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het eigendom van particulieren. Voor aanvang van de werkzaamheden maken waterschap en aannemer afspraken over het tijdstip en de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als de eigenaren, of andere partijen, aanvullende wensen hebben en dit tijdig kenbaar maken, gaat het waterschap in overleg of deze wensen inpasbaar zijn binnen de kaders van het project. Afspraken over het beheer- en onderhoud zijn hiervoor een randvoorwaarde. Daarnaast moet de kadastrale eigenaar instemmen met de werkzaamheden en moeten afspraken met een belanghebbende partij worden gemaakt over de financiering van de meerkosten.

1.10 Communicatie

Communicatie

De werkzaamheden zijn met alle direct betrokkenen besproken. Voor de betrokkenen en belangstellenden is er op 31 oktober 2018 een informatiebijeenkomst georganiseerd. In het voorgestelde ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van alle betrokkenen. Het waterschap heeft 1 op 1 gesprekken gevoerd met alle direct betrokken partijen/personen om de planvorming persoonlijk toe te lichten.

Het ontwerp-projectplan wordt door het waterschap gepubliceerd, waarna belanghebbenden en derden een reactie (zienswijze) op het ontwerp projectplan kunnen indienen.

Deel II - Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

2.1.1 Toetsing Waterwet

Op grond van artikel 2 Waterschapswet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Toetsing

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

De uitvoeringsmaatregelen zijn erop gericht om het mogelijk te maken dat, in zowel de natuurgebieden als de agrarische gebieden, de optimale waterstanden te kunnen instellen.

- b. chemische en ecologische waterkwaliteit

De werkzaamheden hebben geen negatieve effecten op de waterkwaliteit. In de natuurgebieden zal de waterkwaliteit verbeteren omdat overtollig (zuur) regenwater sneller kan worden afgevoerd.

2.1.2 Verdere regelgeving

Legger

De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de watergangen en kunstwerken als gevolg van dit project worden vastgelegd in de Legger Oppervlaktewateren. De legger bestaat uit kaarten en teksten; in de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van de waterstaatswerken.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

2.2.1 Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan

Op grond van artikel 4.6 Waterwet en artikel 3.1 Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 dient voor watersystemen in het beheergebied een waterbeheerplan te worden opgesteld. De resultaten en maatregelen zijn uitgewerkt in onder andere het raamwaterplan "Eiland van Schalkwijk"

2.2.2 Toets overig beleid

Bestemmingsplan

De werkzaamheden vinden plaats op het grondgebied van de gemeente Houten, binnen het bestemmingsplan Buitengebied en Schonauwenseweg 2013, en binnen de bestemming Agrarisch en de dubbelbestemming waarde. Indien nodig wordt voor de uit te voeren werkzaamheden een Omgevingsvergunning aangevraagd.

2.3 Benodigde vergunningen en ontheffingen

De volgende vergunningen en meldingen zijn van belang:

- Aanvraag Omgevingsvergunning

Deze vergunningen en meldingen doorlopen een aparte procedure. Het waterschap doet de melding of vraagt de vergunning aan bij de desbetreffende bevoegde instantie.



Deel III - Rechtsbescherming

3.1 Procedure

Ontwerp-projectplan

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage van 7 januari 2019 tot 18 februari 2019. Belanghebbenden hebben tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar kunnen maken.

Vaststelling definitieve projectplan

De zienswijzen of inspraakreacties worden in behandeling genomen. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, wordt het projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen worden met de beantwoording gebundeld in een inspraaknota.

Het projectplan wordt samen met de inspraaknota door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden vastgesteld.

Beroep na vaststelling definitieve projectplan

Na vaststelling van het definitieve projectplan door het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het projectplan beroep instellen, conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Hij dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking van het projectplan beroep in te stellen bij de rechtbank. Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 170,- voor een natuurlijk persoon en € 338,- voor een rechtspersoon.

Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder overlegging van een afschrift van dit projectplan. Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Op de vaststelling van dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen beroepsgronden meer worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld.


Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 170,-- voor een natuurlijke persoon en € 338,-- voor een rechtspersoon.

Nadeelcompensatie

Bij schade die het gevolg is van een rechtmatig genomen besluit of rechtmatig feitelijk handelen, kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7.14 Waterwet en de Nadeelcompensatieregeling van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een verzoek tot schadevergoeding indienen. Een belanghebbende komt voor een vergoeding in aanmerking, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste hoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins verzekerd is. Het verzoek tot vergoeding van de schade bevat een motivering en een onderbouwing van de hoogte van de schade.

Deel IV. – Bijlagen

A. Overzichtskaart maatregelen (DM 1469106)

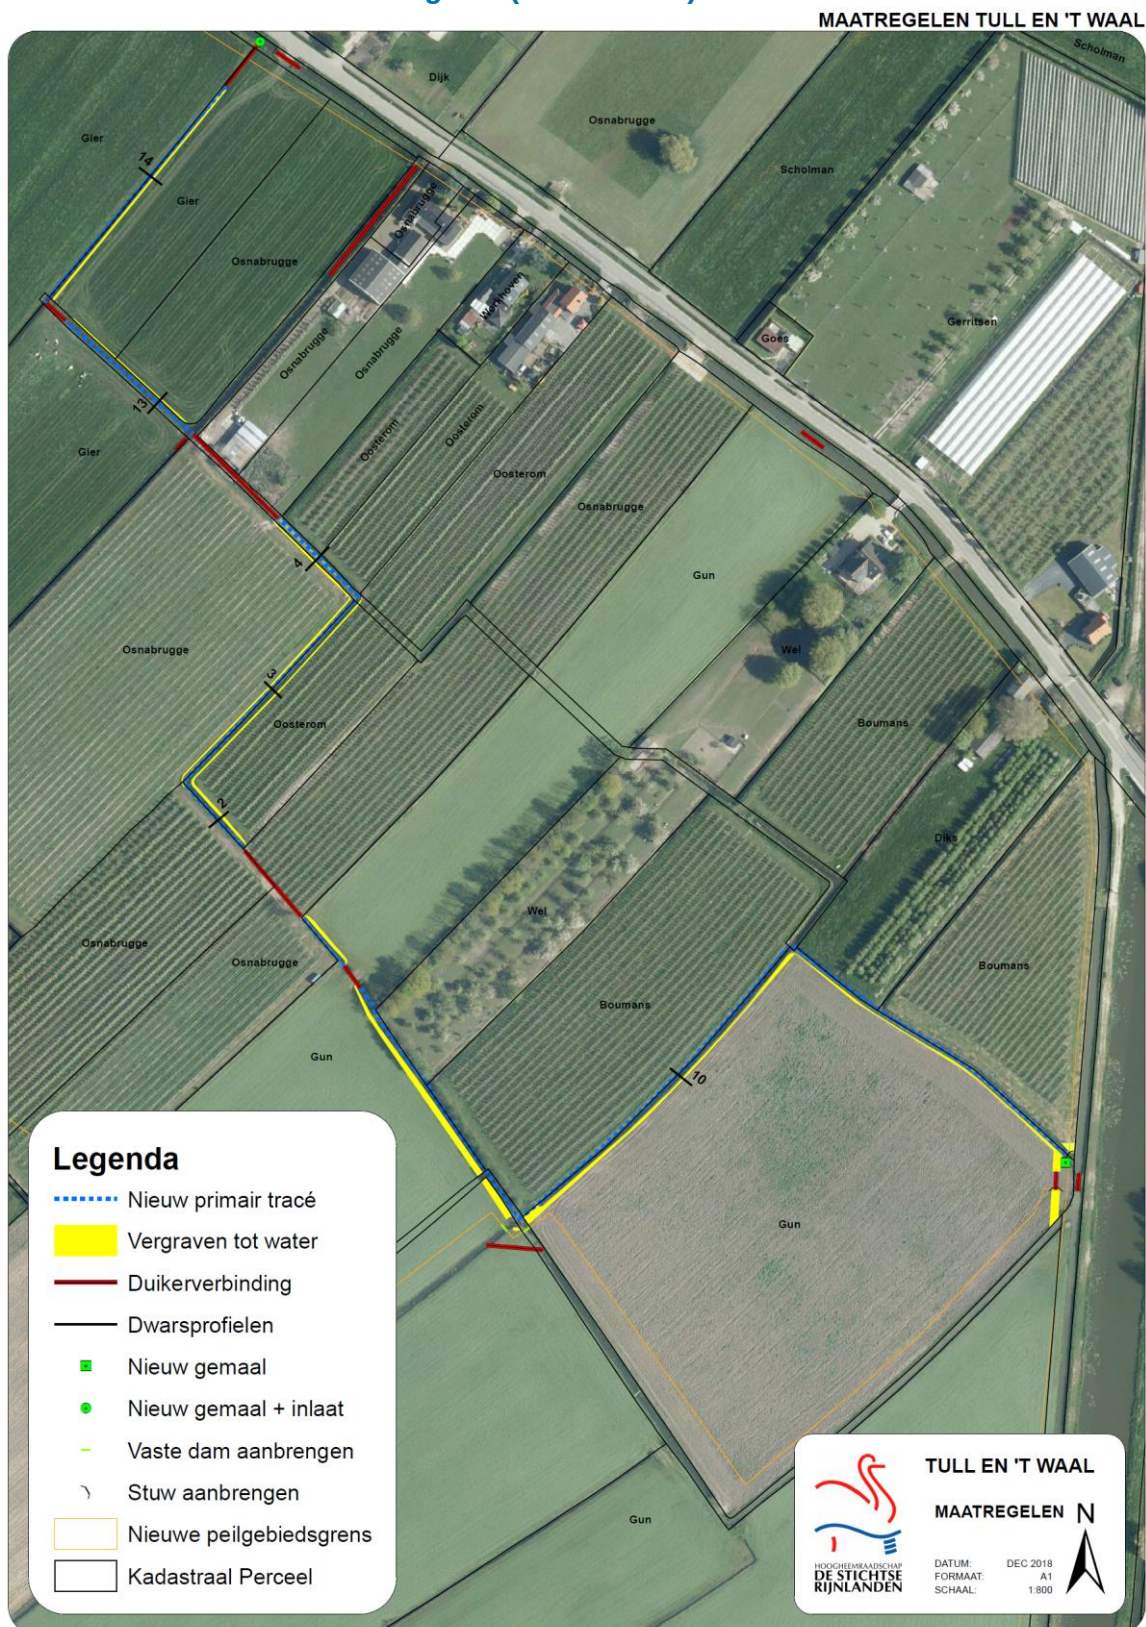

B. Dwarsprofielen (DM 1437501)

