


ONTWERP PROJECTPLAN:

KLIMAAT ROBUUSTE POLDERS: HEMRIKSEIN ZWERVER

Besluit aanleg of wijziging van een Waterstaatswerk: artikel 5.4 Waterwet, in combinatie met het Leggerbesluit:

- artikel 5.1 Waterwet – vastlegging ligging, afmeting, vorm en constructie van de waterstaatswerken
- artikel 78 lid 2 Waterschapswet – toewijzing onderhoud waterstaatswerken

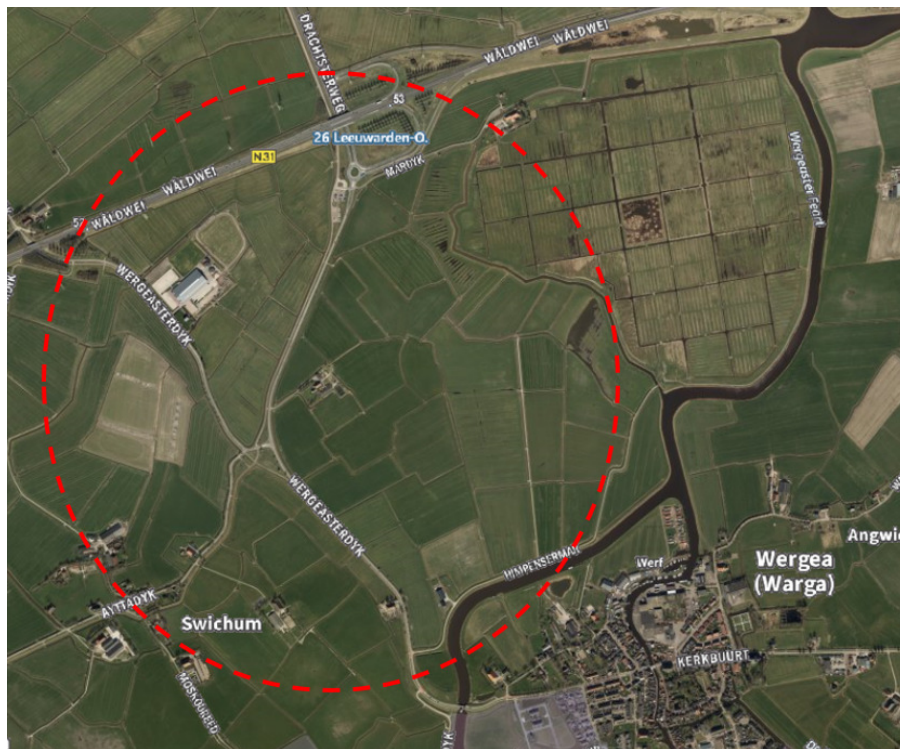

Datum:	19 november 2019
Cluster:	Cluster Projecten
OW nummer:	OW.22801
Projectleider:	Ronald van der Ploeg
Goedkeuring vergunningverlening:	

Inhoud

1. Aanleiding en doel besluitvorming	3
2. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming	3
3. De aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken vast te leggen in de legger.....	4
3.1 Aan te leggen/ te wijzigen waterstaatswerken/Leggerwaarden.....	4
3.2 Te verwijderen waterstaatswerken	8
4. Motivatie, onderbouwing van het besluit	8
5. Benodigde zakelijke rechten	9
6. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan.....	9
6.1. Geïnterpreteerde nadelige gevolgen:	9
6.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.....	9
6.3. Financieel nadeel	10
7. Uitvoering, planning van het werk.....	11
8. Procedure (rechtsbescherming)	11
Bijlage 1 – kaart – Overzicht kadastrale percelen	13
Bijlage 2– tekening – Ligging waterstaatswerken	14
Bijlage 3 – tekening – Dwarsprofielen waterstaatswerken	15
Bijlage 4 – Juridische status Projectplan.....	16

1. Aanleiding en doel besluitvorming

Aanleiding voor dit project zijn de wateropgaven uit het Waterbeheerplan 2016 -2021 en het Watergebiedsplan Âlde Feanen. Het doel van dit project is om via een integrale aanpak in nauw overleg met de streek, te komen tot een duurzamer klimaatrobust ingerichte waterhuishouding in de polder Hemriksein en Zwerver.

In het plangebied Hemriksein Zwerver is concreet sprake van de volgende knelpunten:

- Wateroverlast in polder Hemriksein door een combinatie van afwenteling van wateroverschotten op het direct bemalen peilvak van Hemriksein en een tekort aan waterberging.
- In de gestuwde peilvakken wordt te weinig water vastgehouden door te brede stuwen wat tot overbelasting van het (relatief kleine) direct bemalen peilvak -1,65 m NAP leidt.
- Een weinig robuuste onderbemaling Zwerver die aan renovatie toe is en het wateroverschot (5000 m³/dag) afwentelt op de polder Hemriksein.
- Het gemaal Hemriksein is aan renovatie toe.
- Het huidige peilvak -0,85 m NAP kent veel waterverspilling en wateroverlast in benedenstrooms gelegen gebied. Dit komt door ongecontroleerde afvoer via ongewenste (peilregelende) duikers met bochtstukken, daarnaast is de kerende hoogte van het maaiveld plaatselijk onvoldoende waardoor ongecontroleerde afvoer over maaiveld optreedt.
- De inlaat voor het hoogste huidige peilvak (-0,85 m NAP) bevindt zich op een ongunstig laag gelegen punt wat (bij klimaatverandering) tot meer wateroverlast en waterverspilling leidt.
- De oostelijke bermsloot langs de Drachtsterweg / Wergeasterdyk heeft weinig waterdiepte, er is sprake van overmatige drooglegging en plaatselijk instabiele taluds.
- Plaatselijk is sprake van instabiele taluds langs de hoofdwatgang in het peilvak -1,65 m NAP.
- De bereikbaarheid en staat van onderhoud van enkele kunstwerken is matig.

Hoofddoelstelling

- Een duurzamer klimaat robuust ingerichte waterhuishouding in de polder Hemriksein en polder Zwerver.

Nevendoelstellingen

- Meenemen van door ingelanden ingebrachte water gerelateerde knelpunten en maatregelen om deze op te lossen.

Waarin het plangebied sprake is van peilwijzigingen worden deze tijdelijk vastgelegd via de watervergunning procedure. Deze watervergunning vervalt zodra het revisiepeilbesluit voor dit gebied is vastgesteld.

2. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming

Het Projectplan is als volgt voorbereid:

Op basis van het watergebiedsplan Âlde Feanen en de opgaven die het Wetterskip Fryslân heeft, is er een gebiedsproces opgestart. Binnen dit gebiedsproces hebben veel 1 op 1 gesprekken plaatsgevonden en zijn lokale waterknelpunten benoemd. Er is gezocht naar een "win-win" situatie voor de betrokken partijen en daar waar mogelijk heeft er maatwerk plaatsgevonden. De voorgenomen maatregelen zijn nader uitgewerkt met de betrokkenen (zoals grondeigenaren en pachters). Met de eigenaren is individueel gesproken om het nadelige gevolg, de vermindering van

de gebruiksoppervlakte, financieel te vergoeden. Op basis hiervan zijn overeenkomsten met de eigenaren en pachters afgesloten (zie ook 8.3).

Het waterschap heeft in dit besluit gekozen voor de onder punt 3 genoemde aanleg, wijziging waterstaatswerken, omdat hiermee op de meest optimale wijze een duurzame en klimaat robuuste inrichting van de polders Hemriksein en Zwerver wordt gerealiseerd.

Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zijn de nadelige gevolgen van dit besluit geïnventariseerd. Onder punt 8 wordt uiteengezet hoe deze gevolgen worden voorkomen of beperkt. E.e.a. conform artikel 5.4 lid 2 Waterwet. Zie voor de tekst van genoemd artikel, noot 2.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb ⁽¹⁾).

3. De aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken vast te leggen in de legger

Voor de situering van de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken wordt verwezen naar bijlage 2. Onderstaande nummering van de maatregelen correspondeert met de nummering op de kaart in bijlage 2.

3.1 Aan te leggen/ te wijzigen waterstaatswerken/Leggerwaarden

(1)Hoofdwater OAF-M838- vanaf gemaal Hemriksein naar het zuiden (verbreding)

vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - o bodembreedte (m): 2.20 m
 - o bodemhoogte (m NAP): 2.50-
 - o talud – links en rechts: 1:1.5
- Beschermingszone: 5 meter breed, beide zijden, vanaf de insteek
- Onderhoudsplicht gewoon en buitengewoon
- Onderhoudsplichtige, Wetterskip Fryslân

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 766 m
- breedte (van insteek tot insteek):ca. 8,50 m

(2)Schouwwater 170654, 170825,170656, 211028 – bermsloot Drachtsterweg / Wergeasterdyk (onder profiel brengen)

vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging, zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - o bodembreedte (m): 1.00 m
 - o bodemhoogte (m NAP): 2.70-
 - o talud – links en rechts: 1:1.5
- Beschermingszone: 5 meter breed, beide zijden, vanaf de insteek
- Onderhoudsplicht gewoon en buitengewoon
- Onderhoudsplichtige, eigenaar perceel aan weerszijden van het water, halve breedte

¹ Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 1750 m
- breedte (van insteek tot insteek): ca. 5,00 m

(3) Schouwwater 208337 – vanaf rotonde Hemriksein - Wergeasterfeart (onder profiel brengen)
vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - o bodembreedte (m): 1.20 m
 - o bodemhoogte (m NAP): 2.15-
 - o talud – links en rechts: 1:1.5
- Beschermingszone: 5 meter breed, beide zijden, vanaf de insteek
- Onderhoudsplicht: gewoon en buitengewoon
- Onderhoudsplichtige: eigenaar perceel aan weerszijden van het water, halve breedte

De feitelijk aan te leggen afmetingen zijn:

- totale lengte: 170 m
- breedte (van insteek tot insteek): ca. 5,00 m

(5) Hoofdwater OAF-M1581 – langs Wergeasterdyk (verruimen bocht)

Betreft een plaatselijke aanpassing, de leggerwaarden wijzigen niet.

Inlaten/stuwen

De volgende inlaten en stuwen worden verplaatst, gewijzigd of nieuw aangebracht:

(8) Stuw KST0007950 – (verplaatsen) betreft stuw in bermsloot van noord naar zuidzijde Mardyk
vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - o soort stuw: schotbalkstuw
 - o kruinvorm: rechthoek
 - o kruinbreedte (m): 0,80
 - o minimale kruinhoogte (m NAP): 1.60-
 - o maximale kruinhoogte (m NAP): 1.00-
 - o vispasseerbaar: nee
- Onderhoudsplicht: gewoon en buitengewoon
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân

(9) Stuw – code nog nader in te vullen – (nieuw) betreft stuw in bermsloot langs de Mardyk
vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - o soort stuw: schotbalkstuw
 - o kruinvorm: rechthoek
 - o kruinbreedte (m): 0,40
 - o minimale kruinhoogte (m NAP): 1.40-
 - o maximale kruinhoogte (m NAP): 0.90-
 - o vispasseerbaar: nee
- Onderhoudsplicht: gewoon en buitengewoon
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân

(10) Stuw KST0007912 – (verplaatsen) stuw tussen 1.40- en 1.65- peilvak
vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - o soort stuw: vaste stuw
 - o kruinvorm: rechthoek
 - o kruinbreedte (m): 0,60
 - o minimale kruinhoogte (m NAP): 1.40-
 - o maximale kruinhoogte (m NAP): 1.40-
 - o vispasseerbaar: nee
- Onderhoudsplicht: gewoon en buitengewoon
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân

(11) Stuw KST0007829 – (vervangen) betreft stuw tussen 1.00- en 1.40- peilvak nabij boerderij
vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - o soort stuw: schotbalkstuw
 - o kruinvorm: rechthoek
 - o kruinbreedte (m): 0,60
 - o minimale kruinhoogte (m NAP): 0.90-
 - o maximale kruinhoogte (m NAP): 1.40-
 - o vispasseerbaar: nee
- Onderhoudsplicht: gewoon en buitengewoon
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân

(12) Stuw KST0007830 – (renovatie) betreft stuw tussen 1.40- en 1.65- peilvak
Betreft onderhoud (vervangen damwandschermen) van de stuw, de leggerwaarden wijzigen niet.

(13) Inlaat KDU code nog nader in te vullen – (nieuw) betreft nieuwe inlaat onder Drachtsterweg
t.b.v. polder Hemriksein
vast te leggen in de Legger (leggerwaarden):

- Ligging: zie ligging waterstaatswerken, bijlage 2
- Afmetingen:
 - o peilscheidende duiker? (functie): ja
 - o inlaat functie? (functie): ja
 - o vorm: rond, vierkant of anders: rond
 - o diameter/ breedte (in m): 0,25
 - o hoogte (in m): 0,25
 - o hoogte binnenonderkant bovenstrooms in (m NAP): 0.20-
 - o hoogte binnenonderkant benedenstrooms in (m NAP): 0.50-
 - o materiaal: beton, staal, kunststof (constructie): PVC
 - o Faunapassage: nee
- Onderhoudsplicht: onderhoud doorstroomprofiel + peilregulerend werk / onderhoud (buis)constructie
- Onderhoudsplichtige(n): Wetterskip Fryslân (gewoon onderhoud) / wegbeheerder (buiten gewoon onderhoud).

(Onderhouds)dammen met duikers

In onderstaande tabel staan de (onderhouds-) dammen en duikers weergegeven die worden verplaatst, gewijzigd of nieuw worden aangebracht.

Nummering conform bijlage 2	Leggercode van de onderhoudsdam:	Aanleg/wijziging/ verplaatsing	Betreeft:	Peilscheidende duiker (ja/nee):	Inlaat functie (ja/nee):	Vorm (rond, vierkant of anders):	Diameter/ breedte (m):	Hoogte (m):	Hoogte binnenonderkant bovenstrooms in	Hoogte binnenonderkant benedenstrooms in	Materiaal: (beton, staal, kunststof)	Fauna passage aanwezig (ja/nee):	Onderhoudsplichtige en onderhoudsverplichting	Onderhoudsplichtige en onderhoudsverplichting
18	code n.t.b.	nieuw	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
19	KDU0028857	wijziging	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,30-	1,30-	kunststof	nee	Aangrenzende eigenaar: buitengewoon en	
20	KVD0081237	wijziging	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,30-	1,30-	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
21	KVD0071631	verplaatsing	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
22	KVD0074384	wijziging	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,70-	1,70-	kunststof	nee	Aangrenzende eigenaar: buitengewoon en	
23	code n.t.b.	aanleg	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
24	KVD0065011	verplaatsing	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,95-	1,95-	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
25	KVD0081223	verplaatsing	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,95-	1,95-	kunststof	nee	Aangrenzende eigenaar: buitengewoon en	
26	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,30-	1,30-	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
27	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,30-	1,30-	kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
28	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40			kunststof	nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
29	KVD0071626	verplaatsing	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
30	code n.t.b.	aanleg	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
31	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,30-	1,30-	kunststof	nee	Aangrenzende eigenaar: buitengewoon en	
32	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,70-	1,70-	kunststof	nee	Aangrenzende eigenaar: buitengewoon en	
33	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,70-	1,70-	kunststof	nee	Aangrenzende eigenaar: buitengewoon en	
34	code n.t.b.	aanleg	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
35	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,30-	1,30-	kunststof	nee	eigenaren van percelen die gebruik maken van de dam tbv ontsluiting:	het in goede staat houden van de (buis)constructie en het te allen tijde gangbaar maken van het doorstroomprofiel
36	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,30-	1,30-	kunststof	nee	eigenaren van percelen die gebruik maken van de dam tbv ontsluiting:	het in goede staat houden van de (buis)constructie en het te allen tijde gangbaar maken van het doorstroomprofiel
37	code n.t.b.	aanleg	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
38	code n.t.b.	aanleg	onderhoudsdam met duiker	nee	nee	rond	0,40	0,40	1,30-	1,30-	kunststof	nee	eigenaren van percelen die gebruik maken van de dam tbv ontsluiting:	het in goede staat houden van de (buis)constructie en het te allen tijde gangbaar maken van het doorstroomprofiel
39	code n.t.b.	aanleg	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud
40	code n.t.b.	aanleg	peilscheidingsdam	nee	nee							nee	Wetterskip Fryslân: buitengewoon onderhoud	Aangrenzende eigenaar: gewoon onderhoud

3.2 Te verwijderen waterstaatswerken

De onderstaande waterstaatswerken worden verwijderd en afgevoerd van de Legger:

- (14)Syphon KSY0018828 – betreft onderleider onder te verbreden hoofdwatgang.
- (15)Inlaatduiker KDU0110421 – betreft inlaat onder Drachtsterweg nabij gemaal Zwerver.
- (16)Gemaal KGM0003318 – betreft gemaal Zwerver langs Drachtsterweg.
- (17)Duiker KDU0021015 – betreft duiker nabij Wergeasterweg
-

De onderbemaling Zwerver en gemaal Heriksein worden gerenoveerd. Deze renovatie betreft onderhoud. De waterstaatswerken worden niet gewijzigd qua leggerwaarden. Zie voor de ligging situatiekaart ... Aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen werken

In het project worden de volgende werken (niet zijnde waterstaatswerken) aangelegd, gewijzigd of verwijderd. Benoemd wordt of deze activiteiten op basis van de Keur vergunnings- of meldingsplichtig zijn:

1. Percelen ten noorden van de Drachtsterweg ophogen tot -0,60 m N.A.P. Gehele terrein draineren, grondbewerkingen uitvoeren en inzaaien.
2. Opschonen van watgangen rondom op te hogen perceel ten noorden van Drachtsterweg.
3. Aanbrengen dampalen en hekwerken op dammen langs de Wergeasterdyk.
4. Verbreden kopakkers op perceel langs Wergeasterdyk.
5. Ophogen perceelrand en aanbrengen drain op perceel langs Mardyk.
6. Opschonen watgang 210989 – vanaf Wergeasterdyk tot Ringfeart.
7. Opschonen watgang 171467 – ten noorden van Drachtsterweg.
8. Opschonen watgang 209578 – ten noorden van Drachtsterweg.

Voor de vergunningsplichtige activiteiten geldt op basis van artikel 3.10 Keur een vrijstelling van de Watervergunningsplicht voor het waterschap. Geconcludeerd wordt dat de activiteiten met betrekking tot de werken niet in strijd zijn met de Keur Wetterskip Fryslân 2013.

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.

4. Motivatie, onderbouwing van het besluit

Met dit Projectplan worden de volgende waterhuishoudkundige knelpunten opgelost:

In de huidige situatie is er wateroverlast in polder Hemriksein door een combinatie van afwenteling van wateroverschotten op het direct bemalen peilvak van Hemriksein en een tekort aan waterberging. Door het aanpassen en aanleg van stuwen in de gestuwde peilvakken in polder Hemriksein wordt het water beter vastgehouden waardoor er minder directe belasting is van het (relatief kleine) direct bemalen peilvak -1,65 m NAP. Daarnaast leidt verbreding van de hoofdwatgang in dit peilvak tot meer bergingscapaciteit.

De onderbemaling van polder Zwerver, welke aan renovatie toe is, wentelt het wateroverschot (ca. 5000 m3/dag) af op de polder Hemriksein. Door het ophogen van lage percelen in combinatie met aanpassingen aan het watersysteem kan gemaal Zwerver worden verwijderd.

Het peilvak -0,85 m NAP langs de Drachtsterweg en Wergeasterdyk kent veel waterverspilling en geeft wateroverlast in het benedenstrooms gelegen peilvak door ongecontroleerde afvoer via ongewenste (peilregelende) duikers met bochtstukken. Door het aanpassen van dammen en duikers wordt de afvoer beter gereguleerd en ongewenste afvoer voorkomen.

De inlaat voor het hoogste peilvak (-0,85 m NAP) bevindt zich op een ongunstig laaggelegen punt nabij de Wergeasterfeart wat (bij klimaatverandering) tot meer wateroverlast en waterverspilling leidt. Door verplaatsing van deze inlaat naar de westzijde van het gebied, bij de Wergeasterdyk wordt dit knelpunt opgeheven.

De oostelijke bermsloot van de Drachtsterweg / Wergeasterdyk heeft weinig waterdiepte, er is sprake van overmatige drooglegging en plaatselijk instabiele taluds. Plaatselijk is sprake van instabiele taluds langs de hoofdwatgang in het peilvak -1,65 m NAP. Door verbreding, herprofilering en opschonen van deze watgangen worden deze problemen opgeheven.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee voldoende is gemotiveerd (artikel 3.46 Awb) (²).

5. Benodigde zakelijke rechten

Voor de verbreding van de hoofdwatgang, benoemd onder punt 3 is eigendomsverwerving gewenst. De reden hiervoor is dat het waterschap al eigenaar is van de ondergrond van het hoofdwat. In overleg met de betreffende grondeigenaren wordt hiervoor een koopovereenkomst opgesteld. Voor de andere onder hoofdstuk 3 genoemde waterstaatswerken hoeven geen zakelijke rechten gevestigd te worden.

6. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan

6.1. Geïntervieweerde nadelige gevolgen:

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïntervieweerd, namelijk:

a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering):

- Schade aan lokale Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt uitgevoerd.
- Verkeershinder tijdens de uitvoering van het werk.
- Tijdelijk geen gebruik mogelijk van de te vervangen (onderhouds-)dammen tijdens de uitvoering van het werk.

b. Blijvende nadelige gevolgen:

- Verlies bruikbare agrarische grond als gevolg van de verbreding van de hoofdwatgang.

6.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.

a. Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken:

- Het plaatsen van bebording voor o.a. snelheid beperkingen bij in- en uitritten van het werkterrein, in overleg met de wegbeheerder en eigenaren. Tijdens de uitvoering van het werk wordt gewerkt conform het gestelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.
- Tijdens de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met het gestelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.
- Er wordt tijdig overleg gepleegd met de eigenaren van de aangrenzende percelen waaraan de (schouw)dammen gelegen zijn over het tijdelijk onbruikbaar zijn van de

² Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

(schouw)dammen tijdens uitvoering van het werk.

b. Beperking/voorkoming blijvende nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen als gevolg van dit Projectplan te voorkomen of te beperken:

- Voor zover mogelijk wordt schadeherstel uitgevoerd door Wetterskip Fryslân. Dit vindt plaats bij de aanleg, wijziging waterstaatswerken, genoemd onder punt 4, voor de volgende situaties:

Doordat er land tot water wordt vergraven, zijn er blijvende nadelige gevolgen voor de rechthebbenden (perceeleigenaren en pachters). Het hieruit voortvloeiende nadelig gevolg wordt op basis van het vermelde hieronder (punt 8.3) gecompenseerd.

6.3. Financieel nadeel

(1) Tijdelijk:

- Voor het tijdelijk in gebruik hebben van grond in verband met het gebruik van rij- en werkstroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor gewassen- en mestschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van artikel 7.14 Waterwet / Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) van Wetterskip Fryslân.
- De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan rechthebbenden kenbaar gemaakt.
- Indien nodig wordt de schadevergoeding in de vorm van een besluit bekend gemaakt, waartegen rechtsbescherming openstaat.

(2) Blijvend:

- Ook worden in het kader van het project gronden blijvend in gebruik genomen. Dit is het geval bij de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken benoemd onder punt 3, namelijk: Verbreden hoofdwatergang.
- Het tijdelijk en blijvend (beperkter) gebruik van de gronden zal het waterschap met de gebruikers regelen door middel van een Gebruiksovereenkomst. In de af te sluiten Gebruiksovereenkomst zal ook de vergoeding van schade worden geregeld.
- Het waterschap baseert zich hierbij op haar Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken. Het gaat daarbij om gewassenschadevergoeding, schade in verband met de mestwetgeving en de schade als gevolg van het blijvend in gebruik nemen van grond voor de onder de eerste bullet genoemde waterstaatswerken.

De benodigde hoeveelheid grond voor de verbreding van de hoofdwateren is af te lezen in onderstaande tabel (*).

Voor de kadastrale kaart van het projectgebied wordt verwezen naar bijlage 1.

Kadastraal perceel (nummer)	Oppervlakte perceel (m2)	Benodigd (m2)	Percentage van bedrijfsperceel (%)
HZMooK171	25205	216	0,86%
WRGo4D68	26079	503	1,93%
WRGo4D69	11585	116	1,00%
WRGo4D71	22462	143	0,64%

* Opgemerkt wordt dat in de percentage berekening is uitgegaan van het percentage van het betreffende perceel, en niet van het bedrijfsareaal.

Geconcludeerd wordt dat het gebruik van de grond (de vergraving van het land voor water in verband met de verbreding van de hoofdwateren van zodanig beperkte omvang is, dat dit geen onteigening vergt.

- Voor het overige geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit projectplan en op basis van artikel 3:4 Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit besluit (Projectplan).
- Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij, ondanks de belangenafweging, onevenredige schade hebben geleden als gevolg van dit besluit (Projectplan) dan kunnen zij op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek.

7. Uitvoering, planning van het werk

Het voornemen is om het project uit te voeren vanaf: 1 juli 2020 t/m 31 mei 2021.
De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 – 17.00 uur op werkdagen.

8. Procedure (rechtsbescherming)

Inspraakprocedure

Dit ontwerp-projectplan is door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 19 november 2019. inspraakrijp verklaard.

- Belanghebbenden en ingezetenen van het Beheergebied van Wetterskip Fryslân kunnen een zienswijze (bezwaren/bedenkingen/aanvullingen) indienen tegen het Ontwerp-Projectplan, volgens de procedure vermeld in de bekendmakingsadvertentie. Deze bekendmakingsadvertentie wordt elektronisch gepubliceerd in een Waterschapsblad (overheid.nl).
- Na de inspraakperiode stelt het dagelijks bestuur het Projectplan vast met inachtneming van eventueel binnengekomen zienswijzen. Vervolgens wordt dat besluit ook bekendgemaakt in een Waterschapsblad. Tegen dat besluit staat beroep open bij de rechtbank, sector bestuursrecht en daarna hoger beroep bij de Raad van State.

Het indienen van (hoger) beroep staat uitvoering van het werk niet in de weg. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd).

Op de vaststelling van dit Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank in het beroepsschrift moet worden aangegeven wat de inhoudelijke beroepsgronden zijn (dus geen pro forma beroep).

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 19 november 2019, namens deze,

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,


ir. P.A.E. van Erkelens
Dijkgraaf


O. Bijlsma
Secretaris-directeur

Bijlage 1 – kaart – Overzicht kadastrale percelen

Bijlage 2– tekening – Ligging waterstaatswerken

Bijlage 3 – tekening – Dwarsprofielen waterstaatswerken

Bijlage 4 – Juridische status Projectplan

Definitie

Een Projectplan is een besluit dat een waterschap (als waterbeheerder) vaststelt als dat waterschap waterstaatswerken (3) aanlegt of wijzigt. Het besluit vindt plaats op basis van artikel 5.4 Waterwet (4).

Legger en Algemene wet bestuursrecht

In dit document (Projectplan) is ook het besluit opgenomen voor het vaststellen van de Legger (5), voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken. Deze besluitvorming vindt zijn basis in artikel 5.1 Waterwet (vastlegging waterstaatswerken qua: ligging, afmeting, vorm, constructie) en artikel 78 lid 2 Waterschapswet (toewijzing van de onderhoudsplicht voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken). Het Projectplan is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het besluit vindt een belangenafweging plaats en wordt rechtsbescherming geboden aan belanghebbenden.

Schadebesluiten

In het Projectplan wordt ook beschreven welke nadelige gevolgen rechthebbenden (eigenaren, pachters) en eventueel andere belanghebbenden ondervinden van de besluitvorming. De afhandeling van schade wordt onder punt 8 beschreven. Tegen schadebesluiten die op grond van het Projectplan worden vastgesteld, staat aparte rechtsbescherming open.

Voor de besluitvorming (Projectplan en Legger) is het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bevoegd. Dit is geregeld in het delegatiebesluit Wetterskip Fryslân d.d. 6 juli 2010.

³ Artikel 1.1 Waterwet: waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

⁴ Artikel 5.4 Waterwet:

1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.
2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

⁵ De Legger is een besluit van een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangegeven wordt wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat. Verder wordt in de legger vastgelegd, de ligging, vorm, constructie en afmeting van het waterstaatswerk.
