

**PROJECTPLAN:
NATUURVRIENDELIJKE OEVERS (KRW) DE LINDE**

Besluit aanleg of wijziging van een Waterstaatswerk: artikel 5.4 Waterwet, in combinatie met het Leggerbesluit:

- Artikel 5.1 Waterwet – vastlegging ligging, afmeting, vorm en constructie van de waterstaatswerken
- Artikel 78 lid 2 Waterschapswet – toewijzing onderhoud waterstaatswerken



Datum : 15-05-2020
Cluster : Cluster Projecten
OW-nummer : OW.13803

Projectleider : Libbe Zijlstra

Inhoud

1. Aanleiding en doel besluitvorming	3
2. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming	3
3. Aan te leggen natuurvriendelijke oevers en Leggeraanpassingen	5
3.1 Deeltraject 1 Linde	5
3.2 Deeltraject 2 Linde	8
3.3 Deeltraject 3 Linde	10
3.4 Deeltraject 4 De Linde t.b.v. Het Wijde	12
4. Benodigde zakelijke rechten.....	14
5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan	14
5.1. Geïntariseerde nadelige gevolgen:.....	14
5.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.....	14
5.3. Financieel nadeel	15
6. Uitvoering, planning van het werk.....	15
7. Procedure (rechtsbescherming)	15

Bijlage 1 – Juridische status projectplan

Bijlage 2 – Tekeningen

Bijlage 3 – Beheer en onderhoud

1. Aanleiding en doel besluitvorming

Wetterskip Fryslân heeft zich in het Waterbeheerplan van 2016 – 2021 vastgelegd op de uitvoering van een groot aantal inrichtingsmaatregelen om de ecologische waterkwaliteit binnen haar beheergebied te verbeteren en de waterbergingsmogelijkheden te vergroten.

Op basis van het [Waterbeheerplan 2016-2021](#) Wetterskip Fryslân (verder te noemen: Waterbeheerplan) worden de onder hoofdstuk 3 genoemde waterstaatswerken aangelegd of gewijzigd.

De aanleg en wijziging van de waterstaatswerken bestaat uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs De Linde, het graven van enkele meanders in het rietland grenzend aan De Linde en het aanleggen van een palenrij en KRW-oever op Et Wiede (Het Wijde).

Deze werkzaamheden dragen bij aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteitsdoelen zoals gesteld in het Kader Richtlijn Water. Hiervoor stelt het waterschap een Projectplan vast.

In het Waterbeheerplan, de [KRW beslisnota planperiode 2016 -2021 \(verder te noemen: KRW beslisnota\)](#), en KRW factsheets zijn de stand van zaken, de voortgang en de nog uit te voeren maatregelen expliciet gemaakt.

De KRW beslisnota en de KRW-factsheets zijn door het algemeen bestuur vastgesteld op 29 september 2015.

De KRW-factsheets zijn opgesteld in een format (tabellen) dat landelijk wordt gebruikt. Ze bevatten informatie per waterlichaam (o.a. begrenzing, ecologische en chemische toestand en doelen, maatregelen en onderbouwing). De in de factsheets beschreven uit te voeren maatregelen zijn geen vrijblijvende inrichtingsmaatregelen; ze worden aan de EU gerapporteerd in het kader van de uitvoering van de Kader Richtlijn Water (KRW). Uitvoering van deze maatregelen is wettelijk verplicht. De factsheet voor de KRW Oevers opgenomen is op de volgende locatie te raadplegen:

<https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/Beheer/Data/Publiek?viewName=Factsheets&year=2019&month=December>.

De KRW-opgave voor het verbeteren van de huidige ecologische toestand van de locaties wordt vooral gezocht in maatregelen die te maken hebben met de inrichting en beheer.

KRW-maatregelen zijn aanleg van natuurvriendelijke oevers, inundatiezones en aanpassen van de wijze waarop het onderhoud van de wateren plaatsvindt. Deze maatregelen kunnen worden gecombineerd met het vergroten van de waterberging in de boezem en/of deelsystemen, zoals beschreven in het Waterbeheerplan.

Hoofddoelstelling

- Het verbeteren van de waterkwaliteit door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en meanders.

2. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming

Het Projectplan is als volgt voorbereid:

Op basis van het Waterbeheerplan en de KRW beslisnota hebben er diverse veldbezoeken plaatsgevonden om de haalbaarheid van de aanleg en wijziging van de waterstaatswerken lokaal te toetsen. De locaties waar de haalbaarheid groot is, zijn door de ecologen van Wetterskip Fryslân in samenspraak met terreinbeheerder It Fryske Gea uitgewerkt.

De voorgenomen maatregelen, verwerkt in deze besluitvorming hebben instemming van It Fryske Gea.

In hoofdstuk 3 staat voor de te onderscheiden natuurvriendelijke oevers de besluitvorming over toewijzing van het onderhoud. Vervolgens worden hier, ter uitwerking, nadere afspraken over gemaakt.

Daarnaast is gesproken met de gemeente Weststellingwerf als eigenaar van de aangrenzende percelen en fietsverbinding. De gemeente Weststellingwerf heeft eveneens ingestemd met de voorgenomen besluitvorming.

Het waterschap heeft in dit besluit gekozen voor de onder hoofdstuk 3 genoemde aanleg, wijziging waterstaatswerken, omdat:

- De KRW factsheets hebben aangetoond dat aanleg van meer luwe en ondiepe waterzones nodig is om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en zo te voldoen aan de Kader Richtlijn Water.

Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zijn de nadelige gevolgen van dit besluit geïnterviewd. Onder hoofdstuk 5 wordt uiteengezet wat deze gevolgen zijn en hoe die worden voorkomen of beperkt. E.e.a. conform artikel 5.4 lid 2 Waterwet. Zie voor de tekst van genoemd artikel, bijlage 1, juridische status projectplan.

Voorafgaand zijn ook de nodige onderzoeken uitgevoerd, zoals:

- Flora- en fauna onderzoek;
- Toetsing Natuurwet en een stikstofdepositie (Aerius) berekening;
- Natuur Netwerk Nederland toetsing;
- Onderzoek Niet gesprongen Explosieven;
- Milieukundig grondonderzoek;
- Archeologisch bureau- en booronderzoek;
- Onderzoek naar aanwezige kabels en leidingen.

De resultaten van deze onderzoeken zijn, voor zover nodig, verwerkt in deze besluitvorming.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 AWB ⁽¹⁾).

¹ Artikel 3:2 AWB: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

3. Aan te leggen natuurvriendelijke oevers en Leggeraanpassingen

De aan te leggen of wijzigen waterstaatswerken (natuurvriendelijke oevers, wateren) bevinden zich ten westen van De Blesse en ten noorden van Oldemarkt, gemeente Weststellingwerf.

Het project is onderverdeeld in vier deeltrajecten, weergegeven op onderstaande afbeelding 1. In de volgende paragrafen vindt besluitvorming plaats over aanleg en wijziging van de waterstaatswerken, met bijbehorende leggerwaarden.




Afbeelding 1. Overzicht traject De Linde (bron: ArcGIS)

Deze Leggerwaarden worden opgenomen in de Legger (artikel 5.1 Waterwet ⁽²⁾ en artikel 78 lid 2 Waterschapswet (onderhoudslegger).

3.1 Deeltraject 1 Linde

Op dit traject worden een drietal werkzaamheden uitgevoerd, te weten:

- Aanleg natuurvriendelijke oever langs De Linde (oranje lijn).
- Aanleg meander in rietland (groene arcering).
- Aanleg natuurvriendelijke oever langs afwateringssloot (blauwe lijn).

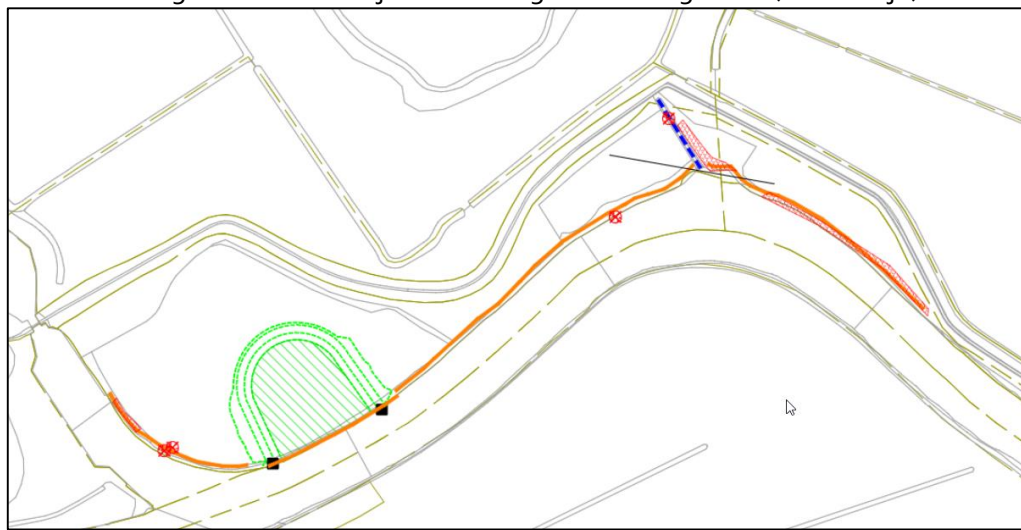

Afbeelding 2 Nieuwe situatie deeltraject 1


² Artikel 5.1 Waterwet (Legger – Waterwet): De Beheerder (waterschap) draagt zorg voor de vaststelling van een Legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar **Ligging, Vorm, Afmeting en Constructie** moeten voldoen. Van de Legger maakt deel uit een overzichtskaart waarop de Ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven.

A. Aan te leggen waterstaatswerken/ Leggerwaarden

a. Natuurvriendelijke oever Linde

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 2 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 600m.
 - o Breedte: 10,00 tot 12,00 m.
 - o Aanlegdiepte: -1,12m NAP.
 - o Talud 1:10.
- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: verwijderen van begroeiingen en afval, herstellen van beschadigingen aan oevers en onderhoud van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies ervan (artikel 2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013).
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de natuurvriendelijke oever voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân, zie bijlage 3.

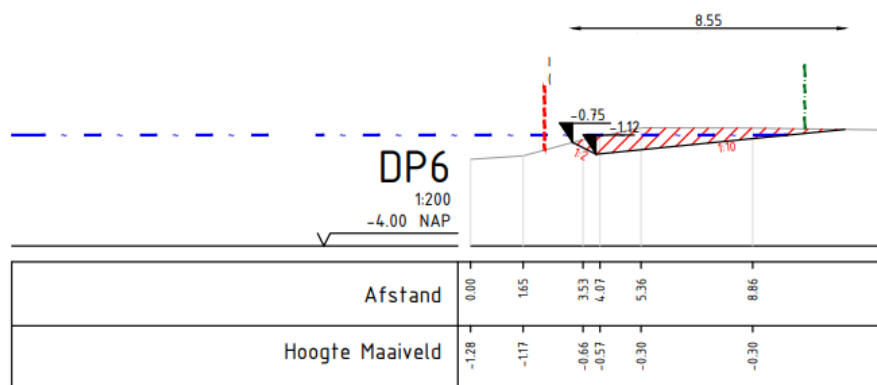


Afbeelding 3 Dwarsprofiel natuurvriendelijke oever Linde deel 1

b. Meander

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden) als waterstaatswerk met de benaming Natuurvriendelijke oever (NVO):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 2 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 350 m
 - o Breedte variabel tussen ca. 12 en 18m.
 - o Aanlegdiepte: -1,12 m NAP
 - o Taluds variabel: 1:3 buitenbocht en 1:10 binnenbocht
 - o Het maaiveld tussen de meander en de Linde wordt afgegraven tot -0,65m NAP.
- Vorm/constructie: rietbegroeiing
- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: verwijderen van begroeiingen en afval, herstellen van beschadigingen aan oevers en onderhoud van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies ervan (artikel 2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013).
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de meander voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: It Fryske Gea, zie bijlage 3.



Afbeelding 4 Dwarsprofiel meander 1


Vast te leggen in het beheerregister

De in- en uitstroomopening van de meanders wordt afgesloten met twee palen en een balk.

c. Natuurvriendelijke oever afwateringssloot (overig water)

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 2 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 55 m.
 - o Breedte: 5,0 m.
 - o Aanlegdiepte: -1,12m NAP.
 - o Talud 1:4.
- Vorm/constructie: rietbegroeiing
- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: verwijderen van begroeiingen en afval, herstellen van beschadigingen aan oevers en onderhoud van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies ervan (artikel 2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013).
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de natuurvriendelijke oever voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân, zie bijlage 3.

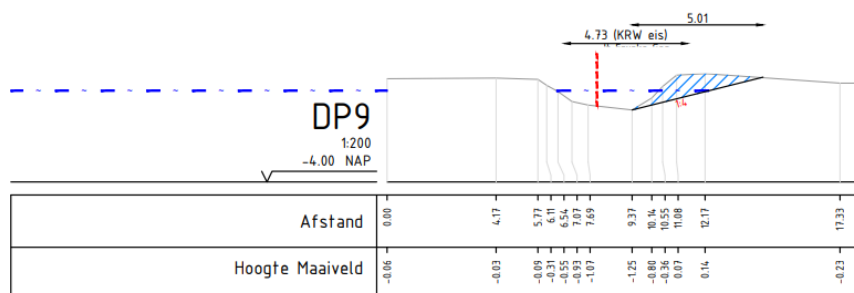


Afbeelding 5 Dwarsprofiel natuurvriendelijke oever afwateringssloot

3.2 Deeltraject 2 Linde

Op dit traject worden een tweetal werkzaamheden uitgevoerd, te weten:

- Aanleg natuurvriendelijke oever (oranje lijn).
- Aanleg meander (groene arcering).

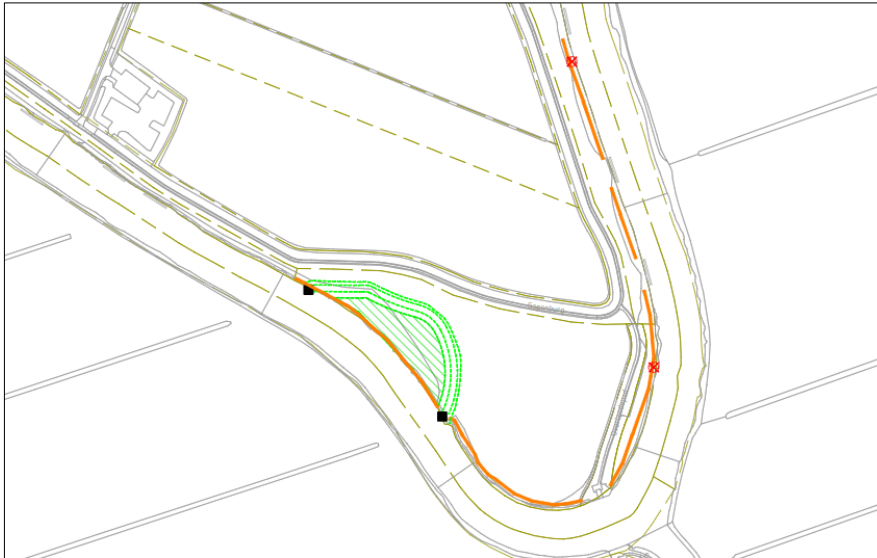


Afbeelding 6 Nieuwe situatie deeltraject 2

A. Aan te leggen waterstaatswerken/ Leggerwaarden

a. Natuurvriendelijke oever Linde

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 6 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 700 m
 - o Breedte: 10,00 tot 12,00m.
 - o Aanlegdiepte: -1,12m NAP.
 - o Talud 1:10.
- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: verwijderen van begroeiingen en afval, herstellen van beschadigingen aan oevers en onderhoud van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies ervan (artikel 2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013).
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de natuurvriendelijke oever voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân, zie bijlage 3.

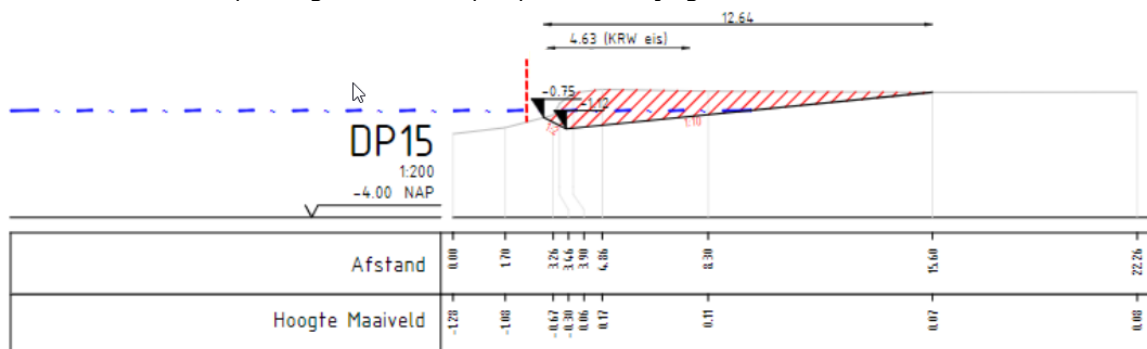


Afbeelding 7 Dwarsprofiel natuurvriendelijke oever Linde deel 2

b. Meander

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden) als waterstaatswerk met de benaming *Natuurvriendelijke oever (NVO)*:

- Ligging, zie afbeelding 1 en 6 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 200 m
 - o Breedte variabel tussen ca. 12 en 18m.
 - o Aanlegdiepte: -1,12 m NAP
 - o Taluds variabel: 1:3 buitenbocht en 1:10 binnenbocht
 - o De in- en uitstroomopening van de meanders wordt afgesloten met twee palen en een balk.
 - o Het maaiveld tussen de meander en de Linde wordt afgegraven tot -0,65m NAP.
- Vorm/constructie: rietbegroeiing
- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: verwijderen van begroeiingen en afval, herstellen van beschadigingen aan oevers en onderhoud van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies ervan (artikel 2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013).
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de meander voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: It Fryske Gea, zie bijlage 3.

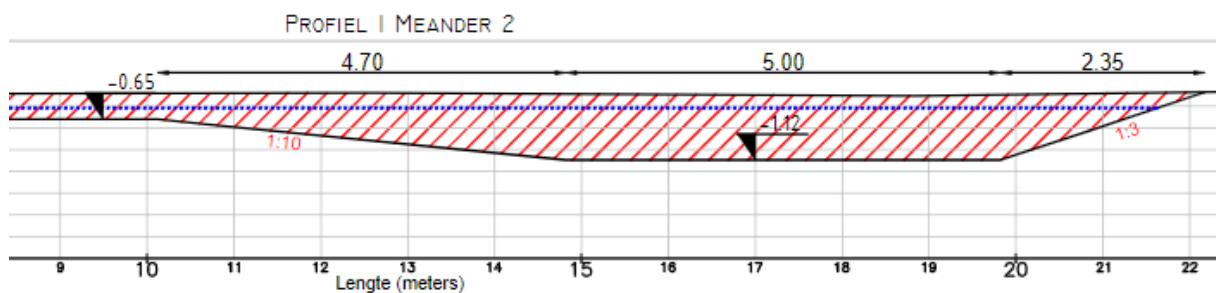

Afbeelding 8 Dwarsprofiel meander 2

3.3 Deeltraject 3 Linde

Op dit traject worden een drietal werkzaamheden uitgevoerd, te weten:

- a. Aanleg natuurvriendelijke oever langs De Linde (oranje lijn).
- b. Aanleg meander (groene arcering).
- c. Aanleg natuurvriendelijke oever langs afwateringssloot (blauwe lijn).




Afbeelding 9 Nieuwe situatie deeltraject 3

A. Aan te leggen waterstaatswerken/ Leggerwaarden

a. Natuurvriendelijke oever Linde

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 9 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 180 m
 - o Breedte: 10,00 tot 12,00m.
 - o Aanlegdiepte: -1,12m NAP.
 - o Talud 1:10.
- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: verwijderen van begroeiingen en afval, herstellen van beschadigingen aan oevers en onderhoud van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies ervan (artikel 2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013).
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de natuurvriendelijke oever voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân, zie bijlage 3.

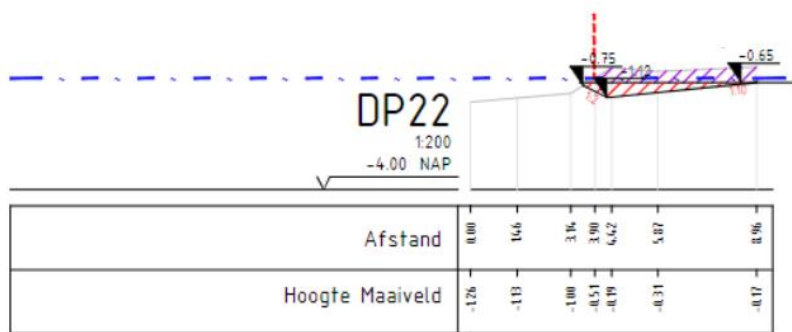


Afbeelding 10 Dwarsprofiel natuurvriendelijke oever Linde deel 3

b. Meander

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden) als waterstaatswerk met de benaming Natuurvriendelijke oever (NVO):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 9 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 200 m
 - o Breedte variabel tussen ca. 12 en 18m.
 - o Aanlegdiepte: -1,12 m NAP, plaatselijk -1,50m NAP.
 - o Taluds variabel: 1:4 buitenbocht en 1:10 binnenbocht
 - o De in- en uitstroomopening van de meanders wordt afgesloten met twee palen en een balk.
- Vorm/constructie: rietbegroeiing
- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: verwijderen van begroeiingen en afval, herstellen van beschadigingen aan oevers en onderhoud van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies ervan (artikel 2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013).
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de meander voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: It Fryske Gea, zie bijlage 3.

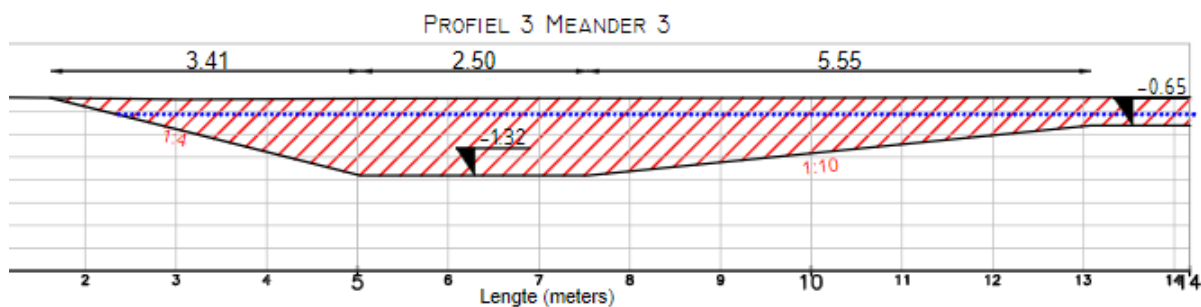


Afbeelding 11 Dwarsprofiel meander 3

c. Natuurvriendelijke oever afwateringssloot (overig water)

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 9 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 35 m.
 - o Breedte: 5,0 m.
 - o Aanlegdiepte: -1,12m NAP.
 - o Taluds 1:5.
- Vorm/constructie: rietbegroeiing

- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: het onderhoud conform het vermelde in het beheer & onderhoudsplan
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de natuurvriendelijke oever voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân, zie bijlage 3.

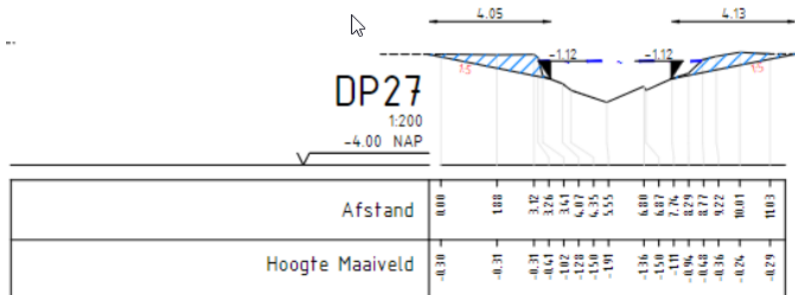


Afbeelding 12 Dwarsprofiel afwateringssloot

3.4 Deeltraject 4 De Linde t.b.v. Het Wijde

Op dit traject worden een tweetal werkzaamheden uitgevoerd, te weten:

- Plaatsen palenrij voor de huidige oever.
- Aanbrengen verondieping achter de palenrij.

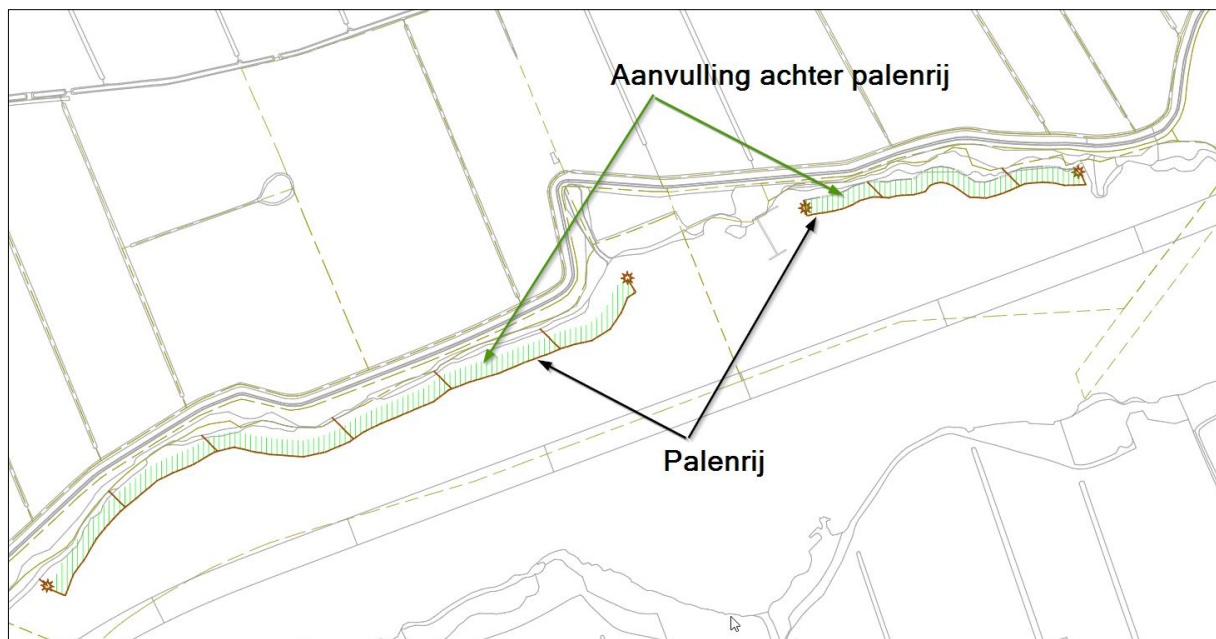


Afbeelding 13 Nieuwe situatie deeltraject 4

a. Palenrij

Vast te leggen in beheerregister (specificaties):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 13 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 900 m
 - o Afstand tot aan oever: ca. 15 m.
 - o Aanleghoogte bovenzijde palen: -0,30 m NAP.
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân, zie bijlage 3.



Afbeelding 14 Dwarsprofiel palenrij met grondaanvulling

b. Natuurvriendelijke oever

Vast te leggen in de legger (leggerwaarden) als waterstaatswerk met de benaming Natuurvriendelijke oever (NVO):

- Ligging, zie afbeelding 1 en 13 en bijlage 2.
- Afmetingen:
 - o Lengte: 900 m
 - o Breedte: ca. 15m.
 - o Aanvulling onder water tot ca. -1,00m NAP (verondieping 20 tot 50cm).
- Onderhoudsplicht:
 - o Gewoon onderhoud: verwijderen van begroeiingen en afval, herstellen van beschadigingen aan oevers en onderhoud van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies ervan (artikel 2.5 Keur Wetterskip Fryslân 2013).
 - o Buitengewoon onderhoud: in stand houden van de natuurvriendelijke oever voor wat betreft: ligging, afmeting vorm/constructie.
- Onderhoudsplichtige: Wetterskip Fryslân, zie bijlage 3.

Motivatie

De maatregel om een natuurvriendelijke oever aan de legger staat beschreven op pag. 18 e.v. van de KRW factsheet, NLO2L10b zie:

<https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/Beheer/Data/Publiek?viewName=Factsheets&year=2019&month=December>

Hiermee wordt invulling gegeven aan doelstelling artikel 2.1 lid 1 c Waterwet, namelijk: bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

De toewijzing van het onderhoud voor de aan te leggen meanders aan It Fryske Gea vindt plaats conform de hierover met hen gemaakte afspraken.

De aanleg en aanvulling achter de palenrij (3.4 Deeltraject 4 Linde) vindt plaats, omdat hiermee een luwe ondiepe zone gecreëerd wordt waar meer kans is voor drijfbladplanten en rietbegroeiing, hetgeen bijdraagt aan een betere waterkwaliteit. Door de windwerking zijn er in de huidige situatie nagenoeg geen waterplanten aanwezig. De verondieping behoeft geen onderhoud, omdat voorzien is dat de verlanding pas op zeer lange termijn plaats gaat vinden, waardoor de aanwijzing van een beheer- en onderhoudsregiem niet van toepassing is.

Voor de meanders is als onderhoudsplichtige It Fryske Gea aangewezen, omdat dit in overeenstemming is met de bestaande beheer- en onderhoudsverplichtingen.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee voldoende is gemotiveerd (artikel 3.46 AWB) (3).

³ Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

4. Benodigde zakelijke rechten

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken benoemd bij punt 4 verandert de eigendomssituatie niet. Alle gronden blijven in eigendom van It Fryske Gea.

Ook is er geen reden andere zakelijke rechten te vestigen. It Fryske Gea stemt er mee in dat de in dit projectplan benoemde natuurvriendelijke oevers op het eigendom van It Fryske Gea worden aangelegd en onderhouden.

5. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan

5.1. *Geïnterpreteerde nadelige gevolgen:*

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïnterpreteerd, namelijk:

a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering):

1. Tijdelijk verlies van leefgebied van de ringslang.
2. Overlast voor vaarverkeer op de Linde als gevolg van de werkzaamheden die vanaf het water uitgevoerd worden.
3. Geluidsoverlast voor recreanten ter plaatse van fietspad en aanlegsteigers. De aanlegsteigers worden tijdens het werk niet buiten gebruik gesteld.
4. Vertroebeling van het water bij aanbrengen verondieping achter de palenrij op deeltraject 4.

b. Blijvende nadelige gevolgen:

1. Afname areaal rietland als gevolg van graven oevers en meanders.
2. Toewijzing onderhoud aan IFG voor de volgende waterstaatswerken: meanders.

5.2. *Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.*

a. Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken:

1. Voor het werk wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin de voorwaarden worden beschreven voor de wijze en het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden. Verder wordt het werk uitgevoerd conform het vermelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen.
2. De werkzaamheden worden buiten het hoogseizoen uitgevoerd, waardoor de negatieve gevolgen op recreatieve vaart beperkt blijven. Alle recreatieve voorzieningen (fietspad, pontje en steigers) blijven in gebruik tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Om geluidsoverlast te beperken worden de werkzaamheden slechts uitgevoerd op werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur.
4. Bij het aanbrengen van de verondieping wordt de grond rustig in het water aangebracht om wervelingen zo veel mogelijk te voorkomen.

b. Beperking/voorkoming blijvende nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen als gevolg van dit Projectplan werk te voorkomen of te beperken:

1. Het nadelig gevolg, vergraven en verlies oppervlak wordt op basis van het vermelde onder (hoofdstuk 5.3) financieel gecompenseerd.
2. Het areaal rietland dat wordt vergraven betreft verdroogd riet, hiervoor komt deels vochtig (waardevol) rietland terug.
3. Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud ter plaatse van de meanders wordt een beheervergoedings overeenkomen met It Fryske Gea.

5.3. Financieel nadeel

Blijvend

- In het kader van het project worden gronden blijvend in gebruik genomen. Dit is het geval bij de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken benoemd onder punt 4, namelijk:
 - aanleg natuurvriendelijke oevers.
 - aanleg meanders.
- Het tijdelijk en blijvend (beperkt) gebruik van de gronden zal het waterschap met de gebruikers regelen door middel van een Gebruiksovereenkomst. In de af te sluiten Gebruiksovereenkomst zal ook de vergoeding van schade worden geregeld.
- De nadelige gevolgen van de afname van het te verpachten areaal wordt met de pachter financieel gecompenseerd.
- Het waterschap baseert zich hierbij op haar Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken. Het gaat daarbij om de schade als gevolg van het blijvend in gebruik nemen van grond voor de onder de eerste bullet genoemde waterstaatswerken.
- Voor het overige geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit projectplan en op basis van artikel 3:4 AWB, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit besluit (Projectplan). In de besluitvorming is geconstateerd dat de (mogelijk) nog aanwezige nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel van dit besluit.
- Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij, ondanks de belangenafweging, onevenredige schade hebben geleden als gevolg van dit besluit (Projectplan) dan kunnen zij op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek.

6. Uitvoering, planning van het werk

Het voornemen is om het project uit te voeren vanaf: augustus 2020 t/m maart 2021. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7:00 – 17:00 uur op werkdagen.

7. Procedure (rechtsbescherming)

Bezwarenprocedure

Rechthebbenden en belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen dit Projectplan, volgens de procedure opgenomen in de bekendmakingsadvertentie. Deze bekendmakingsadvertentie wordt elektronisch gepubliceerd in een Waterschapsblad (overheid.nl).

Na de bezwarenperiode wordt het besluit ook bekendgemaakt in een Waterschapsblad (overheid.nl), eventueel na behandeling van ingediende bezwaren. Tegen dat besluit staat beroep open bij de rechtbank.

Een eventueel ingediend bezwaar of beroep schort de uitvoering van het werk niet op. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd).


Op de vaststelling van dit Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank in het beroepsschrift moet worden aangegeven wat de inhoudelijke beroepsgronden zijn (dus geen pro forma beroep).

Voor eventuele vragen over dit besluit, kan contact opgenomen worden met projectmanager Libbe Zijlstra en voor vragen over de procedure met Anko Greidanus. Beide functionarissen zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 058-292 2222.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 15-05-2020, namens deze,

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Numan'. The signature is stylized with large, overlapping loops and a horizontal line extending to the right.

A. Numan,
Clustermanager projecten

Bijlage 1 - Juridische status Projectplan

Definitie

Een Projectplan is een besluit dat een waterschap (als waterbeheerder) vaststelt als dat waterschap waterstaatswerken (4) aanlegt of wijzigt. Het besluit vindt plaats op basis van artikel 5.4 Waterwet (5).

Legger en Algemene wet bestuursrecht

In dit document (Projectplan) is ook het besluit opgenomen voor het vaststellen van de Legger (6), voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken. Deze besluitvorming vindt zijn basis in artikel 5.1 Waterwet (vastlegging waterstaatswerken qua: ligging, afmeting, vorm, constructie) en artikel 78 lid 2 Waterschapswet (toewijzing van de onderhoudsplicht voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken). Het Projectplan is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (AWB). In het besluit vindt een belangenafweging plaats en wordt rechtsbescherming geboden aan belanghebbenden.

Schadebesluiten

In het Projectplan wordt ook beschreven welke nadelige gevolgen rechthebbenden (eigenaren, pachters) en eventueel andere belanghebbenden ondervinden van de besluitvorming. De afhandeling van schade wordt onder punt 8 beschreven. Tegen schadebesluiten die op grond van het Projectplan worden vastgesteld, staat aparte rechtsbescherming open.

Voor de besluitvorming (Projectplan en Legger) is het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bevoegd. Dit is geregeld in het delegatiebesluit Wetterskip Fryslân d.d. 6 juli 2010.

⁴ Artikel 1.1 Waterwet: waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

⁵ Artikel 5.4 Waterwet:

1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.
2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

⁶ De Legger is een besluit van een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangegeven wordt wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat. Verder wordt in de legger vastgelegd, de ligging, vorm, constructie en afmeting van het waterstaatswerk.
