



Hoogheemraadschap van

Rijnland

Vooroever Reigersbos, Westeinderplassen

projectnummer: DIG-6469

Definitief Projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

Inhoudsopgave

Samenvatting	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1. <i>Inleiding en leeswijzer</i>	3
2. Projectomschrijving (wat gaan we doen)	4
2.1 Aanleiding en doel van het project.....	4
2.2 Wat is een projectplan?.....	4
2.3 Inhoud en omvang van het project	4
2.3.1 Landstuk.....	5
2.3.2 Vooroever	5
2.4 Stakeholders en vergunningen	6
3. Beleidskader (waarom gaan we het doen)	8
4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)	9
4.1 Uitgevoerde onderzoeken	9
4.2 <i>Uitgangspunten</i>	9
4.2.1 <i>Planning</i>	9
4.2.2 <i>Randvoorwaarden</i>	9
4.2.3 <i>Legger</i>	10
4.3 <i>Realisatie</i>	10
4.4 <i>Samenwerking</i>	11
4.5 <i>Graven en dempen</i>	11
4.6 <i>Onderhoud</i>	11
5. <i>Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten</i>	12
5.1 <i>Impact op de omgeving</i>	12
5.2 Beperking nadelige effecten.....	12
5.3 <i>Nadeelcompensatie</i>	12
6. <i>Besluitvormingsprocedure</i>	144
7. Bijlagen	15
7.1 Tekeningen	15
7.2 Tabel met GIS-code.....	16

1. Inleiding en leeswijzer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is verantwoordelijk voor het beheer van watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding en/of de waterkwaliteit kan het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit geval uit het wijzigen van een waterstaatswerk.

In voorliggend projectplan is beschreven wat gaan we doen en waarom we deze werkzaamheden uit gaan voeren (resp. hoofdstuk 2 en 3). Daarna zal beschreven worden hoe we de beoogde werkzaamheden uit gaan voeren (hoofdstuk 4).

In hoofdstuk 5 worden de effecten voor de omgeving beschreven en hoe de besluitvorming tot stand komt (hoofdstuk 6).

De bijlagen volgen in hoofdstuk 7.

2. Projectomschrijving (wat gaan we doen)

2.1 Aanleiding en doel van het project

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Reden voor uitvoering van het project is dat de waterkwaliteit in de Westeinderplassen niet voldoet aan de KRW doelstellingen. Het watersysteem is terechtgekomen in een voedselrijke (eutrofe) toestand waardoor een kritische belasting door eutrofiëring is ontstaan. Door de invoer van veel fosfaatrijk water is er een groot gebrek aan waterplanten; dit heeft tot een slechte kwaliteit van de visstand geleid.

Door de aanleg van een luwe ecologische oeverzone ontstaat ruimte voor een verbetering van de waterkwaliteit. Er ontstaan onder meer betere leefomstandigheden voor de (gewenste) visstand, nutriënten verdwijnen makkelijker uit het water en de oever dient als bufferzone voor uit- en afspoeling van stoffen.

Daarnaast biedt de oeverzone die met planten is begroeid, schuilgelegenheid aan een groot aantal diersoorten en fungeert het als paai- en opgroeigebied voor onder andere vissen, vogels en insecten.

2.2 Wat is een projectplan?

In het kader van dit project is Rijnland van plan om ter plaatse van het eiland 'Reigersbos', welke gelegen is in de Westeinderplassen, een vooroever aan te leggen. Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor deze werkzaamheden een projectplan vastgesteld te worden. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient een projectplan tenminste het volgende te bevatten:

- een beschrijving van het betrokken werk
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd en
- een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Bovenstaande onderdelen worden in de navolgende hoofdstukken besproken.

2.3 Inhoud en omvang van het project

Ter plaatse van de zuidoever van het eiland 'Reigersbos' wordt een vooroever aangelegd om ruimte te creëren voor flora en fauna om zich te ontwikkelen en zo de waterkwaliteit van de Westeinderplassen te verbeteren.

De vooroever bestaat uit een beschermende dam, zodat tussen de dam en het bestaande eiland een verondieping plaats kan vinden. Hier ontstaat een ideale leef- en groeiomgeving voor een diversiteit aan flora en fauna.



2.3.1 Landstuk

Voor de aanleg van de vooroever wordt een luwte gecreëerd middels een beschermende constructie: het zogeheten landstuk. De lengte van het landstuk bedraagt circa 340 meter. Dit betreft een landstuk welke opgebouwd wordt uit wiepen (bijeengebonden bundels wilgenhout). Door de bestorven wiepen kruislings te stapelen en de kruizen te knopen met natuurlijk touw, ontstaat er een raster, welke gevuld wordt met lokaal gewonnen baggerspecie.



2.3.2 Vooroever

De luwtezone tussen het landstuk en het eiland wordt verondiept. Door de verondieping wordt een vooroever gecreëerd met een omvang van ca. 12.500 m².

De resterende waterdiepte varieert van ca. 0,50 tot ca. 1,00 m. Op de grens van het bestaande Reigersbos wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd. In de luwtezone ontstaat ruimte voor plantengroei en de ontwikkeling van de visstand.

In bijlage 7.1 is een overzichtstekening bijgevoegd waarop de beoogde locatie van de vooroever weergegeven is. Eveneens is een dwarsdoorsnede van het ontwerp bijgevoegd.

Onderstaand zijn enkele sfeerbeelden geplaatst van het landstuk ter plaatse van eerdere gerealiseerde projecten. Links een foto direct na afronding van de werkzaamheden, en midden en rechts twee latere foto's nadat het werk goed begroeid is.




2.4 Stakeholders en vergunningen

Stakeholders

De Westeinderplassen zijn grotendeels in eigendom van de gemeente Aalsmeer. Het Reigersbos is kadastraal verdeeld over meerdere eigenaren. In het huidige ontwerp zijn de stakeholders:

- gemeente Aalsmeer
- Staatsbosbeheer
- Stichting De Bovenlanden
- Hoogheemraadschap van Rijnland
- Particuliere eigenaren

De constructie die behoort bij de gekozen maatregel, het toepassen van een landstuk, is onder licentie ontwikkeld door Van Aalsburg B.V. Voor het realiseren van de 'Vooroever Reigersbos' is daarom gekozen om de maatregel in bouwteamverband met Van Aalsburg uit te voeren, waarbij het ontwerp is opgesteld door RWP ingenieurs. Het bouwteam bestaat thans uit:

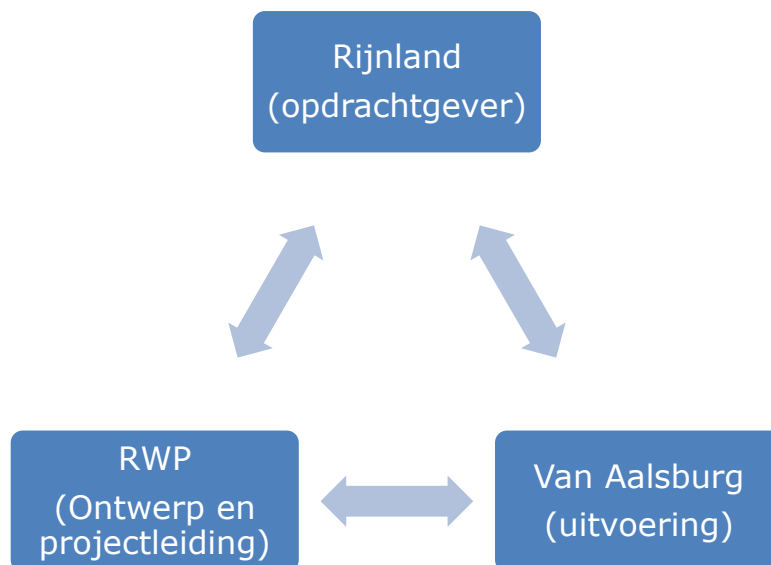

Vergunningen

Het bestemmingsplan voor het gebied Westerplassen wordt opnieuw vastgesteld. Het voorontwerp ligt sinds juni 2020 ter inzage. Conform het bestemmingsplan heeft het gebied de bestemming natuur. Deze bestemming is gebonden aan de volgende regels in relatie tot werken:

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

- het dempen, graven, vergroten of herprofiëren van watergangen en waterpartijen;
- het aanleggen van dammen, dijken of andere taluds, of het vergraven dan wel ontgraven van bestaande dammen, dijken en taluds
- het ontginnen, verlagen van de bodem, afgraven, ophogen of egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;
- het permanent opslaan van goederen.

- het aanbrengen van drainagesystemen, tenzij het de vervanging van een bestaande drainage betreft;
- het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen.

Op basis van bovenstaande informatie dient een Omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

Het plan moet ten behoeve van de ontgrondingsvergunning besproken worden met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Nagegaan moet worden of op basis van het ontwerp en de beoogde werkzaamheden vrijstelling van het aanvragen van een Ontgrondingsvergunning mogelijk is.

3. Beleidskader (waarom gaan we het doen)

In kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) streeft het hoogheemraadschap van Rijnland naar verbetering van de waterkwaliteit van de Westeinderplassen. De waterkwaliteit voldoet niet aan de KRW-doelstellingen. Zowel op het vlak van de fysisch-chemische als de ecologische waterkwaliteit.

In beginsel richt het Hoogheemraadschap zich op het verbeteren van de ecologische kwaliteit. Deze kwaliteit is te verbeteren door op drie verschillende parameters in te zetten, zijnde:

- ecologische kwaliteit - (aanwezige Flora en Fauna)
- fysisch-chemische kwaliteit - (inrichting, temperatuur, zuurgraad, zuurstof etc.)
- overige relevante stoffen - (stoffen die ecosystemen schade toe brengen, maar niet op de lijst prioritaire stoffen staan)

Om de (ecologische) kwaliteiten van de Westeinderplassen te verbeteren heeft het hoogheemraadschap van Rijnland budget ter beschikking gesteld voor het ontwikkelen van maatregelen. Door Rijnland is de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van verbetermaatregelen.

Het project beoogt om met name invulling te geven in de eerste twee parameters. Door de aanleg van de vooroever wordt een impuls gegeven aan een verbetering van de ecologische kwaliteit.

De verwachting is dat ter plaatse van de vooroever door de groei in aantal, en diversiteit van waterplanten en vissen de ecologische balans tussen vissoorten, voedselaanbod en schuilmogelijkheden verbeterd wordt.

Door lokaal te verdiepen ontstaat er ook meer afwisseling in de waterdiepte. Gezien de huidige ecologische toestand van het meer wordt door het realiseren van de lokale verdiepingen voordelen verwacht. Het lokaal creëren van dieper water kan een gunstig effect hebben. Aspecten waar het creëren van deze verdiepingen een positief effect op kan hebben zijn:

- Lichtklimaat: In diepe delen zullen algen en zwevend stof bezinken wat kan bijdragen aan een beter lichtklimaat in het meer.
- Substraat: Door het bezinken van slib in diepe delen zullen op andere locaties minder slib afgezet worden. Dit zorgt voor meer variatie in substraat (weinig slib en veel slib) dit is gunstig voor de biodiversiteit.
- Minder golfwerking: Er is veel golfwerking in de Westeinderplassen. Op diepte is golfwerking minder dit zou gunstig kunnen zijn voor meerdere organismen (mogelijk ook voor visoverwintering enz.).

4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)

4.1 Uitgevoerde onderzoeken

Voor de realisatie van het werk zijn de volgende stappen en/of onderzoeken uitgevoerd. Een aantal onderzoeken zijn thans nog in uitvoering.

Brainstormsessies

In maart en mei 2019 zijn er brainstormsessies gehouden om de verschillende maatregelen te verkennen die mogelijk zijn om de ecologische kwaliteit van het water van de Westeinderplassen te verbeteren. Hierbij is ook middels een rondvaart een verkenning door het gebied gemaakt.

Waterbodemonderzoek

Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd door MHPoly. Doel van het waterbodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van de vooroever en ter plaatse van de locatie waar het opvulmateriaal vandaan moet komen. [*Waterbodemonderzoek Reigersbos in de Westeinderplassen; 20086V1 concept; 20 mei 2020*]

Flora en faunaonderzoek

Ten behoeve van de flora en fauna heeft Bureau Natuurzorg een Quickscan uitgevoerd en een Notitie "verdiepen gebied en effecten op de ecologie Westeinderplassen, Reigerboseiland" opgesteld. Hieruit blijkt dat de uit te voeren werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd mits de Gedragscode Wet natuurbescherming voor Waterschappen, wettelijke verplichtingen zoals de zorgplicht en het op te stellen Ecologisch Werk Protocol uitvoeringsfase (EWPu) worden nageleefd. Dan zijn problemen met het voortbestaan van aanwezige soorten flora en fauna niet te verwachten.

Archeologisch onderzoek

Op basis van Beleidsnota Archeologie Gemeente Aalsmeer van 2016 blijkt dat voor werkzaamheden groter dan 10.000 m² of dieper dan 40 cm een afweging van het archeologisch belang moet plaatsvinden. Hiertoe wordt door ADC een bureaustudie uitgevoerd. Mochten hier zaken uit voortvloeien die invloed hebben op de geplande werkzaamheden wordt het projectplan hierop aangepast.

NGE-onderzoek

Ten aanzien van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) is een gemeentelijke risicokaart opgesteld (*NGE-Risicokaart Aalsmeer; REASeuro; RO-170098 versie 2.0; 20 november 2017*). Hieruit blijkt dat er in het projectgebied geen NGE verwacht worden.

4.2 Uitgangspunten

4.2.1 Planning

De start van de werkzaamheden staan gepland voor september 2020. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in april 2021 afgerond zijn.

4.2.2 Randvoorwaarden


Voor de realisatie van de vooroever dient voorliggend Projectplan in het kader van de Waterwet opgesteld te worden.

Ten aanzien van ecologie dient een EWPu opgesteld te worden. Bij het hanteren van het EWPu en de Gedragscode Wet natuurbescherming van de Waterschappen tijdens de uit-

voering van de werkzaamheden, worden geen nadelige effecten op de aanwezige flora en fauna verwacht.

4.2.3 Legger

De leggerdiepte die voor de plas is vastgesteld betreft een waterdiepte van 2,8 meter. De Westeinderplassen vallen binnen het peilbesluit 'Rijnlandboezem' en heeft een seizoensgebonden, vast peil. Zomers wordt er een zomerpeil van -0,61 m NAP gehanteerd, terwijl er in de winter een winterpeil van -0,64 aangehouden wordt.

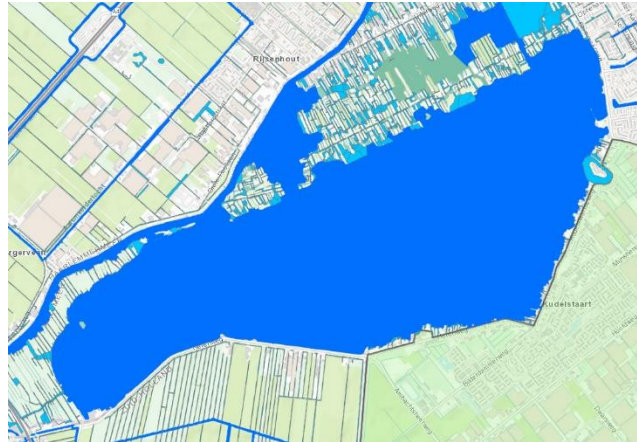

De legger in de Westeinderplassen zal door de aanpassing niet veranderen. Alleen

Ter plaatse van de vooroever, waar een diepte van circa 0,5 tot 1,0 m gerealiseerd zal worden, verandert de diepte van de plas ten opzichte van de legger. Aangezien de vooroever niet bevaarbaar zal zijn, heeft dit geen invloed op de reeds vastgestelde legger.

4.3 Realisatie

Voor de opbouw van het landstuk wordt een werkterrein ingericht op het water door het gebruik van een modulair ponton. De wiepen worden over water aangeleverd, waardoor transportbewegingen over de openbare weg minimaal zullen zijn.

Het baggermateriaal wordt naar alle waarschijnlijkheid eveneens over het water aangevoerd. Hierdoor worden er minimale transportbewegingen van groot materieel over de wegen in de omgeving verwacht.



De werkzaamheden vinden plaats in open water. Er ontstaat geen belemmering van het vaarverkeer door de werkzaamheden. Er is genoeg ruimte in de omgeving om uit te wijken.

Wel dient rekening gehouden te worden met pleziervaart. Eventuele toeschouwers moeten wel uit het werkgebied gehouden worden.

Duurzaamheid

Bij de realisatie van de vooroever is bij zowel de constructie als bij de werkzaamheden zelf gelet op duurzaamheid. Voor het maken van het landstuk worden alleen natuurlijke materialen gebruikt (wilgenhout, sisaltouw, maisdoek). Kunststoffen (geotubes) worden hierbij niet toegepast. Het te gebruiken wilgenhout is FSC-gecertificeerd. Tevens wordt aanvulgrond uit de omgeving gebruikt, waardoor beperkt transport plaatsvindt en er minimaal brandstofgebruik en CO₂-uitstoot is.

Tevens wordt het hele project uitgevoerd met gebruik van 100% biobrandstof. Dit resulteert in een besparing van 89% aan uitstoot van CO₂. Door het CO₂-bewust handelen heeft Van Aalsburg niveau 5 van het handboek CO₂-prestatieladder bereikt.

De certificaten voor de FSC keurmerk en de CO₂-prestatieladder zijn bijgevoegd in bijlage 7.4.

4.4 Samenwerking

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een bouwteam (zie ook paragraaf 2.4). De plas is in eigendom van de gemeente Aalsmeer. Het eiland Reigersbos is kadastraal verdeeld in meerdere eigenaren. Dit betreffen Staatsbosbeheer, de Stichting De Bovenlanden, de gemeente Aalsmeer en particuliere eigenaren. Deze zijn allen in het proces betrokken geweest.

Het hoogheemraadschap van Rijnland treedt op als opdrachtgever binnen het bouwteam.

4.5 Graven en dempen

Voor de realisatie van de vooroever zal 1.029 m² oppervlaktewater gedempt gaan worden. De demping bestaat uit het aanbrengen van het landstuk welke opgevuld wordt met baggerspecie. Het landstuk heeft een lengte van 343 m en een breedte van 3 meter (deze 3 meter betreft de strook van het landstuk dat boven water komt te liggen). In de luwte tussen het landstuk en het eiland wordt het oppervlaktewater verondiept en niet gedempt. Het oppervlak aan verondieping hoeft derhalve ook niet gecompenseerd te worden.

Het verlies aan oppervlaktewater wordt conform het beleid van Rijnland gecompenseerd door het elders graven van open water. Dit water is en wordt gegraven door de Stichting Bovenlanden uit Aalsmeer. Dit water zal gegraven worden alvorens het water gedempt word. De exacte locaties zijn opgenomen in bijlage 7.3. Rijnland heeft een overeenkomst met de stichting om dit water in te zetten als compensatie voor dit werk.

4.6 Onderhoud

Het onderhoud van de vooroever en het landstuk wordt uitgevoerd door Rijnland. Het onderhoud voor de instandhouding van de maatregel bestaat voornamelijk uit maaiwerkzaamheden van het riet.

Daarnaast dient er na een storm geïnspecteerd te worden op mogelijk ontstane schade aan de aangevulde wiepenconstructie. Ook kan er schade aan de wiepenconstructie ontstaan door verkeerd gebruik. Ontstane schade dient hersteld te worden. Om te voorkomen dat in het eerste jaar grond wegspoelt, doordat het riet dan nog niet volgroeid is, zal een golfbreker aangelegd worden.

Om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden goed in beeld te brengen wordt een beheerplan opgesteld voor de eerste twee à drie jaar.

Ter plaatse van de ontgroning is een lokale verdieping van de waterbodem ontstaan van circa 1,5 meter. In principe is hier geen onderhoud noodzakelijk. Door natuurlijke processen zal de verdieping zich geleidelijk gaan vullen met sediment.

5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten

De consequenties en nadelige effecten zijn te verdelen in twee sporen. Het eerste spoor is de maatregel zelf; wat zijn de effecten van de aanleg van de 'vooroever Reigersbos'. Het tweede spoor zijn de werkzaamheden; wat zijn de (tijdelijke) gevolgen door de uitvoering van de werkzaamheden.

5.1 Impact op de omgeving

De visuele impact van de maatregel is minimaal. In de directe nabijheid is geen tot minimaal bebouwing aanwezig met een woonfunctie. Er ontstaat derhalve geen belemmering voor het vrije uitzicht van eigenaren die bewust hebben gekozen voor het wonen bij de Westeinderplassen en het uitzicht over de plassen.

De maatregel heeft ook minimale impact op de recreatievaart. Er is geen directe vaarroute nabij het eiland Reigersbos. Tevens is de breedte van de Westeinderplassen dermate groot dat er geen belemmering ontstaat.

Een risico bij een verdieping/ontgroning in de waterbodem is het mogelijk optreden van extra kwel in de nabijgelegen polders.

Uit het waterbodemonderzoek is gebleken dat de waterbodem ter plaatse van de ontgroning bestaat uit een 1,5 meter dik veenpakket op een kleilaag. Voor de aanvulling van het landstuk en de verondieping van de vooroever wordt het venige materiaal gebruikt. De kleilaag zal hierbij achterblijven. Doordat de kleilaag achterblijft wordt de waterremmende laag niet doorbroken waardoor het toenemen van kwel minimaal wordt geacht. Op basis van deze gegevens wordt als gevolg van de geplande ontgroning dan ook echter geen extra kwel verwacht.

Doordat de uitvoering van het project voornamelijk op het open water plaatsvindt, is er minimale belasting van de openbare ruimte. De meeste transportbewegingen vinden op het water plaats. Hier is voldoende ruimte om een werkgebied te creëren waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder de overige gebruikers van de Westeinderplassen te hinderen.

5.2 Beperking nadelige effecten

Teneinde nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken wordt rekening gehouden met diverse belangen.

- In een vroeg stadium is de uitvoering van het project afgestemd met de gemeente Aalsmeer, Staatsbosbeheer, Stichting De Bovenlanden.
- Schade aan aanwezige beschermde flora en fauna wordt voorkomen door te werken volgens het op te stellen EWPu en de 'gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen' en daarop gebaseerde werkprotocollen van Rijnland. In die werkprotocollen staat hoe in de praktijk moet worden omgegaan met beschermde soorten. Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de uitvoering. Alle daarin beschreven maatregelen zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor beschermde flora en fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig is.
- Gedempt boezemwater/polderwater zal worden gecompenseerd.
- Geohydrologische afsluitende lagen worden niet ontgraven.

5.3 Nadeelcompensatie

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie van dit project staat het eenieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij dijkgraaf en hoogheemraden

een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte procedure in behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek wordt deze beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de geleden schade.

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. Rijnland zal hierbij aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde nadeelcompensatierichtlijnen.

6. Besluitvormingsprocedure

Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is voorbereid door toepassing afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

Het verloop van de procedure op grond van afdeling 3.4 ziet er nu als volgt uit:

Voorafgaand aan het vaststellen van dit definitieve projectplan is eerst een ontwerpprojectplan opgesteld. In het digitale Waterschapsblad (nr. 6679) is dit ontwerp-projectplan op 24 juni 2020 gepubliceerd en belanghebbenden konden gedurende een termijn van een zes weken een zienswijze op het ontwerp-projectplan kenbaar maken bij Rijnland. Er is 1 zienswijze ingediend door een belanghebbende die niet geleid heeft tot aanpassing van het projectplan, zodat dit definitieve projectplan namens dijkgraaf en hoogheemraden ongewijzigd wordt vastgesteld. In par. 6.1 wordt ingegaan op dat wat in de zienswijze naar voren is gebracht.

Na bekendmaking in het Waterschapsblad treedt dit projectplan in werking en kunnen in beginsel alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Projectplannen vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepsschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.

6.1 Zienswijze

Het volgende is naar voren gebracht:

1. Er liggen nog steeds vele tonnen asbestcement en vervuilde bagger, welke destijds na deponeren, door Rijnland zijn opgemerkt, maar waar niets mee is gedaan, alleen een rij paaltjes eromheen gezet zodat de bagger langzaam weg/uitspoelt. Wordt dit met het huidige werk herhaald?

Het werk betreft het aanleggen van een ondiepe zone tegen het Reigersbos aan. Dit wordt aangelegd met grond uit de Westeinderplassen die voldoet aan de voorwaarden uit Besluit Bodemkwaliteit voor toepassing op deze locatie.

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerp-projectplan

2. De overheid wil toch niet dat vuile grond zich met schone grond vermengt?

De afscheiding tussen het Reigersbos en de vooroever blijft bestaan waardoor geen vermenging tussen het Reigersbos en de vooroever kan optreden.

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerp-projectplan

3. Het werk leidt tot het verdwijnen van Reigersnesten in het Reigersbos.

Het werk vindt plaats buiten het Reigersbos en binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet. Daarmee wordt verstoring van broedende vogels voorkomen.

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerp-projectplan

4. Ondiepte trekt ganzen(poep) aan en bij geringe doorstroming bij overmatige plantengroei ontstaat er met warmer weer sneller blauwalg.

Onderdeel van het plan is voor voldoende doorstroming te zorgen door de aanleg van enkele duikers. Daarnaast zal het gebied op een dusdanige manier onderhouden worden dat de ondiepe zone zal dichtgroeien/verlanden waardoor doorstroming niet meer mogelijk is. De wiependam zal ingepland worden met riet met ganzen werende maatregelen totdat het riet ontoegankelijk is geworden voor ganzen.

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerp-projectplan

7. Bijlagen

7.1 Tekeningen

Deze bijlage omvat de volgende tekeningen:

- Tekening locatie legakker
- Tekening dwarsdoorsnede

7.2 Tabel met GIS-code

Object	GIS-code
Westeinderplassen - Grote Poel	458-058-01238

7.3 Gegevens compensatie oppervlaktewater

7.4 Certificaten
