



Projectplan Waterwet

Vervangen en repareren
stuwen en inlaten
district Noord-Oost 2020

14 oktober 2020

auteur

Ronald Koers

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

datum vrijgave

beschrijving revisie 1

--	--	--	--



Inhoud

1	Vervangen en repareren stuwen en inlaten district Noord-Oost 2020.....	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken	3
1.3.1	<i>KST193 – Driekarspelstuw</i>	<i>3</i>
1.3.2	<i>KST309 – Menkeweesterstuw</i>	<i>3</i>
1.3.3	<i>KST421 – Roodzantstuw</i>	<i>3</i>
1.3.4	<i>KST161 – Waterleuzenstuw</i>	<i>3</i>
1.3.5	<i>KST001 – Garsthuisterstuw</i>	<i>3</i>
1.3.6	<i>INL203 – Meervogelinlaat</i>	<i>3</i>
1.3.7	<i>INL117 – Oosterwijdwerdermaarinlaat</i>	<i>3</i>
1.3.8	<i>INL238 – Vismaarinlaat</i>	<i>3</i>
1.4	Beschikbaarheid gronden.....	4
1.5	Effecten van het plan	4
1.6	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	4
1.7	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	4
1.7.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>4</i>
1.7.3	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>4</i>
1.8	Legger en beheer en onderhoud	4
1.8.1	<i>Legger</i>	<i>4</i>
1.8.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.9	Samenwerking	4
2	Verantwoording	5
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	5
2.2	Verantwoording op basis van beleid	5
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project	5
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen	5
3	Bevoegdheid en gevolgde procedure.....	6
3.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	6
3.2	Procedure	6
4	Rechtsbescherming	7


1 Vervangen en repareren stuwen en inlaten district Noord-Oost 2020

1.1 Aanleiding en doel

In het jaar 2020 zijn in district Noord-Oost een aantal kunstwerken (deels) vervangen of gerepareerd. Reden hiervoor is vaak dat de oude kunstwerken verrot waren of niet meer naar wens te bedienen waren. In dit projectplan een opsomming van alle gedane aanpassingen zodat dit allen kan worden opgenomen in het beheerregister en andere systemen.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Alle hier genoemde kunstwerken bevinden zich in district Noord-Oost

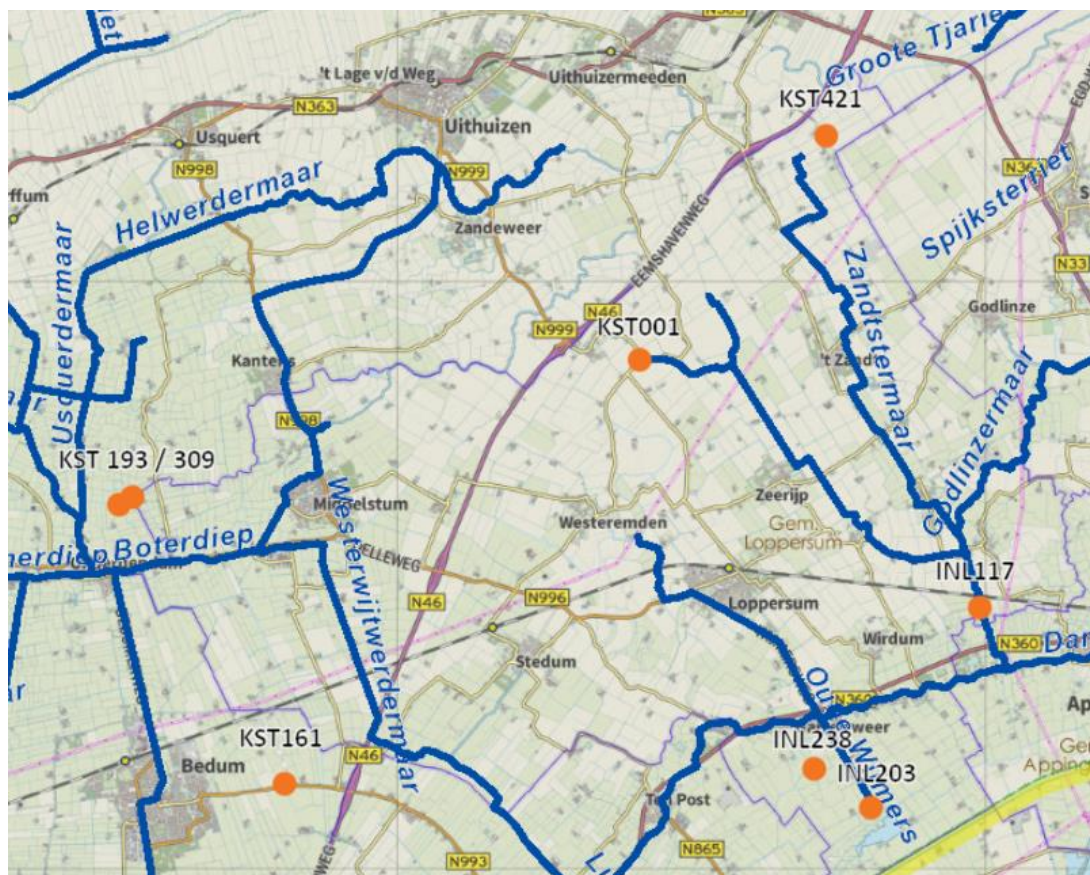

1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

Hieronder een opsomming van de kunstwerken met een omschrijving wat er is gebeurd:

1.3.1 **KST193 – Driekarspelstuw**

Bij deze stuw is de houten damwand aan weerszijden van de stuw vervangen. Het stuwend kunstwerk is in stand gebleven en ook niet van positie veranderd. De bestaande leuning is teruggeplaatst.

1.3.2 **KST309 – Menkeweesterstuw**

Bij deze stuw is de houten damwand aan weerszijden van de stuw vervangen. Het stuwend kunstwerk is in stand gebleven en ook niet van positie veranderd. De bestaande leuning is teruggeplaatst.

1.3.3 **KST421 – Roodzantstuw**

Bij deze stuw was ook de houten damwand verrot. Aangezien er onder water een stortebed van beton aanwezig was en de stuw dus niet op dezelfde plek kon is ervoor gekozen de nieuwe stuw 2 meter verderop te plaatsen. Er is een nieuwe houten damwand geplaatst en daar is het bestaande kerende kunstwerk weer op gemonteerd. Ook de bestaande trap en bordes met leuning zijn teruggeplaatst.

1.3.4 **KST161 – Waterleuzenstuw**

Bij deze stuw was ook de houten damwand verrot. De oude stuw was voorzien van houten schotbalkjes om de hoogte te regelen. In de praktijk wordt deze stuw niet vaak in hoogte gewijzigd. De stuw is vervangen door een nieuwe houten damwand en daar is een KWT schotbalkstuw met aluminium plakjes in gemonteerd. Breedte van de opening is 1000mm (was voorheen 800mm en is in overleg met OWSB aangepast naar een standaard maat) en het peil is over 500mm op en neer te regelen. Het bestaande bordes met leuning is weer teruggeplaatst.

1.3.5 **KST001 – Garsthuisterstuw**

Bij deze stuw is de houten damwand aan weerszijden van de stuw vervangen. Het stuwend kunstwerk is in stand gebleven en ook niet van positie veranderd.

1.3.6 **INL203 – Meervogelinlaat**

Bij deze inlaat is de bestaande schuif vervangen omdat de oude versleten was en niet meer te bedienen. De inlaat is in de bestaande betonput vervangen door een KWT wandafsluiter met halve maan bediening.

1.3.7 **INL117 – Oosterwijtwerdermaarinlaat**

Bij deze inlaat is de bestaande schuif vervangen omdat de oude versleten was en niet meer te bedienen. De inlaat is in de bestaande betonput vervangen door een KWT wandafsluiter met halve maan bediening.

1.3.8 **INL238 – Vismaarinlaat**

Bij deze inlaat is de bestaande schuif vervangen omdat de oude versleten was en niet meer te bedienen. De inlaat is in de bestaande betonput vervangen door een KWT wandafsluiter met halve maan bediening.

1.4 Beschikbaarheid gronden

Tijdens de werkzaamheden is alles in overleg gegaan met de eventuele grondeigenaren. Deels moesten de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf land van derden en deels kon dit vanaf het bij het waterschap in eigendom zijnde onderhoudspad.

1.5 Effecten van het plan

De effecten van het plan betreffen de optimalisatie en juiste handhaving van de huidige situatie m.b.t. waterkwaliteit, -kwantiteit en water aan- en afvoer, van grote veranderingen is geen sprake. De veranderingen die er zijn (doorstroombreedtes stuwen) zijn in overleg met OWSB en met toestemming van OWSB uitgevoerd.

1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemers. Alles is in overleg gegaan en volgens afspraken uitgevoerd.

1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Als gevolg van de genoemde werkzaamheden mag en zal de waterkwaliteit niet achteruit gaan.

1.7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Door het inventariseren van de objecten op locatie wordt de omgeving in beeld gebracht, dit voorkomt onverwachte aspecten.

Tevens is bij de toegepaste materialen gekozen om niet uitlogende materialen te gebruiken om zodoende de waterkwaliteit niet negatief te beïnvloeden.

1.7.3 Nadeelcompensatie

N.v.t.

1.8 Legger en beheer en onderhoud

1.8.1 Legger

Alle gedane aanpassingen moeten worden opgenomen in het beheerregister van het waterschap Noorderzijlvest.

Bij de actualisering van de legger zal hiervoor genoemde worden opgenomen.

1.8.2 Beheer en onderhoud

Het gewoon- en buitengewoonbeheer en onderhoud van de kunstwerken blijft bij het waterschap Noorderzijlvest, dit is onveranderd.

1.9 Samenwerking

N.v.t.



2 Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Werken worden uitgevoerd binnen de kaders wet en regelgeving geldend voor Waterschap Noorderzijlvest.

De werkzaamheden worden tevens volgens de gedragscode voor Flora en Fauna uitgevoerd.

Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de grondweg en waterbouw geschikt zijn.

2.2 Verantwoording op basis van beleid

Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beleidskader van Waterschap Noorderzijlvest.

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

Er zijn geen andere vergunningen benodigd behalve dit projectplan en de benodigde klicmeldingen



3 Bevoegdheid en gevolgde procedure

3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

3.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.



4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
