

Site Survey rapport

Klant: Waterschap Brabantse Delta
Adres: Sluisweg 27 Heijningen (moerdijk)
Datum: 11-11-2020



361136-R

Algemene projectgegevens:

Naam Klant:	
Icap:	IP-0115235
Bison/BSN-nummer(s):	819785
P-benaming:	Hng-P25
Datum site survey:	11-11-2020
Bedrijfsverzamelgebouw:	Nee
Project is V&G plichtig?*	Nee

*Zie checklist voor aanvang APNB209, waar nodig tijdens site survey zelf aanvullen/controleren

Contactpersonen:

Deelnemers site survey:	Bedrijf/afdeling/functie:	Telefoonnummer:	E-mail:
Contactpersonen klant tijdens uitvoering:	Bedrijf / afdeling / functie:	Telefoonnummer:	E-mail:
Gebouweigenaar:	Bedrijf / afdeling / functie:	Telefoonnummer:	E-mail:

Toegang:

Omschrijving:	Opmerkingen / aanvullende gegevens:
Is er voldoende parkeergelegenheid aanwezig:	Ja
Is het noodzakelijk een parkeerplaats te reserveren:	Nee
Meldingsprocedure:	2 weken voor werkzaamheden
Normale werktijden tijdens installatie:	08:00 t/m 17:00
Procedure bij overwerk tijdens installatie:	Via contactpersoon
Toegangsverlening tijdens installatie:	Via contactpersoon
Bereikbaarheid medewerkers tijdens uitvoering:	Via contactpersoon
Bijzonderheden m.b.t. roken / eten / drinken / restaurant / toilet / EHBO:	Daarvoor bestemde ruimtes / roken buiten

Technische opname:

Omschrijving:	Aantal (meters)
Boringen	Bestaande invoer
Goot plaatsen	N.v.t.
(hard) PVC buis aanbrengen	N.v.t.
Flexbuis	
Totaal lengte MDIC-kabel	Circa 20 meter Patching van Mb4 naar Switch.
Totaal lengte HDPE-buis 16mm 2x4.	Circa 180 meter HDPE16mm 2x4
Aansluitpaneel ruimte?	Serverkast
De MB4 komt in ruimte	Stijgpunt in gebouw waar kast staat
Kabelroute aanwezig? (goten e.d.)	Ja
Kabeldoorvoeren aanwezig?	N.v.t.
Openen/sluiten plafonds	N.v.t.
230VAC aanwezig in klantkast	Ja voldoende
Apparatuur	2x Nieuwe Mb4 1x Nieuwe Switch en VOAP
Brandwerend maken doorvoeringen?	N.v.t.

Technische opname ondergronds:

Omschrijving:	Aantal meters
Gebruik bestaande HDPE buis:	Circa 385 meter HDPE40mm 24x4
Nieuwe HDPE buis:	Circa 110 meter HDPE16mm 2x4 72 meter HDPE40mm 24x4
Graven geul:	Circa 104 meter.
Opbreken / herstel en type bestrating:	Circa 92 meter berm, circa 7 meter klinkers, circa 5 meters tegels
Maken gestuurde boring:	N.V.T
Maken persing:	N.V.T
Diamantboringen:	N.V.T
Thealitgoot:	N.V.T
(hard) PVC buis:	N.V.T
Flexbuis:	xx meter
Totaal lengte MDIC-kabel:	Circa 20 meter
Totaal lengte buitenkabel van gevel tot MB:	Circa 80 meter
Aansluitpaneel komt in ruimte naam:	Serverkast
De MB komt in ruimte:	2x Nieuwe Mb4 stijgpunt naast de kast
Worteldoek benodigd:	N.V.T

Veiligheid & Gezondheid

Omschrijving:	Bijzonderheden
Zijn op de site survey V&G risico's gevonden - Voeg toe aan checklist voor aanvang APNB209 - Neem contact op met V&G engineer om juiste informatie te verzamelen.	
Er moet hier kabel getrokken worden onder de sluis door Er moet valbeveiliging gedragen worden. Er moet ook iemand bij het luik blijven staan voor de veiligheid. Dit moet aan 2 kanten gebeuren	Valbeveiliging en mangatwacht

Overige afspraken met de klant:

Beschrijving van de werkzaamheden

Legwerk:

Leggen HDPE 40 24x4 vanaf las 5016 naar las 5020

Vanaf Las 5019 HDPE 16 2x4 onder de sluis door naar MB4

Blaaswerk:

Van las 1229 naar Mb4 circa 600 meter GVK4 micro inblazen.

Laswerk:

Las 1229 openen en dichtten Gvk4 micro afmonteren in de GCO.

Las 5019 openen en dichtten koppelen HDPE 16mm2x4

Mb4 afmonteren in stijgpunt hoofdgebouw

Voap afmonteren in serverkast hoofdgebouw

Patching van Mb4 naar Voap

LET OP VEILIGHEID

VALBEVEILIGING EN MANGATWACHT

Foto's van zowel boven- als ondergronds: ▲



De invoer zit gelijk links om de hoek bij binnenkomst



Hier zit de invoer





Hier koppeling makken 24x4



Hier zit de invoer



Bij de groene kabel naar binnen **VALBEVEILIGING**



In dit gebouw komt de aansluiting




Luik 2 **VALBEVEILIGING**





VALBEVEILIGING

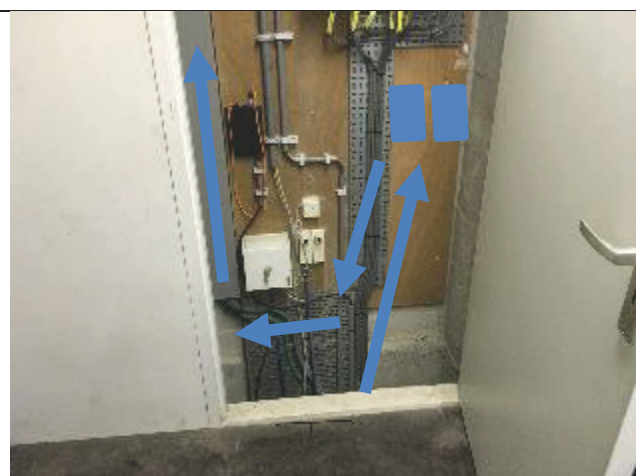



2x MB4 ophangen



Door bestaande goot



Met de trap omhoog

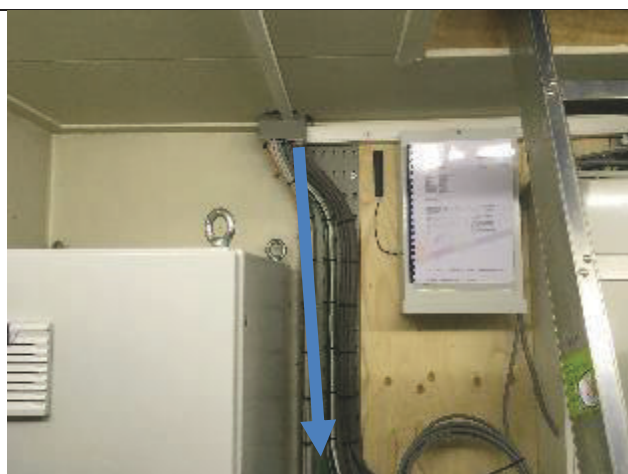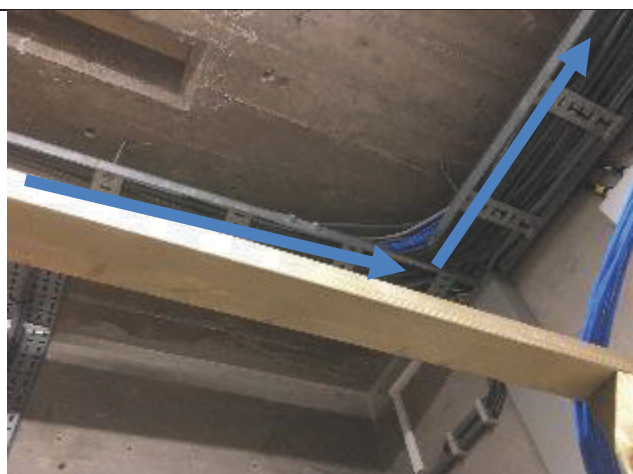

Voap en switch plaatsen



