

datum

23 februari

2021

bemalingsadvies

riolering ontwikkeling stationslocatie Mijldrecht

status : concept

versie : 1

opdrachtgever

Prommenz

t.a.v. W. Timmer

Harmenkaag 11

1741LA Schagen

Adviseur

Loots Grondwatertechniek

ing. Erik Loots

erik@lootsgwt.com

+31 (0) 6 533 92 188

kenmerk

36410220B.1



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Bronvermelding.....	4
3	Uitgangspunten.....	5
3.1	Werkzaamheden	5
3.2	Planning.....	6
3.3	Bodemopbouw.....	7
3.4	Omgeving	8
4	Berekeningsresultaten.....	10
4.1	Verticaal evenwicht, grondbreuk, oppervlaktewater	10
4.2	Debiet bemaling.....	10
4.3	Bemalingssysteem	11
4.4	Effect op grondwater in omgeving	13
5	Conclusie en aanbevelingen	15
5.1	Meldings- en/of vergunningsprocedure	15
5.2	Risico's.....	16
5.3	Monitoring.....	17
5.4	Vervolgstappen.....	19
	Bijlage 1 – Gegevens voor specialisten.....	22
	Bijlage 1.1 – Bodemeigenschappen	23
	Bijlage 1.2 – Grondwaterstand.....	25
	Bijlage 1.3 – Verticaal evenwicht berekeningsresultaten	27
	Bijlage 1.4 – Grondbreuk en oppervlaktewater	29
	Bijlage 1.5 – Debiet, verlaging, verplaatsing grondwater per watervoerende laag en maaiveld daling	30
	Bijlage 1.6 – Analyse (GIS-kaarten) en effect op omgeving.....	36
	Bijlage 1.7 – Risicoanalyse project.....	48
	Bijlage 2 – Gegevens lozingsroute (grondwaterkwaliteit).....	52
	Bijlage 3 – Grondonderzoeken.....	54

1 Inleiding

De opdrachtgever wenst een riolering aan te leggen. De opdrachtgever wenst duidelijkheid op het gebied van grondwater. De opdrachtgever wilt weten welk bemalingssysteem en/of maatregelen noodzakelijk zijn. De opdrachtgever wilt weten welke consequenties dat heeft op de omgeving en welke overheidsnormen van toepassing zijn.

Helderheid op deze punten is van belang, de opdrachtgever wenst een verantwoorde beslissing te nemen over de aanleg van een riolering.

Navigatie bemalingsadvies

Het is mogelijk snel te navigeren door dit rapport. Door op de blauwe tekst te klikken (soms is klikken in combinatie met CTRL knop noodzakelijk). Bijvoorbeeld:

- Door op de tekst in de inhoudsopgave te klikken gaat u direct naar het desbetreffende hoofdstuk.
- Door op de koptekst te klikken gaat u direct naar het desbetreffende onderwerp.

Doel bemalingsadvies

1. [hoofddoel] Noodzakelijk bemalingssysteem bepalen → hoofdstuk 4.3
2. Beoordeling of een vergunning noodzakelijk is → hoofdstuk 5.1
3. Beoordeling of de moeilijkheidsgraad hoog of laag is → hoofdstuk 5.2
4. De risico's bij de bemaling in beeld brengen → hoofdstuk 5.2
5. Monitoring voor risicobeheersing in beeld brengen → hoofdstuk 5.3
6. Vervolgstappen voor een optimaal vervolg → hoofdstuk 5.4
7. Project, bodem, grondwater en omgeving in beeld brengen → hoofdstuk 3 (bijlage 1)
8. Inzicht geven welke parameters/onderzoeken beschikbaar zijn → bijlagen 1 en 3
9. Inzicht geven welke berekeningen zijn uitgevoerd → hoofdstuk 4 (bijlage 1)

Leeswijzer bemalingsadvies

Volgens Loots bereikt het bemalingsadvies het beste zijn doel op het moment dat de opdrachtgever de maatregelen (nut en doel) zo goed begrijpt. We kiezen bewust ervoor zoveel mogelijk jargon en details in de hoofdtekst te voorkomen, dit met als doel de leesbaarheid te verhogen. Met name kennis nemen van hoofdstuk 5 wordt aanbevolen, hierin staan de conclusies en aanbevelingen.

Essentiële specialistische informatie en berekeningen zijn toegevoegd in bijlagen 1 en 2.

Versiebeheer Opmerking

concept 1

Algemene voorwaarden

Op alle, door Loots Grondwatertechniek uitgebrachte adviezen en berekeningen, is de [DNR 2011](#) van toepassing. Niets uit dit drukwerk mag worden veeleenvoudigd, aangepast en/of openbaar gemaakt, in enige vorm op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loots Grondwatertechniek, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

¹ Getest met Adobe Acrobat 2017 en PDF Xchange editor

2 Bronvermelding

Onderstaand een overzicht van de door opdrachtgever aangeleverde en gebruikte gegevens.

1. **SBR.** 273.98 *Leidraad voor het onderzoek naar de invloed van een grondwaterstandsaling op de bebouwing.* Rotterdam : SBR, 1998.
2. —. 190.03 *Bemaling van bouwputten.* Rotterdam : SBR, 2003.
3. **Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu.** Bodemloket. [Online] 2013. <http://www.bodemloket.nl>.
4. **Nederlands Normalisatie-instituut.** NEN 9997-1+C1-2012. Normcommissie 351 006 "Geotechniek". Delft : NEN, 2012. ICS 91.080.01; 93.020.
5. **Dinoloket, Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond.** *Ondergrondgegevens.*
6. **GBO Provincies.** *Grondwaterbescherming en -onttrekking.*
7. **Kadaster.** *Basisregistraties Adressen en Gebouwen.*
8. **Prommenz.** 19054 DO_301 versie 1.1 *tekening rioleringsplan.* 19-1-2021.
9. **ViaMC.** 19001-M01 *beschouwing advies bouwrijp maken.* 8-4-2019.
10. **Milieu, Linge.** *actualisatie waterbodemonderzoek.* 23-3-2018.
11. **Sweco.** 348917 *geotechnisch onderzoek en advies bouwrijp maken.* 22-11-2016.


! Loots Grondwatertechniek staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door derden verstrekte informatie en gegevens.

3 Uitgangspunten

De uitgangspunten van dit project staan in dit hoofdstuk. Uitgangspunten zijn de basis van elk project. Bij foutieve uitgangspunten is het resultaat onnauwkeurig. De uitgangspunten zijn belangrijk, controle is wenselijk omdat uitgangspunten wijzigen in een normaal ontwerpproces.

3.1 Werkzaamheden

In tabel 3.1-A zijn de eigenschappen van het project weergegeven. In figuur 1 is het project met kleur gearceerd. De specialistische informatie kan in bijlage 1 worden gevonden.

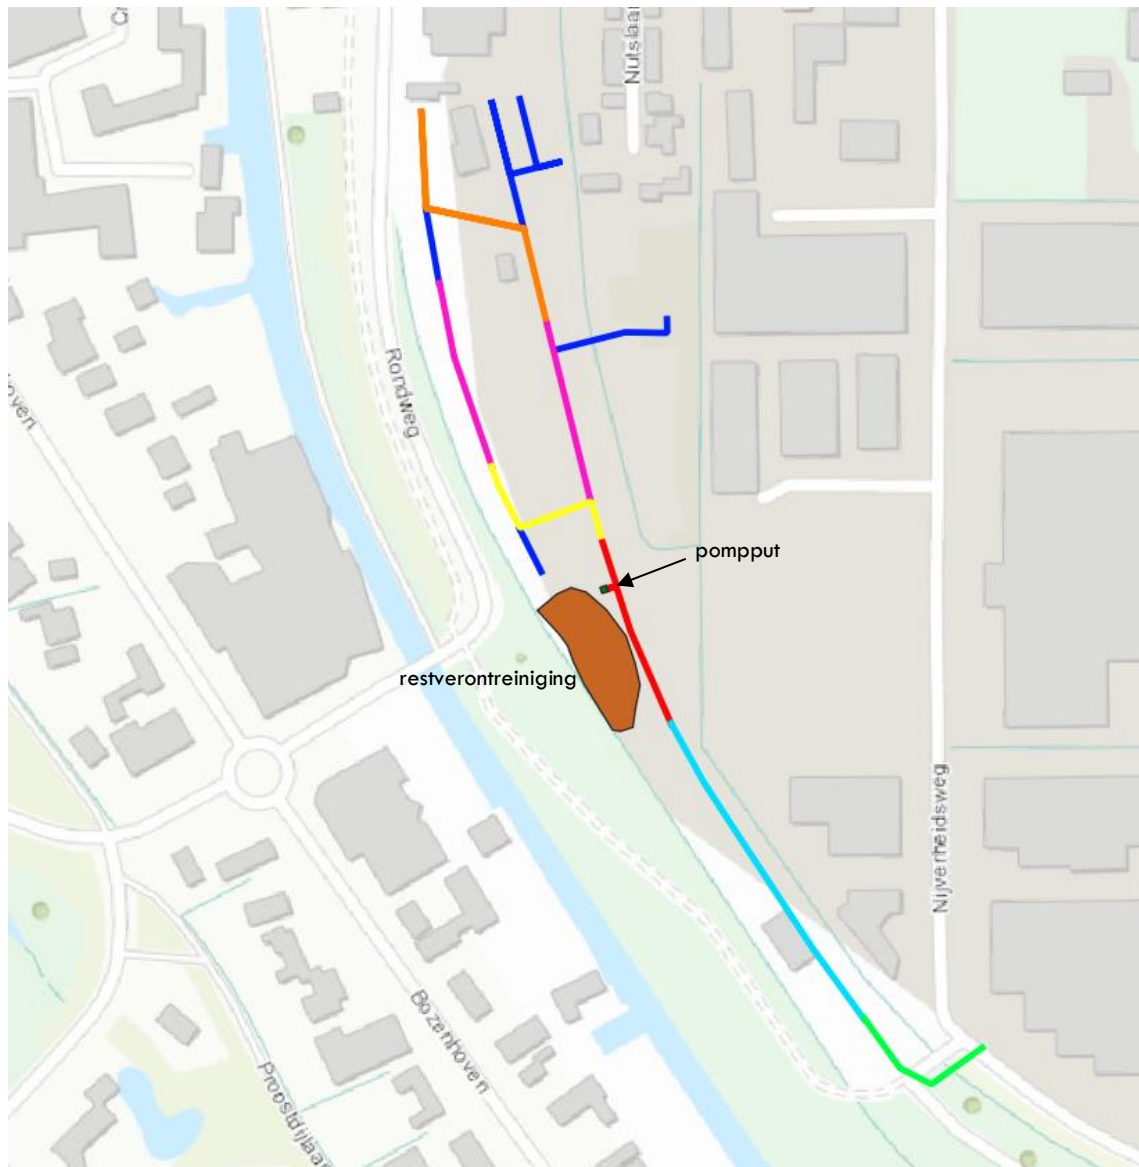

figuur 1 – situatie project

tabel 3.1-A

projecteigenschappen per onderdeel	lengte ^I [m]	breedte [m]	maximale ontgravingsdiepte [m+NAP]	wand ^{III} [m+NAP]	ontwateringsdiepte ^{IV} [m]	kleur in figuur 1
riolering deel 1	5 x 40	0,8	-6,2 (-6,5 ^{II})	sleufbekisting optioneel	0,3	donkerblauw
riolering deel 2	4 x 30	2~2,5	-6,2 (-6,5 ^{II})	sleufbekisting optioneel	0,3	oranje
riolering deel 3	5 x 30	2~2,5	-6,25 (-6,55 ^{II})	sleufbekisting optioneel	0,3	paars
riolering deel 4	2 x 35	2~2,5	-6,45 (-6,75 ^{II})	sleufbekisting optioneel	0,3	geel
riolering deel 5	2 x 40	2~3	-6,65 (-6,95 ^{II})	sleufbekisting verplicht	0,3	rood
pompput	2,5	2,5	-7,65 (-7,95 ^{II})	sleufbekisting optioneel	0,3	donkergroen
riolering deel 6	5 x 30	0,8	-6,44 (-6,74 ^{II})	sleufbekisting optioneel	0,3	lichtblauw
persleiding	60	0,5	-5,55 (-5,85 ^{II})	sleufbekisting optioneel	0,3	lichtgroen

3.2 Planning

In tabel 3.2-A is visueel en tekstueel weergegeven hoe lang de bemaling duurt. Daarnaast is gelijktijdigheid van bemalingen (indien van toepassing) weergegeven. Het aantal vermelde weken (wk) in tabel 3.2-A is het aantal weken na de start van de werkzaamheden (dus geen weeknummers). Voor de bemalingsduur is (soms) een bandbreedte aangehouden (minimale tot maximale duur).

tabel 3.2-A

onderdeel	opstart [dagen]	bemalingsduur [dagen]	wk 1	wk 2	wk 3	wk 4	wk 5	wk 6	wk 7	wk 8	wk 9	wk 10	wk 11	wk 12	wk 13	wk 14	wk 15
riolering deel 1	2	5 x 2~4															
riolering deel 2	2	4 x 2~3															
riolering deel 3	2	5 x 2~3															
riolering deel 4	2	2 x 2~4															
riolering deel 5	2	2 x 2~4															
pompput	2	2~5															
riolering deel 6	2	5 x 2~3															
persleiding	1	1~3															

blauw = opstartperiode bemaling grijs = uitvoeringsperiode werkzaamheden

! De bemalingsduur is altijd een inschatting vooraf, belangrijk is dat de bemalingsduur niet te kort is (waardoor effect op de omgeving onderschat worden).

^I bij een aantal onderdelen is de totale lengte verdeeld in een aantal segmenten, bijvoorbeeld 6 x 75 m (450 m totaal lang), of 6 x 3 à 4 dagen bemaling (18 à 24 dagen totaal)

^{II} hier is extra diepte voor een grondverbetering (optioneel) toegevoegd


^{III} indien een grond(water)kerende constructie wordt toegepast dan is dat in deze kolom weergegeven. Indien er een getal staat, dan is er een waterremmende wand van maaiveld tot en met deze diepte

^{IV} ontwateringsdiepte is de afstand tussen ontgravingsdiepte (exclusief eventuele grondverbetering) [m+NAP] en de gewenste grondwaterstand [m+NAP]

- ! De volgorde van de werkzaamheden kan vaak wel worden afgeweken. Een controle voor eventuele effecten kan echter geen kwaad.
- ! Wanneer onderdelen gelijktijdig uitgevoerd worden (terwijl dit niet het uitgangspunt is in dit rapport), dan moet altijd een controle uitgevoerd worden.
- ! Indien de bemalingsduur veel langer dan noodzakelijk is kan dit resulteren in onnodige extra kosten (zoals monitoring, aanvullende maatregelen, vergunningsplichtig). Het sterk overschatten van de bemalingsduur is niet gewenst.


3.3 Bodemopbouw

In figuur 2 is een schematisering van de bodem weergegeven.

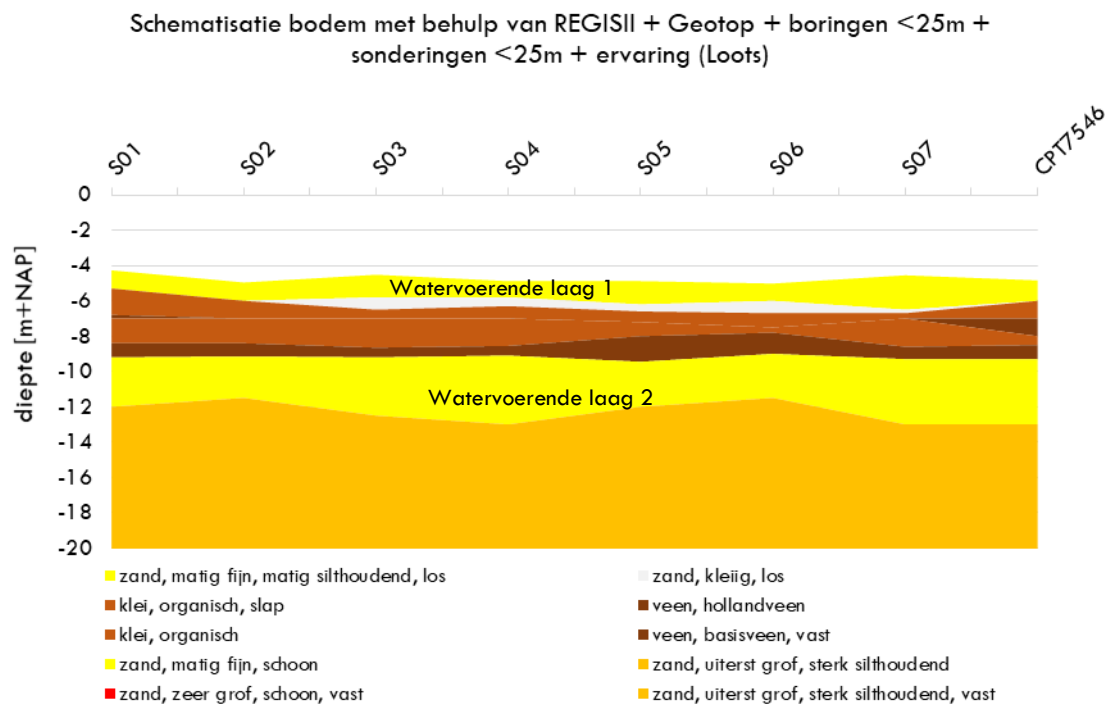

figuur 2 – schematisering bodem

In figuur 3 is de locatie van de bodemonderzoeken weergegeven ten opzichte van de projectlocatie.

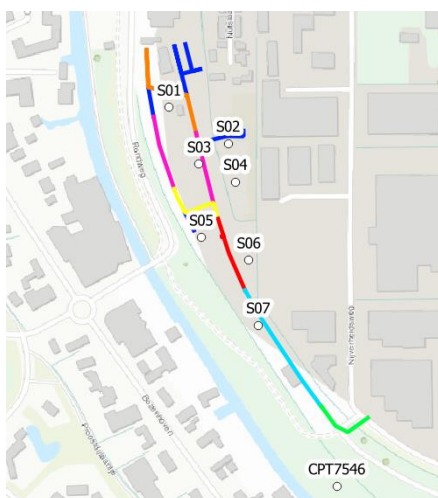


figuur 3 – locatie grondonderzoek

- ! Er is voldoende grondonderzoek (binnen 25 m afstand van het project) voor geotechnische (stabiliteits)berekeningen.
- ! Geohydrologische eigenschappen zijn redelijk in beeld, investeren in aanvullend geohydrologisch onderzoek zal de resultaten van het bemalingsadvies wel verscherpen.
- ! In bijlage 1.1 staan (voor specialisten) de bodemeigenschappen en – onderzoek per onderdeel.
- ! In bijlage 1.2 staan (voor specialisten) de grondwaterstand eigenschappen per onderdeel.

3.4 Omgeving

In figuur 4 zijn de objecten in de omgeving weergegeven. De specialistische informatie (onder andere meer detailkaarten) kan in bijlage 1 worden gevonden.

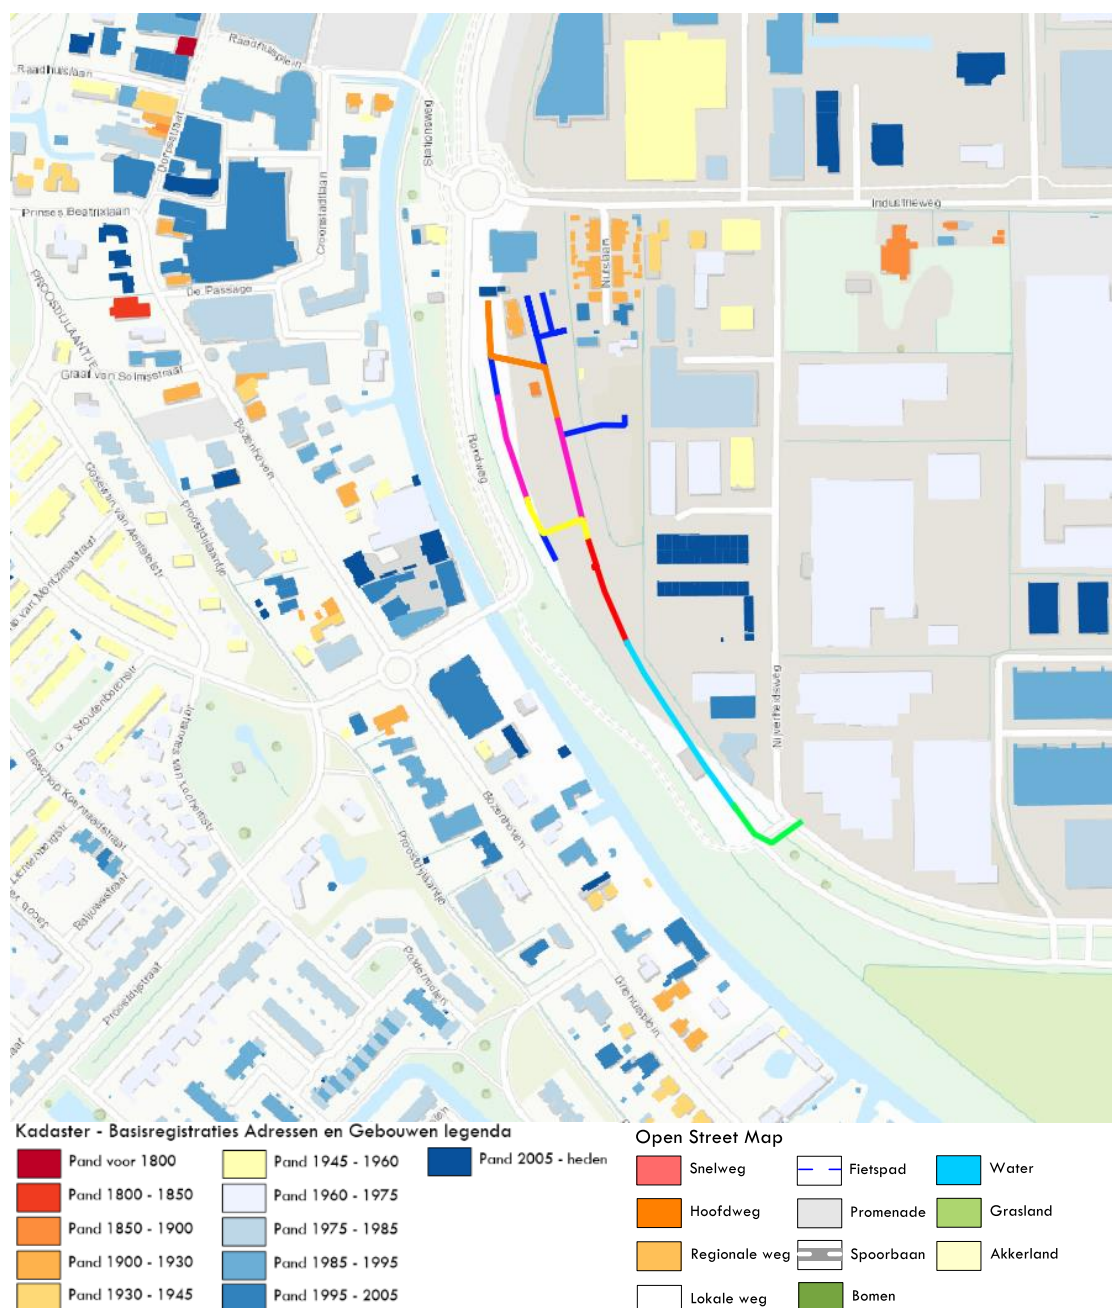

figuur 4 – geïnventariseerde grondwaterafhankelijke objecten in de omgeving

In bijlage 1 zijn tekeningen van de objecten in de omgeving bijgevoegd. Hieronder een korte samenvatting van het resultaat van de inventarisatie.

onderdeel	resultaat inventarisatie binnen reikwijdte (1285 m) van de bemaling
belendingen	De belendingen zijn gebouwd tussen het jaar 1809 en 2016. Vanaf 4 m afstand (en verder) is een houten fundering naar verwachting aanwezig. Het funderingshout start (inschatting) op NAP -5,8 m diepte. Vanaf 230 m afstand (en verder) is een fundering op staal (geen palen) naar verwachting aanwezig. Vanaf 14 m afstand (en verder) is een moderne paalfundering naar verwachting aanwezig. Vanaf 24 m afstand (en verder) is een gemengde fundering naar verwachting aanwezig.
grondwatergebruikers	Grondwateronttrekkingen zijn niet gevonden binnen de reikwijdte van de bemaling. Vanaf 100 m afstand (en verder) is een WKO installatie aanwezig.
mobiele verontreiniging	Vanaf 2 m afstand (en verder) is een mobiele verontreiniging aanwezig.
landbouw	Vanaf 114 m afstand (en verder) zijn in het groeiseizoen landbouwgewassen aanwezig.
archeologie	Vanaf 50 m afstand (en verder) zijn archeologische monumenten aanwezig.
natuur	Vanaf 5 m afstand (en verder) is natuur (bomen) aanwezig.
overige	De dichtstbijzijnde waterkering is op 40 m afstand (en verder) van het project. Het dichtstbijzijnde oppervlaktewater is op 1 m afstand (en verder) van het project. Er is geen spoor-/trambaan aanwezig binnen de reikwijdte van de bemaling. Er is geen gevoelige infrastructuur (kabels, leidingen, etc.) van derden gevonden binnen de reikwijdte van de bemaling.

- ! De omgeving is zo goed mogelijk geïnventariseerd met de beschikbare data, zie bronvermelding en bijlage 1.6 voor de gebruikte bronnen, tevens is in deze bijlage het effect (voor specialisten) op elk object uitgewerkt.
- ! Bij onbekenden (zoals funderingswijze belendingen) wordt gekozen voorzichtig in te schatten, dit zodat de kans klein is dat een fundering van een belending kwetsbaarder is dan ingeschat. De funderingswijze staat beschreven in bijlage 1.6 per belending.

4 Berekeningsresultaten

Met de uitgangspunten zijn berekeningen uitgevoerd om tot de conclusie (hoofdstuk 5) te kunnen komen. In dit hoofdstuk staan de berekeningsresultaten, dit hoofdstuk is met name opgenomen voor bevoegd gezag en specialisten zoals aannemers (veel detailinformatie).

4.1 Verticaal evenwicht, grondbreuk, oppervlaktewater

In tabel 4.1-A is samengevat of er (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden beneden de grondwaterstand. In het kort:

- Verticaal evenwicht: indien maatregelen noodzakelijk zijn dan betekent dit dat de bodem omhoog komt (en kan scheuren);
- Hydraulische grondbreuk: indien maatregelen noodzakelijk zijn dan betekent dit dat drijfzand (en grote verzakking naast ontgraving) mogelijk is;
- Oppervlaktewater: indien maatregelen noodzakelijk zijn dan betekent dit dat de ontgraving instabiel kan worden door de toestroming van oppervlaktewater.

tabel 4.1-A

maatregelen noodzakelijk voor ...	verticaal evenwicht (opbarsten)	hydraulische grondbreuk	oppervlakte-water
riolering deel 1	nee ¹	nee	ja
riolering deel 2	nee ¹	nee	nee
riolering deel 3	nee ¹	nee	nee
riolering deel 4	nee ¹	nee	nee
riolering deel 5	misschien ¹	nee	nee
pompput	ja ¹	nee	nee
riolering deel 6	nee ¹	nee	nee
persleiding	nee	nee	nee

! In bijlage 1.3 zijn de verticaal evenwicht berekeningsresultaten (veiligheidsfactor per watervoerende laag) voor specialisten.


! In bijlage 1.4 zijn de grondbreuk en oppervlaktewater berekeningsresultaten voor specialisten.

4.2 Debiet bemaling

In de onderstaande grafiek 4.2-A is de bandbreedte van het stationaire debiet weergegeven. Het stationaire debiet is het debiet na bereiken van de gewenste verlaging, tijdens de opstart van de bemaling is het debiet hoger dan de weergegeven waarde in de grafiek.

¹ bij deze onderdelen is de grond naast de sleuf belangrijk voor verticaal evenwicht. De ontgravingsafmetingen (bodembreedte) en talud mogen niet zonder overleg groter of flauwer worden uitgevoerd. Meer informatie over talud en ontgravingsafmetingen voor kritieke onderdelen staan in [BIJLAGE 1.3](#).

grafiek 4.2-A

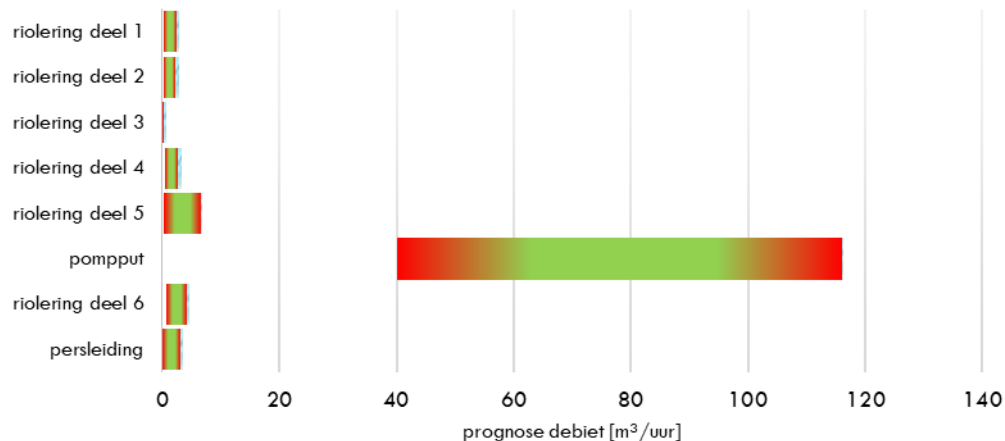

Legenda:

- groen = verwachte stationair debiet
- rood = extreem laag/hoog stationair debiet (hiermee dient rekening gehouden te worden)
- lichtblauw (met druppels) = effect extreme neerslag

In tabel 4.2-A is de bovengrens van het debiet (opstart en stationair) en de bovengrens van het waterbezwaar per onderdeel weergegeven.

tabel 4.2-A

onderdeel	bovengrens opstartdebiet [m³/uur]	bovengrens stationair debiet [m³/uur]	bovengrens waterbezwaar [m³]
riolering deel 1	2,9	2,4	1288
riolering deel 2	2,6	2,4	734
riolering deel 3	0,2	0,2	80
riolering deel 4	3,3	2,7	573
riolering deel 5	7,7	6,6	1370
pompput	126,4	116	14419
riolering deel 6	4,9	4,3	1700
persleiding	4,4	3,1	253

! Het debiet is gevoelig voor uitgangspunten zoals: wel/niet/dieper van waterremmende wanden, maar ook bijvoorbeeld de diepte van de bemaling. Als uitgangspunten wijzigen kan debiet dus afwijken.

! In bijlage 1.5 zijn de debietsberekeningen voor specialisten bijgevoegd, ook kan hier het debiet per watervoerende laag worden gevonden.

4.3 Bemalingssysteem

In tabel 4.3-A staat het geadviseerde bemalingssysteem per watervoerende laag. In het kort:

- In watervoerende laag 1 een (met kettinggraafmachine) geplaatste horizontale drain bemalen 0,3 m onder het riool;
- In watervoerende laag 2 bij de pompput een deepwell plaatsen. De afdichting tussen boorgatwand en bron dient zeer veel aandacht aan besteed worden. Op enkele meters afstand is een grondwaterverontreiniging in watervoerende laag 1, deze mag (wet bodembescherming) zeker niet straks lekken naar beneden doordat de deepwell/boring een gat achter laat. Dus van NAP – 9,5 m tot NAP – 7 m tussen boorgatwand en bron aanvullen met zwelklei. Na beeindigen bemaling de bron afdichten (wederom met

zwellklei) en beneden maaiveld afzagen op een geschikt moment (afhankelijk van zwelvermogen zwellklei);

- In watervoerende laag 2 bij riolering deel 5 diepe peilbuizen plaatsen, alleen bij een te hoge stijghoogte kiezen voor 2 à 3 extra deepwells langs dit tracé om de stijghoogte te kunnen verlagen;
- ! Deepwell(s) moeten geboord worden door middel van zuigboren, door BRL2100 gecertificeerd bemaler en boormeester. Deepwellbemaling uitvoeren met noodstroomvoorziening. Indien afgeweken wordt van voorgeschreven methode en er sprake is van een milieudelict (grondwaterverontreiniging verspreid naar beneden), dan is de aannemer aansprakelijk voor de schade en oplossing (schadekosten+boete loopt in dergelijke situatie tot honderdduizenden euro's en mogelijk verlies van certificering van boorder). Het is maatschappelijk ook niet wenselijk diepe zandlagen te verontreinigen.

tabel 4.3-A

bemalingssysteem watervoerende laag 1	type ^I en reactietijd ^I [uren]	gewenste grond- waterstand ^{II} [m+NAP]	plaatsing elementen ^{III}	onderzijde elementen ^{IV} [m+NAP]	h.o.h. afstand [m] elementen V	diameter elementen + omstorting ^{VI} [m]	open bemaling VII
riolering deel 1	freatisch (<0,1)	-6,5	horizontaal 1-zijde	-6,7	n.v.t.	0,1	1 streng
riolering deel 2	freatisch (<0,1)	-6,5	horizontaal 1-zijde	-6,7	n.v.t.	0,1	1 streng
riolering deel 3	freatisch (<0,1)	-6,55	horizontaal 1-zijde	-6,65	n.v.t.	0,1	1 streng
riolering deel 4	freatisch (<0,1)	-6,75	horizontaal 1-zijde	-6,85	n.v.t.	0,1	1 streng
riolering deel 5	freatisch (<0,1)	-6,95	horizontaal 1-zijde	-7,05	n.v.t.	0,1	1 streng
pompput	freatisch (<0,1)	-7,95	horizontaal 1-zijde	-8,05	n.v.t.	0,1	1 streng
riolering deel 6	freatisch (<0,1)	-6,74	horizontaal 1-zijde	-6,84	n.v.t.	0,1	1 streng
persleiding	freatisch (<0,1)	-5,85	horizontaal 1-zijde	-6,7	n.v.t.	0,1	1 streng

^I De volgende typen bemaling zijn mogelijk:

- "geen", er is geen bemaling noodzakelijk;
- "spanning", spanningsbemaling noodzakelijk ter voorkoming van verlies van verticaal evenwicht;
- "spanning stand-by", hetzelfde als spanning met als verschil dat een spanningsbemaling alleen nodig is bij een bovengemiddelde grondwaterstand (stijghoogte) of minder kwelstroom dan verwacht. Stand-by betekent dat de bemaling (niet actief) OF dat noodmaatregelen (belasting putbodan) direct toepasbaar zijn;
- "freatisch", de watervoerende laag moet worden bemalen met een freatische bemaling;
- "freatisch stand-by", hetzelfde als freatisch, echter alleen nodig bij een bovengemiddelde grondwaterstand.

De reactietijd is de tijdsduur tussen uitval bemaling en het moment dat de grondwaterstand gelijk is met ontgravingsniveau (freatisch) of 50% kans op opbarsten (spanning)

^{II} De gewenste grondwaterstand is de grondwaterstand (of stijghoogte) welke noodzakelijk is in de desbetreffende watervoerende laag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

^{III} Verticaal zijn bijvoorbeeld verticale bronnen, horizontaal zijn bijvoorbeeld horizontale drains. Bij elementen 1-zijde de bemaling aan één zijde van de projectlocatie, 2-zijde is bemaling twee zijden van de projectlocatie en rondom is bemaling rondom de projectlocatie

^{IV} Dit is de maximale diepte van de elementen, bij een diepere plaatsing van elementen zal het debiet en omgevingsbeïnvloeding toenemen (ten opzichte van dit advies) en zullen berekeningen herzien moeten worden.

^V Bij het toepassen van verticale elementen wordt hier de hart op hart (h.o.h.) afstand tussen de verticale elementen weergegeven.

^{VI} Dit is de diameter van de buitenkant van de omstorting. De omstorting van de elementen bestaat uit filterzand of – grind. Het uitgangspunt is dat de omstorting start in de watervoerende laag en wordt doorgezet tot en met de onderzijde van de elementen.

^{VII} Indien open bemaling gewenst is wordt aangegeven hoeveel horizontale drain strengen minimaal gewenst zijn (deze drains worden bemalen door de open bemaling).

bemalingssysteem watervoerende laag 2	type ¹ en reactietijd ¹ [uren]	gewenste grond- waterstand [m+NAP]	plaatsing elementen	onderzijde elementen [m+NAP]	h.o.h. afstand [m] elementen	diameter elementen + omstorting [m]	open bemaling
riolering deel 1	geen						
riolering deel 2	geen						
riolering deel 3	geen						
riolering deel 4	geen						
riolering deel 5	spanning standby ($<0,1$)	-5,75	verticaal 1 - zijde*	-14	20	0,5	nee
pompput	spanning ($<0,1$)	-7,7	verticaal 1 - zijde*	-17	20	0,5	nee
riolering deel 6	geen						
persleiding	geen						

In tabel 4.3-B staat op welk lozingspunt de bemaling zal lozen.

tabel 4.3-B

lozingspunt per onderdeel	watervoerende laag 1	watervoerende laag 2
riolering deel 1	hemelwaterriool/oppervlaktewater	Geen bemaling
riolering deel 2	hemelwaterriool/oppervlaktewater	Geen bemaling
riolering deel 3	hemelwaterriool/oppervlaktewater	Geen bemaling
riolering deel 4	hemelwaterriool/oppervlaktewater	Geen bemaling
riolering deel 5	Riool 2	Oppervlaktewater 2
pompput	Riool 2	Oppervlaktewater 2
riolering deel 6	hemelwaterriool/oppervlaktewater	Geen bemaling
persleiding	hemelwaterriool/oppervlaktewater	Geen bemaling


In tabel 4.3-C staat welke maatregelen bij het lozingspunt getroffen worden.

tabel 4.3-C

maatregelen lozingspunt	toepassen actief koolfilter	toepassen striptoren	toepassen olieafscheider	toepassen flocculatie en/of precipitatie	toepassen zandvanger	toepassen ontijzering
hemelwaterriool/ oppervlaktewater	geen aanleiding	geen aanleiding	geen aanleiding	geen aanleiding	wel	geen aanleiding
vuilwaterriool	geen aanleiding	wel	geen aanleiding	geen aanleiding	wel	geen aanleiding
oppervlaktewater	geen aanleiding	geen aanleiding	geen aanleiding	geen aanleiding	wel	wel

4.4 Effect op grondwater in omgeving

In de onderstaande figuur 5 zijn contourlijnen weergegeven, de contourlijnen betreffen locaties met een gelijke grondwaterstand tijdens bemalen. De contourlijnen met driehoeken zijn de 5cm verlaginglijnen beneden de natuurlijk lage grondwaterstand, dit is de berekende reikwijdte. De blauwe lijnen betreft de prognose (reikwijdte onder normale omstandigheden), de rode lijnen betreft extreem (reikwijdte bij een natuurlijk lage grondwaterstand/droge periode).

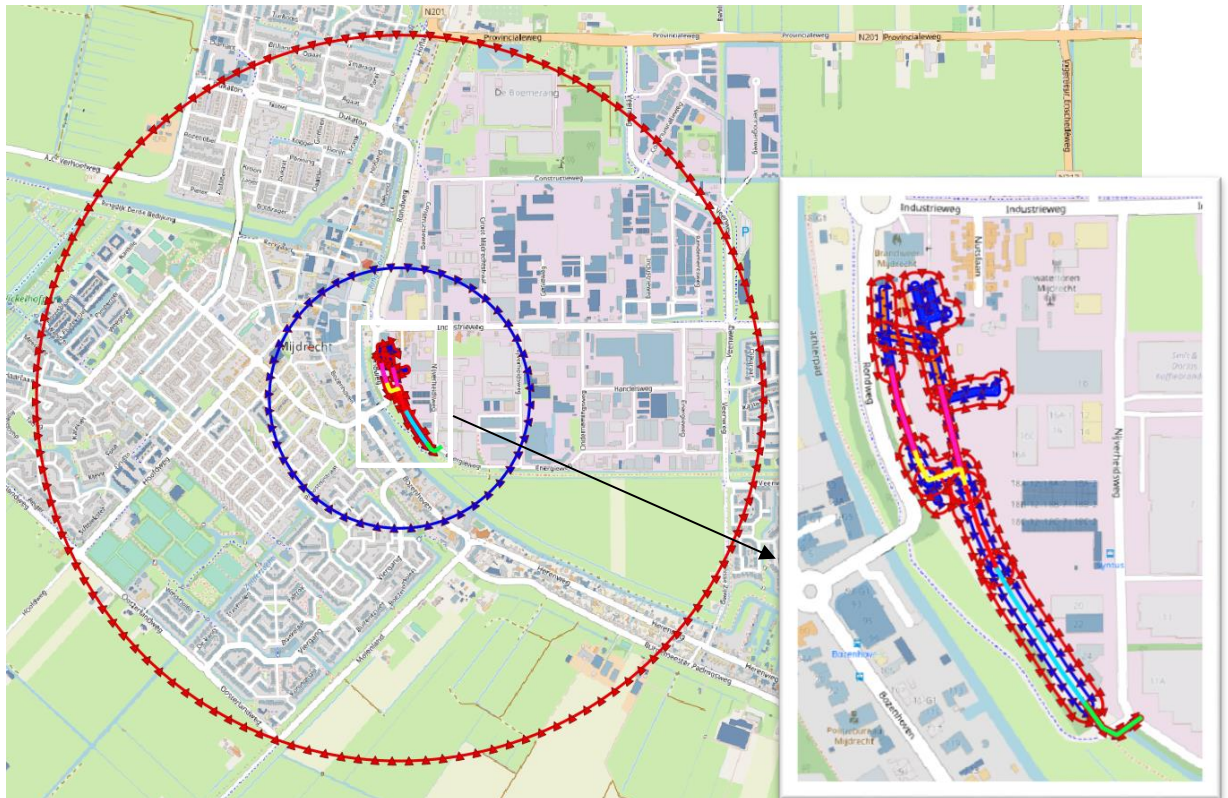

figuur 5 – reikwijdte bemaling, grootste reikwijdte per watervoerende laag is gebruikt voor deze figuur (blauw=prognose onder normale omstandigheden, rood=extreem bij een natuurlijk lage grondwaterstand/droge periode)

- ! Het effect op de grondwaterstand in omgeving is gevoelig voor uitgangspunten zoals: wel/niet/dieper van waterremmende wanden, maar ook bijvoorbeeld de diepte van de bemaling. Als uitgangspunten wijzigen kan effect op omgeving dus afwijken.
- ! In bijlage 1.5 zijn de verhanglijnen (grafieken) per watervoerende laag en voor de verschillende scenario's (nat, gemiddeld, droog) opgenomen.
- ! In bijlage 1.6 is de beschouwing (voor specialisten) ten aanzien van effect op de omgeving door de bemaling. In hoofdstuk 5.2 zijn de effecten op omgeving (in risicotabel) opgenomen.


5 Conclusie en aanbevelingen

Geconcludeerd wordt dat de grondwaterstand verlagen mogelijk is. In hoofdstuk 5.1 is samengevat welke procedures doorlopen moeten worden (melding/vergunning). In hoofdstuk 5.2 staan de risico's (en beheersmaatregelen) bij dit project. In hoofdstuk 5.3 staat de monitoring voor dit project. Tot slot in hoofdstuk 5.4 staan de aanbevolen vervolgstappen voor de opdrachtgever.

5.1 Meldings- en/of vergunningsprocedure

Alle onderdelen bij elkaar bepalen het maatgevend debiet en de tijdsduur. Door de planning (H3.2) en het debiet (H4.2) te combineren ontstaat grafiek 5.1-A.

grafiek 5.1-A

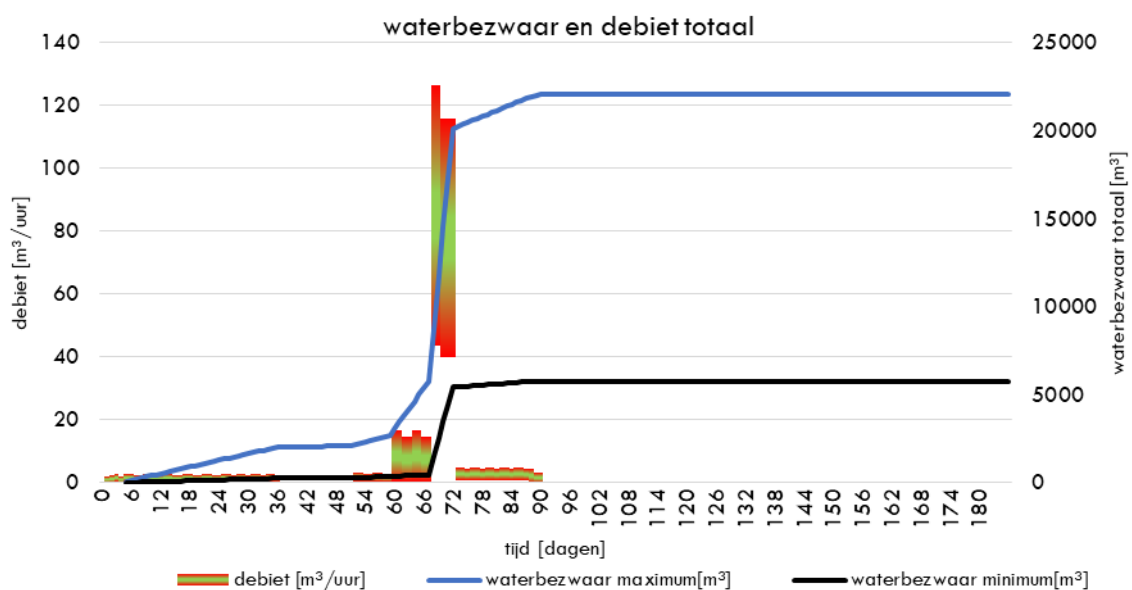

Het project is vergunningsplichtig bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet door de aanwezigheid van een waterkering, verwacht wordt een debiet groter dan 50 m³/uur, een debiet groter dan 15000 m³/maand, een waterbezwaar gelijk of kleiner dan 90000 m³ en de duur van de bemaling is korter dan 6 maanden. De provinciale grondwaterheffing in Utrecht is € 0,0153 per onttrokken m³. Onttrekkingen tot 48000 m³ zijn heffingsvrij, per m³ welke is geretourneerd mag -50% van de hoeveelheid worden verminderd op de totale som van de onttrekking. Bij de vergunningsaanvraag is een vormvrije MER aanmeldnotitie noodzakelijk.

In tabel 5.1-A staan de berekende hoeveelheden voor de grondwateronttrekking procedure.

tabel 5.1-A

waterbezwaar totaal	m³ per uur	m³ per etmaal	m³ per maand	m³ per kwartaal	m³ per jaar	m³ totaal	duur [dagen]
watervoerende laag 1 (neerslag)	5 (0,6)	118	2691	5440	5440	5440	86
watervoerende laag 2	124	2977	16654	16654	16654	16654	86
totaal (afgerond)	125	3040	19400	22100	23100	23100	86
vergunningsgrens	50		15000			90000	182

Adres nabij projectlocatie is Industrieweg 2, 3641RM Mijdrecht. RD-coördinaten nabij projectlocatie zijn x=119630 en y=468582. De bronnen staan van 2,1 tot 12 m-mv of NAP - 7,1 m tot NAP - 17 m.

Bij lozingen op het riool en/of oppervlaktewater moet rekening gehouden worden met de zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing, deze wordt verrekend door middel van vervuilingseenheden. De kosten per vervuilingseenheid zijn € 54,94. De afvalwatercoëfficiënt bepaald het vervuilingseenheden per m³, deze is ingeschat op 0,001 à 0,0025, indicatief zullen lozingskosten tussen € 330,- en € 3540,- liggen. Opgemerkt wordt dat bij de aanvraag (toestemming lozen) de afvalwatercoëfficiënt bepaald zal worden door bevoegd gezag, dit kan afwijken van deze raming.

5.2 Risico's

Het doel van risicomanagement is duidelijkheid voor de opdrachtgever, in een tabel aangeven wat het belangrijkste is en welke maatregelen toe te passen om het beheersen. In tabel 5.2-A zijn de risico's weergegeven (van hoog naar laag).

tabel 5.2-A

omschrijving risico	risico	maatregel
bouwputbodemborst op door verlies verticaal evenwicht	zeer hoog	Het meten van de stijghoogte (grondwaterstand) op de projectlocatie, hiermee de spanningsbemaling sturen. Daarnaast voldoende reservepompen/-energie voor storing op te vangen.
geconcludeerd is dat de moeilijkheidsgraad van dit project hoog is. Als de bemaler onvoldoende aandacht en kennis besteed aan de uitvoering zijn risico's op grote schade (verspreiding grondwaterverontreiniging naar diepere watervoerende lagen)	zeer hoog	kwiteit borgen (toetsen plan en uitvoering), hiermee voorkomen dat schade kan ontstaan. Bemaler voor bemaling watervoerende laag 2 moet beschikken over SIKB BRL2100 certificering, een boommeester en zuigboorstelling.
een mobiele verontreiniging komt in de bemaling, hierdoor wordt lozingsnorm overschreden.	zeer hoog	grondwaterkwaliteit nabij pompput en riolering deel 5 nader onderzoeken (vlek locatie op dit moment). Alternatief preventief een waterzuivering toepassen.
een schadelijke stof (volgens BLBI) wordt in een te hoge concentratie geloosd in lozingspunt(en), hierdoor ontstaat schade aan het milieu	zeer hoog	altijd opletten (stank/verkleuring) en bij twijfel direct actie ondernemen. Wanneer het water (mogelijk) niet voldoet aan de BLBI norm, dan overleg met geohydroloog over toe te passen maatregelen.
door vaste delen in het lozingswater ontstaat een verstopping in het watersysteem bij het lozingspunt	matig	het toepassen van een zandvanger voor het lozingspunt
het water verkleurd bij lozingspunt (door ijzer), hierdoor ontstaat schade aan het milieu	matig	het bepalen van ijzergehalte in grondwater voor de start van werkzaamheden en tijdens werkzaamheden de kleur bij het lozingspunt visueel beoordelen en registreren (foto). Bij verkleuring en lage debieten (<5 m ³ /uur) is de oplossing (tijdelijk) lozen op vuilwaterriool. Bij hogere debieten zal maatwerk (ontijzering) noodzakelijk zijn.
waterbodempoppervlaktewater is (lokaal) sterk doorlatend. Oppervlaktewater veroorzaakt instabiliteit, waardoor ontgraving niet op diepte komt.	matig	Eventuele vertraging incalculeren, bij geen ruimte voor vertraging vooraf proefontgraving/-bemaling uitvoeren. Maatregelen bij teveel toestroom zijn: oppervlaktewater tijdelijk (lokaal) dempen (dam in water), waterremmende wanden toepassen, waterbodempachtmaken (folie) en soms helpt een aanvullende bemaling vlakbij de waterkant.
door obstakels in de bodem kan bemaling niet tot de noodzakelijke diepte worden geplaatst, hierdoor ontstaat vertraging of de bemaling moet aangepast worden	laag	onderzoek naar obstakels, proberen obstakels te verwijderen/verleggen, proces/locatie plaatsen bemaling aanpassen, eventuele vertraging incalculeren
een mobiele verontreiniging in de bodem verplaatst significant (> 5 m of > 100 m ³ nieuw verontreinigde grond).	laag	toepassen grondwater monitoring voor en achter de vlek. Op het moment dat de vlek (in theorie) te snel verplaatst dan het toepassen van lokaal grondwaterinfiltratie (zodat de vlek minder/niet verplaatst).
door gelijktijdig grondwater onttrekken door een derde grondwatergebruiker in de omgeving is er een cumulatief effect waardoor de grondwaterstand meer zakt en omgevingsbeïnvloeding groter wordt	laag	tussen de grondwateronttrekkingen de grondwaterstand meten met als doel het cumulatief effect beoordelen tijdens het project. Eventueel (indien mogelijk) afspraken maken met grondwatergebruiker.
door (bemaling gerelateerde) maaiveld daling ontstaat architectonische schade (schade aan uiterlijk gebouw) bij één belending (kans 4%).	zeer laag	een exterieur vooropname uitvoeren (ter voorkoming van discussie achteraf), bij panden met reeds scheuren in de gevel(s) ook interieur vooropname uitvoeren.
het debiet of de grondwaterstandverlaging is (aanzienlijk) meer dan verwacht. Hierdoor moet de	zeer laag	geen maatregelen niet noodzakelijk wegens lage kans.

omschrijving risico	risico	maatregel
bemaling aangepast worden en/of is er (mogelijk) meer omgevingsbeïnvloeding	zeer laag	het meten van de grondwaterstand, bij een te lage grondwaterstand het groen besproeien met geschikt water. Het is gewenst een wateraftappunt te realiseren in de lozingsroute.
bevoegd gezag heeft geen toestemming kunnen geven voor de startdatum bemaling, hierdoor vertraagd het project.	zeer laag	tenminste 12~18 weken voor start bemaling de grondwateronttrekking en lozing van grondwater aanvragen, bij voorkeur in overleg met bevoegd gezag (in verband met eventuele drukte)
er is maaiveldddaling ter plaatse van een waterkering, bij teveel zakking ontstaat overstromingsgevaar	geen	dit risico is niet gevonden/aanwezig bij dit project, er zijn geen maatregelen van toepassing

! In bijlage 1.7 is de risicoanalyse en het stappenplan om risico's te beheersen tijdens het project, het toepassen van risicomanagement conform deze bijlage is het uitgangspunt. Loots kan assisteren bij de uitvoering van risicomanagement.

5.3 Monitoring

Voor dit project geldt de monitoring in tabel 5.3-A, voor de omgeving geldt de monitoring in tabel 5.3-B. Dit zijn monitoring maatregelen welke bepaald zijn naar aanleiding van de beoordeling risico's (hoofdstuk 5.2). Bij het bereiken van de grenswaarden (signaal-/interventiewaarde) zijn actie(s) gewenst.

tabel 5.3-A

monitoring project	waar	wanneer	H I	L II	eenheid	grens-waarde 1	actie 1	grenswaarde 2	actie 2
controle freatische grondwaterstand	projectlocatie(s)	1 x/dag	x		[m-mv]	0,15	1,4	0,05	7,8,9
controle freatische grondwaterstand	projectlocatie(s)	1 x/dag		x	[m-mv]	0,45	1,4	0,5	7,8
debiet bemaling	lozingspunt	1 x/dag	x		[-]	bovengrens H5.2	1,4	bovengrens H5.2 + 5%	7,8
controle visueel/geur	lozingspunt	1 x/dag			[-]	stank bij lozingspunt	12	verkleuring of overschrijding lozings-parameter	13
peilbuis tot NAP-10m	2x peilbuis projectlocatie riolering deel 5	1 x/dag (O=5x/dag)	g 2	g 1	[m+NAP]	-6,05	1, 4, 7	-5,75	1, 4, 9, 7, 8, 11
peilbuis tot NAP-10m	peilbuis projectlocatie pompput	1 x/dag (O=5x/dag)	g 2	g 1	[m+NAP]	-8	1, 4, 7	-7,7	1, 4, 9, 7, 8, 11

! De minimale monitoring is bepaald op basis van de gevonden risico's. Opgemerkt wordt dat soms meer monitoring (met name vooropname) gewenst is zonder een duidelijk risico, dan heeft de vooropname met name het doel discussies achteraf te voorkomen. Vooropnamen uitvoeren bij

^I Hoger dan: indien de meting hoger is dan de grenswaarde, dan actie ondernemen. Als hier g1 staat dan geldt hoger dan alleen voor grenswaarde 1;

^{II} Lager dan: indien de meting lager is dan de grenswaarde, dan actie ondernemen. Als hier g2 staat dan geldt hoger dan alleen voor grenswaarde 2;


panden buiten de reikwijdte (zie figuur in hoofdstuk 4.4) is niet noodzakelijk (omdat de bemaling daar geen invloed heeft).

tabel 5.3-B

monitoring omgeving	waar	wanneer	H	L	eenheid	grens- waarde 1	actie 1	grenswaarde 2	actie 2
vooropname exterieur + interieur	pand ten zuiden van Rondweg 3	vooraf							
vooropname exterieur	Nijverheidsweg 16A-C	vooraf							
vooropname exterieur	Nijverheidsweg 18A-C	vooraf							
vooropname exterieur	Nijverheidsweg 20	vooraf							
vooropname exterieur	Bozenhoven 4	vooraf							
peilbuis tot NAP- 7,4m	2x bij restverontreinig- ing terrein	1 x/dag	x		verhang	1:10	1,8	1:10	8,15 (14)
peilbuis tot NAP- 6,8m	2x bomen langs Rondweg	3x/week		x	[m+NAP]	-5,72	1,4	-5,82	7,10

De acties (bij tabellen):

1. Controleren dat het meetresultaat/-instrument juist is;
2. Controleren (visueel) of er sprake is van lekkage van de waterremmende (dam)wanden;
3. Bij uitspoelen van grond door lekkage dit direct oplossen en overleg met geohydroloog;
4. Controleren of de bemaling juist functioneert (niet te veel/weinig verlaging);
5. Infiltratiedrain buiten de projectlocatie voeden met water (kunstmatig waterstand verhogen);
6. Uitvoeren deformatiemeting bij zakkingsgevoelig object;
7. Overleg met betrokken partijen, melden bij handhaving;
8. Uitvoeren uitgebreide geohydrologische analyse;
9. Inschakelen of verhogen capaciteit (spannings)bemaling;
10. In overleg met eigenaar lokaal (extra) beregenen (besproeien) van het desbetreffende groen ter aanvulling van de hoeveelheid bodemvocht. Bij oppervlaktewater het waterpeil verhogen door (geschikt) water te lozen. Aanbieden eigen gietwater en/of sproei-installaties. Alternatief is compenseren voor gebruik gietwater en/of sproei-installaties van gemeente;
11. De bouwputbodembelasten (bijvoorbeeld door water in de bouwput te zetten, de hoeveelheid water noodzakelijk in de bouwput = diepste ontgravingsniveau + overschrijding (grondwaterstand - interventiewaarde) + 0,3 m;
12. Monsternamen waterkwaliteit lozingswater;
13. Lozingsmaatregelen treffen;
14. Compenserende maatregelen bij object treffen (nader te bepalen op basis van situatie);
15. Grondwaterkwaliteit in peilbuis (tussen verontreiniging en project) controleren.

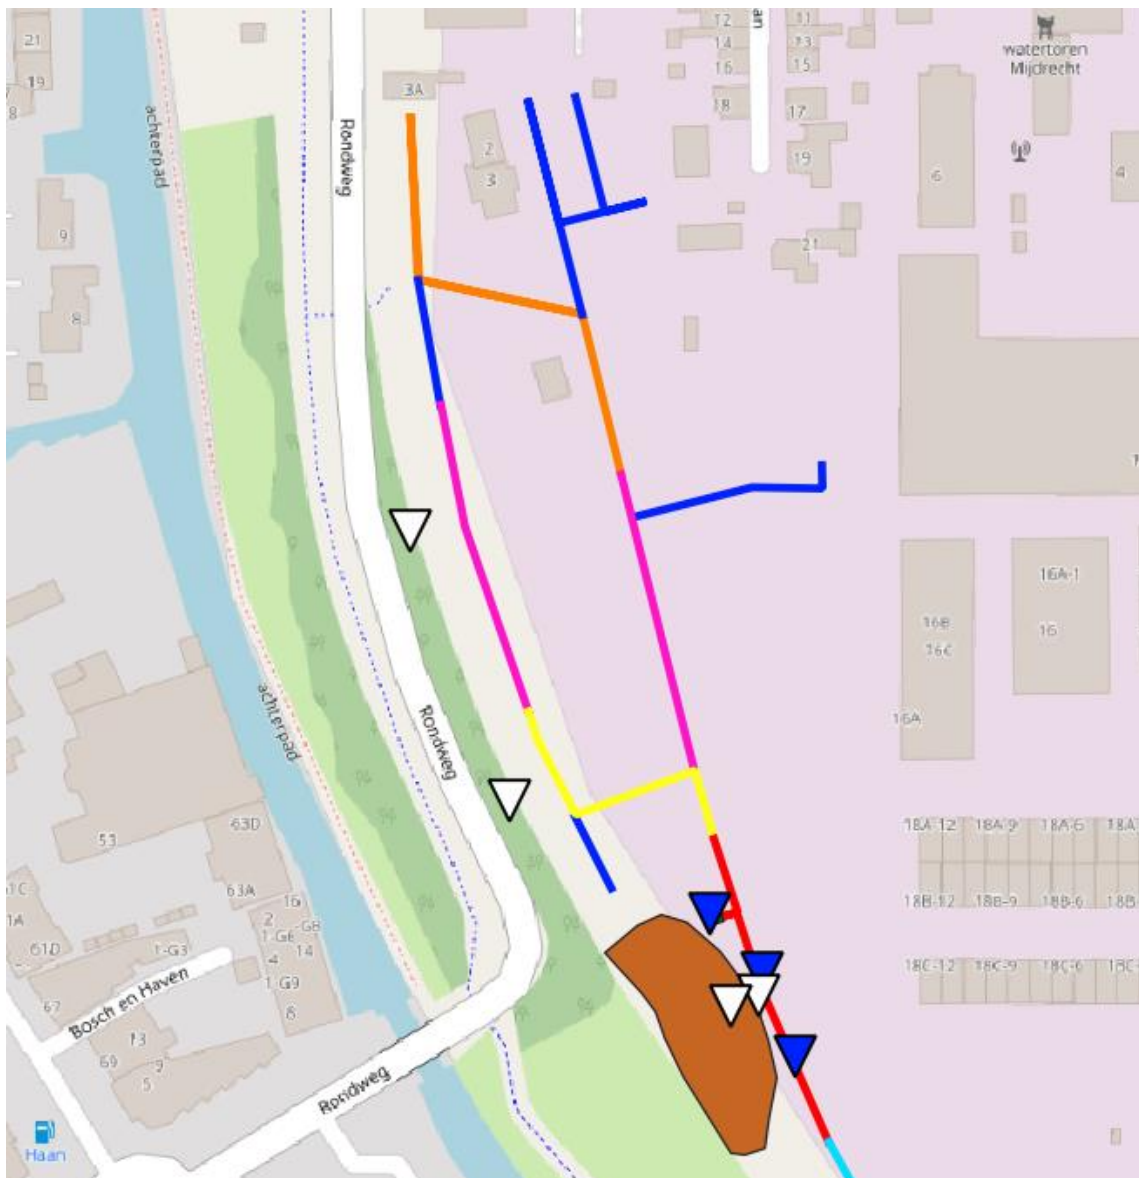

Figuur 6 - locatie peilbuizen (driehoeken blauw is sturing bemaling watervoerende laag 2 en witte driehoeken is voor omgevingsbeïnvloeding)

5.4 Vervolgstappen

Het wordt aanbevolen de volgende vervolgstappen op te volgen

- ☐ Per vervolgstap punt een persoon aanwijzen welke dit zal uitvoeren. Indien gewenst kan Loots Grondwatertechniek (enkele) vervolgstappen uitvoeren;
- ☐ Zodra ontwerp wijzigt, controleren of dit gevolgen heeft voor de bemaling;
- ☐ Controleren of er voldoende tijd is geraamd om de werkzaamheden uit te voeren;
- ☐ Controleren of er voldoende ruimte is om de bemalingsinstallatie te plaatsen;
- ☐ De inrichting van het terrein tijdens de werkzaamheden optimaliseren zodat er bij (hevig) neerslag geen grote stagnatie ontstaat (aandacht zodat hemelwater afstroomt rondom de werkzaamheden, bijvoorbeeld tijdens de werkzaamheden zal (bij hevige neerslag) wateroverslag (langs project) noodzakelijk zijn ter voorkoming dat het waterpeil niet sterk zal stijgen;

- ☐ Bemalingsplan aannemer toetsen conform eisen (bevoegd gezag). Bemalingsplan dient opgesteld te worden door de partij welke de bemaling plaatst. Alternatief kan een bemaler (begeleidende brief) instemmen met een bemalingsplan van derden;
- ☐ Controleren bemalingsplan (mogelijk zal vergunningverlening bevoegd gezag dit controleren);
- ☐ Aanbevolen wordt te controleren dat slecht doorlatende lagen (klei, veen, etc.) tussen en/of boven niet lek gemaakt wordt door bijvoorbeeld: het aanbrengen/verwijderen van de bemaling of het onjuist afdichten van de ruimte tussen boorgat en bron;
- ☐ Uitvoeren aanvraag grondwateronttrekking en -lozing bij bevoegd gezag;
- ☐ De bemaling en/of monitoring plaatsen, laten controleren of gewerkt wordt conform bemalings-/monitoringsplan (mogelijk zal handhaving bevoegd gezag dit controleren);
- ☐ Start monitoring;
- ☐ Start bemaling, voor de start moet de startdatum bij handhaving bevoegd gezag worden gemeld;
- ☐ Mogelijk (niet altijd vereist): monsternamen grondwater bemalingsinstallatie na minimaal 24 uur actieve bemaling;
- ☐ Eind bemaling (debietmeterstanden samenvatten);
- ☐ Melden bij bevoegd gezag dat bemaling beëindigd is;
- ☐ Eind monitoring;
- ☐ Het totale waterbezwaar melden bij bevoegd gezag (lozingspunt);
- ☐ Eventuele onttrekkings-/lozingskosten betalen.

Neem contact op met Erik Loots voor meer informatie.

Opgesteld door:

ing. E.J. Loots (06-53392188)

Loots Grondwatertechniek

23 februari 2021

BIJLAGEN

Bijlage 1 – Gegevens voor specialisten

Werkwijze en gebruikte software bemalingsadvies

De opdrachtgever levert de uitgangspunten (stukken opdrachtgever). Bij specialistische uitgangspunten (bijvoorbeeld eigenschappen bodem) wordt een bandbreedte (boven en ondergrens) bepaald zodat de kans op afwijkingen klein wordt. De bandbreedte wordt bepaald op basis van ervaring en (regionale) modellen.

De berekeningen bestaan uit analytische- en modelberekeningen (software: MicroFEM v4.10, iMOD v4.4, Qgis v3.8, Strater v5, MLU v2.25, Excel en/of Surfer v16). Door de berekeningen meerdere malen te herhalen bij verschillende uitgangspunten wordt een robuust ontwerp gevonden. Door deze werkwijze neemt de kans op (negatieve) afwijkingen af in de praktijk.

Bijlage 1.1 – Bodemeigenschappen

γ is de volumieke massa van de bodemlaag, dit is het gewicht wat gebruikt wordt voor het verticaal evenwicht.

K_h of k_v zijn de doorlatendheid eigenschappen (hogere waarde is meer doorlatend)

geotechnische omschrijving Mijdrecht	top gemiddeld (σ) [m+NAP]	Dikte gemiddeld (σ) [m]	γ_d [kN/m ³]	γ_w [kN/m ³]
zand, matig fijn, matig silthoudend, los	-4,74 (0,26)	1,21 (0,33)	17 (0,425)	19 (0,475)
zand, kleilig, los	-5,95 (0,35)	0,31 (0,3)	17 (0,425)	19 (0,475)
klei, organisch, slap	-6,26 (0,48)	0,8 (0,37)	13 (0,325)	13 (0,325)
veen, hollandveen	-7,06 (0,21)	0,15 (0,35)	11 (0,275)	11 (0,275)
klei, organisch	-7,21 (0,36)	1,15 (0,54)	15 (0,375)	15 (0,375)
veen, basisveen, vast	-8,36 (0,3)	0,85 (0,32)	12 (0,3)	12 (0,3)
zand, matig fijn, schoon	-9,21 (0,14)	3,16 (0,58)	18 (0,45)	20 (0,5)
zand, uiterst grof, sterk silthoudend	-12,38 (0,58)	21,63 (0,58)	18 (0,45)	20 (0,5)
zand, zeer grof, schoon, vast	-34 (0)	7 (0)	19 (0,475)	21 (0,525)
zand, uiterst grof, sterk silthoudend, vast	-41 (0)	9 (0)	19 (0,475)	21 (0,525)

geotechnische omschrijving Mijdrecht deel 2	C'_p (σ)	C'_s (σ)	C_p	C_s
zand, matig fijn, matig silthoudend, los	2E+2 (3E+1)	1E+9 (1E+8)	8E+2	4E+9
zand, kleilig, los	2E+1 (2E+0)	2E+2 (2E+1)	6E+1	6E+2
klei, organisch, slap	8E+0 (9E-1)	3E+1 (4E+0)	3E+1	1E+2
veen, hollandveen	8E+0 (9E-1)	3E+1 (4E+0)	3E+1	1E+2
klei, organisch	1E+1 (1E+0)	4E+1 (5E+0)	4E+1	2E+2
veen, basisveen, vast	1E+1 (1E+0)	4E+1 (5E+0)	4E+1	2E+2
zand, matig fijn, schoon	6E+2 (8E+1)	1E+9 (1E+8)	2E+3	4E+9
zand, uiterst grof, sterk silthoudend	6E+2 (8E+1)	1E+9 (1E+8)	2E+3	4E+9
zand, zeer grof, schoon, vast	1E+3 (1E+2)	1E+9 (1E+8)	4E+3	4E+9
zand, uiterst grof, sterk silthoudend, vast	1E+3 (1E+2)	1E+9 (1E+8)	4E+3	4E+9

geohydrologische omschrijving Mijdrecht	top gemiddeld (σ) [m+NAP]	k_h (σ) [m/d]	k_v (σ) [m/d]	P [-]
zand, matig fijn, matig silthoudend, los	-4,74 (0,26)	5 (1)	3,125 (0,4688)	0,3 (0,03)
zand, kleiig, los	-5,95 (0,35)	0,1 (0,015)	0,025 (0,0038)	0,1 (0,01)
klei, organisch, slap	-6,26 (0,48)	0,1 (0,015)	0,0167 (0,0025)	0,3 (0,03)
veen, hollandveen	-7,06 (0,21)	0,01 (0,002)	0,0005 (0,0001)	0,3 (0,03)
klei, organisch	-7,21 (0,36)	0,1 (0,015)	0,0033 (0,0005)	0,3 (0,03)
veen, basisveen, vast	-8,36 (0,3)	0 (0)	0 (0)	0,1 (0,01)
zand, matig fijn, schoon	-9,21 (0,14)	15 (2,25)	7,5 (1,125)	0,25 (0,03)
zand, uiterst grof, sterk silthoudend	-12,38 (0,58)	50 (7,5)	25 (3,75)	0,3 (0,03)
zand, zeer grof, schoon, vast	-34 (0)	75 (11,25)	28,125 (4,2188)	0,3 (0,03)
zand, uiterst grof, sterk silthoudend, vast	-41 (0)	50 (7,5)	18,75 (2,8125)	0,3 (0,03)

onderdeel	gebruikt bodemonderzoek
riolering deel 1	S06
riolering deel 2	S06
riolering deel 3	S01
riolering deel 4	S06
riolering deel 5	S06
pompput	S06
riolering deel 6	S07
persleiding	S07

Bijlage 1.2 – Grondwaterstand


Waterpeil

In de onderstaande tabel staat het waterpeil van oppervlaktewater.

onderdeel	waterpeil [m+NAP] oppervlaktewater (bovengrens)
riolering deel 1	-5,6
riolering deel 2	-2,15
riolering deel 3	-2,15
riolering deel 4	-2,15
riolering deel 5	-2,15
pompput	-2,15
riolering deel 6	-2,15
persleiding	-6,5

Grondwaterstand

In figuur 7 is het resultaat van een grondwaterstand analyse in de omgeving weergegeven. In de onderstaande tabel zijn de grondwaterstand rekenwaarden per onderdeel samengevat.

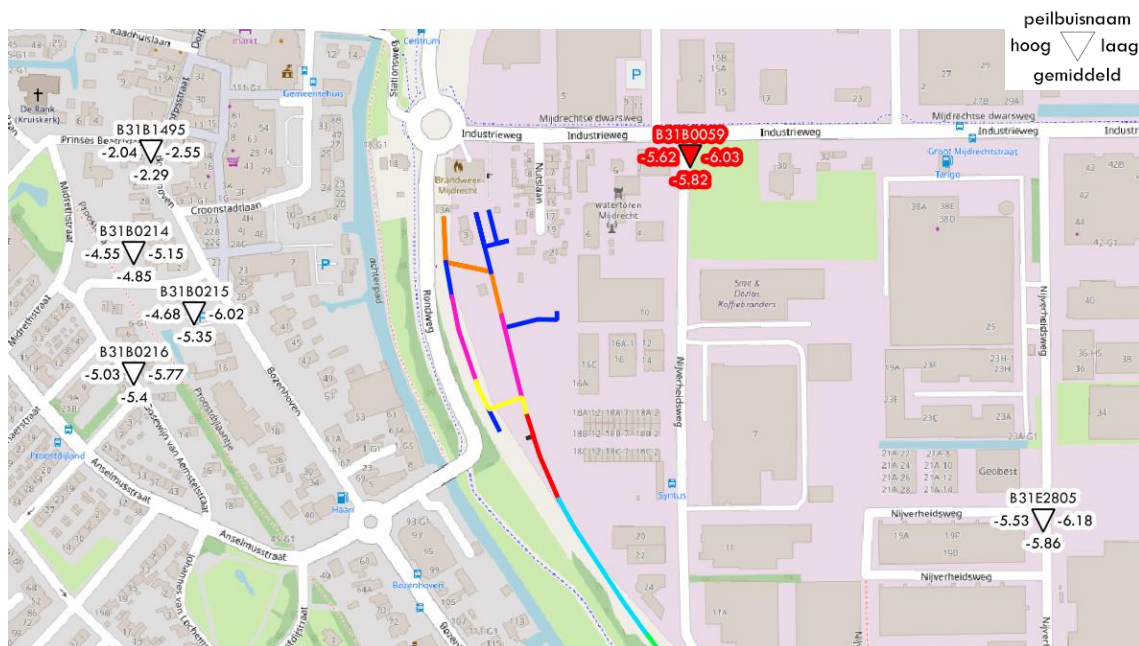

figuur 7 - grondwaterstand t.o.v. NAP per geanalyseerde peilbuis (wit = freatisch/watervoerende laag 1, rood = watervoerende laag 3)

! De ondergrens van de grondwaterstand per watervoerende laag is maatgevend voor de omgevingsbeïnvloeding. Loots Grondwatertechniek kiest er altijd voor deze waarde voorzichtig (niet te laag) in te schatten. Indien de monitoring opstart en de grondwaterstand lager is dan de natuurlijk lage grondwaterstand in de tabel dan moet dit worden gemeld. Een aanvullende geohydrologische analyse is dan noodzakelijk.

Grondwaterstand [m+NAP] per onderdeel	naam peilbuis WVL1	hoog ^I WVL ^{II} 1	gemiddeld ^{III} WVL 1	laag ^{IV} WVL 1	naam peilbuis WVL2	hoog WVL 2	gemiddeld WVL 2	laag WVL 2
riolering deel 1	B31B0216	-5,03	-5,4	-5,77	B31B0059	-5,62	-5,82	-6,03
riolering deel 2	B31B0216	-5,03	-5,4	-5,77	B31B0059	-5,62	-5,82	-6,03
riolering deel 3	B31B0216	-5,03	-5,4	-5,77	B31B0059	-5,62	-5,82	-6,03
riolering deel 4	B31B0216	-5,03	-5,4	-5,77	B31B0059	-5,62	-5,82	-6,03
riolering deel 5	B31B0216	-5,03	-5,4	-5,77	B31B0059	-5,62	-5,82	-6,03
pompput	B31B0216	-5,03	-5,4	-5,77	B31B0059	-5,62	-5,82	-6,03
riolering deel 6	B31B0216	-5,03	-5,4	-5,77	B31B0059	-5,62	-5,82	-6,03
persleiding	B31B0216	-5,03	-5,4	-5,77	B31B0059	-5,62	-5,82	-6,03

^I hoog = natuurlijk hoge grondwaterstand, berekend door gemiddelde plus 2 x standaarddeviatie

^{II} WVL = watervoerende laag


^{III} gemiddeld = maatgevend gemiddelde grondwaterstand

^{IV} laag = natuurlijk lage grondwaterstand, berekend door gemiddelde minus 2 x standaarddeviatie

groene cirkel=hoge grondwaterstand, gele driekhoek=gemiddelde grondwaterstand en rode ruit=lage grondwaterstand

REF=NAP

	B31B0059	B31B0214	B31B0215	B31B0216	B31B1495	B31E2805
naam						
X-coördinaat	119760	119300	119350	119300	119314	120052
Y-coördinaat	468830	468750	468700	468650	468834	468529
maaiveld [m+REF]	-5,26	-4,04	-4,63	-4,78	-0,96	-5,02
bovenkant filter [m+REF]	-19,96	-4,54	-5,64	-5,78	-1,98	-6,64
onderkant filter [m+REF]	-20,96	-5,54	-6,64	-6,78	-2,98	-7,64
laatste meetjaar	1994	1965	1961	1961	2019	2020
laatste meting	-5,8	-4,9	-5,46	-5,36	-2,21	-5,66
totale meetperiode	36	5	1	1	3	4
aantal metingen	790	74	26	15	418	905
hoogste [hele reeks]	-4,92	-4,48	-4,92	-5,05	-1,85	-5,35
ghg [laatste 8 jaren]	-5,75	-4,52	-4,93	-5,12	-1,87	-5,38
hoog σ [hele reeks]	-5,62	-4,55	-4,68	-5,03	-2,04	-5,53
gemiddelde [hele reeks]	-5,82	-4,85	-5,35	-5,40	-2,29	-5,86
gemiddelde [laatste 8 jaren]	-5,88	-4,85	-5,35	-5,40	-2,29	-5,86
laag σ [hele reeks]	-6,03	-5,15	-6,02	-5,77	-2,55	-6,18
glg [laatste 8 jaren]	-5,98	-5,23	-5,93	-5,98	-2,50	-6,16
laagste [hele reeks]	-6,74	-5,25	-6,13	-6,09	-2,55	-6,17
σ [hele reeks]	0,10	0,15	0,33	0,18	0,13	0,16
januari	● -5,81	● -4,70	● -5,06	● -5,19	▲ -2,30	▲ -5,82
februari	▲ -5,82	◆ -4,89	▲ -5,22	● -5,33	▲ -2,26	● -5,75
maart	▲ -5,81	◆ -4,91	▲ -5,31	● -5,36	▲ -2,28	▲ -5,79
april	▲ -5,83	◆ -4,86	▲ -5,20		◆ -2,32	◆ -5,96
mei	◆ -5,85	▲ -4,82	▲ -5,36		◆ -2,36	◆ -6,01
juni	◆ -5,86	◆ -4,89	◆ -5,62		◆ -2,42	◆ -6,04
juli	▲ -5,82	◆ -4,90	◆ -5,60	◆ -6,08	◆ -2,39	▲ -5,90
augustus	▲ -5,83	▲ -4,84	◆ -5,59	● -5,35	▲ -2,29	◆ -5,93
september	▲ -5,84	▲ -4,84	◆ -5,44	● -5,38	● -2,07	▲ -5,81
oktober	▲ -5,83	◆ -4,93	▲ -5,26	▲ -5,78	● -2,11	● -5,75
november	● -5,80	▲ -4,81	● -4,99	● -5,19	▲ -2,24	● -5,78
december	● -5,79	▲ -4,82	● -5,08	● -5,19		● -5,65
2013						
2018					-2,29	-5,81

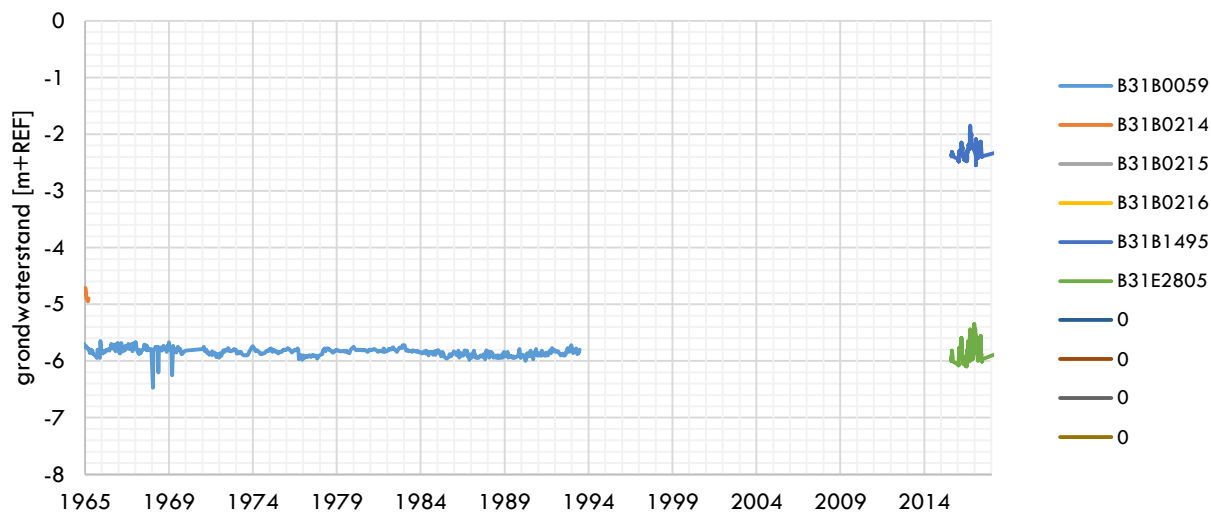

Bijlage 1.3 – Verticaal evenwicht berekeningsresultaten

Het verticaal evenwicht van de bodem wordt beïnvloed door slecht doorlatende lagen (klei, veen of leem) beneden het ontgravingsniveau. In de onderstaande tabel is per watervoerende laag de uitkomst van de verticaal evenwicht berekening weergegeven.

verticaal evenwicht per onderdeel	veiligheids-factor ^I water-voerende laag 1 (WVL1)	WVL1 kritieke grondwater-stand ^{II} [m+NAP]	WVL1 conclusie ^{III}	veiligheids-factor ^I water-voerende laag 2 (WVL2)	WVL2 kritieke grondwater-stand [m+NAP]	WVL2 conclusie
riolering deel 1	0 (0)	-6,5	freatisch	1,21 (1,29)	-4,83	geen
riolering deel 2	0 (0)	-6,5	freatisch	1,18 (1,26)	-4,93	geen
riolering deel 3	0 (0)	-6,55	freatisch	1,11 (1,18)	-5,15	geen
riolering deel 4	0 (0)	-6,75	freatisch	1 (1,07)	-5,55	geen
riolering deel 5	0 (0)	-6,95	freatisch	0,94 (1)	-5,75	spanning stand-by
pompput	0 (0)	-7,95	freatisch	0,38 (0,4)	-7,70	spanning
riolering deel 6	0 (0)	-6,74	freatisch	1,26 (1,33)	-4,58	geen
persleiding	0 (0)	-5,85	freatisch	1,62 (1,72)	-3,21	geen


- ! Op het moment dat de ontgravingsdiepte groter wordt dan opgegeven in tabel 3.3 zal de verticaal evenwichtsberekening herzien moeten worden;
- ! Bij sommige onderdelen in de bovenstaande tabel zal het verticaal evenwicht verslechteren zodra de ontgravingsbreedte groter wordt en/of talud minder steil wordt. In figuur 8 en de tabel eronder zijn de kritieke afmetingen opgenomen (indien van toepassing). Bij een grotere ontgravingsbreedte, en/of minder steil talud moet de verticaal evenwichtsberekening herzien worden. Bij de onderdelen welke ontbreken heeft het geen invloed wanneer de ontgravingsbreedte toeneemt en/of grondverbetering afneemt.

^I Veiligheidsfactor: eerste getal is de veiligheidsfactor bij de hoge grondwaterstand in de watervoerende laag en het opvolgende getal tussen haakjes is de veiligheidsfactor bij de gemiddelde grondwaterstand in de watervoerende laag.

^{II} Kritieke grondwaterstand: dit is de berekende noodzakelijke grondwaterstand in de desbetreffende watervoerende laag voor een stabiele ontgraving.

^{III} De volgende conclusies zijn mogelijk:

- **“geen”**: geen bemaling noodzakelijk voor het verticaal evenwicht in de desbetreffende watervoerende laag. In dit geval is de veiligheidsfactor groter dan 1.0 (bij het toepassen van materiaalfactor 0.9 voor de gronddruk) of het ontgravingsniveau is boven de grondwaterstand;
- **“spanning”**: spanningsbemaling maatregelen noodzakelijk ter voorkoming van verlies van verticaal evenwicht in de desbetreffende watervoerende laag. De veiligheidsfactor is kleiner dan 1.0 (bij het toepassen van materiaalfactor 0.9 voor de gronddruk);
- **“spanning stand-by”**: hetzelfde als spanning met als verschil dat een spanningsbemaling alleen nodig is bij een bovengemiddelde grondwaterstand in de watervoerende laag (kans is dus reëel dat de bemaling stand-by kan zijn tijdens de werkzaamheden);
- **“freatisch”**: in dit geval wordt de slecht doorlatende laag boven de watervoerende laag geheel ontgraven. Er is geen sprake van verlies van verticaal evenwicht, echter moet de watervoerende laag wel worden bemalen met een freatische bemaling;
- **“freatisch stand-by”**: hetzelfde als freatisch met als verschil dat een bemaling alleen nodig is bij een bovengemiddelde grondwaterstand in de watervoerende laag (kans is dus reëel dat de bemaling stand-by kan zijn tijdens de werkzaamheden).

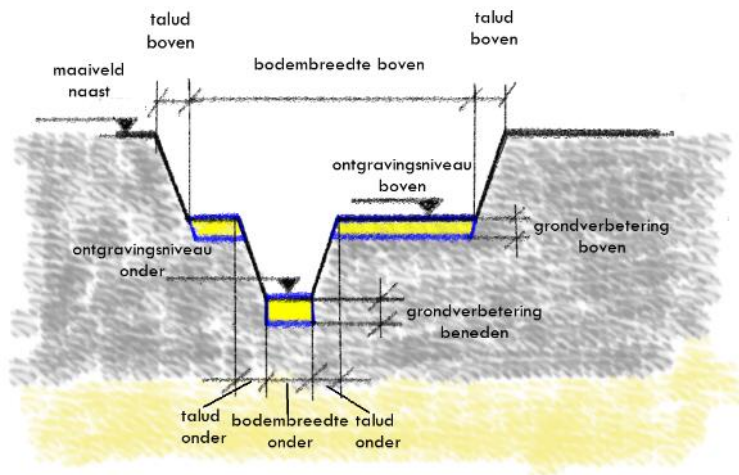

figuur 8 – schets doorsnede ontgraving met begrippen

uitgangspunt afmetingen ontgraving	maaiveld naast ontgraving [m+NAP]	talud boven	bodem breedte boven [m]	ontgravingsniveau boven [m+NAP]	grondverbetering boven [m]	talud onder	bodem breedte onder [m]	ontgravingsniveau onder [m+NAP]	grondverbetering onder [m]
riolering deel 1	-5,02	1:1	0,8	-6,5	0				
riolering deel 2	-5,02	1:1	2,5	-6	0	1:0,5	0,8	-6,5	0
riolering deel 3	-4,27	1:1	2,5	-6,55	0				
riolering deel 4	-5,02	1:1	2,5	-6,5	0	1:0,5	0,8	-6,75	0
riolering deel 5	-5,02	1:0	3	-6,95	0				
pompput	-5,02	1:1	2,5*	-7,95	0				
riolering deel 6	-4,55	1:1	0,8	-6,74	0				

$$f(\text{Boussinesq}) = (f_{\text{rechts}} + f_{\text{links}})/2 - (f_{\text{limiet-rechts}} + f_{\text{limiet-links}})/2$$

$$f(\text{Boussinesq}) = (f_{\text{rechts}} + f_{\text{links}})/2 - (f_{\text{limiet-rechts}} + f_{\text{limiet-links}})/2$$

$$f(\text{Boussinesq}) = (f_{\text{rechts}} + f_{\text{links}})/2 - (f_{\text{limiet-rechts}} + f_{\text{limiet-links}})/2$$

$$f_{\text{(Boussinesq)}} = (f_{\text{rechts}} + f_{\text{links}})/2 - (f_{\text{limiet-rechts}} + f_{\text{limiet-links}})/2$$

$$f_{\text{(Boussinesq)}} = (f_{\text{rechts}} + f_{\text{links}})/2 - (f_{\text{limiet-rechts}} + f_{\text{limiet-links}})/2$$

$$f(\text{Boussinesq}) = (f_{\text{rechts}} + f_{\text{links}})/2 - (f_{\text{limiet-rechts}} + f_{\text{limiet-links}})/2$$

REF=NAP

gvb=grondverbetering

$$f_{\text{(Boussinesq)}} = (f_{\text{rechts}} + f_{\text{links}})/2 - (f_{\text{limiet-rechts}} + f_{\text{limiet-links}})/2$$

Bijlage 1.4 – Grondbreuk en oppervlaktewater

Grondbreuk

Een belangrijke randvoorwaarde voor taludstabiliteit en voorkomen grondbreuk is dat het grondwater lager is dan het ontgravingsniveau. Stoorlagen tussen de grondwaterstand en ontgravingsniveau zijn een risico voor het uitspoelen en instabiliteit van het talud, wanneer deze aanwezig zijn moet gekeken worden of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Verticale waterremmende (dam)wanden worden niet toegepast, een controle op hydraulische grondbreuk is niet van toepassing.

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater welke in verbinding staat met watervoerende lag(en) heeft invloed op het project. De afstand tussen project en oppervlaktewater is vervolgens maatgevend. In de onderstaande tabel is weergegeven binnen welke afstand van (tussen project en oppervlaktewater) een faalmechanisme zal optreden bij een (goed) doorlatende waterbodem.

oppervlaktewater per onderdeel	afstand ^I [m]	water-peil [m+NAP]	water-bodem ^{II} [m+NAP]	faal-mechanisme ^{III} WVL1	kritieke afstand ^{IV} WVL1
riolering deel 1	1	-5,6	-6	verhang	3,1

! De invloed van oppervlaktewater is afhankelijk van diverse factoren. Het is mogelijk dit te onderzoeken (met een proefbemaling). Opgemerkt wordt dat de invloed van oppervlaktewater kan veranderen (tijdens het project), bijvoorbeeld de bodem kan beschadigen door baggerwerkzaamheden of een perforatie van de waterbodem (door derden).

^I Afstand tussen project en oppervlaktewater

^{II} Hoogte van de waterbodem

^{III} "geen" = geen faalmechanisme verwacht door oppervlaktewater

"verhang" = hier kan falen door kritiek verhang optreden, maatregelen bijvoorbeeld: tijdelijk oppervlaktewater dempen, waterremmende wanden toepassen en/of waterbodem dichtmaken.

"piping" = hier kan falen door piping optreden, maatregelen bijvoorbeeld: tijdelijk oppervlaktewater dempen, waterremmende wanden toepassen, waterbodem dichtmaken en/of additionele bemaling tussen het project en oppervlaktewater (op 50 à 90% afstand van het project).

^{IV} de kritieke afstand is de maximale afstand (ten opzichte van project) waar falen door oppervlaktewater mogelijk is. Bij piping staan twee afstanden (links = afstand door piping en rechts = afstand door kritiek verhang).

Bijlage 1.5 – Debiet, verlaging, verplaatsing grondwater per watervoerende laag en maaiveld daling


In de onderstaande tabel is per onderdeel het debiet weergegeven.

debiet per onderdeel [m ³ /uur]	maximale diepte bemaling [m+NAP]	diepte waterremmende wanden [m+NAP]	stationair debiet droog	stationair debiet normaal	stationair debiet extreem	toename opstart [%]	neerslag extreem
riolering deel 1	-6,7	geen	0,4	0,9	2,4	21%	0,4
riolering deel 2	-6,7	geen	0,4	0,9	2,4	12%	0,4
riolering deel 3	-6,65	geen	0,0	0,0	0,2	9%	0,6
riolering deel 4	-6,85	geen	0,5	1,1	2,7	21%	0,6
riolering deel 5	-17	geen	0,5	1,1	14,9	14%	0,3
pompput	-17	geen	44,5	72,3	116,0	9%	0,2
riolering deel 6	-6,84	geen	0,9	2,0	4,3	14%	0,4
persleiding	-6,7	geen	0,1	0,8	3,1	42%	0,5

In de onderstaande tabel is per onderdeel het waterbezwaar weergegeven.

waterbezwaar per onderdeel [m ³]	periode [dagen]	opstart [dagen]	waterbezwaar droog	waterbezwaar normaal	waterbezwaar maximum
riolering deel 1	5 x 4	2	167	511	1288
riolering deel 2	4 x 3	2	91	287	734
riolering deel 3	5 x 3	2	12	12	80
riolering deel 4	2 x 4	2	92	245	573
riolering deel 5	2 x 4	2	88	239	3047
pompput	5	2	4985	8983	14419
riolering deel 6	5 x 3	2	308	781	1700
persleiding	3	1	4	63	253

In de onderstaande grafiek(en) is de bandbreedte van het stationaire debiet weergegeven per watervoerende laag en per onderdeel. Het stationaire debiet is het debiet na bereiken van de gewenste verlaging, tijdens de opstart van de bemaling is het debiet hoger dan de weergegeven waarde in de grafiek.

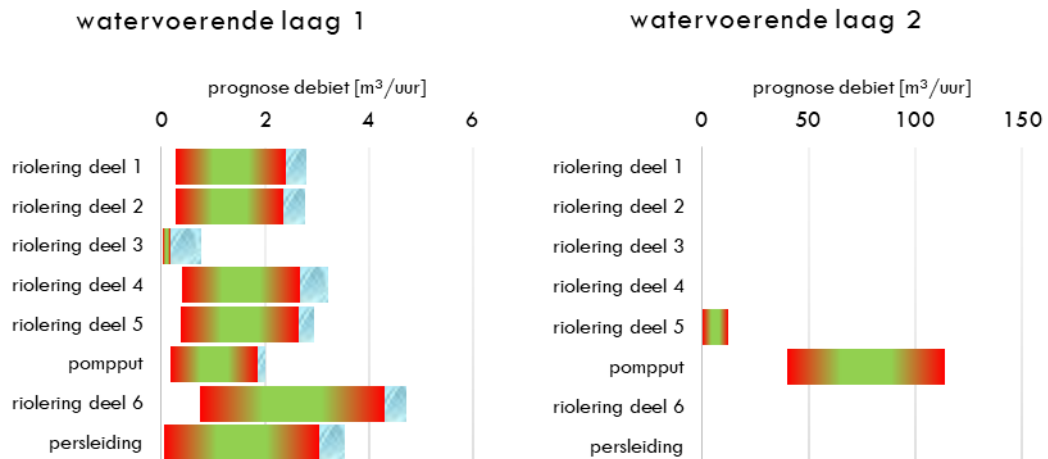


Legenda:


- groen = verwachte stationaire debiet
- rood = extreem laag/hoog stationaire debiet (hiermee dient rekening gehouden te worden)
- lichtblauw (met druppels) = effect extreme neerslag

! Het debiet is bepaald met een variabele doorlatendheid (k-waarde) en variabele grondwaterstand. Op het moment dat de bandbreedte (praktisch) te groot is kan door aanvullend onderzoek (meten grondwaterstand of geohydrologisch onderzoek) de bandbreedte kleiner gemaakt worden.

Grondwaterstand in omgeving

In de onderstaande grafieken is de grondwaterstand in de omgeving weergegeven. Op de x-as is de horizontale afstand (haaks op de projectlocatie), de y-as is de verwachte grondwaterstand ten opzichte van NAP.

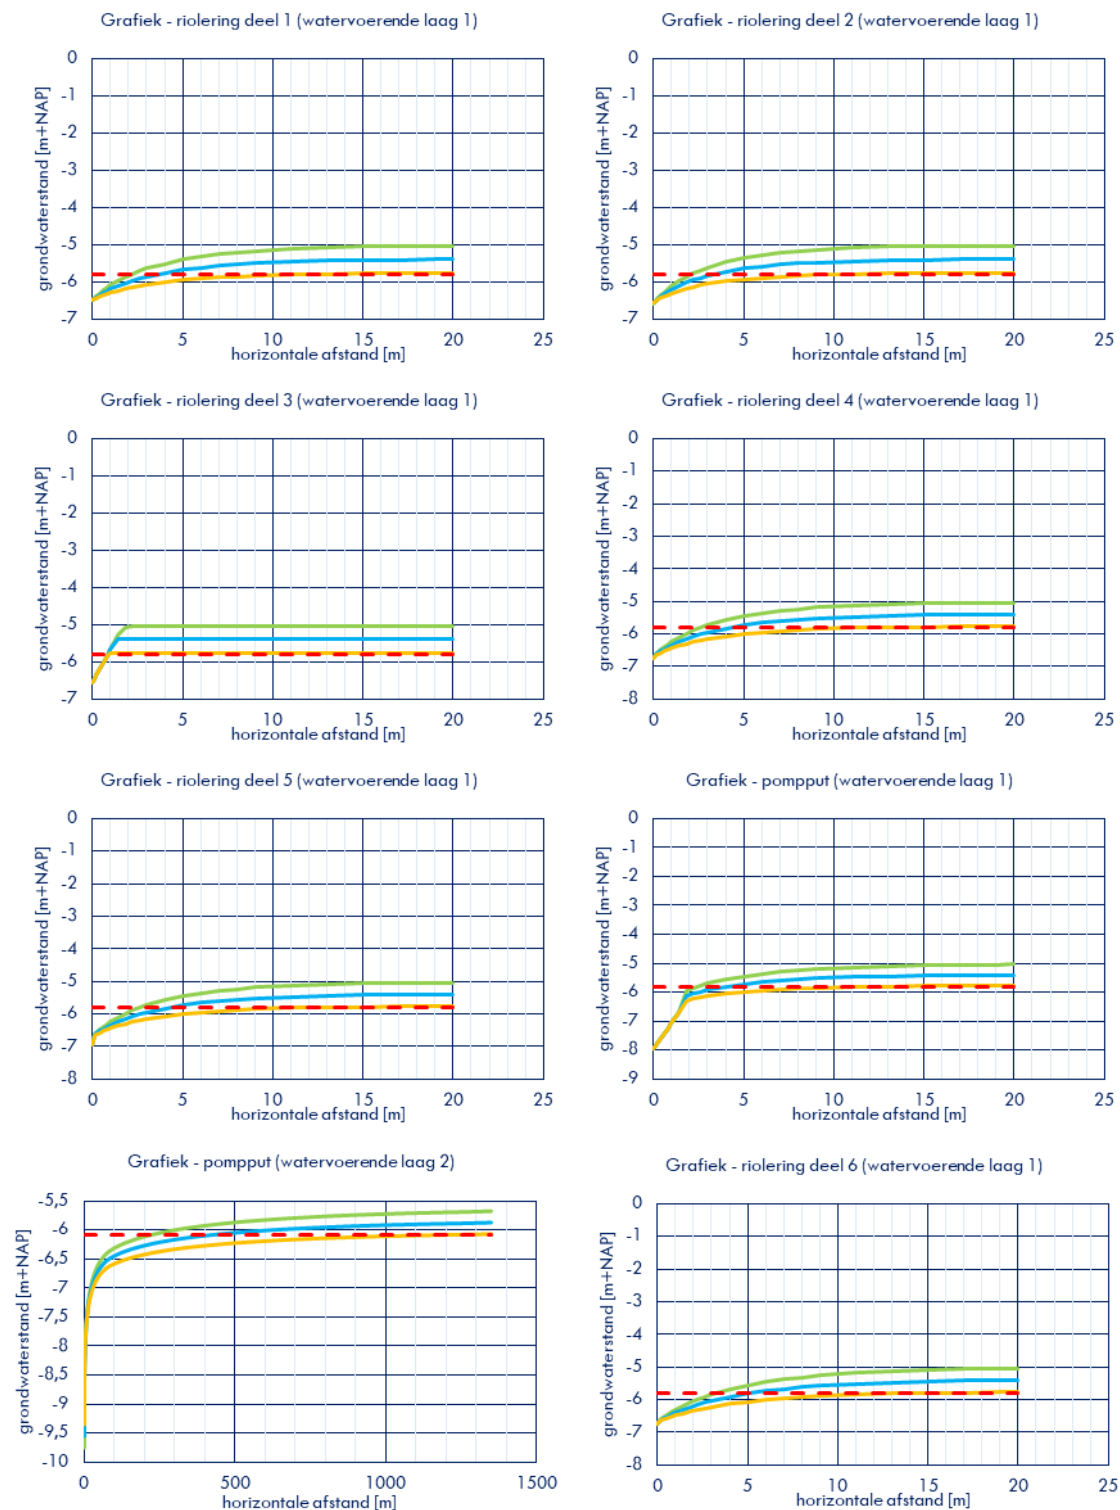

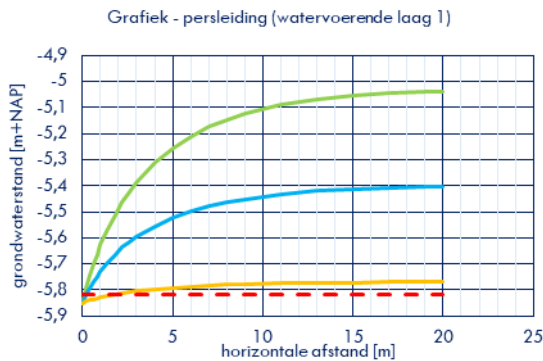

Legenda:

- blauwe lijn is de verwachte verlaging tijdens bemalen (bij natuurlijk gemiddelde grondwaterstand)
- oranje lijn is de verlaging tijdens bemalen in een extreem droge periode (bij natuurlijk lage grondwaterstand)
- groene lijn is de verlaging tijdens bemalen in een extreem natte periode (bij natuurlijk hoge grondwaterstand)
- rode gestippelde lijn is de natuurlijk lage grondwaterstand (voor meer informatie zie bijlage 1.2)

Wanneer de grondwaterstand niet verlaagd wordt beneden de natuurlijk lage grondwaterstand zijn er (door bemaling) verwaarloosbare negatieve gevolgen. Het gebied (afstand tot project) waar de grondwaterstand verlaagd wordt beneden de natuurlijk lage grondwaterstand wordt de reikwijdte van de bemaling genoemd. De reikwijdte is samengevat in de onderstaande tabel.

onderdelen	prognose reikwijdte ¹ [m] watervoerende laag 1	prognose reikwijdte [m] watervoerende laag 2
riolering deel 1	3,4 (2,1~10,4)	0 (0~0)
riolering deel 2	3,2 (2~9,1)	0 (0~0)
riolering deel 3	0,8 (0,8~0,9)	0 (0~0)
riolering deel 4	4,1 (2,5~11,2)	0 (0~0)
riolering deel 5	4,1 (2,6~11,2)	0 (0~0)
pompput	3,9 (2,4~11,6)	436,3 (227,2~1285,8)
riolering deel 6	4,9 (3,1~13,2)	0 (0~0)
persleiding	0,2 (0,1~1,6)	0 (0~0)

¹ Het getal betreft de afstand tot waar 5cm verlaging beneden de natuurlijk laagste grondwaterstand verwacht wordt. Het getal tussen haakjes betreft de bandbreedte afstand waar een verlaging beneden de natuurlijk laagste grondwaterstand mogelijk is, de bandbreedte is bepaald door een berekening bij extreem hoge tot extreem lage natuurlijke grondwaterstand.

Grondwaterstroming


In de onderstaande tabel is weergegeven op welke afstand (ten opzichte van de bemaling) het grondwater 1 m verplaatst en 10 m verplaatst door de bemaling. Daarnaast is de bemalingszone¹ weergegeven. Deze rekenwaarden zijn relevant voor bevoegd gezag bij het beoordelen van effecten op mobiele (grondwater) objecten zoals bodemenergie of grondwaterverontreiniging.

verplaatsing [m] grondwater (bandbreedte)	bemalings- zone water- voerende laag 1	1 m verplaatsing water- voerende laag 1	10 m verplaatsing water- voerende laag 1	bemalings- zone water- voerende laag 2	1 m verplaatsing water- voerende laag 2	10 m verplaatsing water- voerende laag 2
riolering deel 1	6 (4~8)	15 (10~19)	3 (2~4)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)
riolering deel 2	5 (4~7)	12 (9~16)	3 (2~4)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)
riolering deel 3	1 (0~1)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)
riolering deel 4	7 (5~9)	16 (11~20)	4 (3~5)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)
riolering deel 5	7 (5~9)	16 (11~20)	4 (3~5)	5 (3~6)	47 (33~61)	1 (1~1)
pompput	7 (5~9)	17 (12~22)	5 (4~7)	32 (23~42)	552 (386~717)	69 (48~90)
riolering deel 6	6 (4~8)	16 (12~21)	3 (2~4)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)
persleiding	4 (3~5)	11 (8~14)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)	0 (0~0)

¹ Bemalingszone = gebied rondom bemaling waarbij geldt dat het grondwater in de bemaling terecht komt

Maaiveldddaling

In de onderstaande grafiek is weergegeven welke maaiveldddaling verwacht wordt in de omgeving van een bemaling (horizontale as is de afstand ten opzichte van het project). Daarbij zijn vier scenario's¹ beschouwd.

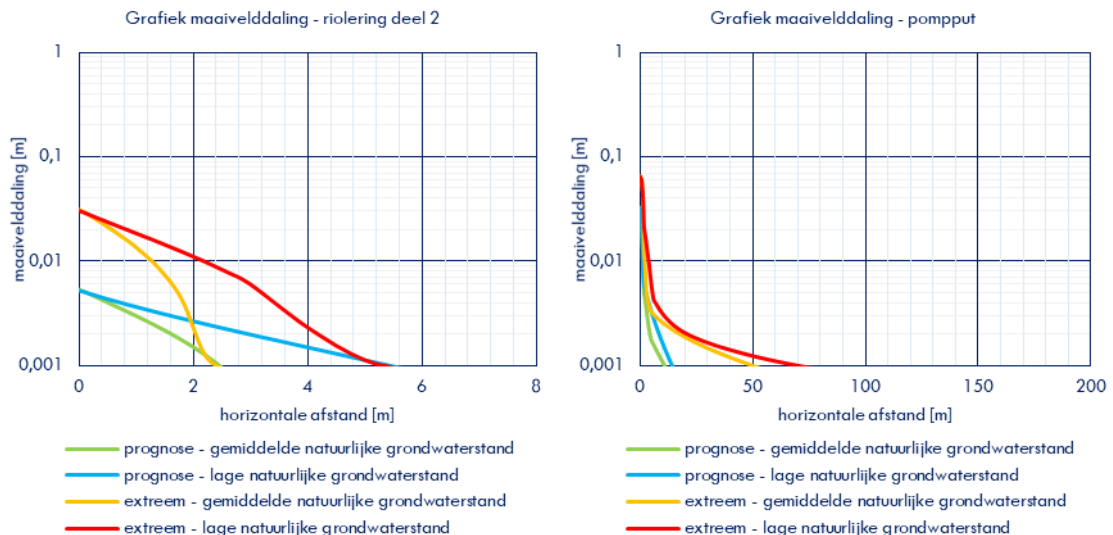

In de onderstaande tabel is de maximale afstand ten opzichte van de bemaling weergegeven waar 3 mm en 8 mm maaiveldddaling wordt verwacht bij de 4 scenario's. De waarden in de tabel zijn bepaald door bij de grondwaterstandsverlaging de bijhorende maaiveldddaling te zoeken. Opgemerkt wordt dat de maaiveldddaling niet opgeteld moet worden van verschillende onderdelen welke overlappen met elkaar.

Afstand [m] 3 mm en 8 mm "maaiveldddaling per scenario	3mm scenario 1	3mm scenario 2	3mm scenario 3	3mm scenario 4	8mm scenario 1	8mm scenario 2	8mm scenario 3	8mm scenario 4
riolering deel 1	1	2	2	4	0	0	2	3
riolering deel 2	1	2	2	4	0	0	2	3
riolering deel 3	0	0	1	1	0	0	1	1
riolering deel 4	2	3	3	5	0	0	2	4
riolering deel 5	2	3	3	5	0	0	2	4
pompput	3	6	7	11	2	2	2	5
riolering deel 6	0	1	3	6	0	0	2	4
persleiding	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ De volgende scenario's zijn beschouwd:

- Prognose – gemiddelde grondwaterstand: dit is de maaiveldddaling bij een gemiddelde natuurlijke grondwaterstand en een normale voorbelasting van de bodem (kans dat dit optreedt is circa 50%);
- Prognose – lage grondwaterstand: dit is de maaiveldddaling bij een zeer lage natuurlijke grondwaterstand en een normale voorbelasting van de bodem;
- Extreem – gemiddelde grondwaterstand: dit is de maaiveldddaling bij een gemiddelde natuurlijke grondwaterstand en een geringe voorbelasting van de bodem;
- Extreem – lage grondwaterstand: dit is de maaiveldddaling bij een zeer lage natuurlijke grondwaterstand en een geringe voorbelasting van de bodem (kans dat dit optreedt is <1%)

¹¹ Bij 8 mm maaiveldddaling (of meer) is het gewenst een schadeprognose uit te voeren bij de gevoelige objecten. Bij 3 mm maaiveldddaling (of meer) is het gewenst een (exterieur) vooropname uit te voeren bij gevoelige objecten.

Bijlage 1.6 – Analyse (GIS-kaarten) en effect op omgeving

Effect Belendingen

Bouwjaar belendingen (kadaster – Basisregistraties Adressen en Gebouwen)



Kadaster - Basisregistraties Adressen en Gebouwen legenda

 Pand voor 1800	 Pand 1945 - 1960	 Pand 2005 - heden
 Pand 1800 - 1850	 Pand 1960 - 1975	
 Pand 1850 - 1900	 Pand 1975 - 1985	
 Pand 1900 - 1930	 Pand 1985 - 1995	
 Pand 1930 - 1945	 Pand 1995 - 2005	

Het effect van de bemaling op de belendingen is ingeschat met behulp van de SBR richtlijn (1). De schadecategorie is bepaald met behulp van de maaiveldddaling berekeningen “prognose” en “extreem” en beoordeling effect op houten funderingsdelen.

Schadecategorieën 1 tot en met 3 vallen nog onder de niet-voorzienbare schade en zijn dan ook verzekeraar. Schadecategorie 4 valt onder voorzienbare schade is niet verzekeraar. In de onderstaande tabel is per belending weergegeven in welk effect verwacht wordt door de bemaling.

Belendingen	Bouwjaar	Verwachting (inschatting of op basis van archieffgegevens) funderingswijze	BK hout [m+NAP]	Droog- stand [dagen]	Maaiveld- daling [mm]	Gebouw- zakking ¹ [%]	Rotatie gebouw ¹¹
Industrieweg 2	1989	beton stuit	geen	0	0	7%	<1:5000
Stationsweg 18	1957	hout opzetter stuit	-6,82	0	0	15%	<1:5000
Rondweg 2+3	1920	hout stuit	-5,77	0~3	0	25%	<1:5000
pand ten zuiden van Rondweg 3	1898	hout stuit	-5,77	0~3	0~2	25%	<1:5000
Nutslaan 14-18	1908	gemengd	geen	0	0	7%	<1:5000
Nijverheidsweg 10	1975	beton stuit	geen	0	0	7%	<1:5000
Nijverheidsweg 16A-C	1970	beton stuit	geen	0	0~1	7%	<1:5000
Nijverheidsweg 18A-C	2016	beton stuit	geen	0	0~1	7%	<1:5000
Nijverheidsweg 20	1970	beton stuit	geen	0	0~1	7%	<1:5000
Nijverheidsweg 22	1996	beton stuit	geen	0	0	7%	<1:5000
Nijverheidsweg 24	1980	beton stuit	geen	0	0	7%	<1:5000
Bozenhoven 4	1809	op staal	geen	0	0	75%	<1:5000

In de onderstaande tabel is aangegeven welk effect verwacht wordt bij de belendingen. In kleuren is aangegeven of het effect op de belendingen acceptabel is in de huidige bouwpraktijk (volgens SBR273.98). De kleuren groen, geel en oranje zijn acceptabel in de tabel. Bij geel en oranje in de tabel is monitoring vereist zodat schade beheerst kan worden, bij groen is dit optioneel (wegens de lage kans). Bij rood of paars in de tabel is er sprake dat onaanvaardbare schade waarschijnlijk optreedt, in dit geval zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Deze aanvullende maatregelen kunnen bestaan uit compenserende maatregelen (financieel of constructief versterken), aanpassing bouw wijze, etc.


Belendingen	aantal	effect houten palen	schade- categorie prognose	schade- categorie extreem	architectonische schadekans	constructieve schadekans
Industrieweg 2	1	geen effect	0	0	geen	geen
Stationsweg 18	1	geen effect	0	0	geen	geen
Rondweg 2+3	2	geen effect	0	0	geen	geen
pand ten zuiden van Rondweg 3	1	geen effect	0~1	0~1	zeer geringe kans	geen
Nutslaan 14-18	3	geen effect	0	0	geen	geen
Nijverheidsweg 10	1	geen effect	0	0	geen	geen
Nijverheidsweg 16A-C	1	geen effect	0	0	geen	geen
Nijverheidsweg 18A-C	3	geen effect	0	0	geen	geen
Nijverheidsweg 20	1	geen effect	0	0	geen	geen
Nijverheidsweg 22	1	geen effect	0	0	geen	geen
Nijverheidsweg 24	1	geen effect	0	0	geen	geen
Bozenhoven 4	1	geen effect	0	0	geen	geen

¹ Het percentage dat het gebouw zakt ten opzichte van de verwachte maaiveld daling. Dit percentage is afgeleid uit de SBR273.98 richtlijn.

¹¹ Het zettingsverhang is bepaald ter plaats van het gebouw, deze is vermenigvuldigd met het gebouwszakking percentage om te bepalen hoeveel het gebouw zal roteren

Effect grondwatergebruikers


Grondwatergebruikers (GBO en landelijk grondwaterregister)

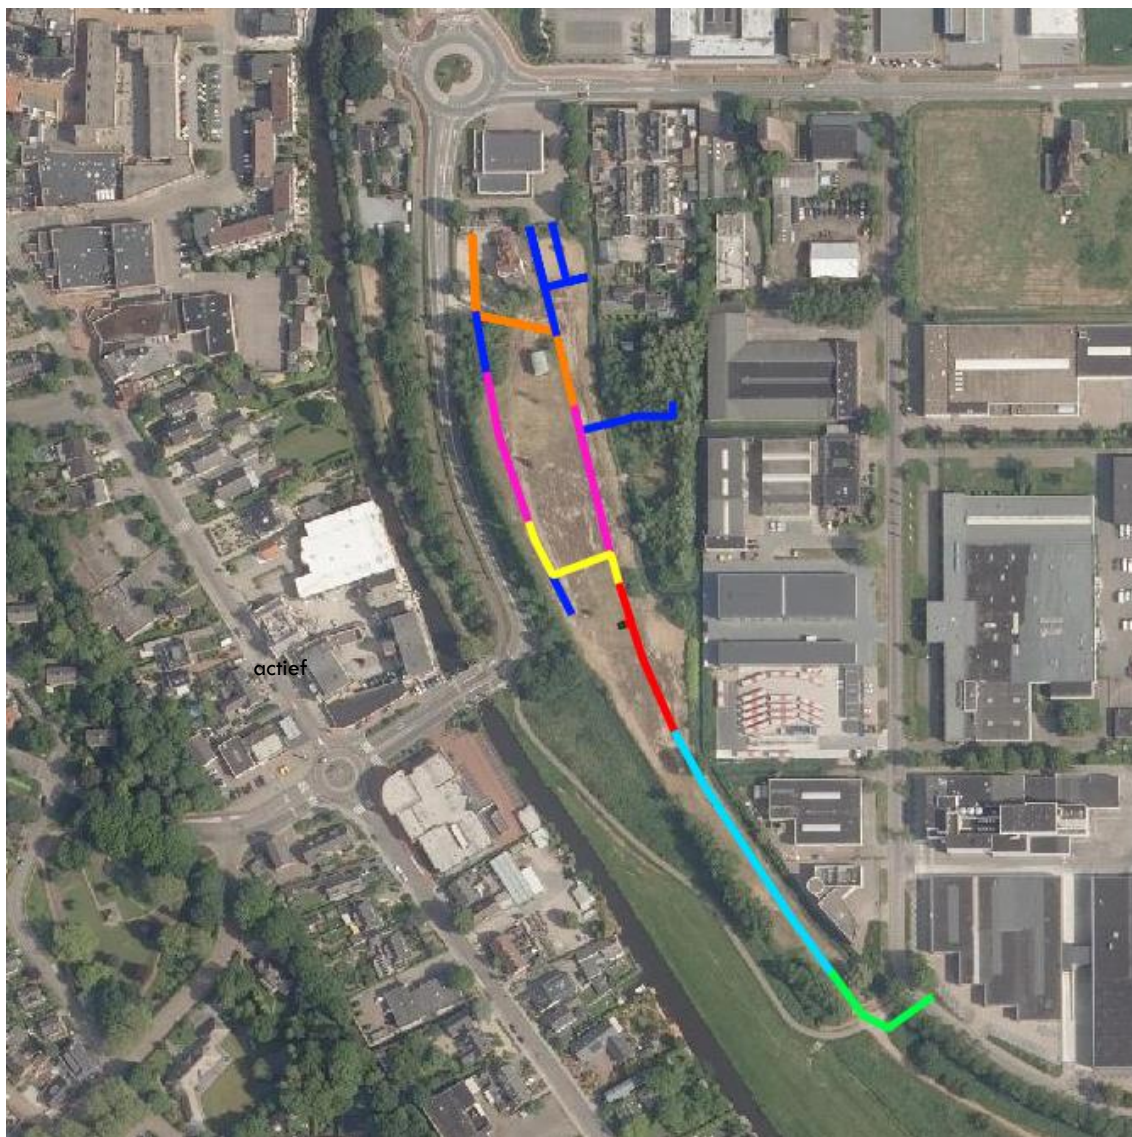

Grondwaterbescherming en -onttrekking (GBO Provincies+LGR) legenda

-  Put
-  Put
-  Grondwaterbescherming gebied

WKO installaties (landelijk grondwaterregister)

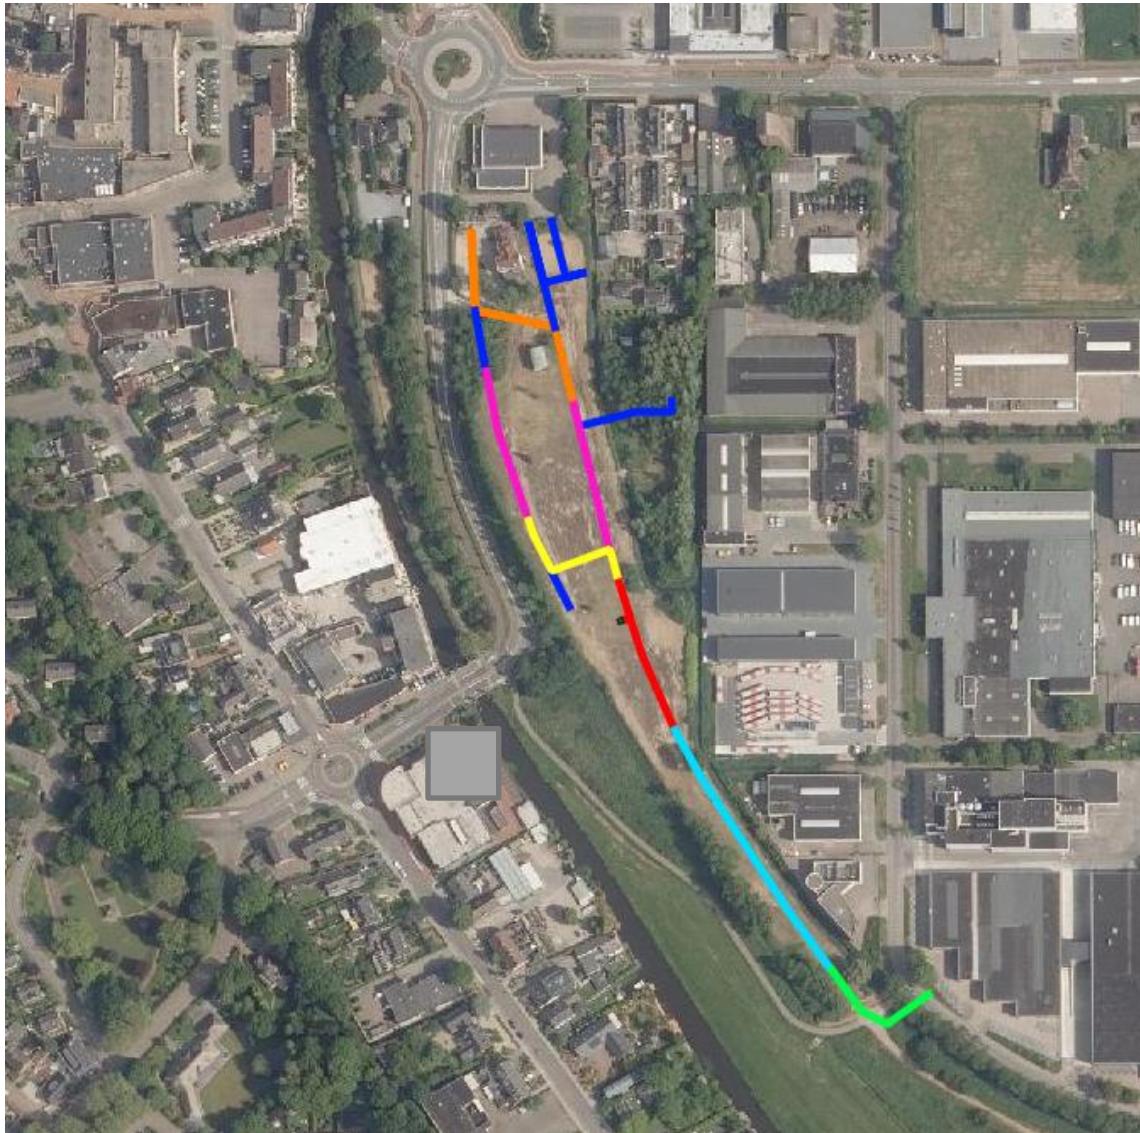

WKO installaties (LGR) legenda



Het effect op de grondwatergebruikers is ingeschat aan de hand van de verwachte verlaging van de grondwaterstand ter hoogte van het filtergebied van de grondwatergebruiker. Bij een WKO installatie is het thermisch verlies ingeschat met behulp van berekening verplaatsing grondwater. In de onderstaande tabel is per grondwatergebruiker weergegeven welk effect verwacht wordt. Bij capaciteits-/thermisch verlies groter dan 5% is het effect meetbaar.

Grondwatergebruikers	Filtergebied [m+NAP]	Thermische straal [m]	Verlaging [m]	Capaciteitsverlies [%]	Verplaatsing [m]	Thermisch verlies [%]
Bozenhoven 93	-30~-50	15	0,6~0,7	5%	1~1,2	4~5%

Mobiele verontreiniging

Bodemverontreinigingen (bodemloket.nl)



Rijkswaterstaat bodemloket legenda

	Gesaneerd
	Onderzoek uitgevoerd, geen noodzaak tot verder onderzoek of sanering
	Onderzoek uitgevoerd, verder onderzoek kan noodzakelijk zijn
	Historische activiteit bekend

De vlekken zijn onderzocht (navraag bij omgevingsdienst) op de bovenstaande figuur is de conclusie weergegeven (BI=buiten invloedsgebied, GG=geen grondwaterverontreiniging boven interventiewaarde, WG=wel grondwaterverontreiniging boven interventiewaarde)


Het effect op mobiele verontreinigingen is ingeschat met behulp van RIZA rapport nummer 2002.025. Nadat de retardatiefactor is bepaald, is uitgerekend in welke mate de meest mobiele stof (per vlek) verplaatst (zowel horizontaal als nieuw verontreinigd volume). Op het moment dat er sprake is van overschrijding dan betekent dit dat de mobiele verontreiniging meer dan 5 m verplaatst of als er sprake is van meer dan 100 m³ nieuw verontreinigd volume. In de onderstaande tabel is per mobiele verontreiniging weergegeven welk effect verwacht wordt.

Mobiele verontreiniging	diameter vlek [m]	diepte [m+NAP]	richting	retardatie- factor	ver- plaatsing [m]	nieuw volume [m ³]	overschrijdings- kans ¹ [%]
restverontreiniging terrein	60	-5~-6	noordoost	3 (benzeen)	0~3	59~106	10%

¹ De overschrijdingskans is ingeschat door de verplaatsing bij verschillende uitgangspunten te vergelijken (hoge/lage grondwaterstand, hoge/lage doorlatendheid, etc.)

Natuur, landbouw, archeologie en/of oppervlaktewater


Natura 2000 gebieden

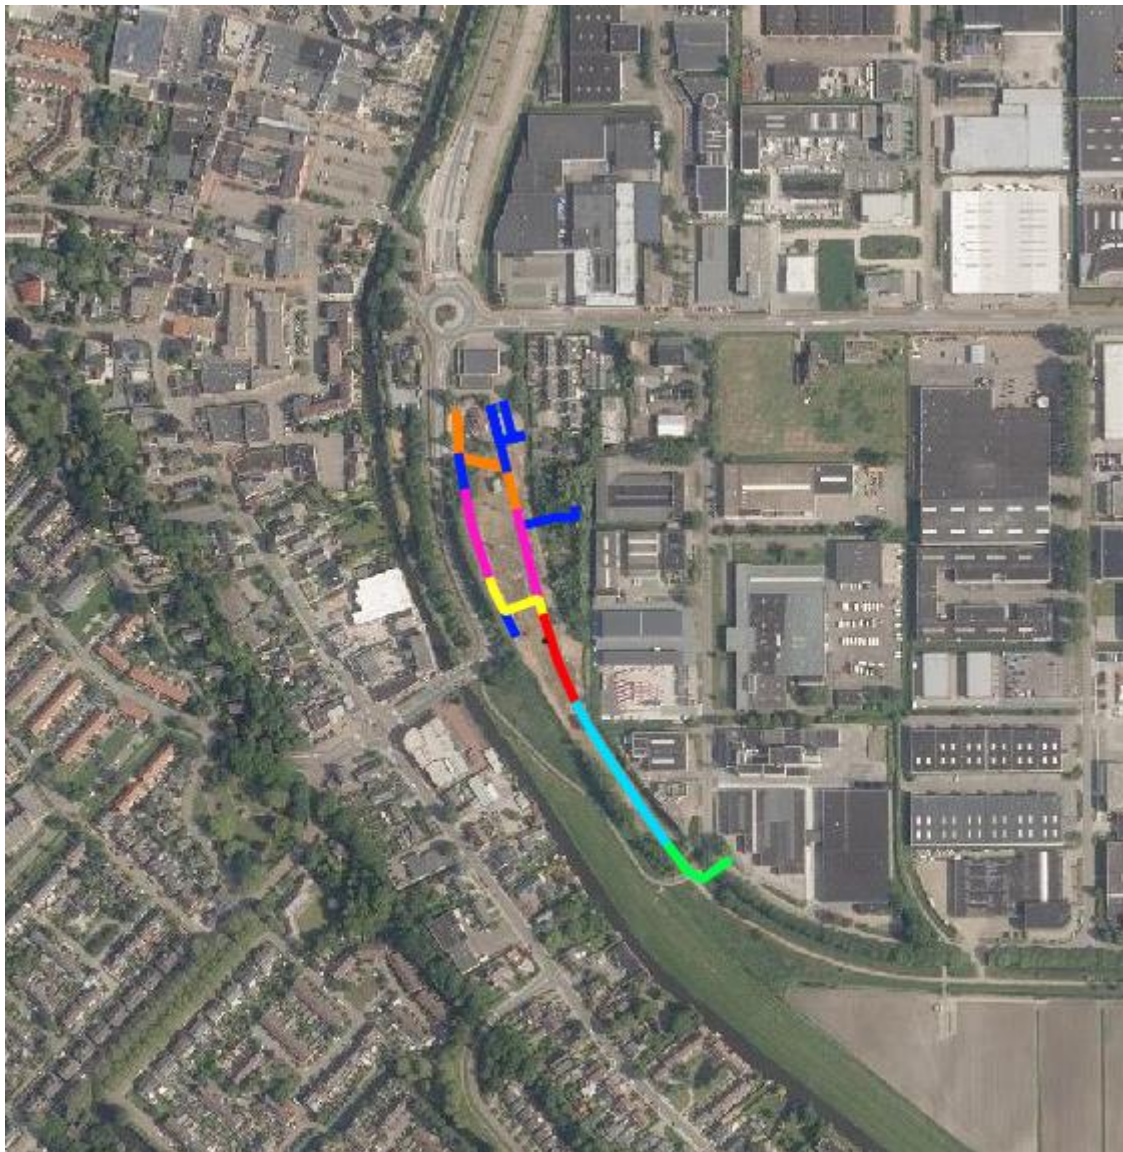

Natura 2000 gebieden (Publieke Dienstverlening op kaart) legenda

	Habitatrichtlijn		Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
	Vogelrichtlijn		Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet
	Habitatrichtlijn en Natuurbeschermingswet		Vogelrichtlijn en Natuurbeschermingswet

Gewassen (basisregistratie percelen)

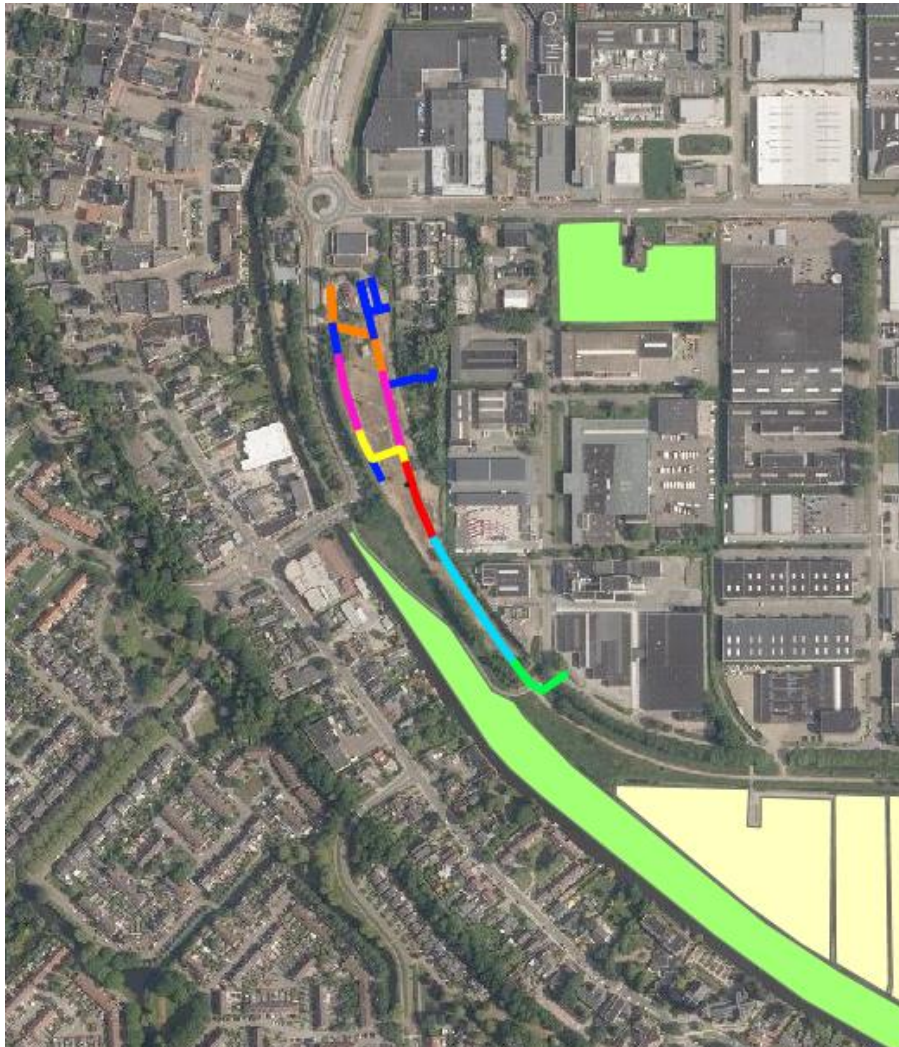

Basisregistratie Percelen (Dienst Regelingen) legenda

	Bouwland		Overige
	Grasland		
	Braakland		
	Natuurterrein		

Op het moment dat er gewassen aanwezig zijn, dan wordt dit weergegeven als “bouwland” (geel) in de bovenstaande figuur, deze gewassen zijn per definitie gevoelig voor een wijziging van de grondwaterstand in het groeiseizoen (maart-november). Groen (grasland) is niet afhankelijk van de grondwaterstand, er ontstaat hier in de praktijk geen schade bij bemalingen naast gras.

Tot slot is braakland (onbegroeide grond) niet gevoelig voor grondwaterstandsverlaging. Wel is natuurterrein gevoelig (bomen, struiken, etc.), de natuur wordt overigens ook bepaald met behulp van luchtfoto's en overige bronnen (niet alleen met de basisregistratie).

Archeologie en rijksmonumenten



IKAW Monumentenkaart, Rijksdienst Cultureel Erfgoed legenda

● Locatie Rijksmonument

■ Omtrek locatie archeologie (IKAW)

De natuur, landbouw, archeologie en oppervlaktewater zijn gevoelig voor een verlaging van de freatische grondwaterstand. Aan de hand van de verwachte grondwaterstandsverlaging is per object in de omgeving ingeschat of er sprake is van een schadekans. Een schadekans is aanwezig bij een verlaging welke groter is dan 0,05 m.

Opgemerkt dat bij natuur en landbouw alleen schade verwacht wordt bij werkzaamheden in het groeiseizoen (periode maart tot en met november). De schade bij landbouw en natuur is bij een korte bemalingsperiode (<7 dagen) meestal verwaarloosbare groeischade. Bij langere freatische grondwaterstand verlagingen in het groeiseizoen kan gedacht worden aan ernstige gevolgen (zoals grote groeischade tot afsterven natuur/gewassen/dieren).

In de onderstaande tabel is per object weergegeven welk effect verwacht wordt.

oppervlaktewater, landbouw, archeologie en natuur	categorie	polder	bodemweerstand [dagen]	oppervlakte [m ²]	verlaging freatisch [m]	schadekans [%]	prognose debiet wegwijzing [m ³ /dag]
gewassen ten zuiden Energieweg 13	landbouw	ja			0	0%	
objecten middeleeuwen tot heden	archeologie	ja			0	0%	
sloot	water	ja	100	250	0,7~1,2	0%	2~3
bomen langs Rondweg	natuur	ja			0,2~0,4	10%	

Groen = schade onwaarschijnlijk, geen aanvullende stappen noodzakelijk;


Geel = schade mogelijk, minimale monitoring gewenst;

Oranje = schade waarschijnlijk, monitoring en plan maatregelen gereed;

Rood/paars = schade zeer waarschijnlijk, monitoring, plan en compenserende maatregelen direct installeren/uitvoeren.

Spoor en waterkering

Open street map (spoor)

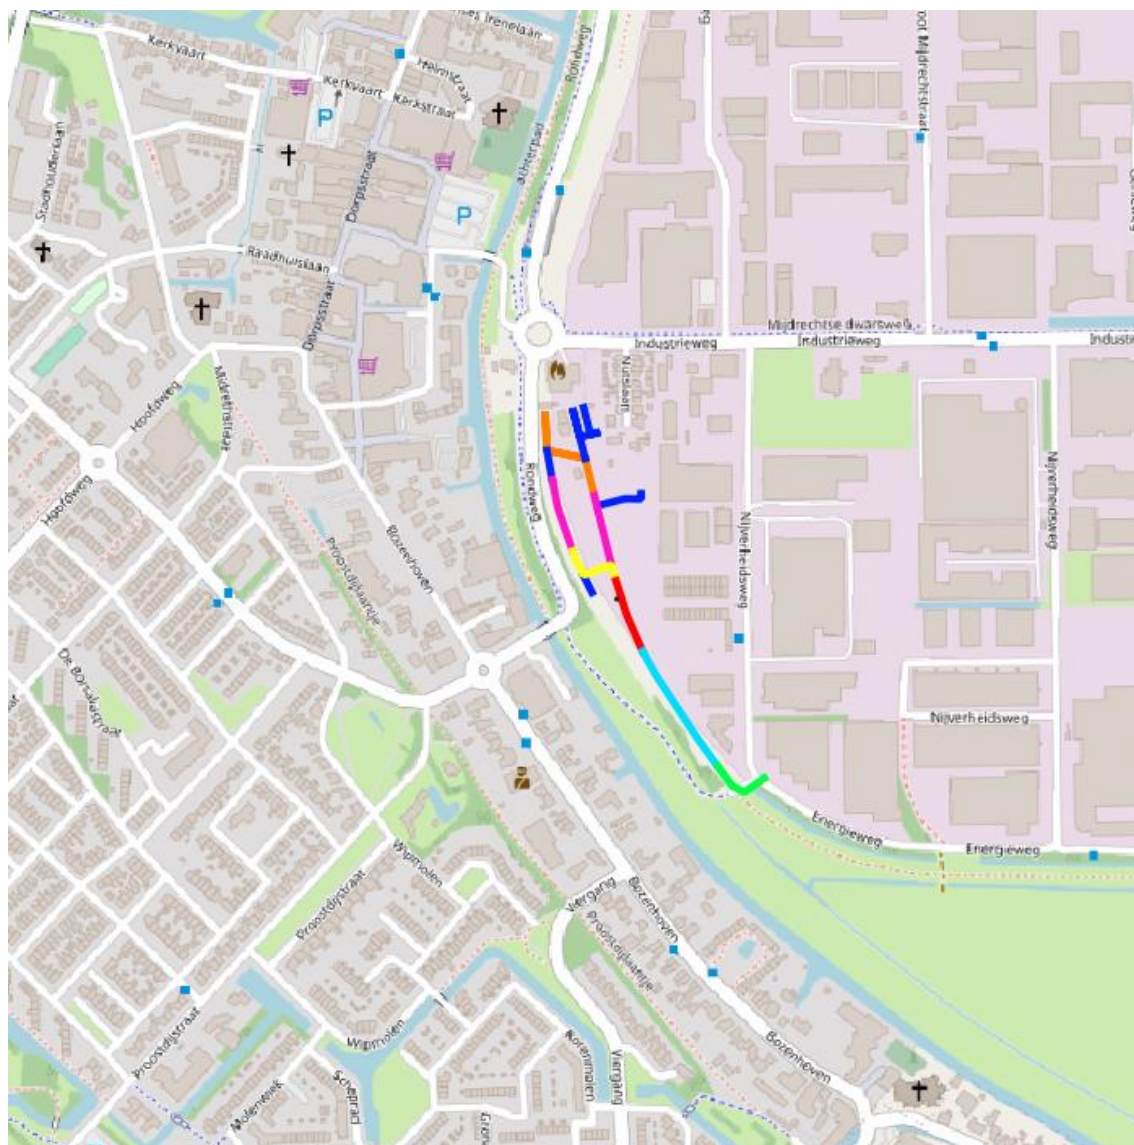

Open Street Map

 Snelweg	 Fietspad	 Water
 Hoofdweg	 Promenade	 Grasland
 Regionale weg	 Spoorbaan	 Akkerland
 Lokale weg	 Bomen	

Waterkeringen en gebieden bevoegd gezag



- ✓ Waterkering
- Bescherminingszone

Aan de hand van de legger en algemene hoogtekaart Nederland (AHN) is bepaald welk verschil zit tussen recente maaiveldhoogte en minimale kruinhoogte.

In de onderstaande tabel is per object (spoor of waterkering) weergegeven welk effect verwacht wordt.

Overige	Norm	Grenswaarde zakking [mm]	Grenswaarde zettings- verhang [1:...]	Maaiveld- daling prognose [mm]	Zettings- verhang prognose [1:...]	Overschrijdings- kans grenswaarde
P1015-003	Legger	33		0~1		0%

Bijlage 1.7 – Risicoanalyse project

Dit project wordt beoordeeld op basis van de risico's en gevoeligheid voor details (van uitvoering). Geconcludeerd is dat de moeilijkheidsgraad van dit project hoog is.


Algemene toelichting

- Lage moeilijkheidsgraad bemaling: de bemaling kan naar verwachting uitgevoerd worden door de meeste partijen;
- Gemiddelde moeilijkheidsgraad bemaling: uit het bemalingsplan moet blijken of de bemalingsaannemer de risico's goed beheerst, indien dit het geval is dan is de kans op slagen goed.
- Hoge moeilijkheidsgraad bemaling: veel details kunnen het resultaat ernstig beïnvloeden. Uit onze ervaring is gebleken dat de kans op problemen hoog is (circa 50%), samenwerking en consensus tussen adviseur en bemalingsaannemer is noodzakelijk. De bemalingsaannemer en adviseur maken in overleg het definitief bemalingsadvies en –plan. Bij onvoldoende onderling vertrouwen zal de adviseur of de bemalingsaannemer genoodzaakt zijn zich terug te trekken. Indien de bemalingsaannemer verder gaat zal deze zelf het definitief bemalingsadvies en –plan op moeten (laten) stellen. Loots kan vervolgens wel een management rol spelen bij de beoordeling van risico's van het plan van de aannemer (zodat duidelijke afspraken ten aanzien van de risicodragers gemaakt kunnen worden).

Kwaliteitsborging

1. Bij een lage moeilijkheidsgraad geen aanvullende stappen, bij een gemiddelde tot hoge moeilijkheidsgraad is de eerste stap te laten beoordelen of de aanbieder en onderaannemer bemaling overeenkomt met het advies (zorg dat dit duidelijk is);
2. Bij een hoge moeilijkheidsgraad wordt de onderaannemer bemaling gevraagd 3 referenties (inclusief contactpersoon wordt hoger beoordeeld) te geven van een vergelijkbare bemaling.

Risicomanagement is een cyclisch proces dat gedurende een project regelmatig moet worden doorlopen. Projecten blijven in beweging, risico's kunnen door de tijd worden ingehaald of zijn afgenomen. Nieuwe risico's kunnen de kop opsteken. Risico's zullen dan ook op regelmatige basis gemonitord en beheerst moeten worden. De onderstaande cyclus moet regelmatig doorlopen worden. Indien een vraag negatief beantwoord zijn de risico's onbeheerst, dat wil zeggen schadekans van het project en/of de omgeving toeneemt.

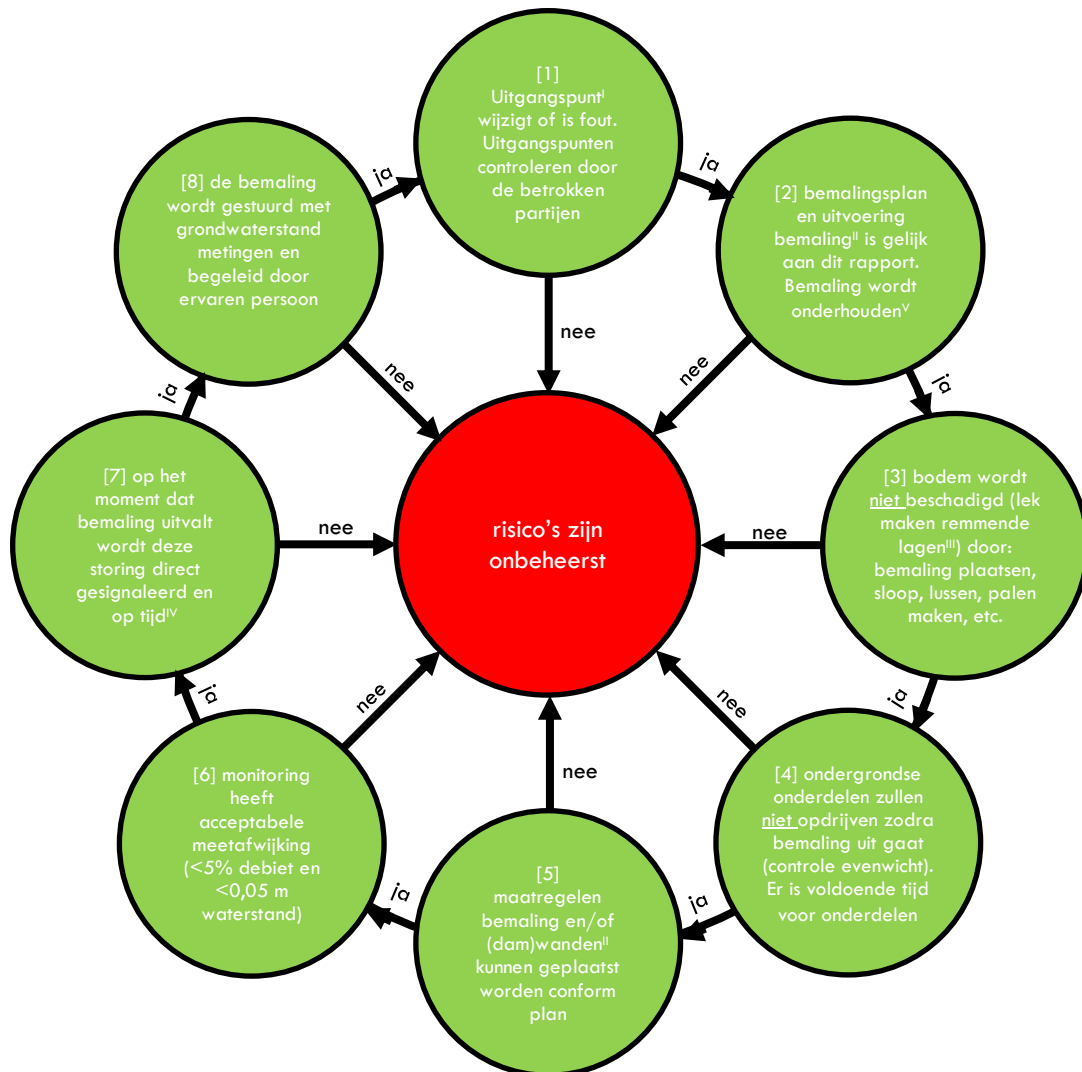

Figuur 9 – controle cyclus risicomanagement, de 8 basiselementen voor een beheerste bemaling

^I Bijvoorbeeld afmetingen wijzigen, nieuw grondonderzoek is beschikbaar, actuele grondwaterstand wijkt af, in de omgeving een wijziging (nieuwe grondwateronttrekking, belending, etc.)

^{II} Bij alternatieve afwijkende uitvoeringswijze zijn risico's onbeheerst. Een niet uitvoerbaar ontwerp zo snel mogelijk signaleren is belangrijk ter voorkoming van stagnatie (bijvoorbeeld door obstakels in de bodem). Bij bemalingsmaterieel van lagere kwaliteit extra reserve bronnen/pompen toepassen.

^{III} Remmende lagen zijn bijvoorbeeld klei, veen en/of leem

^{IV} De beschikbare tijd is ingeschat en per onderdeel samengevat in tabel 4.1A. De storing moet verholpen worden binnen deze tijd. Bijvoorbeeld een open bemaling faalt en er is 1,5 uur beschikbaar, dit betekent dat de storingsdienst binnen 25 km afstand aanwezig moet zijn (bij snelheid 50km/uur en 1 uur voor voorbereiding en afhandelen storing).

^V In het bemalingsplan en bij de uitvoering wordt onderhoud toegepast zodat de bemaling de gehele periode blijft functioneren en bijvoorbeeld niet zal verstoppert of teruglopen in capaciteit.

Indien de controle cyclus positief is, dan zijn de risico's zoals verder bepaald in dit rapport van toepassing en kan worden gesteld dat de bemaling, monitoring en vervolgstappen nog steeds afgestemd zijn op de risico's.

Een **risico** = **gevolg (A=100, B=50 en C=10) x kans^I x aantal gevallen. De risico's in dit hoofdstuk hebben als doel het inzichtelijk maken voor opdrachtgevers waarom monitoring en vervolgstappen aanbevolen worden. Elke vervolgstap en monitoring komt voort uit een risico en is dus doelmatig.**

In de onderstaande figuur is een toelichting gegeven voor de **gevolg** classificering, bij elk risico wordt ingeschat welke classificering het beste past.



Figuur 10 –klasse A tot en met C, de gevolgen zijn rechts van de klasse beschreven in het grijze vlak. Het kan zijn dat een of meerdere gevolgen van toepassing zijn.

In de onderstaande tabel zijn de risico's weergegeven (van hoog naar laag). Risicomanagement is gebaseerd op basis van richtlijnen en praktijkervaring Loots. Het doel van risicomanagement is duidelijkheid voor de opdrachtgever, in een tabel aangeven wat het belangrijkste is en welke maatregelen toe te passen om het beheersen.

! Risico's in onderstaande tabel moeten zo worden vertaald: risico>75=zeer hoog risico, risico>50=hoog risico, risico>25=matig risico en risico<25=laag risico^{II}

tabel 5.4-A

omschrijving risico	G ^{II}	kans	risico	maatregel
bouwputbodemborst op door verlies verticaal evenwicht	A	100%	100	Het meten van de stijghoogte (grondwaterstand) op de projectlocatie, hiermee de spanningsbemaling sturen. Daarnaast voldoende reservepompen/-energie voor storing op te vangen.
geconcludeerd is dat de moeilijkheidsgraad van dit project hoog is. Als de bemaler onvoldoende aandacht en kennis besteed aan de uitvoering zijn risico's op grote schade (verspreiding grondwaterverontreiniging naar diepere watervoerende lagen)	A	95%	95	kwaliteit borgen (toetsen plan en uitvoering), hiermee voorkomen dat schade kan ontstaan. Bemaler voor bemaling watervoerende laag 2 moet beschikken over SIKB BRL2100 certificering, een boommeester en zuigboorstelling.
een mobiele verontreiniging komt in de bemaling, hierdoor wordt lozingsnorm overschreden.	A	90%	90	grondwaterkwaliteit regelmatig bepalen in de bodem op enkele meters afstand van de bemaling (monsternamen) of preventief een waterzuivering toepassen.

^I De **kans** dat een **gevolg** zal optreden is bepaald door meerdere berekeningen uit te voeren per risico (bijvoorbeeld debiet uitrekenen bij hoge + lage doorlatendheid en hoge + lage grondwaterstand). Een hoge grondwaterstand (2,5% kans op voorkomen) x een hoge doorlatendheid (2,5% kans van voorkomen) resulteert bijvoorbeeld in een hoog debiet (waarvan de kans dat deze optreedt kleiner is dan 1% (2,5% x 2,5%). Zo zijn ook voor omgevingsobjecten beoordeeld welk effect zal optreden bij hoge, gemiddelde en lage grondwaterstand.

^{II} G= gevolg klasse

omschrijving risico	G ^{II}	kans	risico	maatregel
een schadelijke stof (volgens BLBI) wordt in een te hoge concentratie geloosd in lozingspunt(en), hierdoor ontstaat schade aan het milieu	A	90%	90	altijd opletten (stank/verkleuring) en bij twijfel direct actie ondernemen. Wanneer het water (mogelijk) niet voldoet aan de BLBI norm, dan overleg met geohydroloog over toe te passen maatregelen.
door vaste delen in het lozingswater ontstaat een verstopping in het watersysteem bij het lozingspunt	B	100%	50	het toepassen van een zandvanger voor het lozingspunt
het water verkleurd bij lozingspunt (door ijzer), hierdoor ontstaat schade aan het milieu	B	99%	50	het bepalen van ijzergehalte in grondwater voor de start van werkzaamheden en tijdens werkzaamheden de kleur bij het lozingspunt visueel beoordelen en registreren (foto). Bij verkleuring en lage debieten (<5 m ³ /uur) is de oplossing (tijdelijk) lozen op vuilwaterriool. Bij hogere debieten zal maatwerk (ontijzering) noodzakelijk zijn.
waterbodemp oppervlaktewater is (lokaal) sterk doorlatend. Oppervlaktewater veroorzaakt instabiliteit, waardoor ontgraving niet op diepte komt.	A	50%	50	Eventuele vertraging incalculeren, bij geen ruimte voor vertraging vooraf proefontgraving/-bemaling uitvoeren. Maatregelen bij teveel toestroom zijn: oppervlaktewater tijdelijk (lokaal) dempen (dam in water), waterremmende wanden toepassen, waterbodemp dichtmaken (folie) en soms helpt een aanvullende bemaling vlakbij de waterkant.
door obstakels in de bodem kan bemaling niet tot de noodzakelijke diepte worden geplaatst, hierdoor ontstaat vertraging of de bemaling moet aangepast worden	B	50%	25	onderzoek naar obstakels, proberen obstakels te verwijderen/verleggen, proces/locatie plaatsen bemaling aanpassen, eventuele vertraging incalculeren
een mobiele verontreiniging in de bodem verplaatst significant (> 5 m of > 100 m ³ nieuw verontreinigde grond).	A	10%	10	toepassen grondwater monitoring voor en achter de vlek. Op het moment dat de vlek (in theorie) te snel verplaatst dan het toepassen van lokaal grondwaterinfiltratie (zodat de vlek minder/niet verplaatst).
door gelijktijdig grondwater onttrekken door een derde grondwatergebruiker in de omgeving is er een cumulatief effect waardoor de grondwaterstand meer zakt en omgevingsbeïnvloeding groter wordt	C	99%	10	tussen de grondwateronttrekkingen de grondwaterstand meten met als doel het cumulatief effect beoordelen tijdens het project. Eventueel (indien mogelijk) afspraken maken met grondwatergebruiker.
door (bemaling gerelateerde) maaiveld daling ontstaat architectonische schade (schade aan uiterlijk gebouw) bij één belending (kans 4%).	B	4%	2	een exterieur vooropname uitvoeren (ter voorkoming van discussie achteraf), bij panden met reeds scheuren in de gevel(s) ook interieur vooropname uitvoeren.
het debiet of de grondwaterstandverlaging is (aanzienlijk) meer dan verwacht. Hierdoor moet de bemaling aangepast worden en/of is er (mogelijk) meer omgevingsbeïnvloeding	A	2%	2	geen maatregelen niet noodzakelijk wegens lage kans.
bij natuur/bomen zakt de grondwaterstand, in het groeiseizoen zal schade ontstaan. De schade kan bestaan uit minder groei tot afsterven groen.	C	10%	1	het meten van de grondwaterstand, bij een te lage grondwaterstand het groen besproeien met geschikt water. Het is gewenst een wateraftappunt te realiseren in de lozingsroute. tenminste 12-18 weken voor start bemaling de grondwateronttrekking en lozing van grondwater aanvragen, bij voorkeur in overleg met bevoegd gezag (in verband met eventuele drukte)
bevoegd gezag heeft geen toestemming kunnen geven voor de startdatum bemaling, hierdoor vertraagd het project.	A	1%	1	

Bijlage 2 – Gegevens lozingsroute (grondwaterkwaliteit)

De hoeveelheid chloride, ijzer en zeer fijne delen (silt) mag niet te hoog zijn bij een lozing van grondwater. De fijne delen (silt) moeten door bronconstructie en zandvanger afgevangen worden. In de onderstaande tabel is de verwachte hoeveelheid ijzer en chloride in het grondwater weergegeven.

chloride ¹ (Cl) en ijzer (Fe) [mg/L]	Cl WV 1	Fe WV 1	Cl WV 2	Fe WV 2
Alle onderdelen	150~250	?	275~450	15?

- ! De hoeveelheid chloride is afgeleid met behulp van het grondwatermodel + het brak-zout en zoet-brak grensvlak (Deltareg digitale atlas natuurlijk kapitaal);
- ! De hoeveelheid ijzer (indien bekend) wordt afgeleid uit milieukundig bodemonderzoek, dinoloket (archief) gegevens in de omgeving en/of TNO NITG02-166A onderzoek.

Grondwaterkwaliteit in relatie tot BLBI

Stoffen in het grondwater op de projectlocatie zijn vergeleken met Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (BLBI), in de onderstaande tabel staan de stoffen welke hoger zijn dan eis (tabel 3.1B van de eis) in BLBI. Bij "geen" zijn er geen grondwaterverontreinigingen gevonden.

BLBI stoffen ¹ [µg/L]	WV 1	WV 2
riolering deel 1	onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
riolering deel 2	onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
riolering deel 3	onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
riolering deel 4	onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
riolering deel 5	benzeen (15/2) monochloorbenzeen (290/7)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
pompput	benzeen (15/2) monochloorbenzeen (290/7) onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
riolering deel 6	onopgeloste bestanddelen (100/20) onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
persleiding	onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
riolering deel 1	onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)
riolering deel 2	onopgeloste bestanddelen (100/20)	onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (15/5)

- ! Grondwaterkwaliteit is ingeschat op basis van enkele steekmonsters en/of visuele waarnemingen (indien opdrachtgever een milieukundig bodemonderzoek heeft aangeleverd bij Loots). In de praktijk kunnen afwijkingen optreden. Bij een vermoeden (aanwezigheid grondwaterverontreiniging) tijdens de uitvoering moet dit direct signaleerd worden.

¹ Bij dikke watervoerende lagen zal de chlorideconcentratie lager zijn en langzaam toenemen. De reductie is ingeschat en tussen haakjes in procenten weergegeven

² Achter elke stof staat tussen haakjes twee waarden. De linker waarde is de waargenomen concentratie van de stof, de rechter waarde is de eis welke overgenomen is uit BLBI (tabel 3.1B in het besluit)

Het grondwater wordt geloosd in het oppervlaktewater/riool. Het uitgangspunt is dat het water bij het lozingspunt (oppervlaktewater of hemelwaterriool) niet zal bruinkleuren en dat er geen visuele verontreiniging plaatsvindt.

Analyse chloride en ijzer

In de onderstaande tabel is per onderdeel chloride en ijzer in grondwater weergegeven. Een concentratie chloride hoger dan 1000 mg/L (grens zoet-brak) wordt beschouwd als onacceptabel om te lozen in een zoetwater lichaam. Een concentratie ijzer hoger dan 5 mg/L wordt beschouwd als risicovol (in relatie tot verkleuring) om te lozen in een zoetwater lichaam.

concentratie chloride (zout) en ijzer	Prognose chloride start	Prognose chloride eind	ijzer hoger dan 5 mg/L
riolering deel 1	150~250	150~250	?
riolering deel 2	150~250	150~250	?
riolering deel 3	150~250	150~250	?
riolering deel 4	150~250	150~250	?
riolering deel 5	234~391	234~391	Alleen bij bemaling in watervoerende laag 2
pompput	260~433	260~433	ja
riolering deel 6	150~250	150~250	?
persleiding	150~250	150~250	?
riolering deel 1	150~250	150~250	?
riolering deel 2	150~250	150~250	?


Analyse BLBI (besluit lozen buiten inrichtingen)


In de onderstaande tabel is per onderdeel weergegeven welke stoffen de emissienorm (besluit lozen buiten inrichtingen) overschrijden in het grondwater.



BLBI stoffen prognose	Stof (prognose/norm) [$\mu\text{g/L}$]
riolering deel 1	onopgeloste bestanddelen (100/20)
riolering deel 2	onopgeloste bestanddelen (100/20)
riolering deel 3	onopgeloste bestanddelen (100/20)
riolering deel 4	onopgeloste bestanddelen (100/20)
riolering deel 5	benzeen (0/2) monochloorbenzeen (0/7) onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (0/5)
pompput	benzeen (0/2) monochloorbenzeen (0/7) onopgeloste bestanddelen (100/20) ijzer (0/5)
riolering deel 6	onopgeloste bestanddelen (100/20)
persleiding	onopgeloste bestanddelen (100/20)

! De resultaten in dit hoofdstuk zijn indicatief, grondwaterkwaliteit monsternamen zijn altijd een steekproef (volume watermonster is klein ten opzichte van volume bemaling). Over het algemeen betekent dit dat concentraties in het lozingswater meestal (aanzienlijk) lager zijn dan de extremen in het milieukundig onderzoek. Soms is er een "niet gevonden grondwaterverontreiniging" welke in de bemaling komt, de omvang van een "niet gevonden grondwaterverontreiniging" is klein (anders was deze wel gevonden). De kans is gering dat de emissienorm hoger is dan de prognose, echter de kans is niet nihil. Tijdens uitvoering moet bij twijfel (stank of visuele verontreiniging bij lozingspunt) direct actie worden ondernomen.

Bijlage 3 – Grondonderzoeken

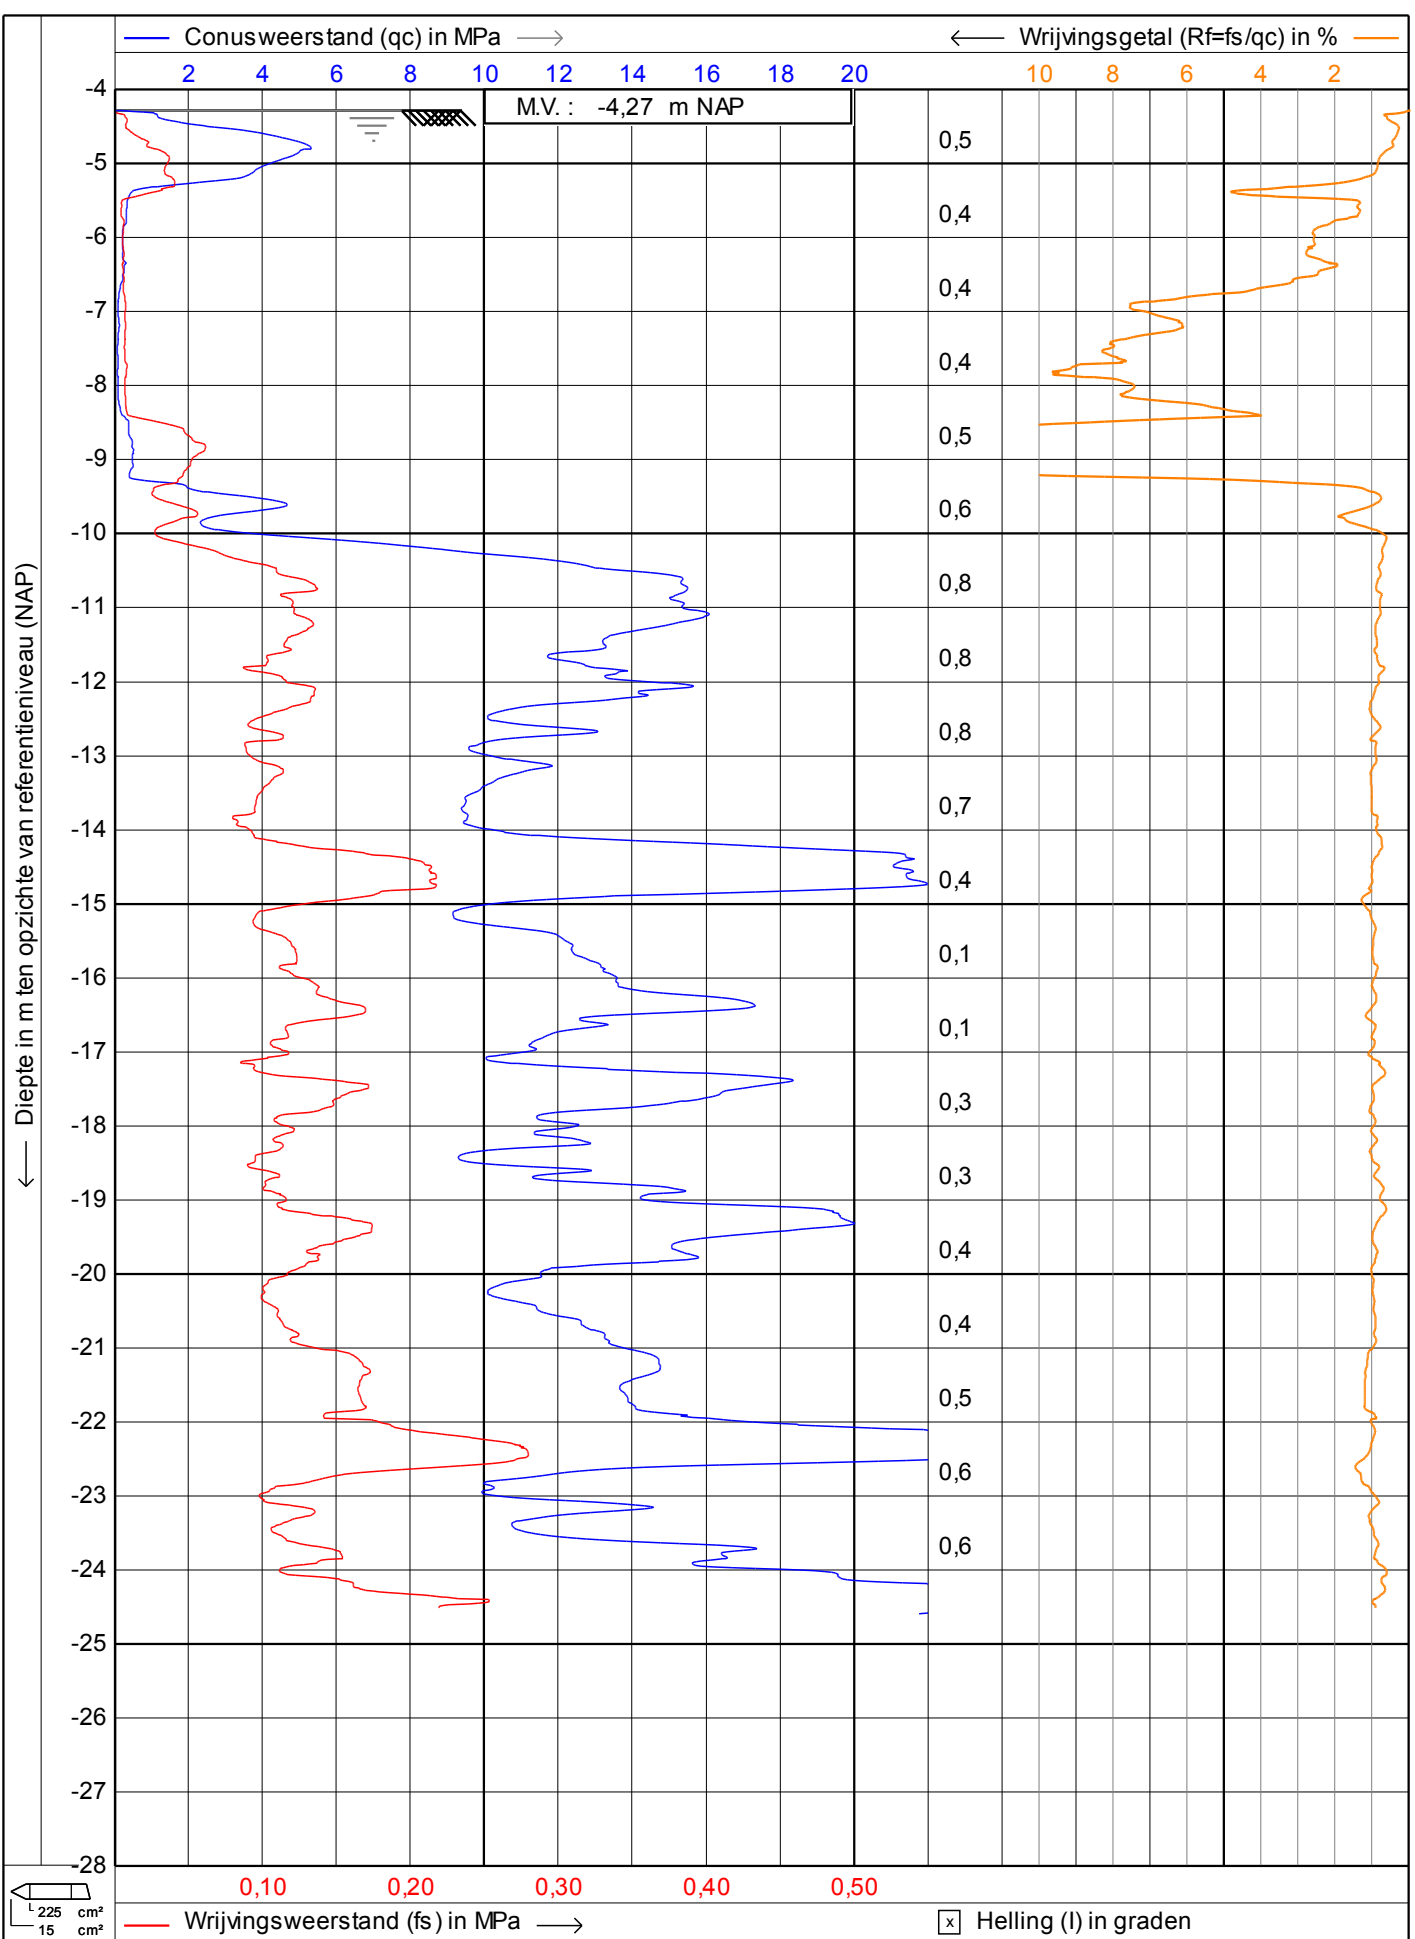

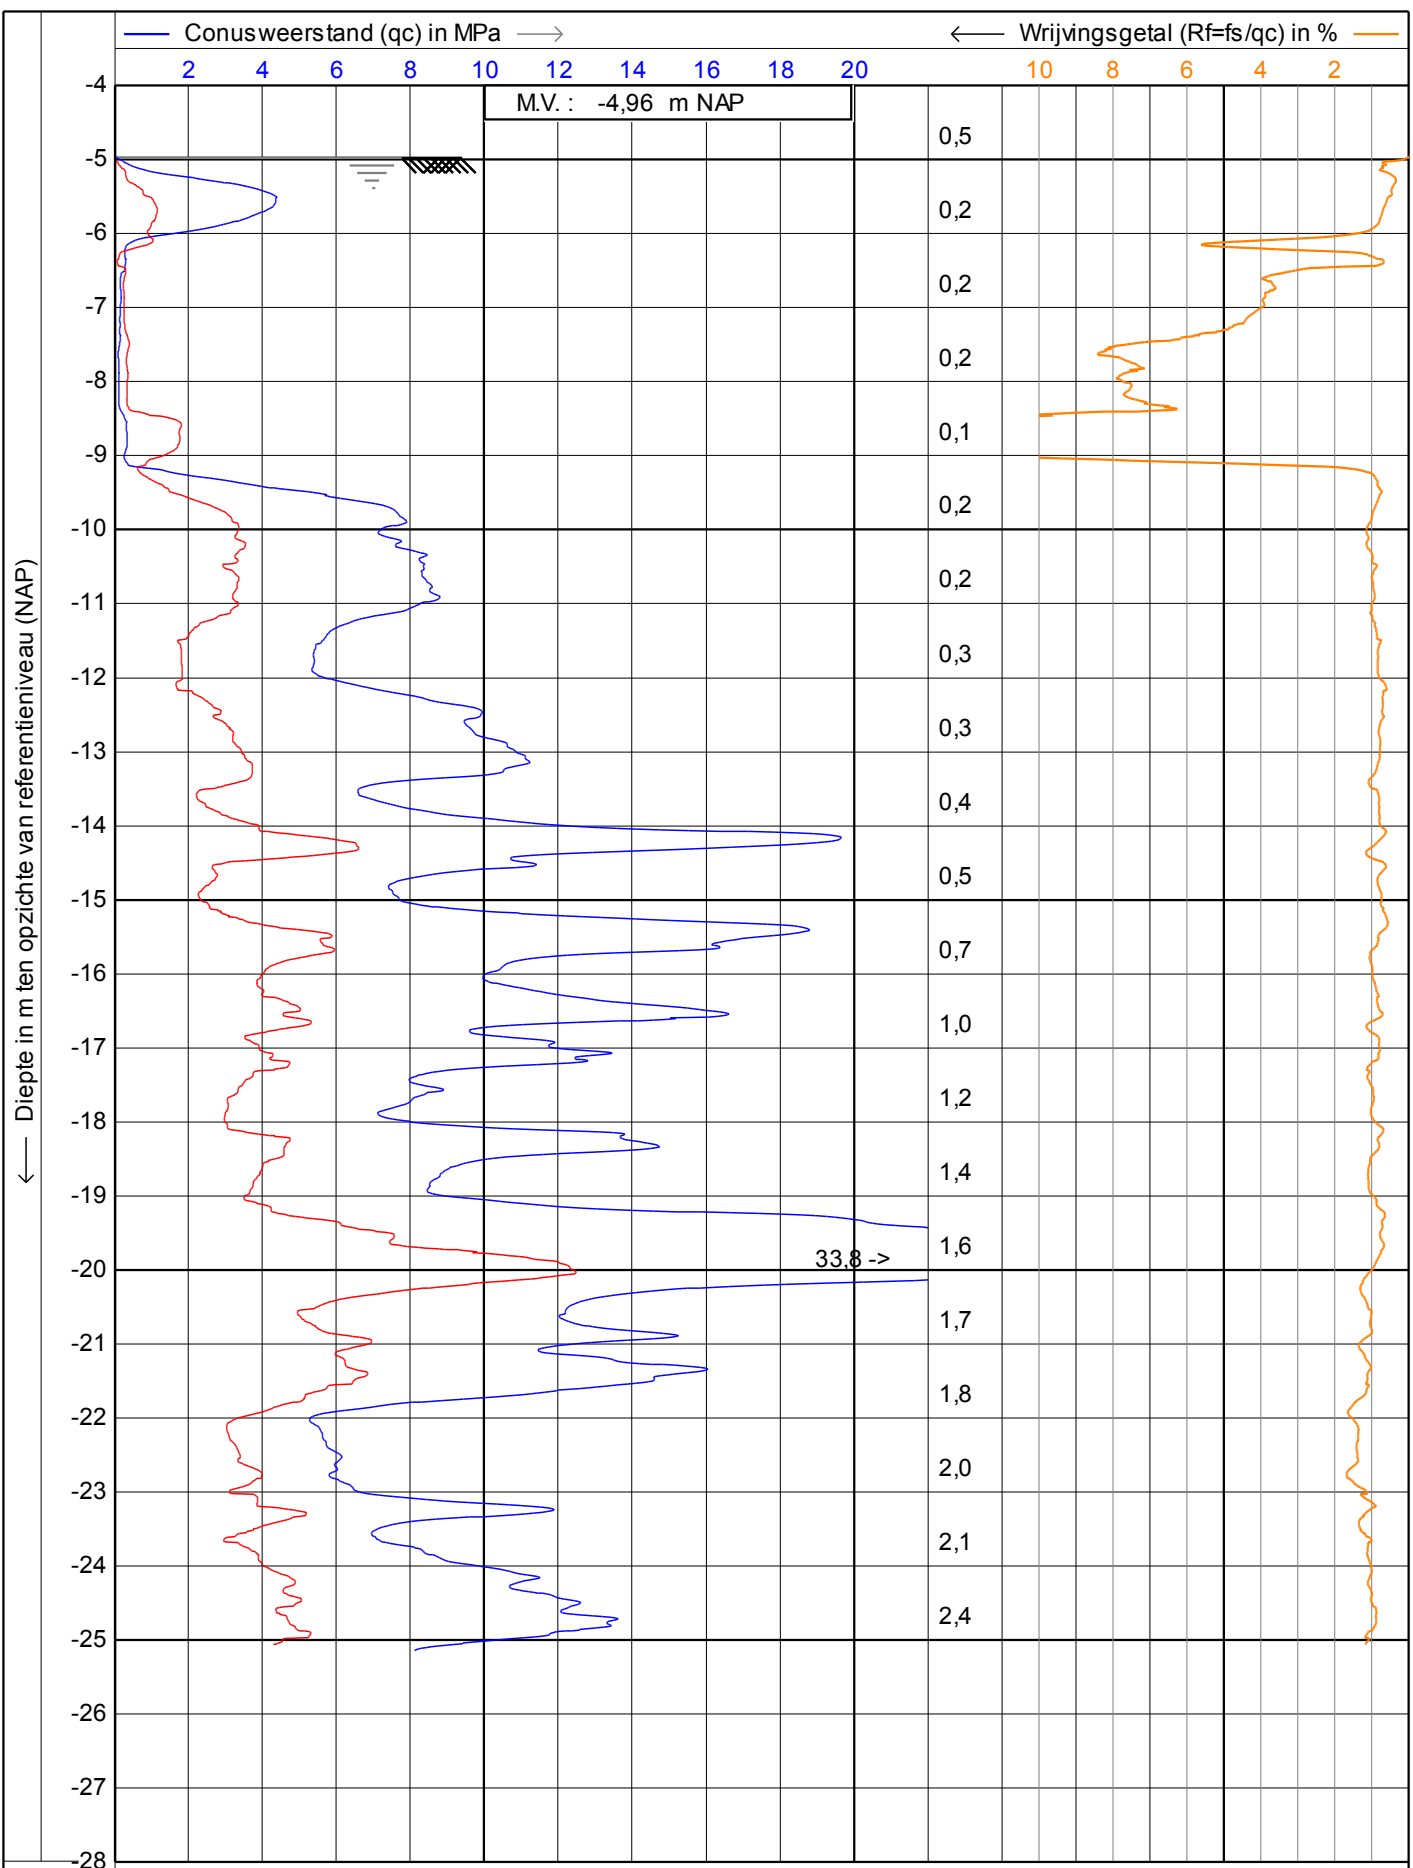

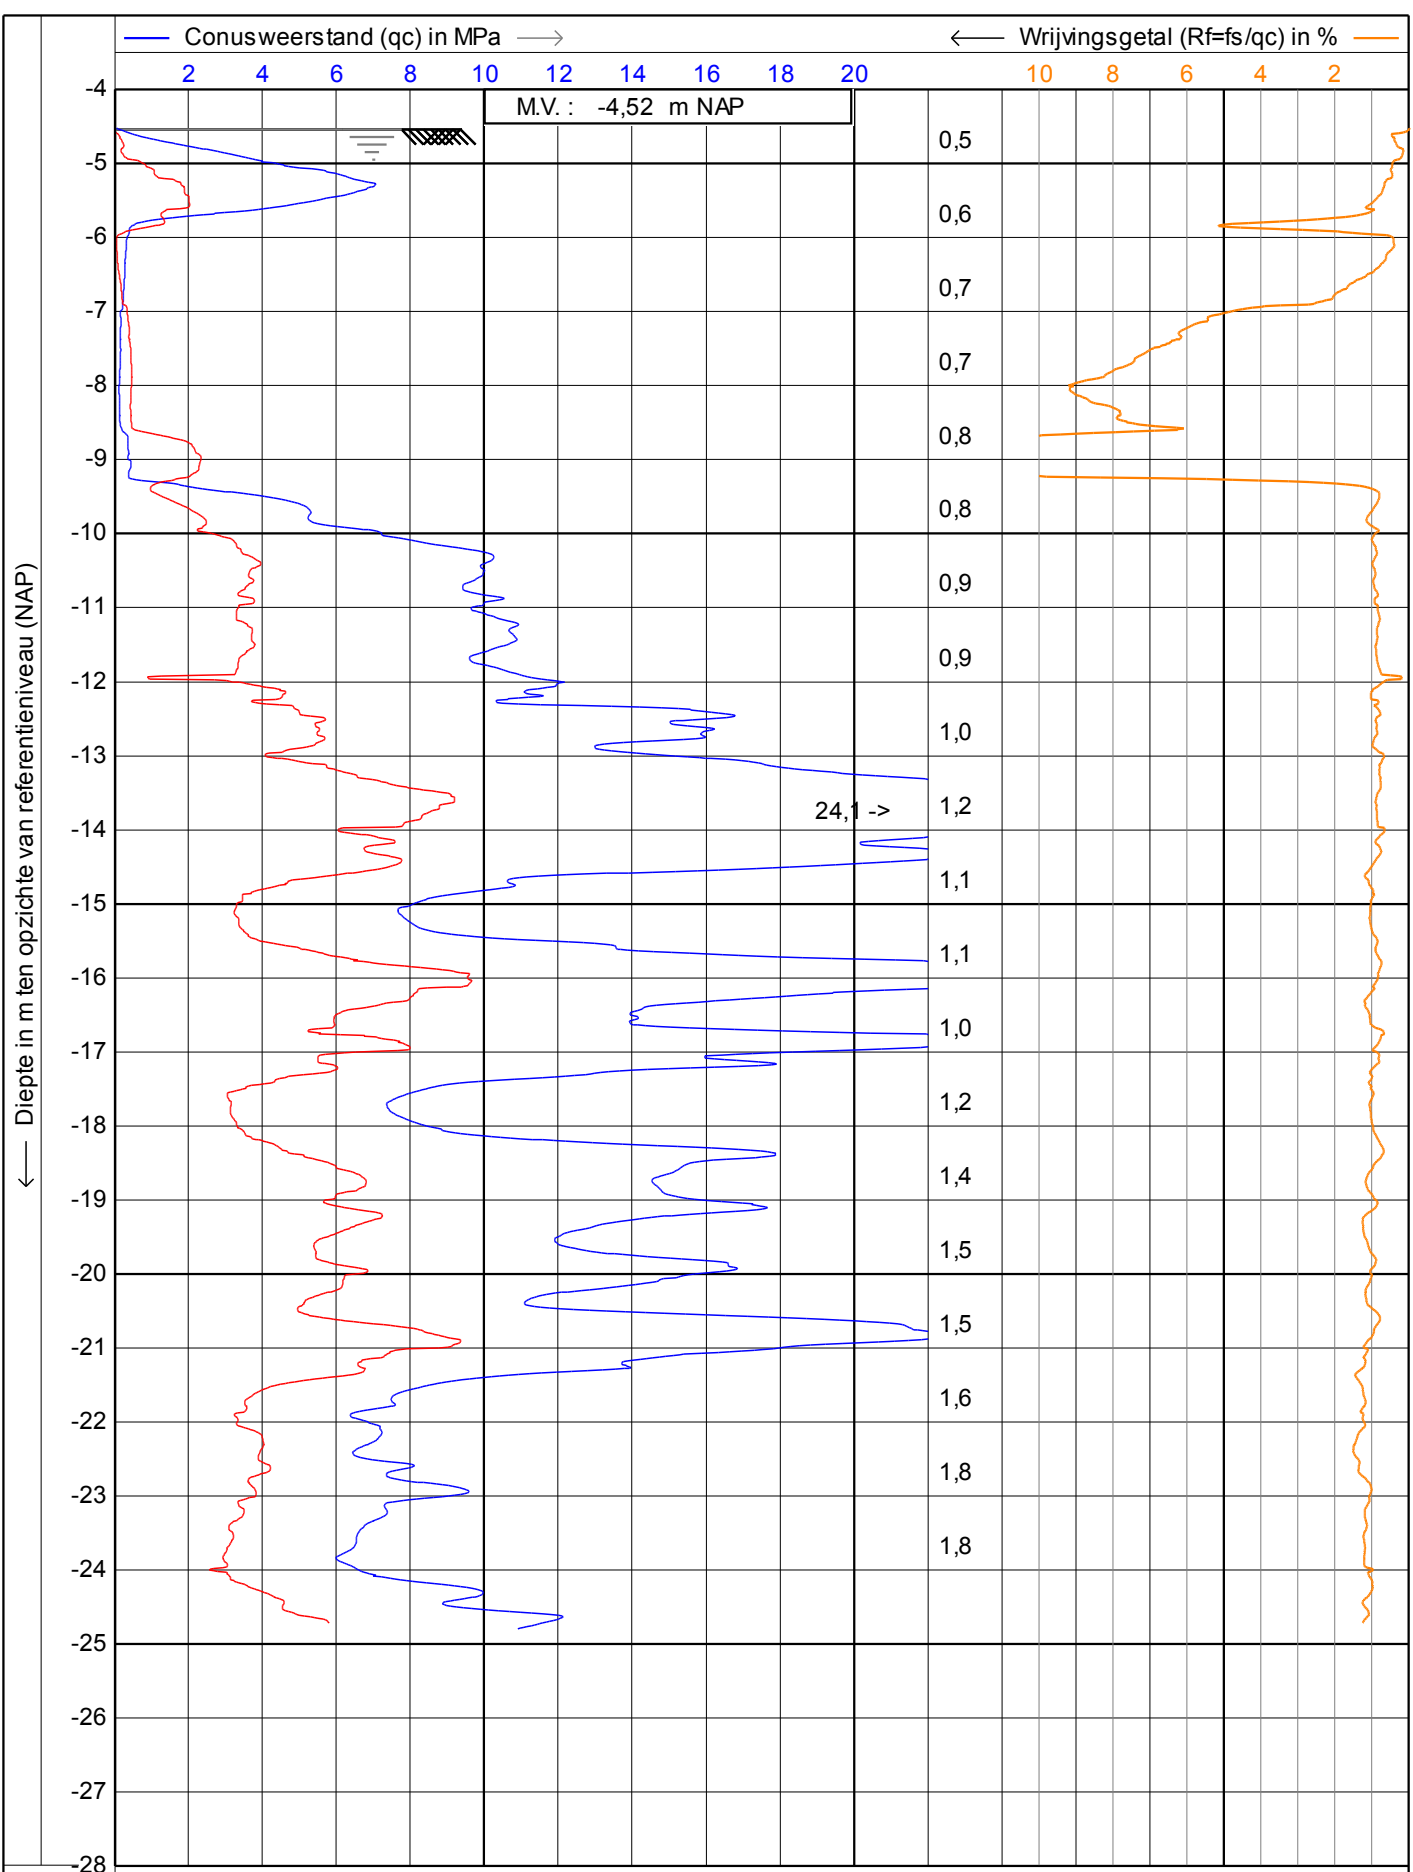

ISO 22476-1 Application Class 3

Project : **Geotechnisch Onderzoek Oude Treinstation**

Locatie : **Mijdrecht**

Positie : **119606,97, 468668,39 RD**


Datum : **8-9-2016**

Conusnr. : **S15CFILS14572**


Projectnr. : **348917**


Sondeernr.: **S03**

1/1

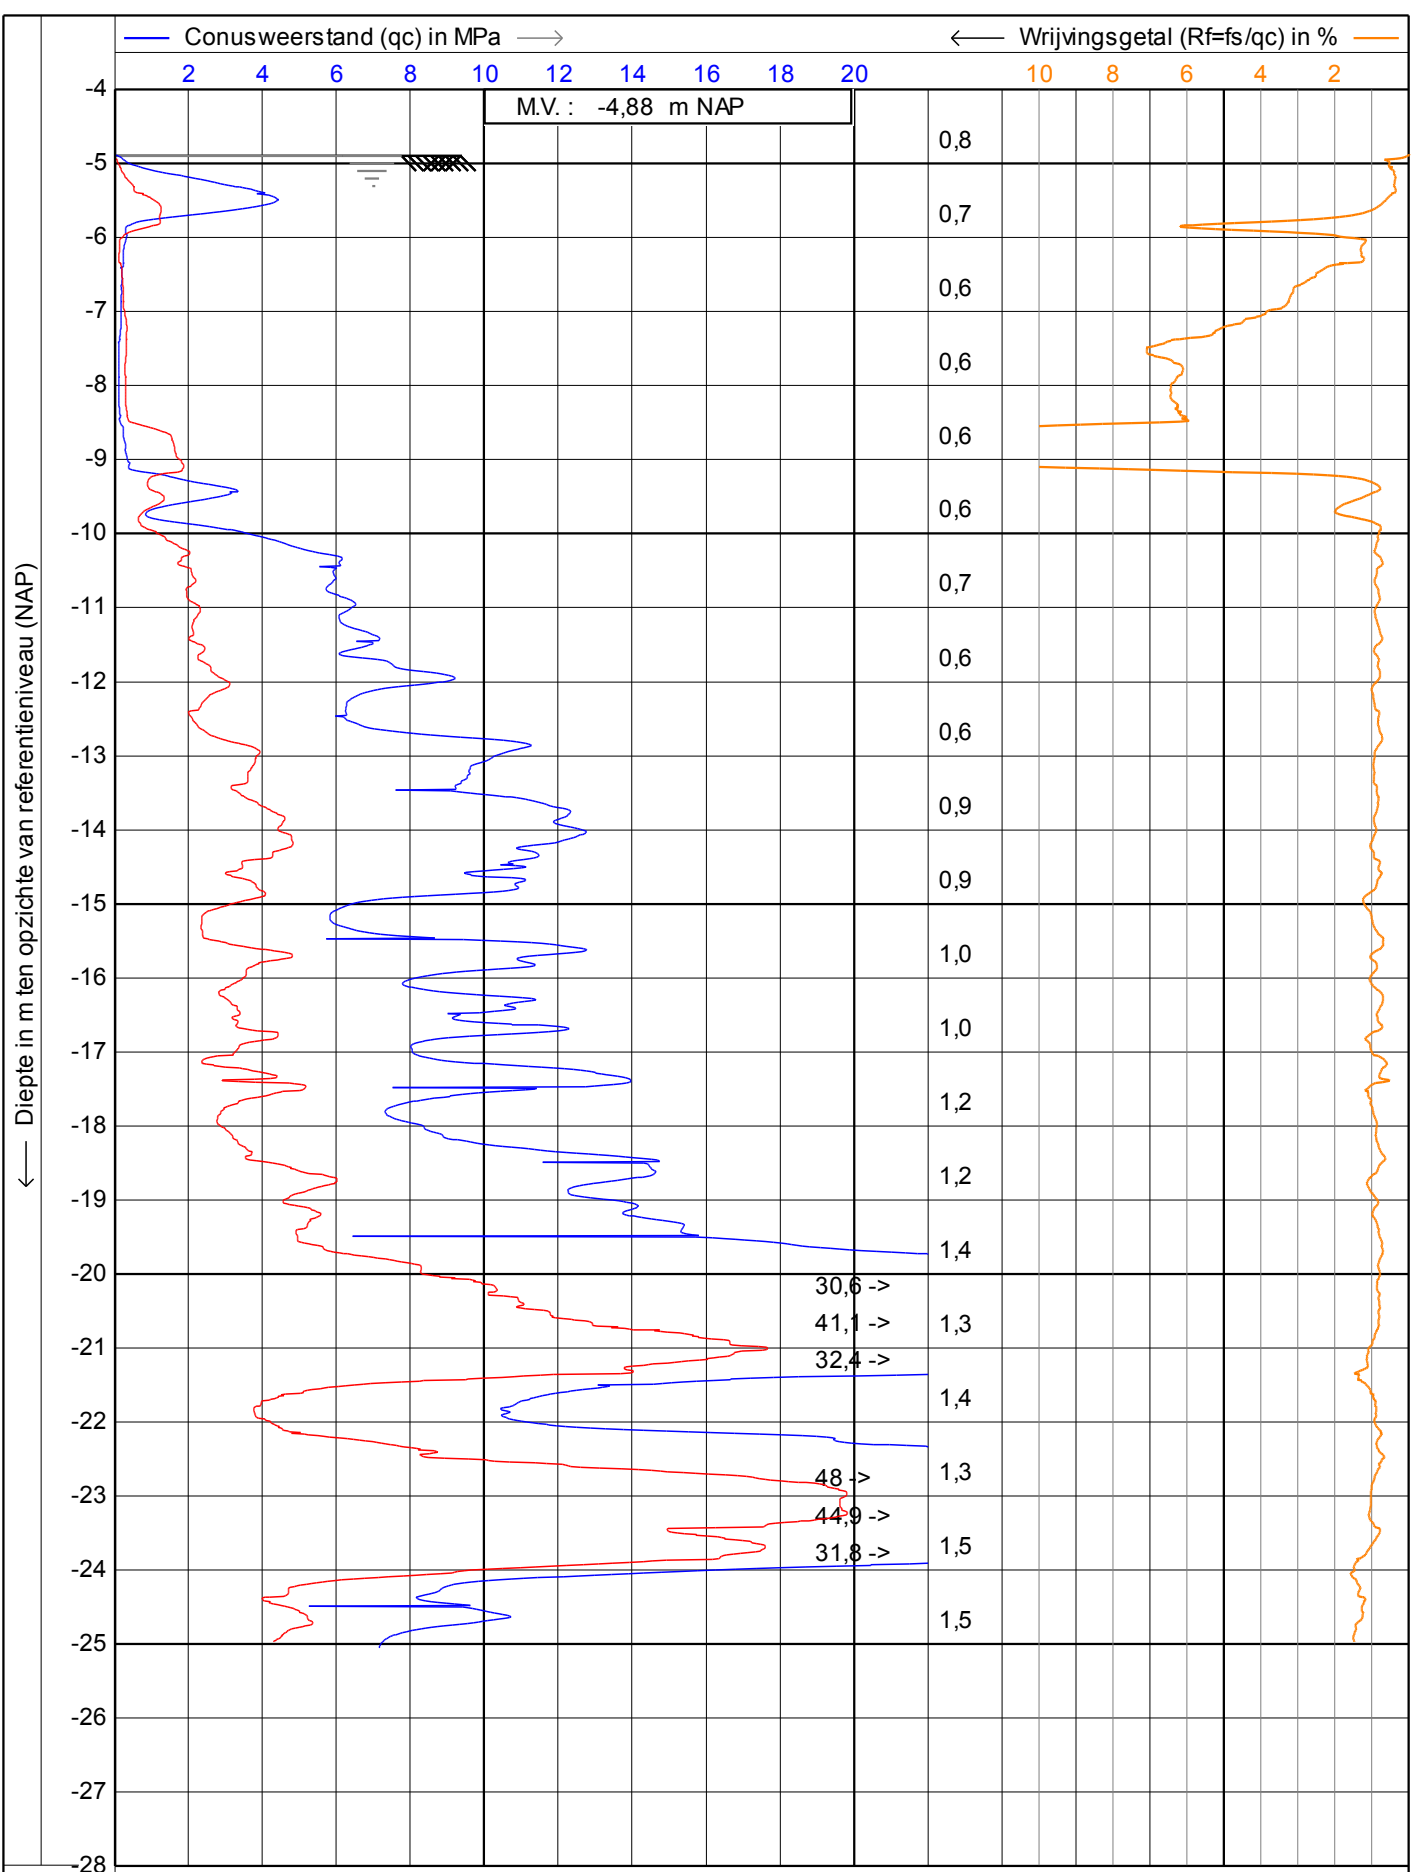


	ISO 22476-1 Application Class 3		Datum : 8-9-2016	
	Project : Geotechnisch Onderzoek Oude Treinstation		Conusnr. : S15CFILS14572	
	Locatie : Mijdrecht		Projectnr. : 348917	
	Positie : 119641,78, 468650,83 RD		Sondeernr.: S04	
			1/1	

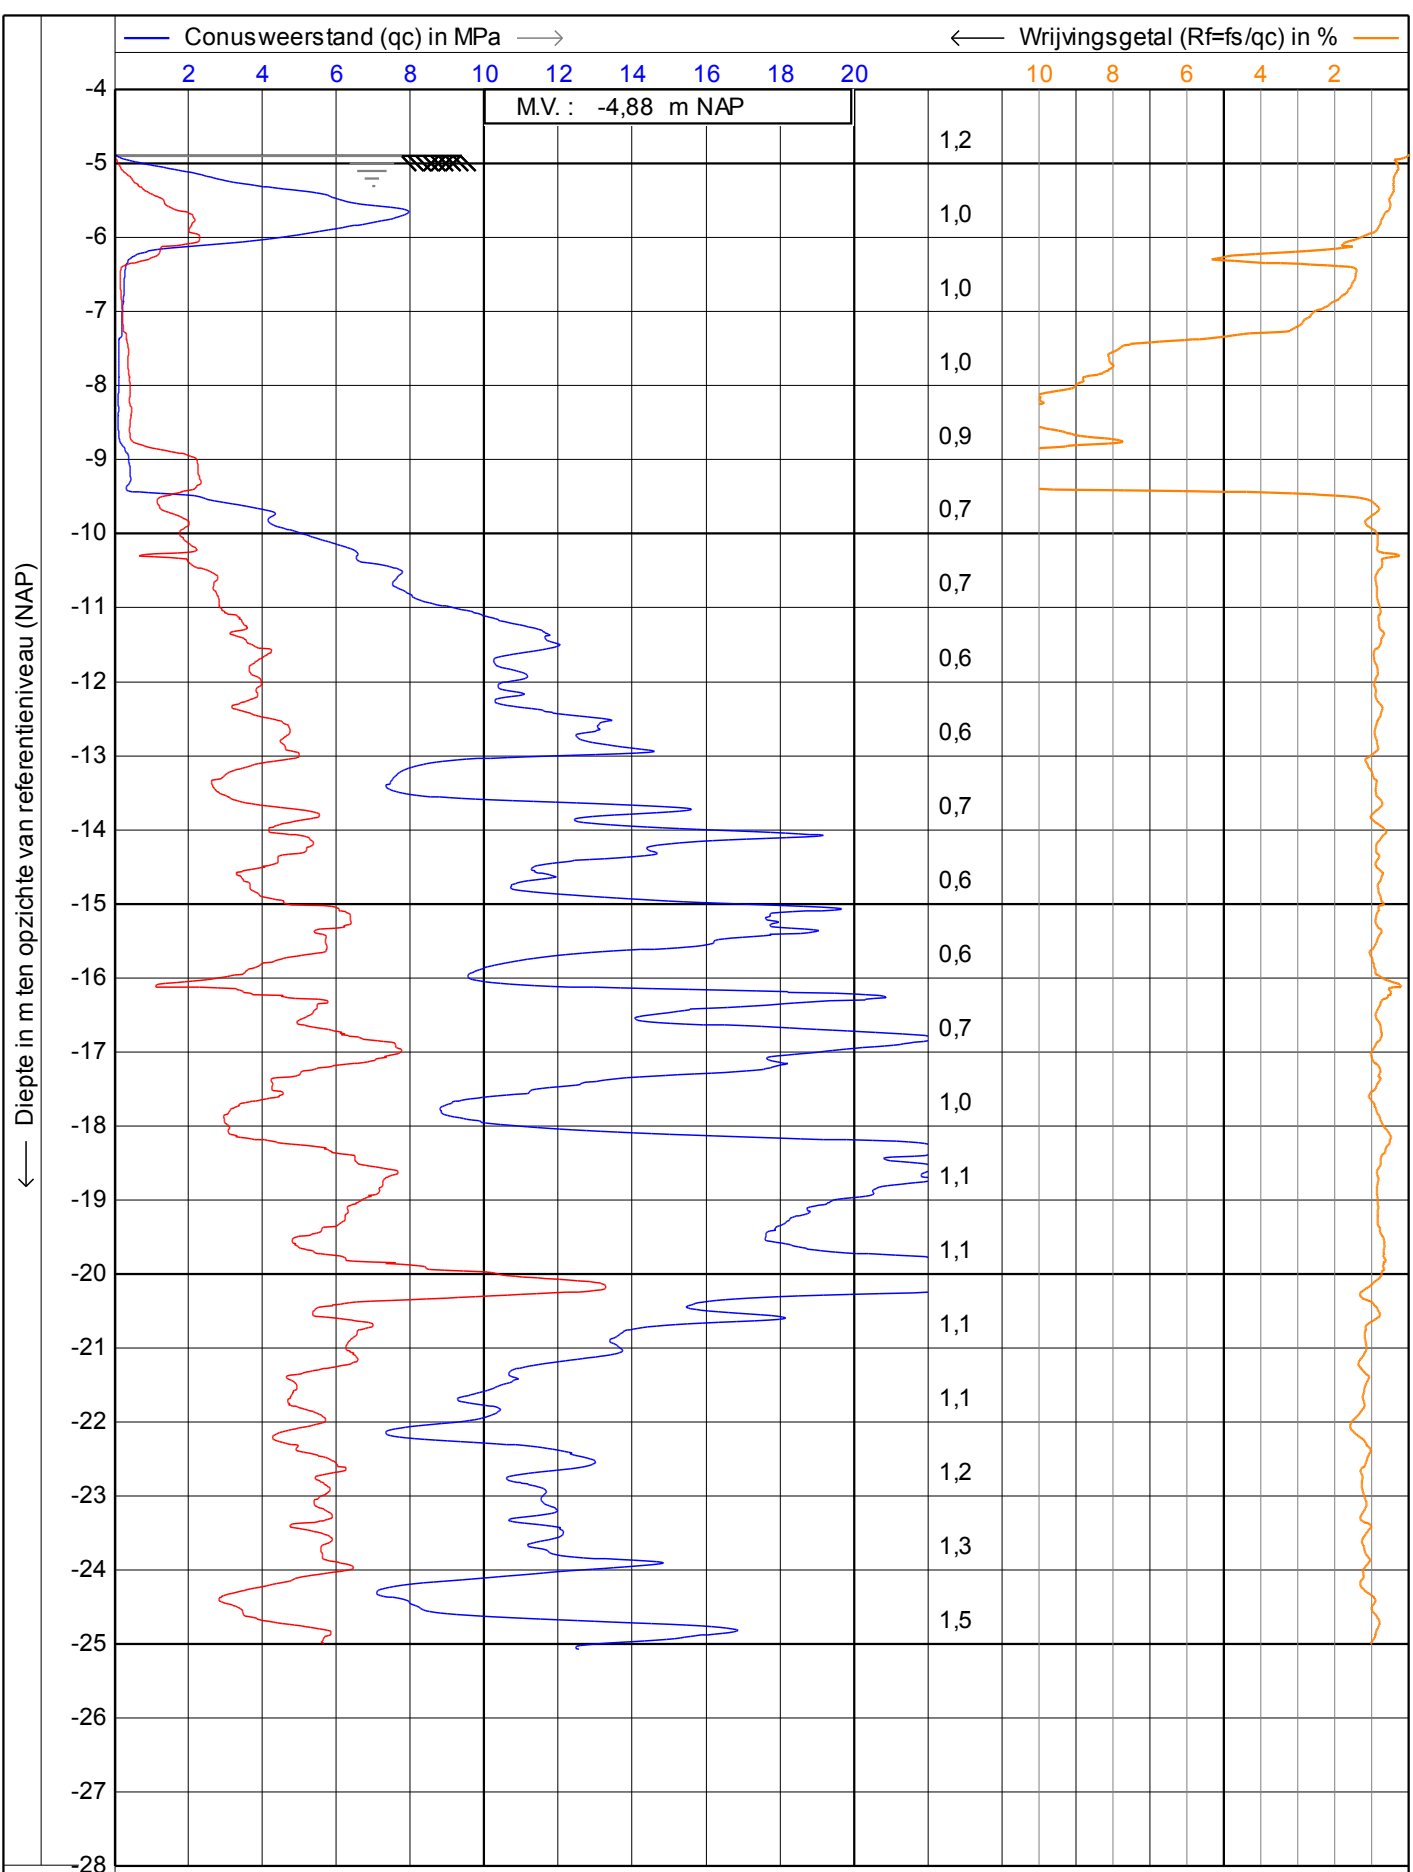

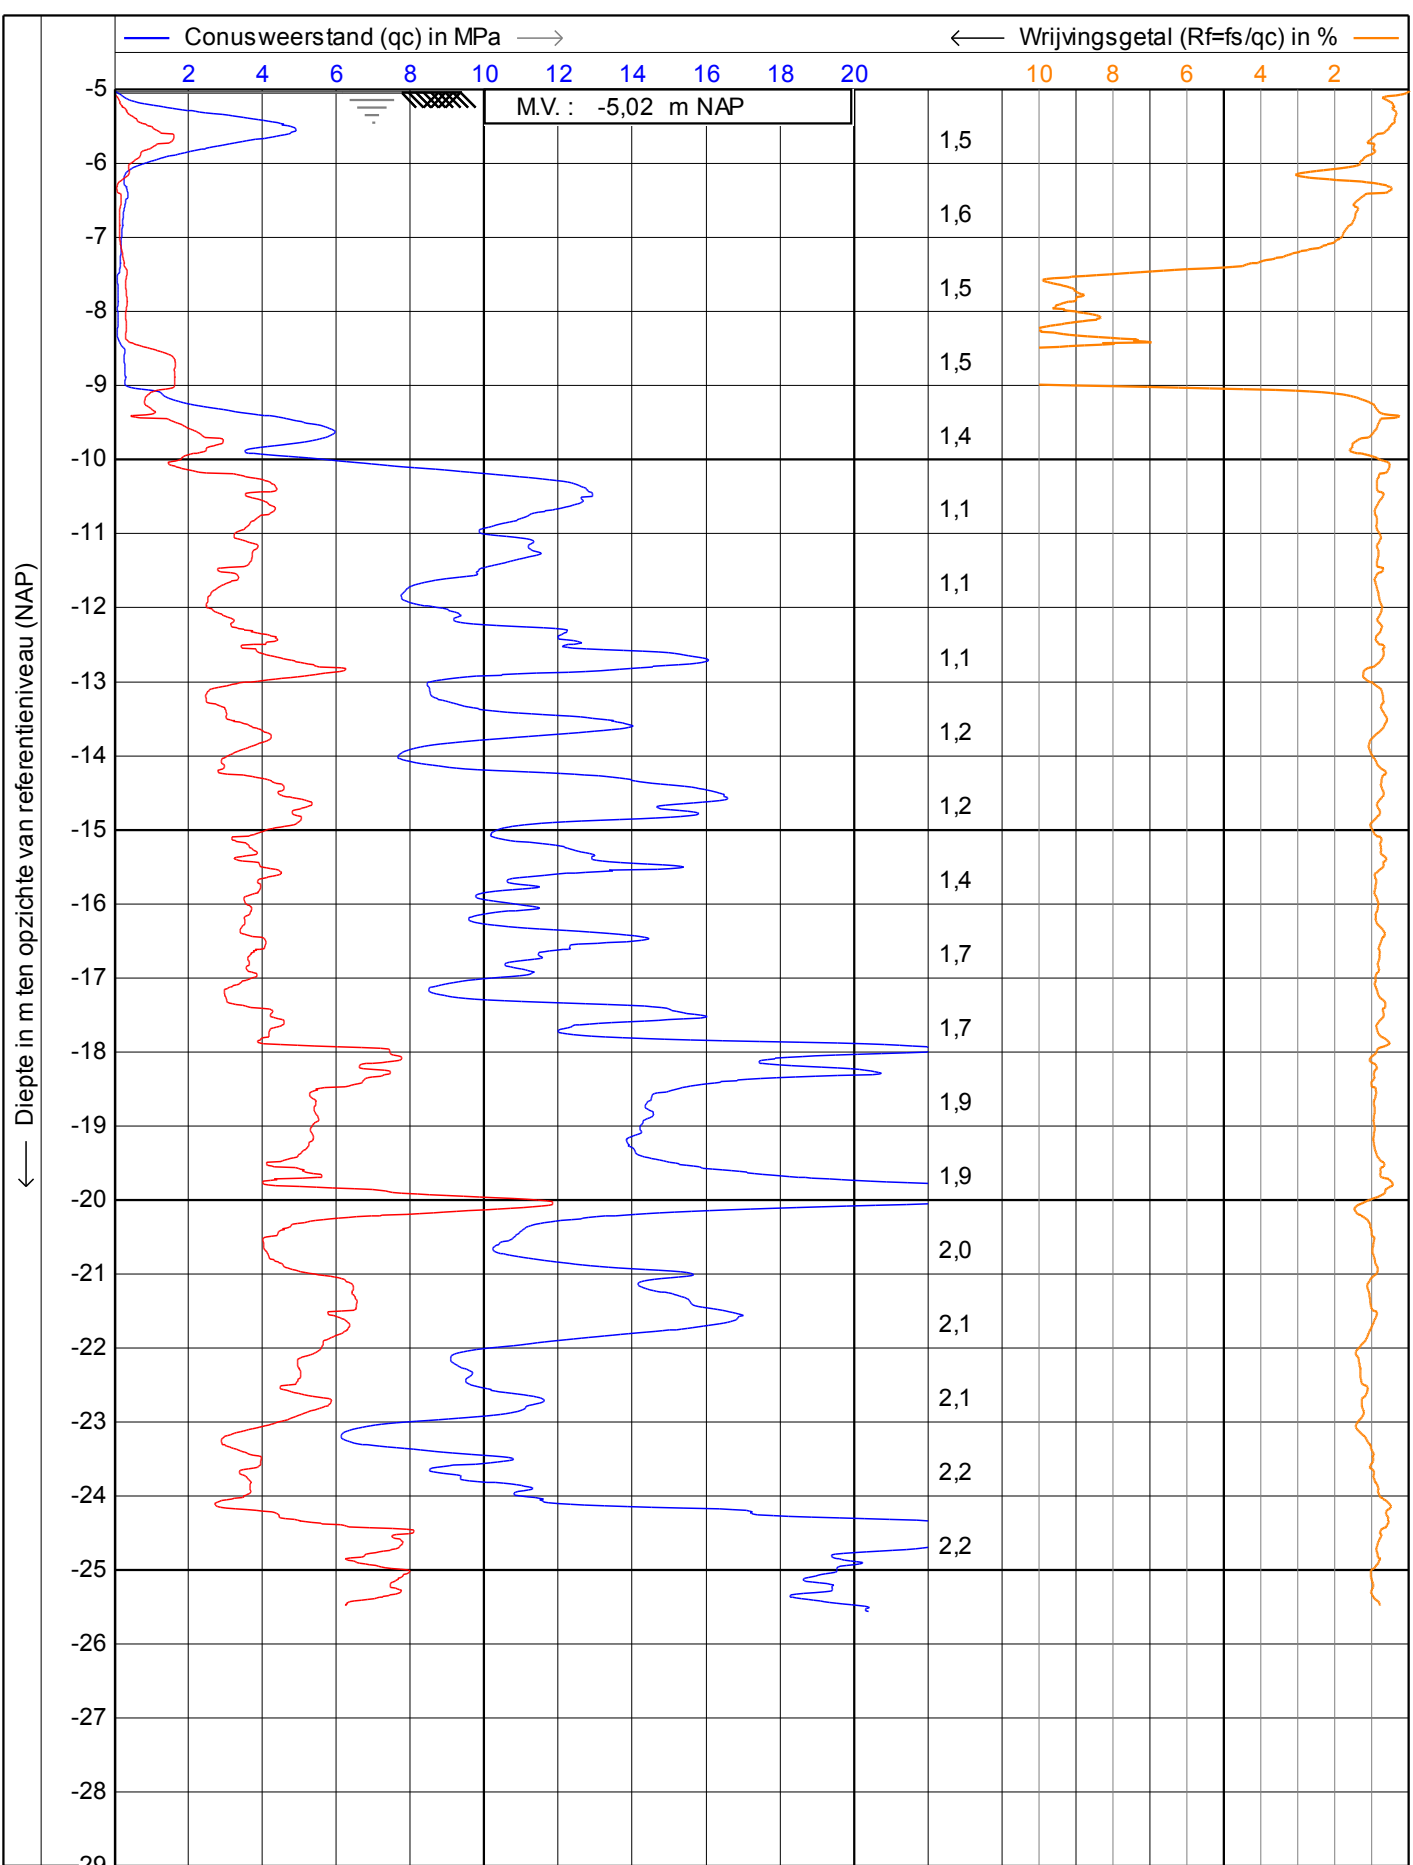

	ISO 22476-1 Application Class 3		Datum : 8-9-2016	
	Project : Geotechnisch Onderzoek Oude Treinstation		Conusnr. : S15CFILS14572	
	Locatie : Mijdrecht		Projectnr. : 348917	
	Positie : 119655,17, 468575,04 RD		Sondeernr.: S06	
			1/1	

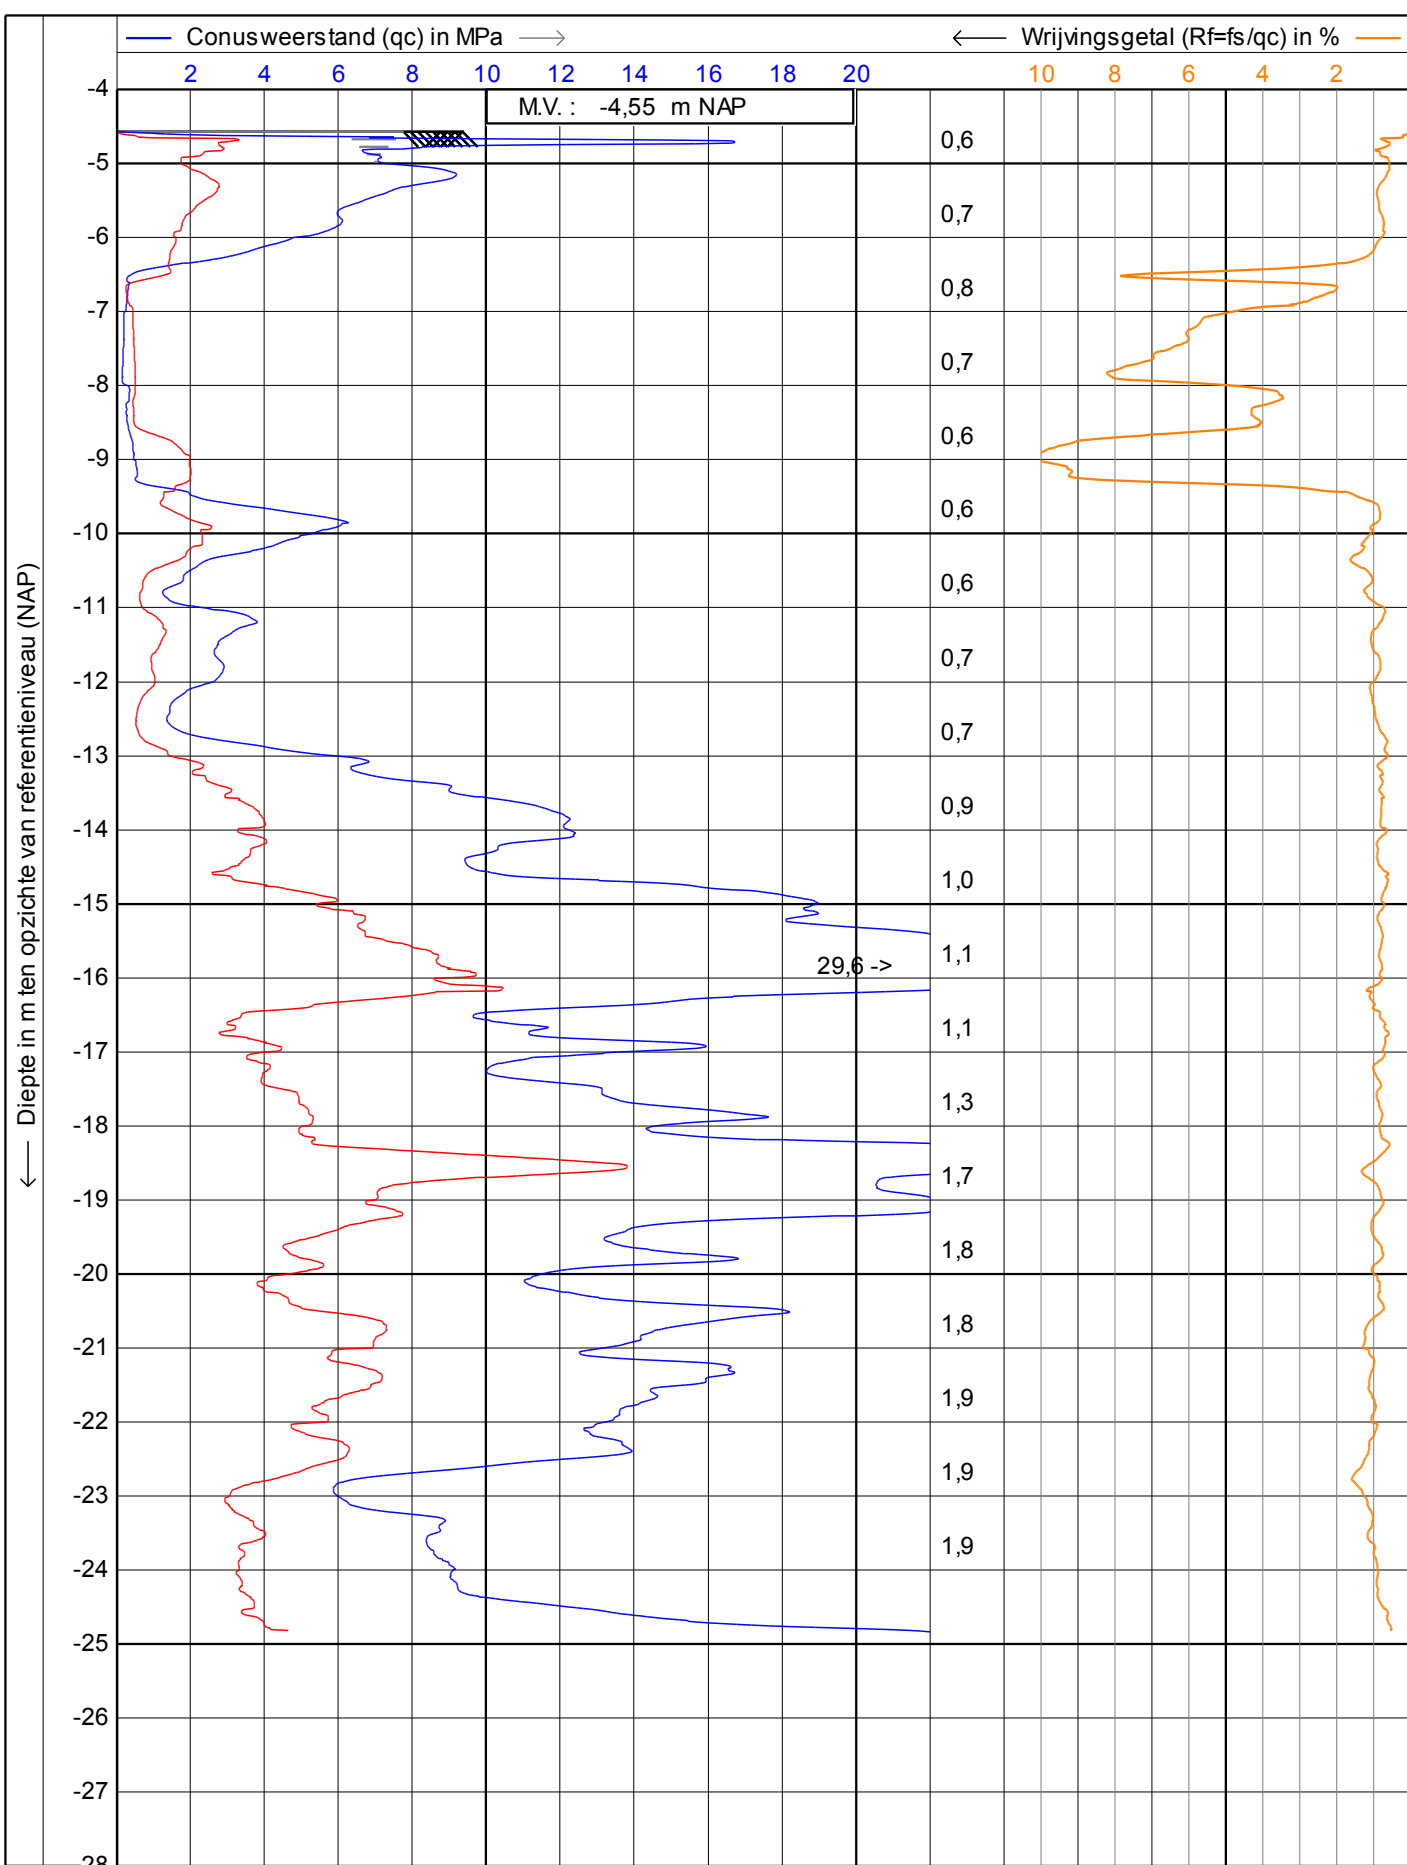

ISO 22476-1 Application Class 3

Project : **Geotechnisch Onderzoek Oude Treinstation**

Locatie : **Mijdrecht**

Positie : **119664,49, 468512,06 RD**

Datum : **8-9-2016**

Conusnr. : **S15CFILS14572**

Projectnr. : **348917**

Sondeernr.: **S07**

1/1

