

Besluit CHI



Registratienummer

17.25232

Onderwerp

Partiële herziening peilbesluit Wieringen

Het college van hoofdingelanden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 18 april 2017, nr. 17.59796;

gelet op de Waterwet en de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het bij dit besluit behorende 'Projectplan gemaal Gesterkoog en toelichting partiële herziening peilbesluit Wieringen', 17.12276;

gehoord de commissie Water &Wegen;

b e s l u i t :

1. De waterpeilen in polder Oosterlanderkoog vast te stellen voor de aangegeven peilgebieden in de peilentabel en op de kaart GB17-036, 16 maart 2017 behorende bij dit besluit;
2. Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit het peilbesluit Wieringen vastgesteld op 23 februari 1990 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 3 april 1990 nr. 90-511005, gedeeltelijk in te trekken voor de onder 1 bedoelde gebieden en voor het overige het peilbesluit Wieringen in stand te laten;
3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van bekendmaking;
4. Gewijzigde peilen in te stellen na het gereedkomen van de daarvoor benodigde werken en tot dat moment de peil te handhaven overeenkomstig het onder 2 vermelde peilbesluit.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 september 2017
van het college van hoofdingelanden,

de secretaris,

M.J. Kuipers

de voorzitter,

drs. L.H.M. Kohsiek

Peilentabel Wieringen

Het waterpeil in de gebieden die zijn aangegeven in onderstaande peilentabel en op kaart GB17-036, 16 maart 2017 wordt gehandhaafd onder de volgende voorwaarden:

- Zomer en winterpeil

Voor het peilgebied 2856F wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. Dit houdt in dat een ander streefpeil voor het zomerseizoen is vastgesteld dan voor het winterseizoen. Bij dit type peilbeheer bestaat de bandbreedte tussen het winterpeil en zomerpeil uit 0,05 - 0,50 meter waarbij het winterpeil lager is dan het zomerpeil. Zo is er in het nattere winterseizoen ruimte voor waterberging, terwijl in het drogere zomerseizoen extra water in het gebied aanwezig is. Dit type peilbeheer wordt met name toegepast ten behoeve van agrarische functies. Afhankelijk van de weersomstandigheden varieert het waterpeil met enkele centimeters rondom het streefpeil.


Code	Opp. (ha)	Soort peilbeheer	Vast peil (NAP +m)	Zomerpeil (NAP +m)	Winterpeil (NAP +m)	Ondergrens zomer (NAP +m)	Bovengrens zomer (NAP +m)	Ondergrens winter (NAP +m)	Bovengrens winter (NAP +m)
2856F	62,5	Zomer - winter		-1,00	-1,40				

De aanpassing van het peilgebied wordt pas definitief bij invoer in het beheerssysteem van het hoogheemraadschap.

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

T 072-582 8282
F 072-582 7010
info@hnhk.nl
www.hnhk.nl

Partiële herziening peilbesluit Wieringen

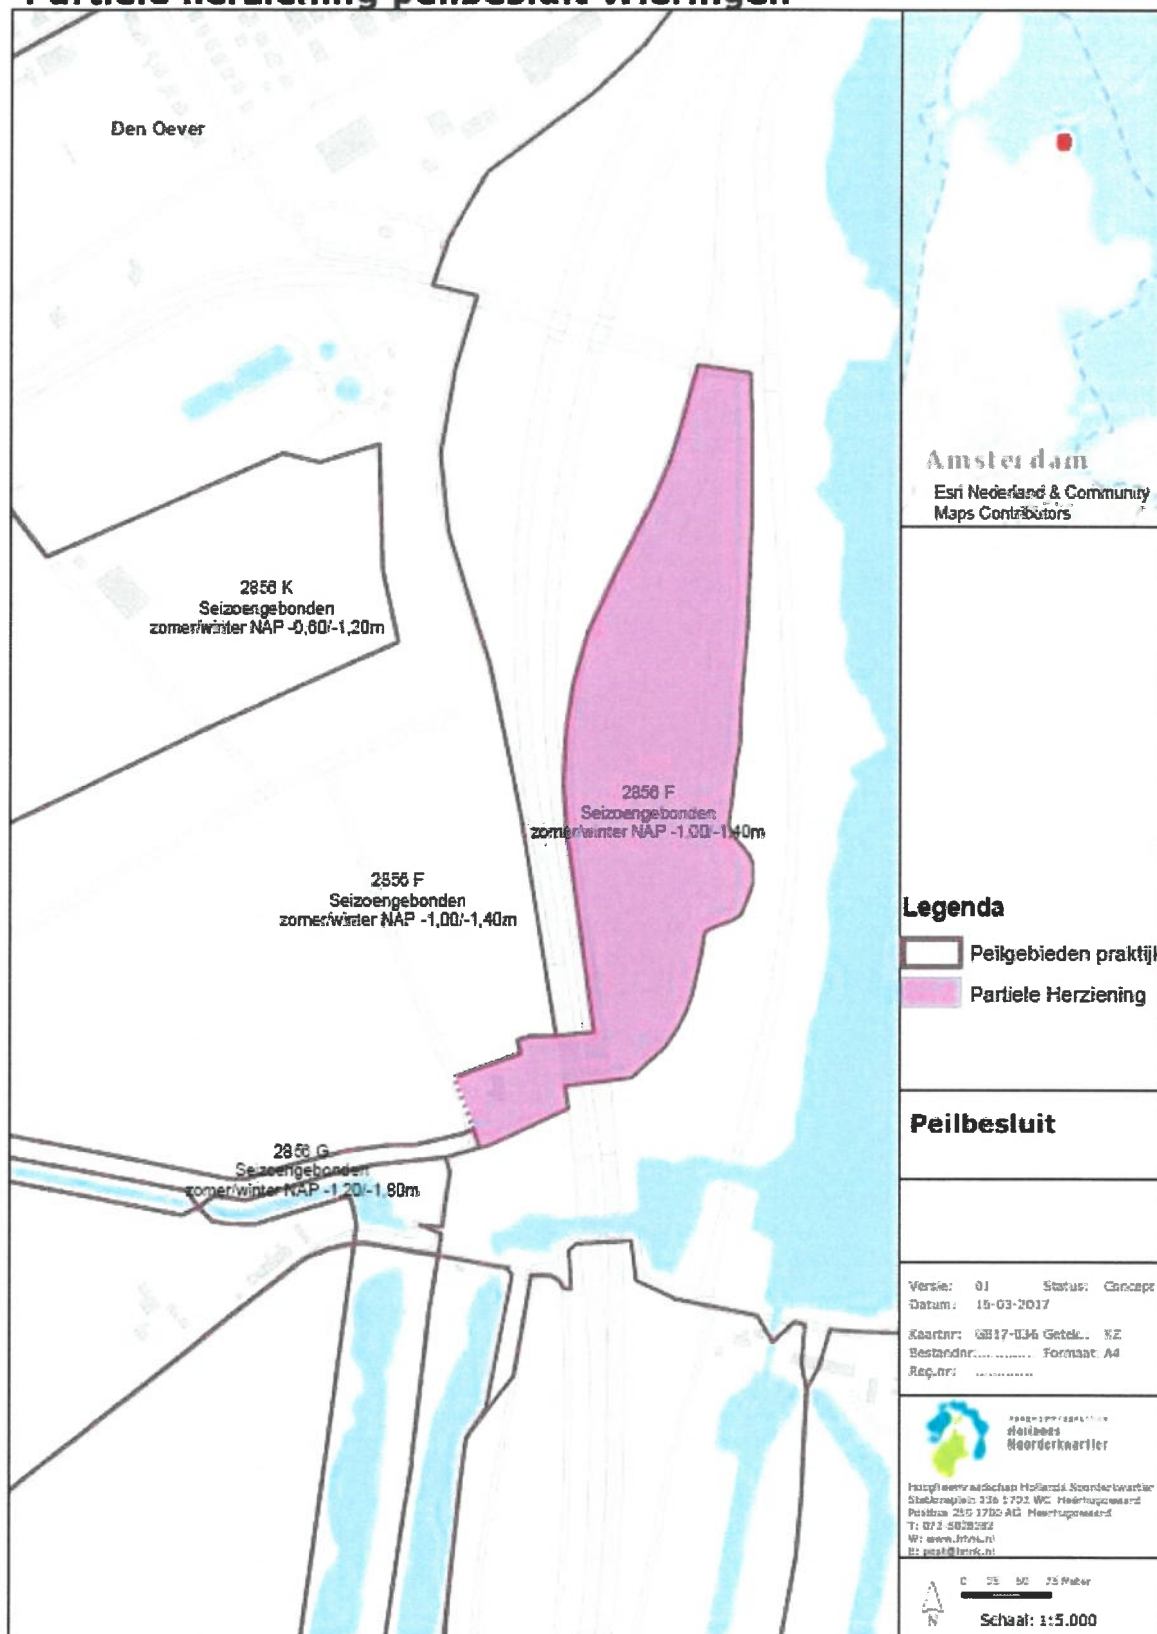

© Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

T 072-582 8282
F 072-582 7010
info@hhnk.nl
www.hhnk.nl



Projectplan gemaal Gesterkoog en toelichting partiële herziening peilbesluit Wieringen



Auteur
L. Zeinstra / Jan Zijp

Registratienummer
17.12276

Datum
12 juni 2017

Versie
0.5

Status
definitief

Afdeling
Afdeling Watersystemen





Inhoudsopgave

Status	5
1 Aanleiding	6
1.1 Samenhang tussen projectplan en partiële herziening peilbesluit	6
1.1.1 Procedure en rechtsbescherming projectplan en peilbesluit	6
1.2 Huidige situatie	6
1.3 Gewenste situatie	9
1.4 Contactpersoon	11
1.5 Leeswijzer	11
2 Voorgenomen werkzaamheden	11
2.1 Ligging en begrenzing van het projectgebied	11
2.2 Maatvoering	12
2.3 Effecten op de omgeving	14
2.3.1 Belanghebbenden	14
2.3.2 Wonen en werken	14
2.3.3 Verkeer en bereikbaarheid	15
2.3.4 Veiligheid	15
2.3.5 Landbouw en veeteelt	15
2.3.6 Recreatie en toerisme	16
2.3.7 Natuur	16
2.3.8 Water	19
2.3.9 Bodem	19
2.3.10 Landschap, cultuurhistorie en archeologie	20
2.3.11 Archeologie	21
2.3.12 Niet gesprongen explosieven	21
2.3.13 Geluid, luchtkwaliteit en trillingen	22
2.3.14 Kabels en leidingen	22
2.4 Vergunningen en ontheffingen	23
2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering	24
2.5.1 Planning	24
2.5.2 Beschikbaarheid van de benodigde grond	24
2.6 Afwijkmogelijkheden in de uitvoering	24
2.7 Beheer en onderhoud	25



2.8	Schade en nadeelcompensatie	25
3	Toelichting partiële herziening peilbesluit Wieringen	27
3.1	Aanleiding partiële herziening	27
3.2	Gebiedsbeschrijving	27
3.3	Vigerend peilbesluit	28
3.4	Watersysteembeschrijving nieuw peilgebied	28
3.5	Uitgangspunten en belangen	29
3.6	Afweging belangen	29
3.6.1	Afweging op basis van uitgangspunten	29
4	Bijlagen	31
4.1	Onderhoudsplicht	31
4.2	Effectstudie 'QuickScan flora en fauna Wierdijk'	33
4.3	Toelichting ontwerp gemaal Gesterkoog / Wierdijk	34
4.4	Rapport vooronderzoek conventionele explosieven 'Polder Waard-Nieuwland Deel II - Wieringen'	35
4.5	Rapport bureauonderzoek archeologie 'Waterverbetering Oosterlanderkoog/Gesterkoog te Wieringen'	36
4.6	Besluitvormingsprocedure	37



Status

Het ontwerpprojectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) op 18 april 2017.

Het projectplan is ambtelijk vastgesteld op 13 juni 2017.

De toelichting partiële herziening peilbesluit Wieringen is vastgesteld door college van hoofdingelanden (CHI) op 20 september 2017.



1 Aanleiding

Verwacht wordt dat als gevolg van klimaatverandering de neerslag heftiger en langduriger wordt met name in de herfst- en wintermaanden. Watersystemen die jarenlang dienst hebben gedaan, kunnen hierdoor in de toekomst problemen ondervinden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ruim 220 poldersystemen getoetst (BWN-studie) aan de landelijke normen en geconstateerd dat ook in de 'Oosterlanderkoog' maatregelen nodig zijn om in de toekomst de kans op wateroverlast te beperken.

Dit projectplan gaat in op het project ter verbetering van het watersysteem in de Gesterkoog. De Gesterkoog (figuren 1 en 2A) is onderdeel van de polder Oosterlanderkoog en is gelegen in de gemeente Hollands Kroon. De aanleg van een waterberging als maatregel om wateroverlast tegen te gaan, is in dit overwegend agrarisch ingestelde gebied niet haalbaar. Door het bouwen van een gemaal, enkele stuwen en het koppelen van peilgebieden wordt het watersysteem robuuster en toekomstbestendig. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast verminderd.

1.1 Samenhang tussen projectplan en partiële herziening peilbesluit

In dit document is de beschrijving en motivering van zowel het projectplan als de partiële herziening van het peilbesluit opgenomen. Dit vanwege de grote verwevenheid tussen het projectplan en het peilbesluit voor de Gesterkoog en de direct op elkaar aansluitende onderzoeken en onderbouwingen.

1.1.1 Procedure en rechtsbescherming projectplan en peilbesluit

Voor het projectplan gemaal Gesterkoog en voor de partiële herziening van het peilbesluit Wieringen worden aparte besluiten genomen. Bij de voorbereiding van het peilbesluit is het verplicht de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen. In de Inspraakverordening van HHNK is bepaald dat voor een projectplan met betrekking tot een waterstaatswerk eveneens inspraak wordt verleend overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden die opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun specifieke belang onvoldoende is meegenomen kunnen gedurende een periode van zes weken een zienswijze inbrengen. Vanwege de samenhang tussen peilbesluit en projectplan worden beide (ontwerp)besluiten in de besluitvormingsprocedure tegelijkertijd ter inzage gelegd. Gedurende de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Het peilbesluit wordt vastgesteld door het college van hoofdingelanden (algemeen bestuur). Het projectplan is ambtelijk vastgesteld (17.69268).

Na vaststelling bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank Noord-Holland en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de behandeltermijnen is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

1.2 Huidige situatie

Het gebied de Gesterkoog (ca 200ha) watert in de huidige situatie af op het (te kleine) waterlopenstelsel van de polder Waard-Nieuwland (figuur 2B). Er is regelmatig wateroverlast, omdat de hoog gelegen bebouwingen van Den Oever en Oosterland water afvoeren op de Gesterkoog. Het watersysteem heeft te weinig waterbergend vermogen om de gevolgen van klimaatverandering (met name hevige regenval in korte perioden) op te kunnen vangen.




De polder Waard-Nieuwland aan de zuidrand van Wieringen was tot voor enkele jaren het kerngebied van het beoogde 'Wieringerrandmeer'. Door de aanleg van dit meer zou de gehele wateropgave in de polder Oosterlanderkoog worden opgelost. Nu de aanleg van dit meer niet doorgaat, is het noodzakelijk om alsnog andere maatregelen in de Gesterkoog te nemen om de kans op wateroverlast te beperken.

De Gesterkoog is gelegen in de gemeente Hollands Kroon. Het huidige projectgebied heeft in het bestemmingsplan een agrarische bestemming. De locatie voor het te bouwen gemaal heeft de bestemming 'verkeersdoeleinden' in het geldende bestemmingsplan Buitengebied Wieringen 2002.

De Gesterkoog bevat de volgende peilgebieden: 2856D, 2856F, 2856G en 2856K. Het projectgebied ligt alleen in de peilgebieden 2856F (zomerpeil NAP -1.00 m en winterpeil NAP -1.40 m) en 2856G (zomerpeil NAP -1.20 m en winterpeil NAP -1.80 m).



Figuur 1: Topografische kaart projectgebied

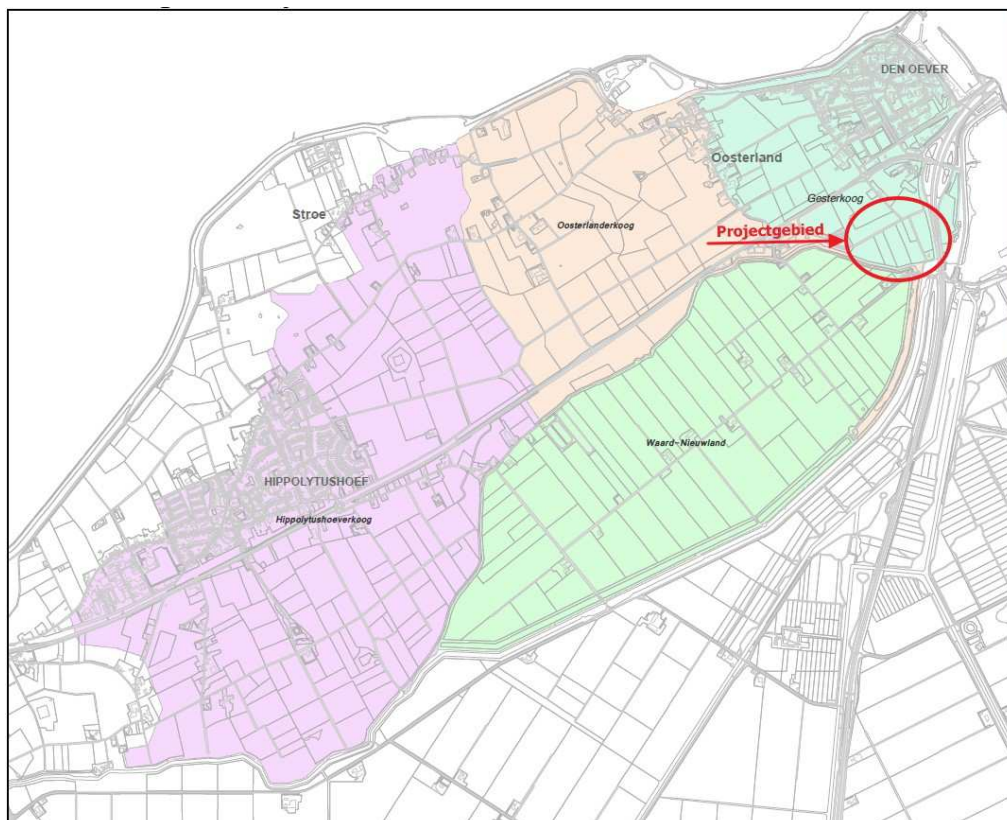

Figuur 2A: locatie projectgebied in de Gesterkoog.




Figuur 2B: Locatie bemalingsgebied Gesterkoog. Het nieuwe gemaal 'Gesterkoog' maalt direct uit op het IJsselmeer/de Zuiderhaven (rode pijlen). De huidige bemalingsroute via de onderleider naar polder Waard Nieuwland en uiteindelijk gemaal De Stonte'le blijft behouden voor noodsituaties (groene pijlen).



1.3 Gewenste situatie

De Gesterkoog ontvangt veel water uit de hoger gelegen bebouwingen van Den Oever en Oosterland. Om de actuele problemen van wateroverlast tegen te gaan en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen, wordt het watersysteem heringericht en wordt meer waterbergend vermogen gecreëerd. Het is niet haalbaar gebleken om de bestaande afvoer van water naar de polder Waard-Nieuwland te verbeteren door de bestaande waterlopen te verbreden. De omwonende agrariërs zijn niet bereid om de benodigde stroken grond hiervoor te verkopen. Ook is de aanleg van een waterberging in dit overwegend agrarisch gebied niet realistisch. In het gebied bestaat sterke weerstand tegen de aanleg van waterbergingen: een waterberging wordt gezien als een niet gewenste uitbreiding van natuur in een sterk agrarisch gebied. In het Collegeprogramma van B&W van de gemeente Hollands Kroon is nadrukkelijk opgenomen dat geen enkele uitbreiding van natuur mag plaatsvinden buiten de reeds vastgestelde Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/Natuurnetwerk Nederland (NNN). De aanleg van waterbergingen in dit agrarische gebied is dus geen optie.

Daarom is voor het oplossen van de wateropgave in dit gebied gekozen voor het bouwen van een nieuw gemaal. Het nieuwe gemaal krijgt een capaciteit van 22 m³/minuut. Hiermee wordt het water van de Gesterkoog rechtstreeks uitgemalen naar de Zuiderhaven/IJsselmeer. Het water wordt dan niet meer via de polder Waard-Nieuwland afgevoerd (figuur 2B). Deze maatregel levert ook een energiebesparing op doordat bij het uitmalen minder hoogteverschil hoeft te worden overbrugd. Het water loopt namelijk niet meer eerst naar het gebied met het maalpeil van het huidige gemaal Waard-Nieuwland op NAP -2,80 m, maar wordt straks direct uitgemalen vanaf NAP -1,40 m. De huidige afvoermogelijkheid naar Waard-Nieuwland blijft bestaan voor noodgevallen. Voor de toevoer naar het nieuwe gemaal wordt de waterloop ten westen van de A7 verbreed, en andere maatregelen genomen om de toevoer naar het gemaal te bevorderen (figuur 3). In de Gesterkoog worden twee peilgebieden (2856F en 2856G) samengevoegd waardoor er een robuuster watersysteem ontstaat (figuur 4). Zie hoofdstuk 3 voor de toelichting.

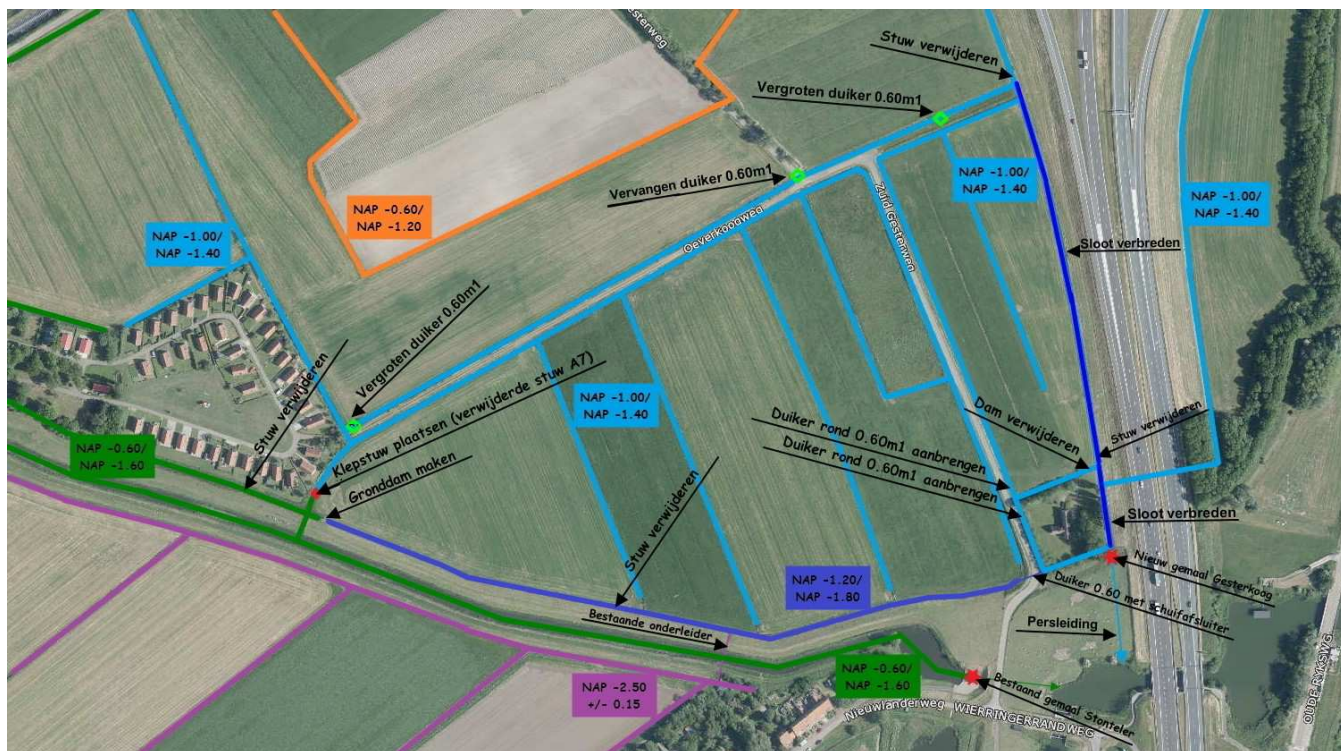

Figuur 4: samenvoegen peilgebieden 2856F en 2856G.



1.4 Contactpersoon

Jan Zijp
Projectleider Watersystemen
T: 072 5827264
E: j.zijp@hhnk.nl

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de voorgenomen werkzaamheden van het projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet beschreven. Dit artikel geeft aan dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.

In hoofdstuk 3 is de toelichting partiële herziening peilbesluit Wieringen beschreven. Het peilbesluit is gebaseerd op artikel 5.2 Waterwet waarin is bepaald dat een beheerder verplicht is voor daartoe aan te wijzen oppervlaktewater- of grondwaterlichamen onder zijn beheer één of meer peilbesluiten vast te stellen.

2 Voorgenomen werkzaamheden

2.1 Ligging en begrenzing van het projectgebied

Het projectgebied is gelegen in de gemeente Hollands Kroon. Het wordt aan de noordkant begrenst door de Rijksweg N99 en aan de westkant door het chaletpark de Wierde aan de Akkerweg. Aan de oostkant door de Rijksweg A7 en aan de zuidkant door de primaire waterloop. Het gebied ligt in de peilgebieden 2856 F (zomerpeil NAP -1.00 m en winterpeil NAP -1.40 m) en 2856 G (zomerpeil NAP -1.20 m en winterpeil NAP -1.80 m).



Figuur 5: Projectgebied voor de uit te voeren werkzaamheden inclusief de peilgebieden.



2.2 Maatvoering

Het watersysteem in de Gesterkoog wordt aangepast. Een aantal kunstwerken (stuwen en dam) worden verwijderd waarvoor nieuwe kunstwerken (klepstuw, duikers en dam) op andere locaties in de plaats komen. Daarnaast wordt een nieuw gemaal gebouwd met een persleiding naar de boezem. Voor de aanvoer van het water naar het gemaal wordt de hoofdwaterloop verbreed naar 4,5 meter breedte. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om het nieuwe watersysteem als één peilgebied te kunnen laten functioneren.

De maatvoering is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar er moet rekening gehouden worden met bij de uitvoering onvermijdelijke of noodzakelijke afwijkingen.

Werkzaamheden uit te voeren door hoogheemraadschap:

Nr.	Onderdeel	Waterpeil	Maatvoering			
			Drempelhoogte	Max. klephoogte		Kruinbr.
1.	Klepstuw plaatsen	Waterpeil benedenstr. NAP -1,40 m Waterpeil bovenstr. NAP -0,60 m	NAP -1,80 m	NAP -0,2 m		1 m
2.	Grondnam aanleggen			Talud 1:2	Kruin-hoogte -0.1 m	Kruinbr. 6 m
3.	Duiker plaatsen	Zomerpeil NAP -1.00 m Winterpeil NAP -1.40 m	b.o.b. ¹ NAP -1.50 m	Duikerl. 10 m	Diam. 0.60 m	Kruinbr. 5 m
4.	Duiker vervangen	Zomerpeil NAP -1.00 m Winterpeil NAP -1.40 m	b.o.b. NAP -1.50 m	Duikerl. 13 m	Diam. 0.60 m	Kruinbr. 8 m
5.	Duiker plaatsen	Zomerpeil NAP -1.00 m Winterpeil NAP -1.40 m	b.o.b. NAP -1.50 m	Duikerl. 10 m	Diam. 0.60 m	Kruinbr. 5 m
6.	Duiker plaatsen	Zomerpeil NAP -1.00 m Winterpeil NAP -1.40 m	b.o.b. NAP -1.50 m	Duikerl. 8 m	Diam. 0.60 m	Kruinbr. 4 m
7.	Duiker plaatsen	Zomerpeil NAP -1.00 m Winterpeil NAP -1.40 m	b.o.b. NAP -1.50 m	Duikerl. 8 m	Diam. 0.60 m	Kruinbr. 4 m
8.	Hoofdwater-loop verbreden	Zomerpeil NAP -1.00 m Winterpeil NAP -1.40 m	Waterlijnbr. Verbreden naar 4.5 m	Talud 1:2	Waterd. 1 m	
9.	Gemaal plaatsen	Waterpeil benedenstr. NAP -1.40 m Waterpeil bovenstr. NAP -0.50 m	Capaciteit 22 m ³ /min			
10.	Duiker met schuif plaatsen	Waterpeil benedenstr. NAP -1.80 m Waterpeil bovenstr. NAP -1.40 m	b.o.b. NAP -1.50 m	Duikerl. 12 m	Diam. 0.60 m	Kruinbr. 6 m
11.	Persleiding gemaal			Lengte 80m	Diam. 0.40 m	

Tabel 1: werkzaamheden HHNK

¹ B.o.b. staat voor binnen onderkant buis.




Voor het beheer en onderhoud van de waterlopen/kunstwerken is in onderstaande tabel 2 aangegeven onder welke categorie en onderhoudsplicht deze in de legger worden opgenomen:

nr.	Onderdeel	categorie*	leggermaat *	Onderhouds- plicht	onderhouds- combinatie*
1.	Klepstuw plaatsen	Primair		Kunstwerken	1
2.	Gronddam aanleggen	Primair		Peilscheiding	3
3.	Duiker plaatsen	Primair		Kunstwerken	4
4.	Duiker vervangen	Primair		Kunstwerken	6
5.	Duiker plaatsen	Primair		Kunstwerken	4
6.	Duiker plaatsen	Secundair		Kunstwerken	5
7.	Duiker plaatsen	Secundair		Kunstwerken	5
8.	Hoofdwaterloop verbreden	Primair	G1	Wateren	1
9.	Gemaal plaatsen	Primair		Kunstwerken	1
10.	Duiker met schuif plaatsen	Secundair		Kunstwerken	1
11.	Persleiding gemaal	Primair		Kunstwerken	1

Tabel 2: Onderhoudsplicht

*zie de tabellen A en B in hoofdstuk 4.1. (Bijlagen)

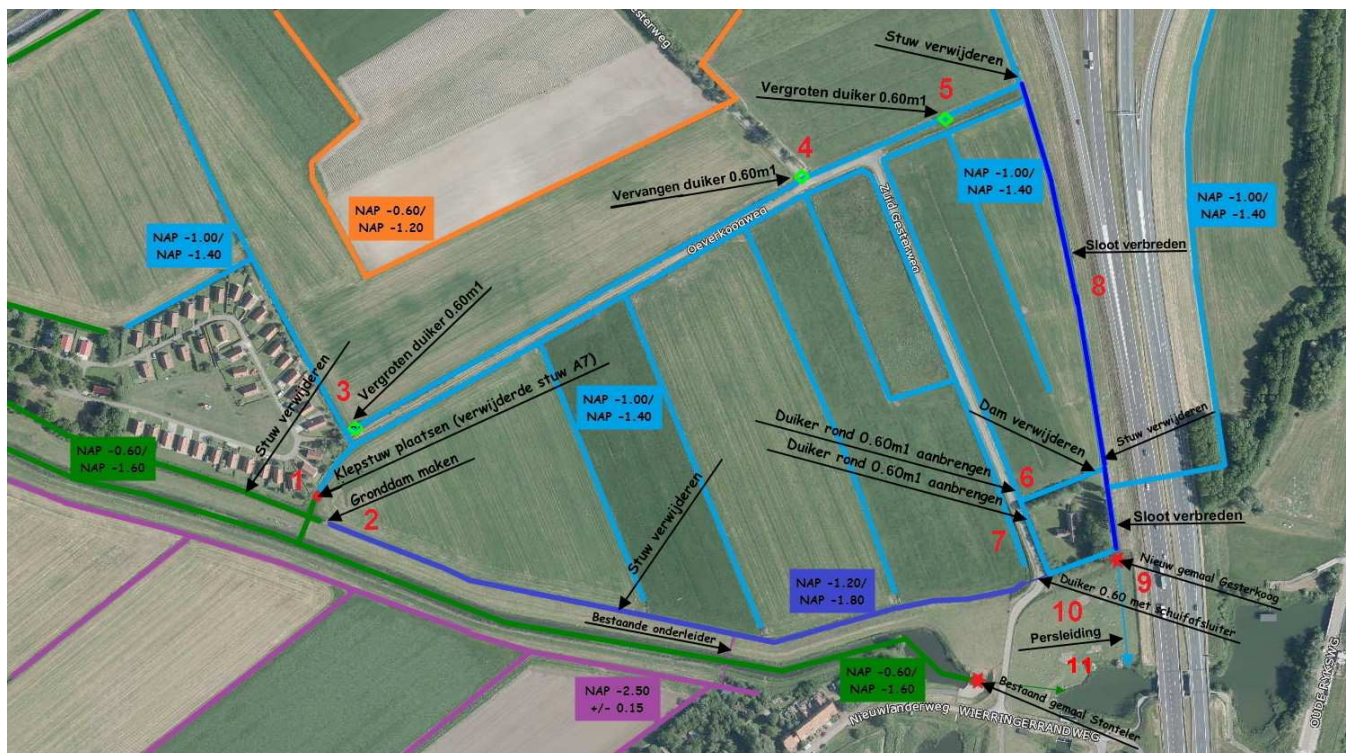

Figuur 6: Uit te voeren werkzaamheden door HHNK.



2.3 Effecten op de omgeving

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de activiteiten ten behoeve van dit project beschreven. Tevens zijn de relevante mitigerende en compenserende maatregelen beschreven. De effecten zijn zowel voor de gebruiksfase als de uitvoeringsfase bepaald. De gebruiksfase betreft de situatie na de uitvoering van het project.

De volgende omgevingsaspecten zijn beoordeeld, maar zijn niet van betekenis voor dit project:

- Licht
- Ontwikkelingen in de directe omgeving

In onderstaande paragrafen volgen de relevante omgevingsaspecten.

2.3.1 Belanghebbenden

In het projectgebied zijn vier belanghebbende partijen te benoemen: een particulier (woning), Rijkswaterstaat (grondeigenaar), agrariër (grondeigenaar en pachter) en de gemeente Hollands Kroon (wegbeheerder inclusief wegsloten). Met alle partijen is een aantal gesprekken gevoerd om de werkzaamheden en het verbinden van de peilgebieden af te stemmen. De grond waar de werkzaamheden met betrekking tot het gemaal plaatsvinden (inclusief slootverbreding en de aan te leggen persleiding) is in bezit van Rijkswaterstaat. Het gebied waar de persleiding door wordt aangelegd wordt gepacht door een agrariër. Deze agrariër pacht ook alle overige agrarische gronden in het projectgebied die niet in zijn bezit zijn.

De regionale wegen en de wegsloten in het projectgebied zijn in eigendom van de gemeente Hollands Kroon. De overige watergangen rondom het projectgebied zijn in het bezit van het hoogheemraadschap. De aanpassingen in het watersysteem (verwijderen en aanbrengen kunstwerken) vinden plaats in deze watergangen. Gedurende de realisatie van de kunstwerken zal tijdelijk gebruik gemaakt worden van grond van derden. Met alle belanghebbenden heeft afstemming plaatsgevonden over de voorgestelde werkzaamheden en het verbinden van de twee peilgebieden.

2.3.2 Wonen en werken

Binnen het projectgebied is één woning aanwezig en deze ligt naast de locatie voor de nieuwbouw van het gemaal. Er zal beperkt overlast zijn tijdens de uitvoering voor de particulier. Het gemaal ligt op een afstand van circa 35 meter van de woning en bevindt zich achter een groene strook met bomen en struiken. Er is geen direct zicht op het gemaal vanuit de woning. De bomen die gekapt moeten worden voor de verbreding van de waterloop staan nog voor deze groene strook, direct langs de waterloop. Ondanks dat de persleiding vanaf het gemaal open wordt gegraven zal dit tot weinig overlast leiden voor de particulier. Ook in de definitieve situatie zijn de nadelige gevolgen voor de particulier minimaal. Er is geen stankoverlast aangezien het oppervlaktewater betreft. De pompinstallatie bevindt zich in een afgeschermd kastconstructie waardoor de hoorbaarheid van het geluid beperkt is.

De grond waar de persleiding wordt aangelegd is in bezit van Rijkswaterstaat maar wordt gepacht door een agrariër. De locatie voor het gemaal met persleiding is afgestemd met de pachter en RWS. Alleen tijdens de uitvoering van de persleiding zal de pachter (gedeeltelijk) geen gebruik kunnen maken van dit gebied. De planning van de werkzaamheden worden tijdig afgestemd zodat het vee elders ondergebracht kan worden of op een afgezet stuk op ruime afstand van de werkzaamheden. De persleiding heeft geen gevolgen voor het gebruik van het gebied na aanleg, dit blijft agrarisch en kan begraasd worden door vee.




Met de pachter en de particulier worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de werkzaamheden.

2.3.3 Verkeer en bereikbaarheid

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen tijdelijk vrachtauto's over de Zuid-Gesterweg en de polderwegen in de omgeving van Gesterkoog rijden om materiaal aan te voeren. Ten tijde van de uitvoering zullen verkeersmaatregelen worden genomen om een veilige aanvoer van materiaal mogelijk te maken. Indien door de werkzaamheden openbare wegen tijdelijk afgesloten moeten worden zullen hiervoor de benodigde maatregelen worden getroffen. De woning zal bereikbaar blijven.

2.3.4 Veiligheid

Met het nieuwe gemaal wordt het water van de Gesterkoog via een persleiding uitgemalen naar de Zuiderhaven/IJsselmeer. De persleiding kruist hierbij de aanwezige primaire waterkering. De uitvoering van de kruising dient te voldoen aan de NEN3650 en NEN3651 normen². Doordat de primaire kering 80 meter breed is, de persleiding in twee etappes wordt aangelegd en boven het inundatiepeil van het IJsselmeer zal worden aangelegd, zijn de eventuele risico's verwaarloosbaar. De randvoorwaarden en genoemde NEN-normen met betrekking tot de stabiliteit van de waterkering en kwel worden meegenomen in de uitwerking van het bestek.

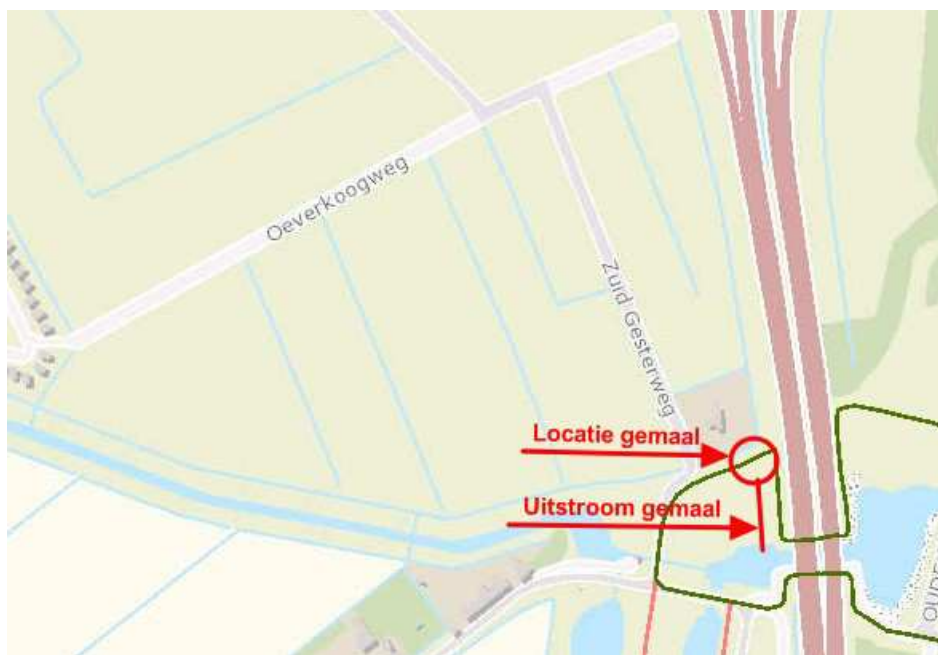

Figuur 7 Locatie kering in projectgebied als groene lijn weergegeven.

2.3.5 Landbouw en veeteelt

Het perceel van RWS waar het gemaal en persleiding worden gerealiseerd wordt gepacht. Met deze pachter wordt de start van de werkzaamheden tijdig afgestemd zodat het eventuele aanwezige vee elders ondergebracht kan worden. Het gemaal en de persleiding hebben geen gevolgen voor het

² Voorbeelden normen: het kunstwerk is dubbel kerend (door het toepassen van bereikbare afsluiters), de leiding is voldoende sterk en er worden kleikisten en kwelschermen toegepast.



gebruik van het gebied na aanleg, het perceel blijft geschikt om vee te houden. Het gemaal wordt zo afgeschermd dat het vee op afstand wordt gehouden.

2.3.6 Recreatie en toerisme

Aan de oostelijke kant van het recreatiepark de Wierde worden enkele kunstwerken verwijderd/aangelegd. Het betreffende gebied kan via de openbare weg bereikt worden zodat er geen gebruik wordt gemaakt van het park. De werkzaamheden zullen circa 2 weken duren en worden in de winterperiode (begin 2018) uitgevoerd voor zover dat mogelijk is. De Zuid-Gesterweg ligt tussen twee wandelknooppunten van het wandelnetwerk Noord-Holland. Gedurende de werkzaamheden zal de weg altijd bereikbaar zijn en is de wandelroute te gebruiken.

2.3.7 Natuur

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt onder andere de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet. De wet- en regelgeving van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet is hierbij grotendeels opgenomen in de Wet Natuurbescherming, waardoor de beschermingsregimes op hoofdlijnen behouden blijven. Door de wetwijzigingen wijzigt de toetsing als volgt:

1. De lijsten met beschermde soorten wijzigen. Ten opzichte van de Flora- en faunawet vervalt de bescherming van een aantal soorten, wijzigt de beschermingscategorie van een aantal soorten en een aantal nieuwe soorten krijgen een beschermingsstatus.
2. De toetsing aan Natura 2000-gebieden wijzigt. Voor werkzaamheden nabij Natura 2000-gebieden is een stikstofdepositiebeoordeling nodig.

Natura 2000

Voor projecten en activiteiten die kunnen leiden tot negatieve effecten op instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden moet een vergunning aangevraagd worden. Dat is geregeld in de Wet natuurbescherming. Vergunningen worden verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag speelt onder meer het betreffende provinciale beheerplan een rol. Voor aangewezen beschermde natuurgebieden zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld, waarin de instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd. Instandhoudingsdoelen richten zich op algemene doelen, habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels.

Het projectgebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. De Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Waddenzee liggen respectievelijk op één en 1,5 kilometer vanaf het projectgebied. Tussen het projectgebied en de Natura 2000-gebieden liggen de A7, diverse bosgebieden, havens en de bebouwing van Den Oever. Vanwege de beperkte aard en omvang van het project kunnen negatieve effecten van het project op Natura 2000-gebieden worden uitgesloten.

In de Natura 2000-gebieden liggen habitattypen die gevoelig zijn voor vermisting door stikstofdepositie uit de lucht. Om te beoordelen of er sprake kan zijn van negatieve effecten door de inzet van verbrandingsmotoren is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd in AERIUS Calculator. Uit de berekening volgt dat het project niet leidt tot een overschrijding van drempelwaarden van stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Vermestende of verzurende effecten door de inzet van verbrandingsmotoren worden op voorhand uitgesloten.



Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het NNN is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan een natuurverbinding in het NNN. De uitstroom van het gemaal wordt gerealiseerd in een waterplas die onderdeel uitmaakt van een Natuurverbinding. De Natuurverbinding is aangewezen als 'Extra leefgebied voor de soorten'. Bij het realiseren van de uitstroom wordt over een lengte van maximaal drie meter oever omgezet in verharding. Hierbij gaat oevervegetatie verloren. Vanwege de beperkte omvang van de werkzaamheden wordt de Natuurverbinding niet wezenlijk aangetast. Uitgesloten wordt dat het project leidt tot een aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk Nederland.

Weidevogelleefgebieden

Het projectgebied ligt nabij een weidevogelleefgebied. Het project wordt uitgevoerd direct naast de A7 en door het project worden bomen als mogelijke versturende elementen voor weidevogels verwijderd. De uit te voeren maatregelen nabij het weidevogelleefgebied vinden plaats langs de Rijksweg A7 en op enige afstand van de Zuidgesterweg. De Zuidgesterweg is één van de ontsluitingswegen van nabijgelegen buurtgemeenschappen en dorpen en is onder andere bestemd voor gemotoriseerd (vracht)verkeer. Broedgevallen van weidevogels worden daarom niet verwacht binnen de verstoringzone van het project. Negatieve effecten van het project op weidevogelleefgebied worden niet verwacht.

Soortbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De Wet natuurbescherming bestaat uit een zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en verschillende verbodspalingen. De zorgplicht heeft tot doel dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. De verbodsbepalingen zorgen ervoor dat in het wild levende soorten worden beschermd. De Flora- en faunawet maakte onderscheid in tabel 1-soorten, tabel 2-soorten (middelzwaar beschermd) en tabel 3-soorten (zwaar beschermd). Veel van de tabel 1, 2 en 3 Flora- en Faunawet soorten vallen nu onder Wet natuurbescherming als Habitatrichtlijnsoorten (deels tabel 3) of Andere (overige) soorten, maar er zijn ook soorten die per 1 januari 2017 geen beschermde status meer bezitten. Er zijn ook nieuw beschermde soorten op de lijst met Andere (overige) soorten geplaatst, het gaat om de molmuis, kwabaal, diverse vaatplanten en dagvlinders welke binnen het beheersgebied van HHNK kunnen voorkomen.

Voor middelzwaar en zwaar beschermde soorten geldt als uitgangspunt dat een ontheffing is vereist voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij overtreding van de genoemde verbodsbepalingen optreden, tenzij wordt gewerkt volgens de Gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen 2012³. De gedragscode is bij ruimtelijke ontwikkelingen niet van toepassing op tabel 3-soorten.

Vrijgestelde soorten

Een deel van de beschermingscategorie Andere soorten is vrijgesteld door de Provincie Noord-Holland (2016c). Aantasting van verblijven en het verwonden en doden van individuen dient wel gemeld te worden voorafgaand aan het project.

Door het project in lijn met de gedragscode uit te voeren (Unie van Waterschappen 2012), wordt het verwonden en doden van vrijgestelde soorten zoveel mogelijk voorkomen. Desondanks kan niet

³ <http://www.uvw.nl/publicatie/gedragscode-flora-en-faunawet-waterschappen-2012>



uitgesloten worden dat het project leidt tot het verwonden en doden van individuen en het vernietigen van verblijven van de volgende soorten:

1. Algemene amfibieën: Meerkikker, Middelste groene kikker, Kleine watersalamander;
2. Algemene muizen: Huismuis, Bosmuis, Dwergmuis, Veldmuis, Aardmuis, Rosse woelmuis, Huisspitsmuis, Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis, Woelrat;
3. Overige algemene grondgebonden zoogdieren: Egel.

Er is een melding gedaan voor gebruik van de vrijstellingsregeling voor deze soorten bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Conclusies

Het gebied is onderzocht tijdens de effectstudie 'Quickscan flora en fauna Wierdijk' (15.65929) en een aanvullend veldbezoek (Memo oplegnotitie Natuurtoetsing Gemaal Gesterkoog, 16.721630). De conclusies en aanbevolen maatregelen zijn hier kort samengevat:

- *Gebiedsbescherming*

Het projectgebied ligt niet in en grenst niet aan Natuurbeschermingswetgebieden. Negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn niet te verwachten.

Het projectgebied ligt nabij een Natuurverbinding in het Natuurnetwerk Nederland en ligt nabij een Weidevogelleefgebied. Vanwege de beperkte omvang van de werkzaamheden wordt de Natuurverbinding niet wezenlijk aangetast. Vanwege de ligging van het project langs een weg met gemotoriseerd (vracht)verkeer wordt een aantasting van Weidevogelleefgebied niet verwacht.

- *Overzicht te verwachten soorten en effecten*

Zie onderstaande tabel voor een beknopt overzicht van de aangetroffen en te verwachten soorten van de Wet natuurbescherming in het projectgebied en de mogelijke effecten op de soorten.

Tabel 1. Overzicht (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en beschermde functies in het plangebied.

Soortgroep	(Mogelijk) aanwezige beschermde soorten	WNb*	Beschermde functie plangebied
Vaatplanten	Geen	-	-
Vogels: nesten jaarrond beschermd	Geen	-	-
Vogels: overig	o.a. Meerkoet, Koolmees, Merel	VR	Nest
Grondgebonden zoogdieren	Geen	-	-
Vleermuizen	Gewone dwergvleermuis, Ruige Dwergvleermuis, Laatvlieger en Meervleermuis	HS	Geen
Reptielen	Geen	-	-
Amfibieën	Geen	-	-
Vissen	Geen	-	-
Overig	Geen	-	-

* Beschermingscategorie Wet natuurbescherming: Habitatsoorten (HS), Vogelrichtlijnsoorten (VR) of Andere soorten (AS).



Aanbevolen maatregelen

Met inachtneming van de volgende maatregelen wordt rekening gehouden met beschermde soorten en vinden de werkzaamheden plaats in lijn met de gedragscode:

- Voer het project uit in de periode augustus t/m februari of controleer in de periode maart t/m juli op broedgevallen en mijdt deze. Hierdoor wordt verstoring en het verlies van broedgevallen voorkomen.
- *Ontheffing- of vergunningenplicht*
Met inachtneming van genoemde maatregelen is nader onderzoek of een ontheffing van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk. Met een uitvoering van de werkzaamheden conform de gedragscode (Unie van Waterschappen, 2012) zijn negatieve effecten op beschermde soorten niet te verwachten.

2.3.8 Water

De Waterwet eist dat de aanleg of de wijziging van een waterstaatswerk plaatsvindt volgens een door het hoogheemraadschap vast te stellen projectplan. Een projectplan is een waterstaatkundig besluit waartegen rechtsbescherming open staat.

De uitvoering van dit projectplan levert een bijdrage aan het realiseren van de volgende doelen/thema's uit het Waterbeheerplan: droge voeten en voldoende water.

De aanleg van het nieuwe gemaal en de aanpassingen in het projectgebied leiden tot positieve effecten op het watersysteem. Er ontstaat een robuust watersysteem waardoor de afwatering vanuit het bovenliggende (stedelijk) gebied sterk verbetert en de laag gelegen percelen worden ontlast. De drooglegging is afgestemd op de agrarische functie van het projectgebied.

Het verbinden van de twee peilgebieden heeft geen negatieve effecten op de omliggende bebouwing noch op de wegen. Ook heeft het geen gevolgen voor de agrarische functie van het projectgebied.

2.3.9 Bodem

Tijdens het ontwerp van het gemaal is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd (16.8324). Er is een sondering gemaakt ter hoogte van de toekomstige instroom en uitstroom van het gemaal. Een tweede geplande sondering in het midden van het tracé van de persleiding was niet mogelijk in verband met de brokken puin onder het maaiveld. Daarom zal tijdens de aanleg van de persleiding rekening worden gehouden met de aanwezigheid van puin en wordt dit puin afgevoerd indien nodig.

Verder blijkt uit het verkennende bodemonderzoek dat de hypothese 'verdachte locatie' voor het bodemonderzoek stand houdt. In de ondergrond is een sterk verhoogd gehalte PAK aangetoond. Tevens zijn diverse andere parameters (metalen en minerale olie) licht verhoogd aangetoond in de grond en het grondwater.

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' voor het verkennend asbest in grondonderzoek geen stand houdt. Asbest is niet aangetroffen en/of aangetoond.

Aanbevelingen

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te adviseren.

Voorafgaande aan de grondwerkzaamheden dient een Besluit uniforme saneringen (BUS) melding te worden ingediend bij en goedgekeurd door de provincie Noord-Holland. De grondwerkzaamheden dienen door een gecertificeerde aannemer te worden uitgevoerd en door een gecertificeerde milieukundige begeleider te worden begeleid.

Bij afvoer van grond of puin van de projectlocatie kan een aanvullend onderzoek verlangd worden.



Een extra bodemonderzoek is uitgezet voor de verbreding van de waterloop. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek worden passende beheersmaatregelen getroffen tijdens de uitvoering.

2.3.10 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Landschap

Het toetsingkader voor het landschap bestaat onder andere uit het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de provinciale ruimtelijke verordening en het bestemmingsplan van de gemeente Hollands Kroon. Effecten van de voorgenomen waterhuishoudkundige werkzaamheden (de bouw van een gemaal, het plaatsen van stuwen en duikers en het koppelen van twee peilgebieden) zijn niet te verwachten.

Cultuurhistorie

Gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Deze verplichting, die voorkomt uit het rijksbeleid voor modernisering van de monumentenzorg (MoMo), is vanaf 1 januari 2012 vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het doel van deze verplichting is te bevorderen dat de cultuurhistorische waarden al bij de start van een planontwikkeling een rol spelen en worden meegewogen in de besluitvorming.


De Wierdijk is een provinciaal cultuurhistorisch monument, alle werkzaamheden aan deze dijk zijn vergunningplichting. De werkzaamheden in dit projectplan hebben geen invloed op de Wierdijk. Eventuele effecten van de voorgenomen werkzaamheden op cultuurhistorische waarden zijn niet te verwachten.

Monumenten

De Erfgoedwet beschermt cultureel erfgoed. Deze wet geeft het Rijk de mogelijkheid om objecten aan te wijzen als rijksmonument. Rijksmonumenten worden wettelijk beschermd via het vergunningstelsel. Daarnaast bestaan er nog beschermde stads- en dorpsgezichten. Onder stads- en dorpsgezicht worden groepen van onroerende zaken bedoeld die een bijzondere eigenschap hebben en in welke zich een of meer monumenten bevinden. Sinds 2012 wijst het Rijk geen nieuwe rijksbeschermd stads- en dorpsgezichten meer aan. Gemeenten houden in bestemmingsplannen voor bijzondere gebieden al (verplicht) rekening met cultuurhistorie. Een stads-of dorpsgezicht kan nog wel op gemeentelijk niveau als beschermd aangemerkt worden; dan gaat het om een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Dit geldt voor gemeenten waar dit is vastgelegd in het gemeentelijk beleid. De aanwijzing zorgt voor extra bescherming via aangepaste bestemmingsplannen en het daarbij horende vergunningstelsel.

De Erfgoedwet geeft aan provincies en gemeenten de vrijheid om zelf monumenten aan te wijzen en een monumentenlijst op te stellen. Dit is uitgewerkt in de provinciale en de gemeentelijke erfgoedverordeningen.

Voor het wijzigen, verstoren, afbreken of verplaatsen van een beschermd monument is een vergunning nodig. Vlakbij het projectgebied ligt het monument de Wierdijk. De dijk loopt tot aan de Zuid-Gesterweg. Zoals op de kaart (figuur 8) aangegeven wordt het gemaal ten oosten van de Zuid-Gesterweg geplaatst. De voorgenomen werkzaamheden hebben geen invloed op het monument de Wierdijk.

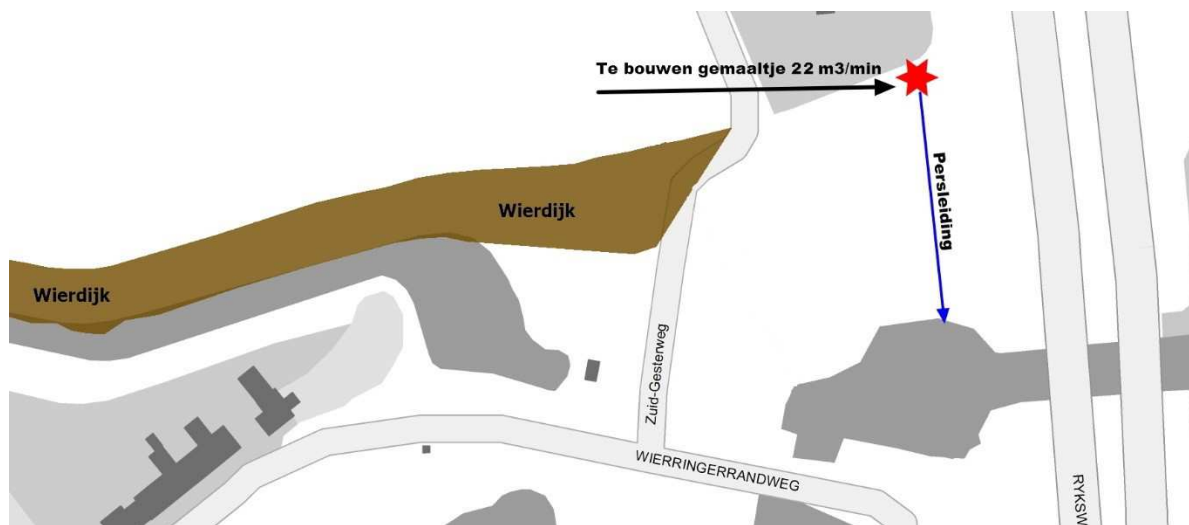

Figuur 8: Locatie gemaal ten opzichte van de Wierdijk.

2.3.11 Archeologie

Door ondertekening van het Verdrag van Malta heeft Nederland zich verplicht om bij de planvorming rekening te houden met archeologische waarden in een gebied. Uitgangspunt is daar waar mogelijk behoud van archeologische waarden 'in situ' (bij behoud in situ blijven de archeologische waarden in de bodem bewaard). De Wet op de archeologische monumentenzorg legt beperkingen op ten aanzien van het grondgebruik. Bij aantasting van archeologische waarden geldt het uitgangspunt dat de verstoorder betaalt.

De Wierdijk is op de Archeologische Monumentenkaart als terrein van hoge archeologische waarde aangegeven. Ook is de Wierdijk als provinciaal archeologisch monument aangewezen. Aangezien in een eerder ontwerp van het project het gemaal door de Wierdijk zou gaan, is op verzoek van het HHNK een archeologisch bureauonderzoek met verkennende boringen uitgevoerd (16.1442). Realisatie van het oude plan zou kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het gemaal wordt op een andere locatie gerealiseerd waarbij de Wierdijk volledig intact blijft. De resultaten uit het archeologische onderzoek zijn niet meer relevant voor de nieuwe locatie van het gemaal, de Wierdijk ligt op afstand. Wel blijft de persleiding ook in de nieuwe situatie door de puinstort gaan. De boringen uit het onderzoek op de locatie van de persleiding blijven relevant voor de nieuwe locatie van het gemaal en de persleiding. De boringen ter hoogte van de persleiding laten zien dat er sprake is van een dik opgehoogd pakket (> 2,0 m) en bevestigen de bevindingen van de kaartanalyse dat hier sprake is van een opgebracht zandpakket/puinstort. Deze puinstort is ontstaan bij de bouw van de huidige Rijksweg A7 door RWS. Het materiaal van de oude weg is hier gestort. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in het kader van de aanleg van de persleiding geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Nu het gemaal niet meer naast de Wierdijk wordt gebouwd, maar juist naast de puinstort is de kans op aantasting van archeologische waarden verwaarloosbaar.

2.3.12 Niet gesprongen explosieven

Een historisch vooronderzoek naar conventionele explosieven (CE) is uitgevoerd rond het projectgebied (17.20789). De in het onderzoek vermelde verdachte locaties liggen ver van het projectgebied. Op basis van de beoordeelde feiten van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen indicaties zijn van CE in het projectgebied.



De werkzaamheden worden onder reguliere condities uitgevoerd. De kans op het aantreffen van CE is net zo groot als de gemiddelde kans op het aantreffen van CE op als 'onverdacht' aangemerkte locaties in de rest van Nederland.

2.3.13 Geluid, luchtkwaliteit en trillingen

Geluid

Van een extra geluidsbelasting op de omgeving is alleen sprake tijdens de bouw van het gemaal en de persleiding. Sloop- en grondwerk en het trillen of het heien kan belastend zijn voor de omgeving. In het door de uitvoerder op te stellen uitvoeringsplan wordt aangegeven wanneer welke werkzaamheden worden uitgevoerd. In dit uitvoeringsplan worden ook de werktijden benoemd, die voor werken binnen de gemeente van toepassing zijn.

Lucht

De werkzaamheden voor de realisatie van het project worden uitgevoerd met machines die qua milieueisen (uitstoot van gassen en geluid) aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Ook indien deze tussentijds door de overheid worden gewijzigd of aangescherpt. Het door de opdrachtnemer voor de realisatie te gebruiken materieel (kranen, vrachtauto's, et cetera) moet aan deze eisen voldoen. Extra belasting tijdens de uitvoering zal ten opzichte van de bestaande situatie gering zijn.


Trillingen

Bij het aanbrengen van verticale constructies kan onder andere een keuze gemaakt worden voor drukken, trillen of heien. Ook andere technieken zoals een cement-bentoniet sleuf of een diepwand behoren tot de mogelijkheden. Deze keuze is afhankelijk van de aanwezigheid van gebouwen en funderingen in de directe omgeving, de grondslag (bodemopbouw) en de gevraagde technische specificatie van een verticale constructie. Bij het detailleren van het ontwerp door de uitvoerder wordt ook de verticale constructie nader gespecificeerd, evenals de methode van aanbrengen.

Alleen trillen en heien levert trillingen op, waarbij het verschil zit in een langdurige geringe belasting (trillen) of een korte klap bij heien. Heiwerkzaamheden zijn tijdens het broedseizoen uitgesloten. De uitvoerder bepaalt binnen de gestelde kaders welke techniek toegepast wordt. Het ontwerp en de uitvoeringsmethode van de uitvoerder zullen door het hoogheemraadschap worden getoetst, waarbij preventie van schade aan gebouwen voorop staat.

2.3.14 Kabels en leidingen

Er is voor het projectgebied een KLIC-melding gedaan. De meeste kabels en leidingen liggen ver van het gebied af waar gegraven gaat worden voor de aanleg van het gemaal en de verbreding van de waterloop (figuur 9). Alleen de KPN kabel ten oosten van de woning ligt dicht tegen de te verbreden waterloop aan. Aangezien de waterloop aan de andere zijde wordt verbreed zal de kabel geen obstakel zijn. In voorbereiding op de bouw van het gemaal zullen enkele proefsleuven gegraven worden om de exacte locatie van de kabel te bepalen zodat hier rekening mee gehouden kan worden tijdens de werkzaamheden.

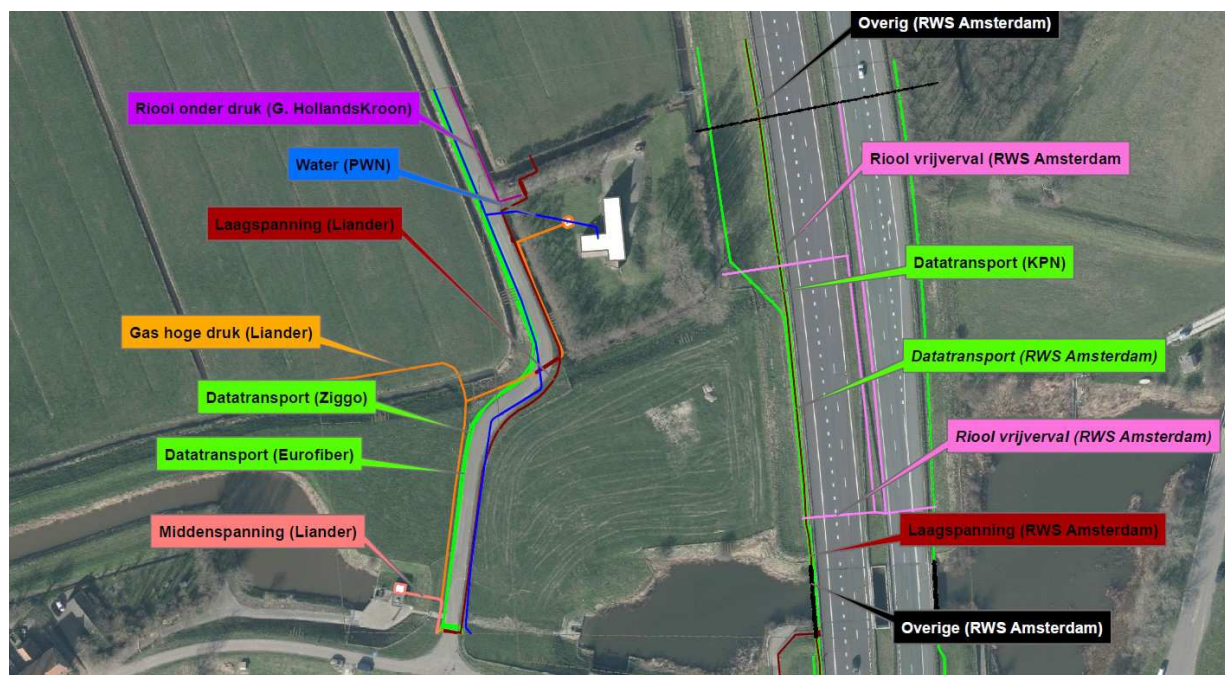

Figuur 9: Kabels en leidingen locatie gemaal Gesterkoog.

2.4 Vergunningen en ontheffingen

Het gemaal is gelegen in de bestemming 'verkeersdoeleinden' van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Wieringen 2002 van de gemeente Hollands Kroon. De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, parkeerplaatsen, bermen en de daarbij behorende verhardingen, geluidwerende voorzieningen en groenvoorzieningen. Een gemaal is daarmee een afwijking van het bestemmingsplan. Er zal een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan worden aangevraagd middels een kruimelprocedure (artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht). Het gemaal voldoet aan de eisen voor een kruimelprocedure: het is een bouwwerk ten behoeve van de waterhuishouding, niet hoger dan 3 meter en de oppervlakte is kleiner dan 15m².

Daarnaast is (in december 2016) een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Hollands Kroon voor de activiteit bouwen.

Voor de verbreding van de waterloop is het noodzakelijk om enkele bomen te kappen. De benodigde kapvergunning (omgevingsvergunning gemeente Hollands Kroon) is in februari 2017 aangevraagd. Bij de Provincie Noord-Holland wordt vooraf aan de grondwerkzaamheden een BUS-melding ingediend.

Het is noodzakelijk om een Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) vergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat omdat het gemaal en de verbreding van de waterloop binnen de Wbr grens liggen. De aanvraag is in februari ingediend.



2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten voor de uitvoering

2.5.1 Planning

De voorlopige planning voor het totale project is in onderstaande tabel weergegeven. De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd om overlast te beperken en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot vergunningen en Flora en Fauna.

Fase	Periode	Uitvoering door
Ontwerp & bestek	Tot de zomer 2017	HHNK
Realisatie	Najaar – Winter 2017	Aannemer
Garantieperiode	Een jaar na realisatie	Aannemer, HHNK

2.5.2 Beschikbaarheid van de benodigde grond

1. Het projectgebied omvat circa 16 ha waarvan enkel de watergangen in eigendom zijn van het hoogheemraadschap.
2. De gemeente Hollands Kroon is wegbeheerder van de regionale wegen en de daarbij behorende wegsloten in het projectgebied.
3. 1 ha van het projectgebied is in eigendom van Rijkswaterstaat. Het betreft de grond waar het gemaal en persleiding wordt aangelegd, de toevoer naar het gemaal wordt verbreed en de toegangsweg naar het gemaal voor onderhoud wordt aangelegd. Met Rijkswaterstaat wordt een zakelijk recht gesloten voor het gemaal, de persleiding, de toevoer en de verharding (toegangsweg).

Voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het gemaal en de kunstwerken is het van belang dat het hoogheemraadschap vrijelijk kan beschikken over de binnen het ruimtebeslag betrokken gronden. Daar waar nodig worden de betrokken eigendommen conform het eigendommenbeleid van het hoogheemraadschap verworven en daar waar derden gebruik maken van de eigendom van het hoogheemraadschap, wordt dit gebruik beëindigd dan wel worden de gebruikers aangeschreven de werkzaamheden te gedogen.

2.6 Afwijkingsmogelijkheden in de uitvoering

Inherente afwijkingsmogelijkheden

In hoofdstuk 2.2 staan de afbeeldingen en de afmetingen van de waterstaatswerken die worden gewijzigd. Deze maten en de afbeeldingen zijn bepalend voor de wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd. Desondanks is niet uit te sluiten dat in de uitvoering beperkte afwijkingen ontstaan van de hierboven beschreven maatvoering. Dit is inherent aan de aard van de waterstaatswerken voorkomend uit de praktische en de noodzakelijke grofmazigheid van de uitvoeringswerkzaamheden en -machines.

Nadere invulling bij omgevingsvergunning

Dit projectplan geeft primair duidelijkheid over de functionele eisen van de waterstaatswerken die het hoogheemraadschap gaat uitvoeren. Daarnaast wordt het vereiste ruimtebeslag en de maatvoering van deze werken zo nauwkeurig mogelijk aangegeven. Voor de aanleg van het gemaal geldt dat naast dit plan nog een omgevingsvergunning (bouwvergunning) en een toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig is. Zie hoofdstuk 2.4 voor de toelichting.



Archeologie

Het hoogheemraadschap heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar de archeologische waarden in het projectgebied. Dit projectplan houdt rekening met de uitkomsten van dat onderzoek. Ondanks de verrichte onderzoeken is niet volledig uit te sluiten dat tijdens de uitvoering onverwachte vondsten worden gedaan. Gelet op de internationale afspraak om archeologische resten zoveel mogelijk in situ te behouden, behoudt het hoogheemraadschap zich het recht voor om af te wijken van de maatvoering, de ligging en de locatie van de in paragraaf 2.2 genoemde waterstaatswerken onder voorwaarde dat:

1. de afwijking dient om een archeologische vondst in situ te behouden;
2. geen nadelige effecten voor derden optreden, anders dan reeds voorzien en onderzocht in dit plan (zie paragraaf 2.3.11);

daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de waterstaatkundige doelen en de uitgangspunten van dit plan.

2.7 Beheer en onderhoud

Op het moment dat dit projectplan is uitgevoerd, zal het hoogheemraadschap de gerealiseerde werken inmeten en optekenen op revisietekeningen. Vervolgens worden de maten of de functionele eisen in de legger vastgelegd. Hiervoor neemt het hoogheemraadschap een leggerbesluit. Het beheer en het onderhoud wordt uitgevoerd conform de beheer- en onderhoudsrichtlijn.

2.8 Schade en nadeelcompensatie

Bij de voorbereiding van dit projectplan is onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit project voor omwonenden en bedrijven. De conclusies van het onderzoek zijn dat er geen schade kan ontstaan voor omwonenden.

Nadeelcompensatie

Indien een belanghebbende als gevolg van de uitvoering van het projectplan toch schade lijdt, kan zij bij het hoogheemraadschap een verzoek om een vergoeding indienen. Het hoogheemraadschap keert een schadevergoeding uit voor zover de schade redelijkerwijs niet ten laste van de indiener moet komen en de schade niet al anderszins is verzekerd. Schade die binnen het normaal maatschappelijke risico valt, wordt derhalve niet vergoed. Een belanghebbende kan een verzoek indienen tot uiterlijk vijf jaar nadat hij heeft vastgesteld dat hij in een wezenlijk nadeliger positie is komen te verkeren door de uitvoering van het projectplan. Twintig jaar na het afgerond zijn van de werkzaamheden verjaart elke mogelijkheid om nadeelcompensatie te vragen. Bij de behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie past het hoogheemraadschap de Verordening nadeelcompensatie 2015 van het hoogheemraadschap toe. Ook een beheerder of eigenaar die zijn kabel of leiding moet aanpassen vanwege het projectplan, kan het hoogheemraadschap om nadeelcompensatie vragen. De Verordening nadeelcompensatie 2015 van het hoogheemraadschap verklaart de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten Rijkswaterstaatswerken en Spoorwerken 1999 van overeenkomstige toepassing op deze verzoeken.

Planschade

De mogelijkheid tot vergoeding van planschade is geregeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Planschade kan optreden indien het college van Burgemeester en Wethouders een geldend bestemmingsplan wijzigt om de nieuwe waterstaatswerken planologisch mogelijk te maken.



De gewijzigde bestemming moet dan tot gevolg hebben dat onroerende zaken (grond, gebouwen) objectief in waarde dalen (vermogensschade). Met een wijziging van het bestemmingsplan is gelijk gesteld de omgevingsvergunning om de werkzaamheden te mogen uitvoeren in afwijking van dat bestemmingsplan. Op grond van artikel 7.16 Waterwet blijft afdeling 6.1 van de Wro buiten toepassing indien een belanghebbende een beroep kan doen op een schadevergoeding als bedoeld in artikel 7.14 lid 1 Waterwet. In dat geval wordt een planschadeverzoek opgevat als een verzoek om nadeelcompensatie ingevolge de Waterwet, dat wordt afgehandeld door het hoogheemraadschap.

Uitvoeringsschade


Tijdens de realisatie van het project kan sprake zijn van niet voorziene situaties waarbij als gevolg van werkzaamheden fysieke schade wordt toegebracht aan de eigendommen van derden (doorgaans gebouwen, grondstructuur, gewassen en dergelijke). Als deze schade onverhoopt optreedt en aan de werkzaamheden zijn toe te schrijven, kan de eigenaar/gebruiker een schadeloosstelling indienen bij het hoogheemraadschap.



3 Toelichting partiële herziening peilbesluit Wieringen

3.1 Aanleiding partiële herziening

Aanleiding voor deze partiële herziening van het peilbesluit Wieringen is de verbetering van het watersysteem en de aanleg van een gemaal in de Gesterkoog. Om de kans op wateroverlast te beperken wordt een robuust watersysteem gecreëerd met een nieuw gemaaltje waarbij twee peilgebieden in de Gesterkoog met elkaar worden verbonden (zie projectplan). De peilgebieden 2856F en 2856G worden samengevoegd (figuur 10).

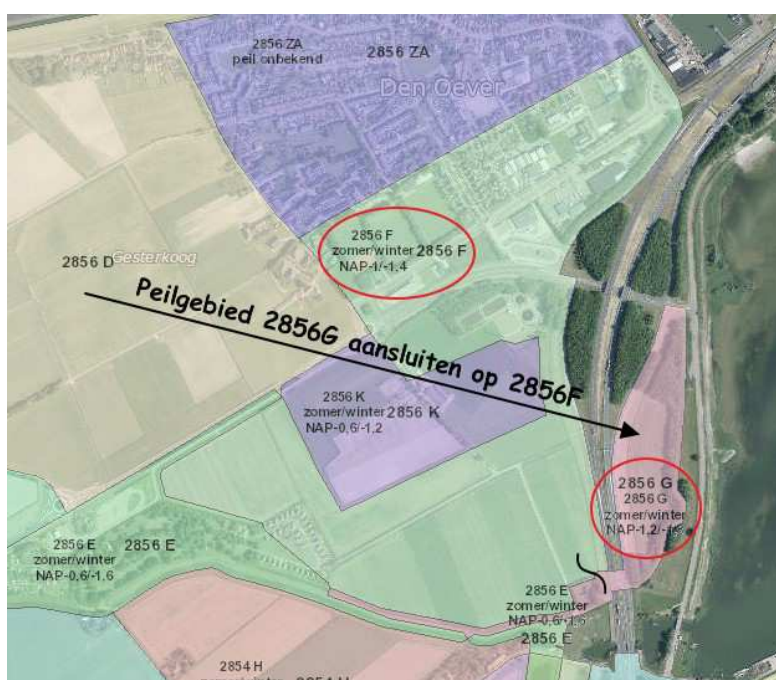

Figuur 10: Verbinden peilgebieden 2856F en 2856G.

3.2 Gebiedsbeschrijving

De peilgebieden 2856F en 2856G zijn gelegen in het gebied de Gesterkoog dat onderdeel uitmaakt van de polder Oosterlanderkoog in de gemeente Hollands Kroon.

Het peilgebied 2856F heeft een zomerpeil van NAP -1,0 m en een winterpeil van NAP -1,4 m. En het peilgebied 2856G een zomerpeil van NAP -1,2 m en een winterpeil van NAP -1,80 m.

Het samengevoegde nieuwe peilgebied wordt aan de noordkant begrenst door de dorpskern van Den Oever en aan de oostkant door de Stontelerweg. Aan de zuidkant door een primaire waterloop (peilgebied 2856E) en aan de westkant door het chaletpark de Wierde aan de Akkerweg. De Rijksweg A7 loopt aan de oostkant door het peilgebied heen. Middels een duiker onder deze weg door staan beide gebieden met elkaar in verbinding.


Het zuidelijke deel langs de primaire waterloop van het peilgebied 2856G houdt het bestaande waterpeil (zomerpeil NAP -1,20 m en winterpeil NAP -1,80 m). Dit deel wordt aan de oostkant door een nieuwe duiker met schuifafsluiter afgesloten van de rest van het peilgebied en in het westen door een gronddam.



3.3 Vigerend peilbesluit

Het gebied de Gesterkoog (onderdeel polder Oosterlanderkoog) maakt onderdeel uit van het peilbesluit Wieringen dat op 23 februari 1990 door het CHI is vastgesteld.

3.4 Watersysteembeschrijving nieuw peilgebied

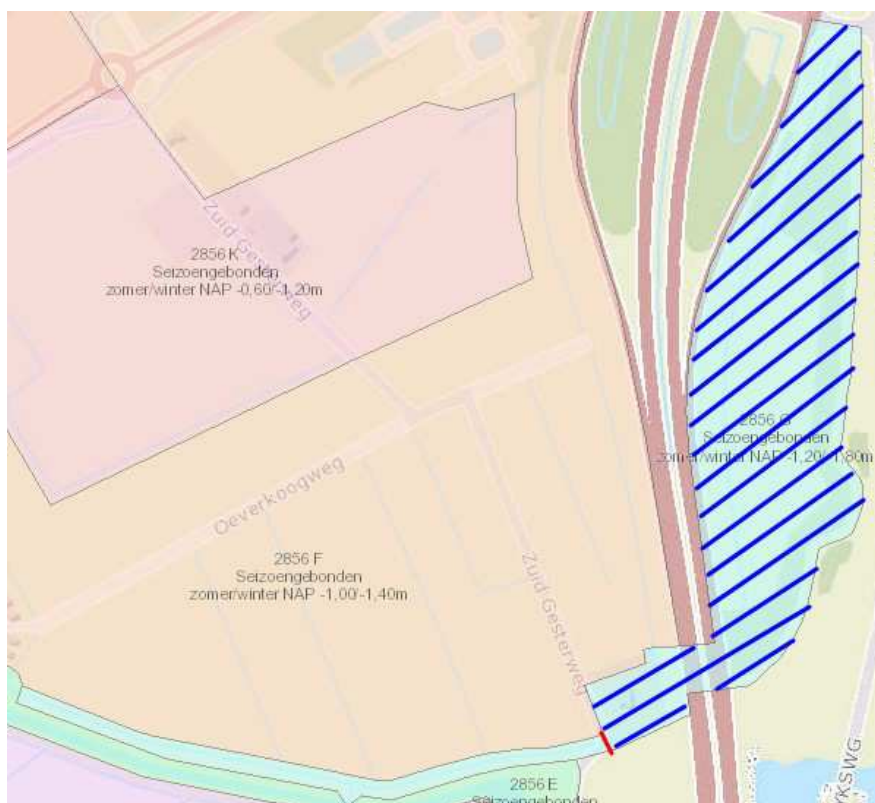

Figuur 11: Verhoging waterpeil in peilgebied 2856G.

In de huidige situatie zijn in de peilgebieden 2856F en 2856G geen onderbemalingen aanwezig. Door het verbinden van beide peilgebieden zal het waterpeil in het peilgebied 2856G 20 cm hoger staan in de zomer en 40 cm hoger in de winter. Het waterpeil voor het samengevoegde peilgebied wordt NAP -1,0 m zomerpeil en NAP -1,4 m winterpeil, conform het huidige peil in peilgebied 2856F. RWS is gevraagd om de peilverhoging te beoordelen aangezien dit effect kan hebben op de Rijksweg A7 en zij grondeigenaar zijn van het betreffende gebied. Het oordeel van RWS is dat de verhoging geen impact heeft op de wegconstructie van de A7 en dat negatieve effecten door het verbinden van de twee peilgebieden voor RWS uitgesloten zijn.

De bestaande waterlopen in het huidige watersysteem blijven in de nieuwe situatie grotendeels intact. Slechts één hoofdwaterloop (ten noorden van het nieuwe gemaal) wordt verbreed met circa 2 meter naar 4,5 meter over een lengte van circa 355 meter. Deze waterloop dient als toevoer naar het gemaal. De waterloop ligt op ruime afstand (22 meter) van de oostelijk gelegen Rijksweg A7 en wordt aan de westelijke kant (van de weg af) verbreed. Voor de verbreding van de waterloop dient een WBR vergunning te worden aangevraagd (zie 2.4). De peilwijziging heeft geen effect op deze waterloop. Deze blijft het huidige waterpeil houden.

Zoals in figuur 11 is te zien wordt het peil voornamelijk aan de oostzijde van de A7 verhoogd. Het gebied bestaat uit een natuurstrook met een waterloop. In dit gebied zijn geen woningen aanwezig



en er is geen agrarisch grondgebied. De waterloop ligt op ruime afstand (25 meter) van de A7 waardoor de wijziging minimale impact heeft.

Aan de westzijde van de A7 heeft de verhoging alleen effect op de primaire en secundaire waterlopen rondom de woning. De woning ligt tussen de 15 en 25 meter van de waterloop af en is hoger gelegen op het perceel. De eigenaar heeft aangegeven graag een iets hoger waterpeil te wensen. Het effect van de geringe peilverhoging is verwaarloosbaar. Ook het effect voor de pachter van het perceel op de kering is minimaal doordat de kering 80 meter breed is en de waterloop op afstand ligt.

3.5 Uitgangspunten en belangen

Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten die gebruikt zijn bij het opstellen van de partiële herziening. Daarnaast is geïnventariseerd of er knelpunten worden voorzien en welke wensen er zijn ten aanzien van het waterpeil binnen het projectgebied.

Deze informatie is meegenomen bij de afweging van het vast te stellen peil.

Uitgangspunten

Beleid en wetgeving

Bij het opstellen van deze partiële herziening en het projectplan is rekening gehouden met de nu geldende wetgeving en beleid. Een van de consequenties van deze wetgeving is dat een voorgenomen peilwijziging wordt getoetst op eventueel optredende effecten voor het functioneren van het watersysteem en het faciliteren van de functies in het gebied.

Belangen

Aanleiding voor deze partiële herziening van het peilbesluit Wieringen is de verbetering van het watersysteem en de aanleg van een gemaal in de Gesterkoog. Doordat er een robuuster watersysteem ontstaat wordt de kans op wateroverlast kleiner.

De direct belanghebbenden zijn de particulier, de pachter en Rijkswaterstaat. Het vast te stellen peil door het verbinden van de twee peilgebieden is in overleg met deze partijen bepaald. De gemeente Hollands Kroon wordt als wegbeheerder geïnformeerd.

3.6 Afweging belangen

In dit hoofdstuk worden de keuzes en afwegingen beschreven die voortkomen uit de gebruikte uitgangspunten.

3.6.1 Afweging op basis van uitgangspunten

3.6.1.1 Peilbeheer

In de Gesterkoog wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. Dit houdt in dat een ander streefpeil voor het zomerseizoen is vastgesteld dan voor het winterseizoen. Bij dit type peilbeheer bestaat de bandbreedte tussen het winterpeil en zomerpeil uit 0,05 - 0,50 meter waarbij het winterpeil lager is dan het zomerpeil. Voor de Gesterkoog is het verschil tussen zomerpeil en winterpeil 0,40 meter. Zo is er in het nattere winterseizoen ruimte voor waterberging, terwijl in het drogere zomerseizoen extra water in het gebied aanwezig is. Dit type peilbeheer wordt met name toegepast ten behoeve van agrarische functies. Afhankelijk van de weersomstandigheden varieert het waterpeil met enkele centimeters rondom het streefpeil.



3.6.1.2 Effecten

In deze paragraaf worden de te verwachte effecten van de verandering in de partiële herziening beschreven.

Géén formele m.e.r.-beoordelingsplicht

Op grond van de Wet milieubeheer en de bijlage bij het Besluit m.e.r. kan een structurele verlaging van het (streef-)peil van een oppervlaktewater m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Dit is het geval wanneer de activiteit:

1. betrekking heeft op een verlaging van 16 centimeter of meer,
2. plaatsvindt in een gevoelig gebied of een weidevogelgebied, en
3. betrekking heeft op een oppervlakte van 200 hectare of meer.

Omdat er in dit peilbesluit géén sprake is van bovenstaande situatie geldt er géén formele m.e.r.-beoordelingsplicht.

Géén effecten op milieu- en omgevingsaspecten

Omdat de peilaanpassing minimaal is (zowel in de oppervlakte van het gebied als in de verhoging van het waterpeil met 0,20 cm zomerpeil / 0,40 cm winterpeil) zijn er als gevolg van het peilbesluit géén effecten te verwachten op milieu- en omgevingsaspecten, zoals waterberging, waterkwaliteit, landbouw, natuur of cultuurhistorie. Zoals eerder beschreven in 3.4 heeft de peilwijziging nauwelijks invloed op de omgeving doordat er geen bebouwing en agrarisch grondgebied aanwezig is in het oostelijke deel van het peilgebied 2856G. Het effect op de woning aan de westelijke kant is verwaarloosbaar doordat de waterlopen op afstand liggen en de woning hoger is gelegen op het perceel. De peilen in waterlopen in het agrarische gebied in de Gesterkoog behouden het huidige waterpeil. Er zijn dan ook geen effecten voor de agrariërs door de peilwijziging. Het effect voor de pachter van het perceel op de kering is minimaal doordat de waterloop op afstand ligt en de kering breed is (80 meter).

Veiligheid

Het oordeel van RWS is dat de verhoging geen impact heeft op de wegconstructie van de A7 en dat negatieve effecten door het verbinden van de twee peilgebieden voor RWS uitgesloten zijn.

Het samenvoegen van de twee peilgebieden heeft geen invloed op de primaire waterkering. Het hoogheemraadschap heeft de invloed van de peilverhoging op de waterkering onderzocht en concludeert dat het effect minimaal is.



4 Bijlagen

4.1 Onderhoudsplicht

Tabel A: onderhoudsplicht wateren:

	buitengewoon onderhoud	baggeren	gewoon onderhoud nat	gewoon onderhoud droog	principe indeling wateren
1	HHNK	HHNK	HHNK	aanliggende eigenaar	primair water en stedelijk water ⁽¹⁾ (na overname)
2	gemeente	gemeente	gemeente	aanliggende eigenaar	stedelijk water ⁽¹⁾ (nog) niet overgenomen
3	dijkeigenaar	dijkeigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	dijksloten ⁽²⁾
4	spoorweg- beheerder	spoorweg- beheerder	spoorweg- beheerder	aanliggende eigenaar	spoorsloten ⁽³⁾
5	vervallen				
6	RWS	RWS	RWS	aanliggende eigenaar	wegsloten ⁽⁴⁾ rijkswegen en rijksvaarwegen
7	defensie	defensie	defensie	aanliggende eigenaar	defensie terrein
8	provincie N-H	provincie N-H	provincie N-H	provincie N-H	provinciale vaarwegen
9	wegeigenaar	wegeigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	wegsloten ⁽⁴⁾
10	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	secundair en tertiair water
11	HHNK	HHNK	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	breed secundair water ⁽⁵⁾
12	gemeente	gemeente	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	breed secundair water ⁽⁵⁾
⁽¹⁾ Stedelijk water: Wateren in een overnametraject conform beleidsuitgangspunten aanwijsbaar als overnameobject. ⁽²⁾ Dijksloten: Wateren die door een (brede) berm of talud gescheiden, naast de dijk gelegen is en derhalve behoort tot het waterstaatswerk waterkering. ⁽³⁾ Spoorsloten: Wateren die door een (brede) berm of talud gescheiden, naast een spoorbaan gelegen is en derhalve behoort tot het profiel van de spoorbaan. Daar de onderhoudsplicht voortvloeit uit de exploitatie van het spoor wordt Railinfratrust bedoeld met spoorweginfrastructuur. ⁽⁴⁾ Wegsloten: Wateren die door een (brede) berm of talud gescheiden, naast de weg gelegen is en derhalve behoort tot het profiel van de weg. Wanneer de weg onderdeel is van een dijkprofiel dan wordt de sloot aangemerkt als dijksloot en niet als wegsloot. Wanneer een sloot van de weg wordt gescheiden door een, niet bij de wegeigenaar in eigendom zijnde, strook land of natuurgebied dan wordt dat water niet meer als wegsloot aangemerkt. Indien een wegsloot gelegen is tussen twee wegen, dan geldt de onderhoudsplicht voor het baggeren en buitengewoon onderhoud voor de wegeigenaar van de weg met het grootste belang. Daarbij hanteert het hoogheemraadschap als volgorde: Provinciale weg, weg buiten de bebouwde kom, weg binnen de bebouwde kom, fietspaden, voetpaden. ⁽⁵⁾ Breed water: Breed secundair water waarvan het middengedeelte van het natte profiel volledig wordt onderhouden door het hoogheemraadschap of de gemeente. De onderhoudsplicht van de aanliggende eigenaar geldt tot 3 meter in het water.					



Tabel B: onderhoudsplicht kunstwerken:

	onderhoud constructie	onderhoud gewoon nat	onderhoud gewoon droog	afval^(*)	principe indeling kunstwerken
1	HHNK	HHNK	aanliggende eigenaar	HHNK	peilregelende werken ⁽¹⁾ die dienen voor het peilbeheer in de polder
2	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	peilregelende werken ⁽²⁾ die zijn voor het peilbeheer rond de percelen van enkele eigenaren
3	HHNK	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	peilscheidingen ⁽³⁾
4	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar ⁽⁴⁾	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	toegangsdammen met duiker, en toegangsbruggen in primaire wateren
5	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	toegangsdammen met duiker en toegangsbruggen in secundaire en tertiaire wateren
6	wegeigenaar	wegeigenaar ⁽⁴⁾	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	dammen met duiker en bruggen in/onder wegen in primaire wateren
7	vergunninghouder of eigenaar	vergunninghouder of eigenaar ⁽⁴⁾	vergunninghouder of eigenaar	vergunninghouder of eigenaar	duikers door percelen van derden in primaire wateren
8	wegeigenaar	wegeigenaar	aanliggende eigenaar	aanliggende eigenaar	dammen met duiker en bruggen in/onder wegen in secundaire en tertiaire wateren
9	vaarweg- beheerder	vaarweg- beheerder	vaarweg- beheerder	vaarweg- beheerder	schutsluizen
10	vergunning- houder	n.v.t.	vergunning- houder	vergunning- houder	overige kunstwerken ⁽⁵⁾
^(*) afval ruimen:			Binnen stedelijk gebied gemeente.		
⁽¹⁾ peilregelende werken polder:			Gemalen, spuisluizen, stuwen, inlaatconstructies, aquaducten, onderleiders.		
⁽²⁾ peilscheidende werken particulier:			Gemalen t.b.v. peilafwijking (onderbemalingspomp), stuwen en terugloopvoor- zieningen, inlaatconstructies, aquaducten, onderleiders.		
⁽³⁾ peilscheidende werken:			Vaste dammen; ook wel spekdam, kistdam, pendam of keerschut genoemd.		
⁽⁴⁾ Kunstwerken in primaire wateren:			HHNK onderhoudt in het primaire systeem de oppervlaktewaterlichamen. Bij het regulier onderhoud daarvan verzorgt HHNK indien mogelijk en aansluitend ook het natte onderhoud van de kunstwerken in de primaire wateren zoals bij duikers en bruggen. Dit onderhoud door HHNK ontslaat de eigenaar of vergunninghouder van een kunstwerk niet van zijn verantwoordelijkheid voor het onderhoud.		
⁽⁵⁾ overige kunstwerken:			Vispassages, sluizen buiten de aangewezen vaarwegen, kunstwerken behorende bij particuliere peilafwijkingen.		



4.2 Effectstudie 'QuickScan flora en fauna Wierdijk'

De effectstudie (15.65929) is op te vragen voor geïnteresseerden. Daarnaast is een aanvullende memo Natuurtoetsing Gemaal Gesterkoog (16.721630) op te vragen voor geïnteresseerden.



4.3 Toelichting ontwerp gemaal Gesterkoog / Wierdijk

Het ontwerp is inclusief grondonderzoeken (16.95627) op te vragen voor geïnteresseerden.



4.4 Rapport vooronderzoek conventionele explosieven 'Polder Waard-Nieuwland Deel II - Wieringen'

Het rapport vooronderzoek conventionele explosieven (17.20790) is op te vragen voor geïnteresseerden.



4.5 Rapport bureauonderzoek archeologie 'Watervverbetering Oosterlanderkoog/Gesterkoog te Wieringen'

Het rapport bureauonderzoek archeologie (16.1442) is op te vragen voor geïnteresseerden.



4.6 Besluitvormingsprocedure

Onderdeel	Datum
1. Behandeling ontwerppeilbesluit en ontwerpprojectplan door dagelijks bestuur en vrijgave voor inspraak.	18/04/2017
2. Zienswijzetermijn	28 april tot 9 juni 2017
3. Behandeling vast te stellen stukken in het dagelijks bestuur en aanbieding peilbesluit ter vaststelling aan algemeen bestuur hoogheemraadschap. ^{4 5}	niet van toepassing
4. Behandeling in adviescommissie W&W	6 september 2017
5. Vaststelling in algemeen bestuur	20 september 2017
6. Beroepstermijn	PM

⁴ Bij geen zienswijzen blijft het peilbesluit ongewijzigd en vervalt deze stap. Het peilbesluit wordt dan direct ter advies voorgelegd aan de adviescommissie van het algemeen bestuur.

⁵ Indien geen zienswijzen op het ontwerpprojectplan wordt deze ambtelijk vastgesteld. Bij zienswijzen is vaststelling van het onderdeel projectplan een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Het vaststellingsbesluit van het onderdeel projectplan zal pas in werking treden na de bekendmaking en na vaststelling van het peilbesluit door het algemeen bestuur.
