



Projectplan Waterwet

Nieuwbouw gemaal Het Anker

projectnr. 777

Objectcode :

KGM265 - Gemaal 'Het Oude Anker'

KGM318 - Nieuw gemaal 'Het Anker'

3 december 2021

auteur(s)

J. (Julia) Klooker

R. (Reinier) Buringa

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest

Postbus 18

9700 AA Groningen



Inhoud

blz.

1	Vervangen gemaal Het Anker	2
1.1	Aanleiding en doel	2
1.2	Ligging plan- en werkgebied.....	2
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken en knelpunten	3
1.3.1	<i>Huidige situatie</i>	<i>3</i>
1.3.2	<i>Nieuwe situatie</i>	<i>4</i>
1.3.3	<i>Sloop gemaal Het Oude Anker</i>	<i>5</i>
1.3.4	<i>Nieuw gemaal Het Anker</i>	<i>5</i>
1.3.5	<i>Planning.....</i>	<i>6</i>
2	Effecten van het plan en de werkzaamheden	7
2.1	Watersysteem.....	7
2.2	Waterveiligheid.....	7
2.3	Ecologie	8
2.3.1	<i>Overlast omgeving</i>	<i>8</i>
2.4	Legger en beheer en onderhoud	8
2.4.1	<i>Legger</i>	<i>8</i>
2.4.2	<i>Beheer, onderhoud en bediening van objecten</i>	<i>8</i>
3	Samenwerking en communicatie	9
4	Verantwoording	9
4.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	9
4.2	Verantwoording van keuzes in het project	9
4.3	Benodigde vergunningen en meldingen	9
5	Bevoegdheid en gevolgde procedure	10
5.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan.....	10
5.2	Procedure	10
6	Rechtsbescherming	10
7	Bijlagen (los toegevoegd):	11
7.1	Bijlage 1: Plan- en werkgebied 'Nieuwbouw Poldergemaal Het Anker'	11
7.2	Bijlage 2: Asbestonderzoek Gemaal Het Oude Anker	11
7.3	Bijlage 3: Ontwerpnotitie Het Anker, Schetsontwerp, d.d. 16-4-2021	11
7.4	Bijlage 4: Definitief Ontwerp Poldergemaal het Anker	11
7.5	Bijlage 5: Ecologische toets 'Nieuwbouw Poldergemaal Het Anker'	11



1 Vervangen gemaal Het Anker

Benaming van de objecten:

- KGM265 Gemaal 'Het Oude Anker' (bestaande gemaal)
- KGM 094 Gemaal Ten Boer
- KGM318 Nieuw gemaal 'Het Anker'

1.1 Aanleiding en doel

Oostelijk van het Westerwijtwerdermaar, tussen Ten Boer en Ten Post, bevindt zich de polder Het Anker, een landelijk gebied dat bemalen wordt door het poldergemaal Het Anker (KGM00265) (zie ook bijlage 1).

Poldergemaal Het Anker is aan vervanging toe; het verkeert in een zeer slechte bouwkundige staat en voldoet niet aan de actuele functionele en technische eisen en arbo-richtlijnen. Het gemaal is bijvoorbeeld niet aangesloten op telemetrie en lastig bereikbaar voor de peilbeheerder.

Het algemeen bestuur heeft reeds op 5 februari 2014 ingestemd met het voorstel om zowel poldergemaal Ten Boer als poldergemaal Het Anker te vervangen en te combineren tot één gemaal met voor elk bemalingsgebied één pomp. Poldergemaal Ten Boer is in 2014 vervangen. Toen is echter ook een financiële afweging gemaakt om het bemalingsgebied Het Anker op dat moment nog niet te koppelen middels een onderleider.

Op 26 augustus 2020 heeft het Algemeen Bestuur krediet beschikbaar gesteld om de koppeling wel te realiseren. Na een aanbesteding van een bouwteamopdracht heeft aannemingsbedrijf KWS deze opdracht aangenomen om het ontwerp en de bouw voor te breiden.

Begin 2021 is uit de voorbereiding voor de onderleider een hoog risicoprofiel en hoge aanlegkosten gebleken. Deze hebben geleid tot een voorstel om tegen lagere kosten en een lager risicoprofiel een nieuw gemaal te bouwen op de huidige locatie van gemaal Het Anker en dus geen onderleider aan te leggen. Dit wijzigingsvoorstel is voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en op 24 november 2021 door hen akkoord bevonden.

Dit Projectplan Waterwet is van toepassing op de volgende activiteiten:
Amoveren huidige gemaal Het Oude Anker (KGM 265)
Realisatie nieuw gemaal Het Anker (KGM 318).
Realisatie inlaatvoorziening bemalingsgebied Het Anker
Toegangspad naar het gemaal, over de kering langs het Westerwijtwerdermaar

1.2 Ligging plan- en werkgebied

Het plan- en werkgebied zijn weergegeven op bijlage 1.

Het huidige en nieuwe gemaal zijn gesitueerd op een graslandperceel (BOE00 A3533) (adres: Rijksweg bij 105, 9792 PC TEN POST) en is via een aangrenzend graslandperceel (BOE00 A4703) lopend en met klein materieel bereikbaar. Ter plaatse van het huidige gemaal ligt het maaiveld op circa -0,80 tot -1,0 m NAP.



1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken en knelpunten

1.3.1 Huidige situatie

Het huidige poldergemaal Het Oude Anker is elektrisch aangedreven en heeft een pompcapaciteit van 2,7 m³ per minuut. De installaties van het poldergemaal Het Oude Anker zijn aan vervanging toe. Het object voldoet niet meer aan de functionele en technische eisen en arbo-richtlijnen. Zo is het huidige gemaal niet aangesloten op telemetrie en is het object slecht bereikbaar. Door de sterk verouderde pompinstallatie kan een bedrijfszekere peilbeheer in de polder niet langer worden gegarandeerd. Daarnaast is er in de huidige situatie geen inlaatmogelijkheid om in tijden van droogte water in te laten in deze polder.



Gemaal Het Oude Anker, Bovenbouw



Instroomvoorziening gemaal Het Oude Anker



Uitstroom voorziening gemaal Het Oude Anker

1.3.2 Nieuwe situatie

Het nieuwe gemaal zal bestaan uit een betonnen pompput met daarin een Hidrostaal pomp. De persleiding achter de pomp zal voorzien worden van een dubbele kering, te weten: een balkeerklep en een terugslagklep. De betonnen put wordt gefundeerd middels stalen damwanden, welke tevens dienst doen als kwelschermen. De damwanden steken daarom ook iets verder de kering in om onder- en achter loopsheid te voorkomen. Voor de besturing van het gemaal komt er een besturingskast naast de pompput te staan. Voor een veilige bedrijfsvoering is het ontwerp getoetst aan CE normeringen en richtlijnen. Daaruit volgend is het ontwerp geoptimaliseerd en wordt er onder andere leuningwerk toegepast. Voor de bereikbaarheid is een verharde toegangsweg zeer gewenst en daarvoor wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

1.3.2.1 Berekeningen gemaalcapaciteit

De benodigde capaciteit voor het gemaal is als volgt berekend:

- Oppervlakte polder = 25 ha
- Maatgevende afvoer huidig = 1,33 l/s/ha
- Maatgevende afvoer tot 2050 = 1,55 l/s/ha
- Kwel = 2 mm/dag (kwelkaart provincie Groningen)
- Maatgevend tot 2050 + kwel = 1,78 l/s/ha
- Totale afvoer = 25 ha * 1,78 l/s/ha = 44,5 l/s = 2,67 m³/min.

De ontwerpisen aan het watersysteem van Noorderzijlvest staan vermeld in het 'Beleid peilbeheer en peilbesluiten', d.d. mei 2018.

De eisen aan het watersysteem zijn als volgt:

- Maximale stroomsnelheid watergang = 0,20 m/s bij half maatgevende afvoer.
- Maximaal verhang in de watergang = 5 cm/km bij half maatgevende afvoer.
- Maximaal verval over een duiker = 2 cm bij maatgevende afvoer.* Gezien voetnoot is een kleiner verval wenselijk.
- Tenminste 20% lucht in duikers bij maatgevende afvoer.
- Maximale opstuwing in het peilgebied = 25 cm bij half maatgevende afvoer.

1.3.2.2 Berekeningen watergangen

Voor verschillende watergangen zijn de doorstroomoppervlakken, stroomsnelheden en verhangen berekend bij een peil van -1,80m NAP (winterpeil). Voor alle profielen, ook de bovenstroomse, is het debiet voor het gehele bemalingsgebied gebruikt. Dit is mogelijk een overschatting van het debiet voor het bovenstroomse gedeelte, maar door de kleine schaal van het gebied en de onzekerheid die in de kwelflux en andere data zit is het verstandig de hoogste waarden te gebruiken voor berekeningen, hierdoor zit je aan de veilige kant van de foutmarge.

In de tabel hieronder staan de resultaten:

Pro_id	Afvoer (half maatgevend) (l/s)	lengte (m)	zonder slib, peil -1,80			met slib (ingemeten okt 2019) peil -1,80		
			v (m/s)	s (cm/km)	s totaal (cm)	v (m/s)	s (cm/km)	s totaal (cm)
129444	22,27	175	0,04	0,33	0,058	0,06	1,39	0,24
129445	22,27	157	0,02	0,03	0,004	0,03	0,26	0,04
129446	22,27	318	0,02	0,06	0,018	0,02	0,08	0,02
129447	22,27	193	0,01	0,02	0,003	0,02	0,03	0,01
129752	22,27	83	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00
totaal					0,084			0,32



In de tabel valt af te lezen dat het verhang in watergang de Ankertoht bij half maatgevende afvoer onder de 5 cm/km blijft en over het gehele peilgebied kleiner is dan 25 cm, namelijk 0,08 cm of 0,3 cm respectievelijk zonder slib en met slib. Ook de berekende stroomsnelheid is ter hoogte van ieder ingemeten profiel ruim onder de 0,2 m/s. Uit tabel 1 valt dus te concluderen dat de watergang de Ankertoht ter hoogte van alle profielen voldoet aan de gestelde hydraulische eisen, zowel in huidige situatie met slib als in een situatie waarin de watergang opgeschoond wordt van slib.

Conclusie uit de tabel: in sommige delen van de Ankertoht ligt een aanzienlijke laag slib. **Uit hydraulische berekeningen blijkt dat dit geen belemmering vormt voor een goede doorstroming.** Mogelijk vormt de grote hoeveelheid slib in de Ankertoht wel een risico voor de levensduur van de pomp van gemaal het Anker. Voor het nieuwe gemaal is daarom een slibscherm opgenomen in het ontwerp.

1.3.2.3 Berekeningen inlaat

Noorderzijlvest heeft geen vastgelegde norm voor wateraanvoer, daarom is gezocht naar een vergelijkbaar waterschap dat wel een vastgestelde norm heeft. Er wordt gebruik gemaakt van de aanvoernorm van Hoogheemraadschap Delfland (2009):

De aanvoernorm (debiet voor de wateraanvoersituatie) te gebruiken voor wateren met een wateraanvoerfunctie, wordt bepaald met de volgende normen:

- Grasland/akkerbouw/stedelijk gebied: 2,7 mm/dag
- Open water: 6,0 mm/dag
- Glastuinbouw: 5,0 mm/dag

Peilgebied het Anker = 25ha, hoofdzakelijk grasland en een beetje bebouwing.

$0,0027 \text{ m/dag} * 250.000 \text{ m}^2 = 675 \text{ m}^3/\text{dag} \rightarrow 0,47 \text{ m}^3/\text{min}$ of $0,0078 \text{ m}^3/\text{s}$

Het totale verval: $-1,33 - (-1,60) = 0,27 \text{ m}$. De lengte van de duiker zal 10 meter zijn.

Het advies is om de inlaat, op de locatie van het oude gemaal het Anker, een diameter van minimaal 0,1 meter te geven.

1.3.3 Sloop gemaal Het Oude Anker

Het oude gemaal wordt in zijn geheel gesloopt. De bestaande onderdelen zijn ongeschikt om op verder te bouwen en sluiten niet aan bij een veilige en zekere bedrijfsvoering. Het gebouw heeft geen beschermingsstatus en het sloopafval bedraagt minder dan 10m³ waardoor er geen sloopmelding van toepassing is. Het bouwwerk is asbestvrij (bijlage 2). De huidige stroomvoorziening van het oude gemaal is van voldoende capaciteit voor het nieuwe gemaal. De stroomvoorziening wordt daarom omgezet naar het nieuwe gemaal.

1.3.3.1 Tijdelijke bemaling

Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden wordt de polder middels een tijdelijke pomp bemalen, totdat het nieuwe gemaal in gebruik wordt genomen. De tijdelijke pomp, met een vergelijkbare capaciteit als het huidig gemaal, wordt nabij de locatie van gemaal Het Anker aan de Ankertoht geïnstalleerd, zodanig dat het poldergebied goed wordt bemalen en de pomp en afvoerbuis het werk niet belemmeren.

1.3.4 Nieuw gemaal Het Anker

Het nieuwe gemaal is uitgebreid beschreven in de ontwerpnotitie (bijlage 3) en het definitieve ontwerp (bijlage 4).

Het ontwerp is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Het gemaal dient dubbelkerend te worden uitgevoerd in de vorm van een tweede afsluitmiddel. Dit, omdat het gemaal in de regionale kering komt te staan;
- Gemaal het Anker wordt een 1-pomps gemaal;
- Als ontwerpcapaciteit is voor het gemaal 2,70 m³/min aangehouden;
- Het nieuwe gemaal moet een visvriendelijke pomp krijgen;
- Een vispassage is niet nodig;



- Het gemaal wordt voorzien van een krooshek.

In samenspraak met de beheerder is besloten om te kiezen voor de pomp, gesitueerd in een betonnen pompkelder, welke gefundeerd op damwanden. De besturing wordt ondergebracht in een (standaard) buitenopstellingskast. Zowel aan de in- als uitstroomzijde worden schotbalkspinningen geplaatst zodat het gemaal drooggezet kan worden voor onderhoud. Op het dek van de kelder dient rekening gehouden te worden met het (instorten) van een voorziening ten behoeve van een hijsdavit. Bij het gemaal wordt een opstelplaats gerealiseerd van 10 bij 10 meter. Aan de noordwestzijde van het gemaal wordt een veekerend hekwerk geplaatst van 1,10 m hoog.

1.3.4.1 Inlaatwerk

De inlaatleiding wordt uitgevoerd als een Ø200 mm met twee handbediende schuifafsluiters (visvriendelijk), dit ook vanwege de eis van dubbele kering. De inlaatleiding wordt om het gemaal heen geleid, zie hiervoor ook het Voorlopig Ontwerp in bijlage 4.

1.3.4.2 Toegangspad

Het toegangspad is gesitueerd aan de rand van het perceel (bijlage 1) en ligt deels op de regionale kering van het waterschap. Deze grond is in particulier eigendom en zal aangekocht moeten worden. De ligging en uitvoering van het toegangspad zal daarvoor worden afgestemd met de huidige grondeigenaar en daarnaast zal de uitvoeringswijze door het waterschap worden getoetst aan de eisen die gesteld worden aan een regionale kering. Indien overeengekomen, wordt het toegangspad bestraat met grasbetonstenen, 3 meter breed en met aan weerszijden een berm van 0,50 meter.

Uitgangspunten pad in traject regionale kering:

- De regionale kering voldoet. Toetshoogte ter plaatse is - 0,58 m;
- De kering wordt aan de buitenzijde niet vergraven en ook niet tijdelijk verlaagd. Aan de bovenzijde op de kruin wordt een klein cunet gegraven voor het toegangspad;
- Het pad wordt aangelegd op een hoogte van -0,20 m en wat extra overhoogte i.v.m. mogelijke klink;
- Er wordt rekening gehouden met 1 m breedte tussen insteek en pad op de kruin;
- Benodigde ophoging / verbreding huidige kering kan met gesloten grondbalans, mits het kleigrond betreft;
- Het pad en de kering (zonder beschoeiing) zijn stevig genoeg voor het gebruik door licht materieel;
- Het pad bestaat uit grasbetonstenen, opgesloten met opsluitbanden;
- Van toepassing voor de aanleg zijn de voorwaarden voor werken in een beschermingszone regionale kering;

1.3.5 Planning

De bouwteamfase wordt in december 2021 afgerond met een aanbieding van aannemingsbedrijf KWS voor de werkzaamheden. De planning ziet er daarop als volgt uit:

Opdrachtverlening door Noorderzijlvest	: 1 januari 2022
Werkvoorbereiding door KWS	: januari 2022 - maart 2022
start realisatie	: medio april 2022
oplevering	: medio juli 2022
onderhoudstermijn	: 6 of 12 maanden/ nader te bepalen


2 Effecten van het plan en de werkzaamheden

Beoogd effect

Het garanderen van bedrijfszeker peilbeheer in peilgebied Het Anker en een veilige werk- en leefomgeving voor ingelanden, agrariërs en beheer- en onderhoudspersoneel van het waterschap.

2.1 Watersysteem

Het plangebied bestrijkt het peilgebied Het Anker in de gemeente Groningen. Het gemaal is aangesloten op de Ankertocht. Uit de hydrologische toetsing komt naar voren dat het voorliggende plan voorziet in realisatie van een watersysteem dat voldoet aan de door het waterschap gestelde eisen en normen.

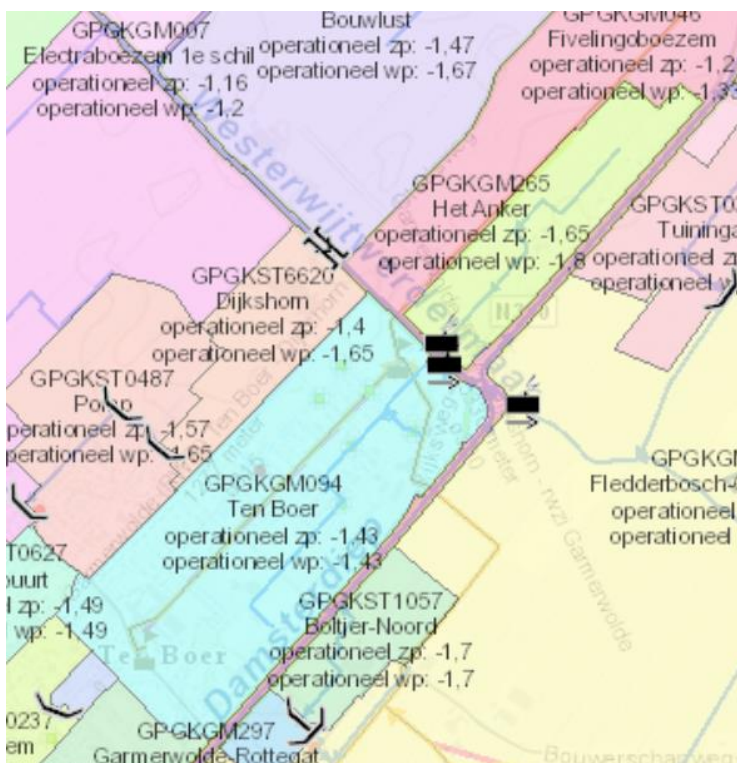

Het plan heeft effect op de waterhuishouding in peilgebied Het Anker. In dit peilgebied geldt een operationeel peil van -1.65 m NAP zp en -1.80 m NAP wp.

Het waterbeheer is in de huidige omstandigheden moeilijk te garanderen, met name doordat de pomp niet is voorzien van telemetrie en doordat de pomp lastig te bereiken is. Na realisatie van het nieuwe gemaal zal de afvoer van het overtollige water stabiel verlopen. Bovendien kan desgewenst water worden ingelaten. Het operationele peil blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.

Figuur 1: peilgebieden Het Anker (geel) (bron: Geoweb)

2.2 Waterveiligheid

Het gemaal ligt in de beschermingszone van de regionale kering van het Westerwijtwerdermaar. De kerende hoogte blijft voortdurend gewaarborgd middels bouwkuipen van stalen damwand, al of niet aangevuld met grondrammen.

Tijdens graafwerkzaamheden wordt een protocol met toetsen en beheermaatregelen m.b.t. de stabiliteit van de kering in acht genomen. Het gemaal wordt dusdanig gefundeerd dat de stabiliteit van de kade niet wordt belemmerd.

De plannen en werkzaamheden hebben geen effect op de waterveiligheid. De waterveiligheid is in de huidige én de toekomstige situatie geborgd. Het tracé van het onderhoudspad langs de Westerwijtwerdermaar ligt in de beschermingszone van de regionale kering. De kerende hoogte blijft voortdurend gewaarborgd.



De werkzaamheden worden buiten het stormseizoen (1 oktober- 1 april) uitgevoerd. De waterkeringen blijven voor het waterschap te allen tijde bereikbaar voor onder andere inspecties of calamiteitenbestrijding.

Door stalen damwanden te plaatsen onder en naast het gemaal wordt er met nieuwe gemaal rekening gehouden met onder- en achter loopsheid.

2.3 Ecologie

Ten behoeve van de realisatie van het nieuwe gemaal heeft het waterschap een ecologische quickscan uit laten voeren (Altenburg&Wymenga, 2021) (bijlage 5). Hieruit volgt dat er op eventueel beschermde soorten geen negatieve effecten worden verwacht van het plan en de werkzaamheden. Wel geldt de Zorgplicht. Het waterschap stelt de eis dat bij de werkzaamheden de Gedragscode Flora en Fauna wordt nageleefd. Hiermee voldoet het waterschap aan de zorgplicht. Het plan en de werkzaamheden hebben nauwelijks tot geen effect op de aquatische natuur. Het waterpeil in de primaire watergangen wordt niet gewijzigd.

Het waterschap heeft als beleid om gemalen bij nieuwbouw of renovatie te voorzien van visveilige pompen met minimaal 95% schadevrije vispassage. Dit percentage geldt niet alleen voor de pomp maar voor de volledige installatie, waarbij getest is conform testprotocol NEN 8775. Indien 95% schadevrije passage niet mogelijk is, dan wordt gestreefd naar het hoogst mogelijke schadevrije percentage. Voor kleine pompen, pompen met een capaciteit van 2,7m³/min zoals hier het geval is, is 95% schadevrije passage vrijwel niet haalbaar vanwege de dimensies en het toerental, zoals in het (concept)testprotocol van de NEN aangegeven. Wel wordt dan zo mogelijk gekozen voor een visvriendelijk type pomp.

2.3.1 Overlast omgeving

De werkzaamheden worden tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd op werkdagen. Voor de werkzaamheden is toegang via een particulier weideperceel benodigd, dit wordt afgestemd met de perceeleigenaar.

2.4 Legger en beheer en onderhoud

2.4.1 Legger

Nadat het projectplan onherroepelijk is, zullen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond vindt een oplevercontrole plaats. De nieuwe werken zullen vervolgens worden opgenomen in het beheerregister van waterschap Noorderzijlvest. Vastlegging van de nieuwe situatie zal daarna in de eerstvolgende leggerwijziging worden meegenomen.

2.4.2 Beheer, onderhoud en bediening van objecten

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud (dagelijks en buitengewoon) van het gemaal, de inlaat, het toegangspad (in het geval het toegangspad in eigendom komt) en toebehoren als hekwerken en verhardingen tot deze objecten. Tevens is het waterschap verantwoordelijk voor de bediening van het gemaal en de inlaat. De in dit projectplan beschreven nieuwe situatie is besproken met de afdeling Beheer en Onderhoud van waterschap Noorderzijlvest en door hen goedgekeurd.



3 Samenwerking en communicatie

De werkzaamheden zijn binnen het waterschap besproken met de verantwoordelijken voor het peil- en objectbeheer; op basis hiervan zijn de ontwerpen gemaakt zoals omschreven in dit projectplan (par 1.3). In de fase van het definitieve ontwerp worden de werken ook getoetst aan de eisen van het waterschap voor de CE-markering en de veiligheid (RIE-sessie).

Het waterschap heeft tijdens de voorbereiding overleg gevoerd met de grondeigenaar van het perceel dat toegang verschaft tot de werklocatie.

4 Verantwoording

4.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

De nieuwbouw van het poldergemaal Het Anker is gericht op voorkomen dan wel beperken van wateroverlast. Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en die voor toepassing in de grond- weg en waterbouw geschikt zijn.

Ongewenste gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem zijn uit te sluiten. Het betreffende watersysteem heeft zowel in de huidige als de nieuwe situatie geen maatschappelijke functie. Derhalve is dit item niet relevant.

4.2 Verantwoording van keuzes in het project

De primaire aanleiding voor het project is dat het poldergemaal niet meer voldoet aan de huidige eisen van een poldergemaal. Uit het vooronderzoek kwam als beste keuze naar voren om het gemaal te vernieuwen (zie paragraaf 1.1). In dit project wordt het watersysteem ingericht om aan de gemaakte keuze te voldoen.

4.3 Benodigde vergunningen en meldingen

Voor dit plan en deze werkzaamheden dient een projectplan Waterwet te worden vastgesteld.

Het waterschap heeft de ontwerpnotitie besproken met de gemeente Groningen. De gemeente heeft aangegeven dat dit project vergunningsvrij gerealiseerd kan worden

In de Wet Milieubeheer en in het Besluit M.e.r. wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die m.e.r. plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten) en activiteiten die m.e.r. beoordeling plichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten). M.e.r. beoordelingplichtige activiteiten zijn activiteiten waarvoor de beslissing wel of niet de M.e.r. procedure moet worden doorlopen niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag (in dit geval waterschap Noorderzijlvest) moet worden genomen. Het bevoegd gezag moet bepalen of er sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu', die het doorlopen van de M.e.r. procedure wenselijk/noodzakelijk maken.

De uit te voeren werkzaamheden vallen niet onder de bijlage C, maar kunnen vallen onder bepaalde activiteiten die genoemd zijn in bijlage D (bv. D 3.2., de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken en/of D 46.3 de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden).

Gelet op de aard van de werkzaamheden en de uitkomsten van de ecologische quickscan (rapport Altenburg&Wymenga, 2021, bijlage 5), waaruit naar voren komt dat geen nadelige effecten op het milieu te verwachten zijn, kan worden geconcludeerd dat er geen m.e.r hoeft te worden opgesteld.



5 Bevoegdheid en gevolgde procedure

5.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

5.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

6 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepsschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.



7 Bijlagen (los toegevoegd):

- 7.1 Bijlage 1: Plan- en werkgebied 'Nieuwbouw Poldergemaal Het Anker'**
- 7.2 Bijlage 2: Asbestonderzoek Gemaal Het Oude Anker**
- 7.3 Bijlage 3: Ontwerpnotitie Het Anker, Schetsontwerp, d.d. 16-4-2021**
- 7.4 Bijlage 4: Definitief Ontwerp Poldergemaal het Anker**
- 7.5 Bijlage 5: Ecologische toets 'Nieuwbouw Poldergemaal Het Anker'**
