



## Projectplan Waterwet

Vervanging houten damwanden zoetwaterplan  
Aanpassing maaidam Siemenstocht  
Uithuizen - Uithuizermeeden

### Auteur:

Ronald Koers  
15-08-2022

### Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest  
Postbus 18  
9700 AA Groningen

datum vrijgave

beschrijving revisie 1

## Inhoud

1	Vervanging damwanden en aanpassing maaidam .....	2
1.1	Aanleiding en doel .....	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied .....	2
1.3	Beschrijving van de werkzaamheden .....	3
1.4	Beschikbaarheid gronden .....	5
1.5	Effecten van het plan.....	5
1.6	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd.....	5
1.7	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen .....	5
1.7.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	5
1.7.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	5
1.7.3	<i>Nadeelcompensatie.....</i>	5
1.8	Legger en beheer en onderhoud .....	5
1.8.1	<i>Legger.....</i>	5
1.8.2	<i>Beheer en onderhoud .....</i>	5
1.9	Samenwerking .....	5
2	Verantwoording .....	7
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving .....	7
2.2	Verantwoording op basis van beleid .....	7
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project.....	7
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen.....	7
2.5	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan .....	7
2.6	Procedure .....	7
3	Rechtsbescherming .....	8

# 1 Vervanging damwanden en aanpassing maaidam

## 1.1 Aanleiding en doel

In het zoetwaterplan ten noorden van Uithuizen / Uithuizermeeden zijn in het verleden aan weerszijden van de aanwezige dammen damwanden gemaakt van aaneengesloten palen met een enkele gording. Nu vele jaren later zijn deze palen dermate verrot dat er vervanging noodzakelijk is. In het jaar 2022 is daarom een behoorlijke slag gemaakt en zijn van een 12tal dammen de damwanden vervangen.


In dat werk liepen wij tegen een situatie aan bij de Siemenstocht waar een aanpassing aan een maaidam noodzakelijk was voor een efficiëntere manier van onderhoud, dit is in ditzelfde week aangepast.

## 1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het betreft de volgende watergangen:

- Tweede Middentocht
- Derde Middentocht
- Middelste Pompriet
- Menkematocht
- Nieuw Rensumatocht
- Siemenstocht
- Haddertocht
- Schutstocht

Al deze watergangen tezamen vormen het zoetwaterplan waarin de werkzaamheden uitgevoerd zijn.

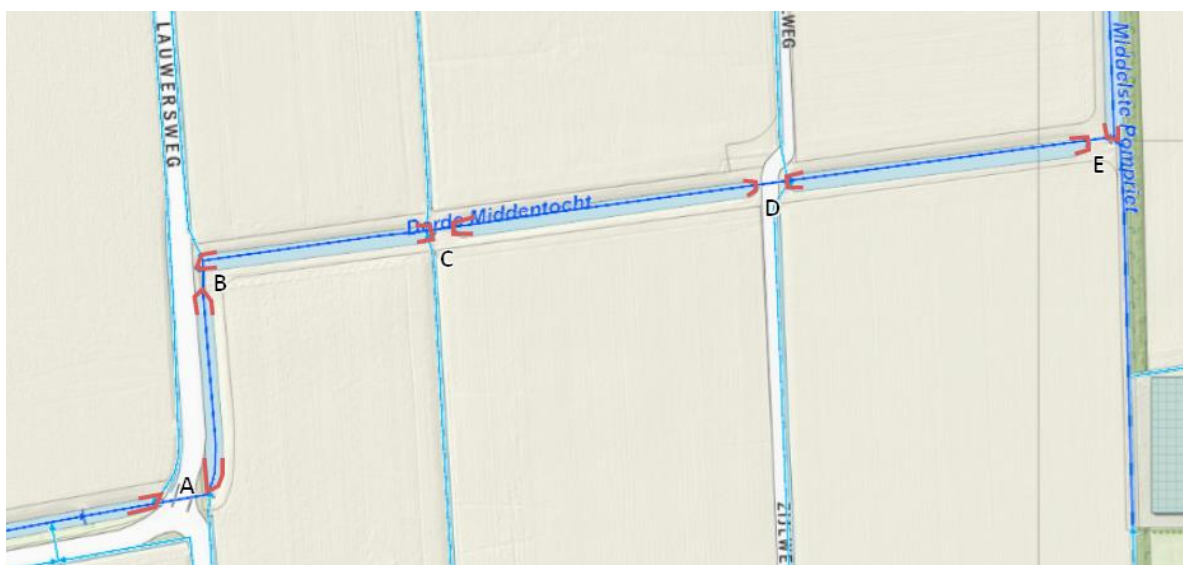

Locatie A t/m E



Locatie F t/m H



Locatie I t/m L

### 1.3 Beschrijving van de werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het bestaande houtwerk (palen en gording). Dit hout zal allemaal afgevoerd worden op correcte wijze. Hierna zal de lijn bepaald worden van de nieuwe hardhouten damwand waarna deze geplaatst wordt. De te gebruiken damwandplanken zijn Azobe planken met veer en groef van 5 x 400 cm. Aan de bovenzijde van de damwand komt een dubbele gording van 5 x 15 cm en 10 x 15 cm. Indien nodig zal de damwand nog versterkt worden met een enkele klapanker. De nieuwe damwand zal niet exact op dezelfde plek terugkomen. In de oude situatie was het een soort 'trechter' richting de duiker waarin maaisel zich ophoopt. Doordat het te smal is kon de maaikorf ook niet tot de duiker komen. In de nieuwe situatie maken we de 'trechter' iets breder zodat de maaikorf tot de duiker kan komen.



Foto voorbeeld oude situatie

Op locatie J gaan we naast het vervangen van de damwanden ook nog een maaidam aanpassen. Om de Siemenstocht te kunnen 'oversteken' is het noodzakelijk om de Siemenstocht aan de zuidzijde te passeren. Reden hiervoor is dat de maaidam te ver naar het noorden ligt, eigenlijk buiten het doorgaande maaipad. Door de 'kom' op de driesprong aan te passen en de maaidam daarin 10 meter naar het zuiden te verplaatsen kan het brede maaipad gewoon gevolgd worden. De bestaande duiker zal op gelijke BOK hoogte in de nieuwe dam gelegd worden, dit levert dus geen grote aanpassing op in het watersysteem. In onderstaande plattegrond wordt de aanpassing weergegeven:



Rood = nieuwe damwand / oranje = nieuwe beschoeiing / paars = nieuwe locatie maaidam met bestaande duiker



Foto oude situatie



Foto nieuwe situatie

## **1.4 Beschikbaarheid gronden**

De werkzaamheden zullen meest plaatsvinden vanaf de, bij het waterschap in eigendom zijnde, maaipaden. Daar waar we percelen of paden van derden moeten betreden zullen deze in kennis gesteld worden.

## **1.5 Effecten van het plan**

Door het vervangen van de damwanden wordt het onderhouden van het zoetwaterplan een stuk veiliger. Veel duikers moeten in het zomerseizoen regelmatig handmatig schoongemaakt worden. Wanneer er behoorlijke gaten achter de damwand zitten kan dit leiden tot ongevallen en letsel. Ook komt op de duur de doorstroming in gevaar. Na vervanging van de damwanden kan het er eerst weer tientallen jaren tegenaan. Door het aanpassen van de maaidam kan ons onderhoud praktischer uitgevoerd worden met minder omrijden om de Siemenstocht.

## **1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd**

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een aannemer. Het benodigde hout is in eigen beheer ingekocht door het waterschap en het plaatsen zal uitbesteed worden.

## **1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen**

### **1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan**

Als gevolg van de genoemde werkzaamheden mag en zal de waterkwaliteit niet achteruitgaan en wordt de afvoer en veiligheid verbeterd. Tevens wordt door het plaatsen van de damwand de waterberging niet kleiner, doordat de 'trechter' iets ruimer wordt voor de duikers komt er zelfs iets meer nat oppervlak.

### **1.7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering**

Door het inventariseren van het object op locatie wordt de omgeving in beeld gebracht, dit voorkomt onverwachte aspecten. Ook is bij de toegepaste materialen gekozen om niet uitlogende materialen te gebruiken om zodoende de waterkwaliteit niet negatief te beïnvloeden.

### **1.7.3 Nadeelcompensatie**

N.v.t.

## **1.8 Legger en beheer en onderhoud**

### **1.8.1 Legger**

De aanpassing/verplaatsing van de maaidam in de Siemenstocht zal moeten worden opgenomen in het beheerregister van het waterschap Noorderzijlvest. Indien noodzakelijk kan ook de damwand opgenomen worden.

### **1.8.2 Beheer en onderhoud**

Het beheer en onderhoud van de geplaatste houten damwanden komt te liggen bij het waterschap als eigenaar en beheerder van de watergang. Bij de nieuwe maaidam blijft het onderhoud, gewoon en buitengewoon, onveranderd aan de oude situatie en blijft dit voor het waterschap.

## **1.9 Samenwerking**

N.v.t.



## **2 Verantwoording**

### **2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving**

Werken worden uitgevoerd binnen de kaders wet- en regelgeving geldend voor Waterschap Noorderzijlvest. De werkzaamheden worden ook volgens de gedragscode voor Flora en Fauna uitgevoerd. Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de grond- weg en waterbouw geschikt zijn.

### **2.2 Verantwoording op basis van beleid**

Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beleidskader van Waterschap Noorderzijlvest.

### **2.3 Verantwoording van de keuzen in het project**

### **2.4 Benodigde vergunningen en meldingen**

Er zijn geen andere vergunningen benodigd behalve dit projectplan en de benodigde klicmeldingen Bevoegdheid en gevolgde procedure.

### **2.5 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan**

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

### **2.6 Procedure**

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen. Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt. Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.



### 3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken).

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
