

Definitief Projectplan Waterwet

Verlengen duiker nabij Heusdenseweg in Haarsteeg



1	AANLEG DUIKER NABIJ DE HEUSDENSEWEG IN HAARSTEEG	4
1.1	Aanleiding en doel	4
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	5
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken (=gewenste situatie)	5
1.4	Effecten van het plan	6
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	7
1.6	Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen.	7
1.7	Legger, beheer en onderhoud	7
1.8	Afstemming	8
2.	VERANTWOORDING	9
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	9
1.2	Benodigde vergunningen en meldingen	9
3.	RECHTSBESCHERMING	10



LEESWIJZER

Het projectplan geeft invulling aan artikel 5.4 van de Waterwet voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk. Het projectplan “verlengen duiker nabij Heusdenseweg in Haarsteeg” bestaat uit drie delen. In hoofdstuk 1 wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Hoofdstuk 3 geeft informatie over rechtsbescherming en procedures.


1 VERLENGEN DUIKER NABIJ HEUSDENSEWEG IN HAARSTEEG

Dit projectplan heeft betrekking op het verlengen van een duiker in de A-watergang die de Heusdenseweg in Haarsteeg kruist (gemeente Heusden).

1.1 Aanleiding en doel

Huidige situatie

In Haarsteeg ligt tussen de Hoeven en Het Zand een A-watergang in beheer en eigendom bij waterschap Aa en Maas ('Sloot door de Hoeven'). Dit stuk watergang heeft vooral een wateraanvoerfunctie om de A-watergang op peil te houden en te kunnen doorspoelen als de riooloverstort aan De Hoeven heeft gewerkt (zie figuur 1).

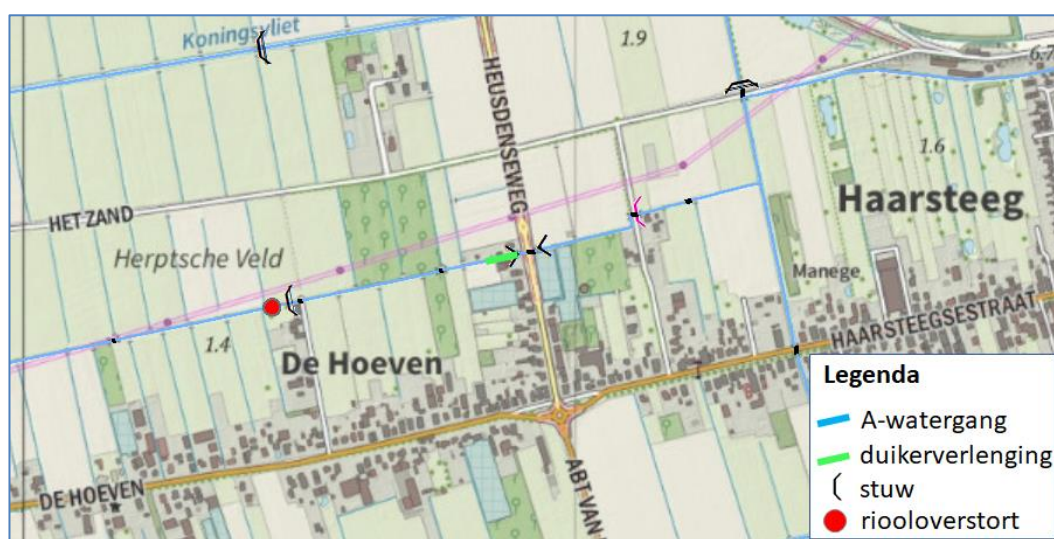

Figuur 1. locatie te verlengen duiker (groen = verlenging)

De betreffende watergang is in de jaren '60 aangelegd met de ruilverkaveling.

Knelpunt

Het onderhoud is in de huidige situatie niet goed uit te voeren. Dat heeft te maken met de volgende factoren:

- Hoge onderhoudsdruk:
 - in de A-watergang is de invasieve waterplant 'Grote waternavel' aanwezig.
 - gedurende het groeiseizoen maken we doorgaans 5 onderhoudsrondes in deze A-watergang. De watergang wordt 2x gemaaid en 3x wordt Grote waternavel verwijderd.
 - maaisel moet worden afgevoerd met kipkarren vanwege de aanwezigheid van een riooloverstort. Ook de waternavel moet als ongewenste soort worden afgevoerd.
- Slechte bereikbaarheid:
 - de A-watergang loopt door laag gelegen gebied, dus is in natte periodes slecht begaanbaar.

- In de huidige situatie kunnen we niet vanaf de openbare weg langs de sloot rijden met kipkarren omdat de doorgang te krap is (van oudsher aanwezige obstakels). Dus rijden we 200m over agrarische percelen naar achter om vanaf Het Zand bij de A-watergang te komen. In natte periodes leidt dit tot insporing en dus schade voor de betreffende agrariër(s). Doorgaans rijden we ook aan dezelfde kant van de watergang (noordzijde) omdat deze zijde beter bereikbaar is. Ook dat leidt tot onevenredige belasting van aanliggende eigenaren aan de noordzijde.

In de betreffende A-watergang is het belang van een goede waterafvoer groot - met name benedenstrooms van riooloverstort, anders is er kans op wateroverlast in de kern van Haarsteeg.

Door de bestaande duiker onder de Heusdenseweg met 50 meter te verlengen, wordt de betreffende A-watergang goed bereikbaar vanaf de openbare weg en kan het onderhoud goed uitgevoerd worden. Tegelijk met de verlenging van de duiker wordt de doorgang langs de A-watergang aan de zuidzijde op een aantal locaties geoptimaliseerd, zodat onderhoud weer vanaf beide zijden kan plaatsvinden. Daarmee is de belasting die het onderhoud met zich meebrengt voor aanliggende eigenaren weer evenredig verdeeld.

Doelstelling

De doelstelling van dit projectplan is:

- Het verlengen van een bestaande duiker om bereikbaarheid van de A-watergang voor onderhoud te verbeteren.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied


In dit projectplan is de verlenging van de duiker onder de Heusdenseweg in Haarsteeg beschreven. De voorziene wijziging beperkt zich tot de directe omgeving van de watergang en kan gerealiseerd worden binnen de gronden die in eigendom en beheer van waterschap Aa en Maas zijn.

1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken (=gewenste situatie)

De bestaande duiker onder de Heusdenseweg wordt verlengd met 50m. Bij de aansluiting van op de bestaande duiker wordt een inspectieput aangebracht met rooster voor lichtinval. In onderstaande figuur is de ligging van de duiker en de put weergegeven.

Afmetingen te verlengen duiker:

- Totale verlenging: 50m
- Diameter 800 mm
- Hoogteligging binnenzijde onderkant buis (b.o.b.) op NAP +0,24m (aansluitend op hoogteligging van bestaande duiker).

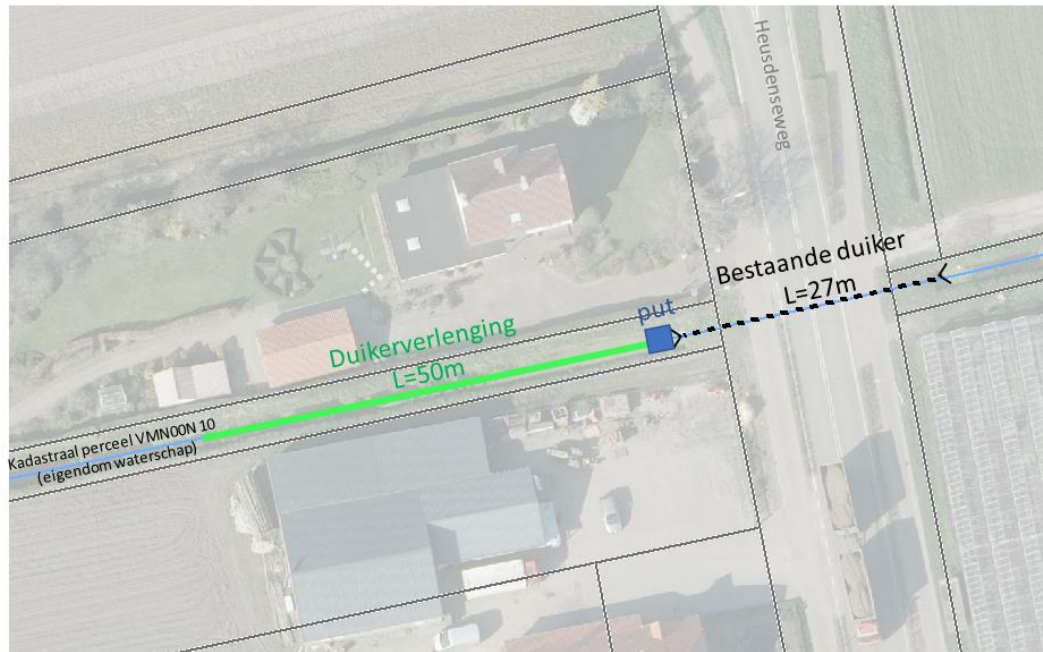

figuur 6. Globale ligging van de te plaatsen duiker

1.4 Effecten van het plan

Ecologie

Beperkt effect. Voor het slootleven is een open watergang beter dan een duiker, zowel als verblijfplaats voor flora en fauna als ook voor het migreren van fauna. Als verblijfplaats is de bestaande kleine sloot in de huidige situatie echter niet bijzonder waardevol, mede ook door aanwezigheid van de Grote waternevel. Om de migratiemogelijkheden te vergroten, wordt een put met open roosterdeksel toegepast, zodat er licht in de duiker valt.

Hydrologie

De aanleg van de duiker heeft geen noemenswaardig effect op de doorstroomcapaciteit van de watergang. De reeds aanwezige duiker onder de Heusdenseweg heeft een lengte van 27m en diameter van 700mm. Het nieuwe deel heeft een lengte van 50m, maar is met een diameter van 800mm flink groter (doorstromend oppervlak 31% groter). Omdat het nieuwe deel benedenstrooms van het oude deel ligt, zal er geen opstuwing optreden. Bovendien is dit gedeelte van de watergang voornamelijk van belang voor wateraanvoer.

Conclusie

Op basis van de genoemde uitgangspunten worden geen noemenswaardige negatieve effecten voorzien.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Het streven is om na vaststelling van het projectplan de duiker te realiseren (winter 2022/2023). Bij de uitvoering zal rekening worden gehouden met de leefbaarheid en bereikbaarheid van de directe omgeving.

Het werkterrein is bereikbaar via openbare weg. Indien nodig zullen afspraken gemaakt worden met aanliggende eigenaren voor tijdelijke ingebruikname van werkstroken op gronden van derden.

1.6 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen.

Beperken nadelige gevolgen van het plan

n.v.t.

Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Ter beperking van de nadelige gevolgen van het plan tijdens de uitvoering zijn de volgende maatregelen voorzien:

- Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming.
- Indien aan de orde zal er een omleidingsplan en bereikbaarheidsplan worden opgesteld ten behoeve van de uitvoering van het werk met in achtneming van de veiligheid voor de omgeving.

Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de verordening schadevergoeding van het waterschap Aa en Maas.

1.7 Legger, beheer en onderhoud

Legger

De in dit projectplan beschreven maatregelen leiden tot een aanpassing van de legger (gedeelte watergang wordt duiker). De beschermingszones ter plaatse van de verlengde duiker blijven ongewijzigd.

Beheer en onderhoud

Met de aanleg van de duiker hoeft het betreffende stuk watergang niet meer gemaaid te worden. Alleen het terrein boven de duiker moet 1 á 2x per jaar gemaaid worden en met de 7-jarige baggercyclus zal de duiker indien nodig opgeschoond worden. De duiker en inspectieputten wordt beheerd en onderhouden door het waterschap. Het beheer en onderhoud bestaat voor een groot deel uit controle en het in goede staat houden van de constructie.

1.8 Afstemming

De plannen zijn voorafgaand aan de besluitvorming door het DB besproken met aanliggende eigenaren.

2. VERANTWOORDING

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Waterwet

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, dit inclusief een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken (zie deel 1). Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem en vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

In beginsel staat het waterschap geen duikers in A-waterlopen toe tenzij dit nodig is voor perceelontsluiting of vanwege infrastructurele werken. De aanleg van een duiker uit oogpunt van het verbeteren van het onderhoud is als zodanig niet in onze regelgeving opgenomen.

In dit geval is echter de aanleg van een duiker de enige mogelijkheid is om de onderhoudssituatie te verbeteren. Het gaat in dit geval echter niet ten koste van de doelen van de Waterwet zoals hierboven beschreven.

1.2 Benodigde vergunningen en meldingen

De volgende vergunningen en meldingen kunnen benodigd zijn. Hierbij is kort weergegeven op welke onderdeel van de werkzaamheden de vergunning of ontheffing betrekking heeft:

- omgevingsvergunning - activiteit aanleggen
- melding Besluit lozen buiten inrichtingen: aan de orde voor lozen van tijdelijke bronnering en bemaling

Deze vergunningen en meldingen zullen een aparte procedure doorlopen bij de betreffende bevoegde gezagen.

3. RECHTSBESCHERMING

Uitgebreide procedure conform afdeling 3.4 Awb

Zienswijze

Het ontwerp-projectplan is door het dagelijks bestuur van het waterschap vastgesteld op 7 februari 2023 en heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen (van 13 februari t/m 27 maart 2023). Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep en hoger beroep

Als het definitieve projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt door publicatie op <https://www.officielebekendmakingen.nl>. Tegen het plan staat gedurende zes weken de mogelijkheid tot beroep open. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.
