



## **Projectomschrijving Omgevingswet**

*Projectomschrijving Nieuwe Wetering Benedenloop*

# Colofon

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dokter van Deenweg 186

8025 BM Zwolle

Postbus 60, 8000 AB Zwolle

E-Mail: [info@wdodelta.nl](mailto:info@wdodelta.nl)

Website: [www.wdodelta.nl](http://www.wdodelta.nl)

Telefoonnummer: 088-2331200

Datum: september 2025

Status: Definitief

| Versie | Datum          | Opgesteld door       | Toetser              | Opmerking                           |
|--------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.0    | September 2025 | Projectteam IWP Zuid | Projectteam IWP Zuid | Ter bespreking / review Projectteam |
| 2.1    | September 2025 | Projectteam IWP Zuid | Programmateam IWP    | vastgesteld                         |
|        |                |                      |                      |                                     |
|        |                |                      |                      |                                     |

## Leeswijzer

De projectomschrijving IWP Nieuwe Wetering Benedenloop bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

## Inhoudsopgave

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Leeswijzer .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING .....</b>        | <b>6</b>  |
| 1. Aanleiding en doel .....                      | 6         |
| 1.1 Aanleiding .....                             | 6         |
| 1.2 Doel .....                                   | 6         |
| 1.3 Opgaven .....                                | 6         |
| 2. Plangebied .....                              | 7         |
| 3. Maatregelen .....                             | 9         |
| 3.1 KRW-opgave en biodiversiteit .....           | 9         |
| 3.2 Beheer en onderhoud .....                    | 10        |
| 4. Gevolgen van de maatregelen .....             | 10        |
| 5. Omgeving .....                                | 12        |
| 5.1 Beschikbaarheid gronden .....                | 12        |
| 5.2 Participatie .....                           | 12        |
| 5.3 Samenwerking .....                           | 13        |
| 6. Uitvoering .....                              | 13        |
| 6.1 Uitvoeringsplanning .....                    | 13        |
| 7. Planschade .....                              | 13        |
| 8. Legger, beheer en onderhoud .....             | 14        |
| 8.1 Legger .....                                 | 14        |
| 8.2 Beheer en onderhoud .....                    | 14        |
| <b>DEEL II – VERANTWOORDING .....</b>            | <b>15</b> |
| 1. Wet- en regelgeving .....                     | 15        |
| 1.1 Omgevingswet .....                           | 15        |
| 1.2 Kaderrichtlijn Water (KRW) .....             | 15        |
| 2. Beleid .....                                  | 15        |
| 2.1 Toets beleid waterschap .....                | 15        |
| 2.2 Toets overig beleid .....                    | 16        |
| 3. Projectkeuzes .....                           | 16        |
| 4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen ..... | 19        |
| <b>DEEL III – RECHTSBESCHERMING .....</b>        | <b>20</b> |
| 1. Zienswijzen .....                             | 20        |

|                                 |                                           |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 2.                              | Beroep of hoger beroep .....              | 20        |
| 3.                              | Verzoek om voorlopige voorziening.....    | 20        |
| <b>DEEL IV – BIJLAGEN .....</b> |                                           | <b>21</b> |
| A.                              | Overzichtskaart.....                      | 21        |
| B.                              | Dwarsprofielen .....                      | 21        |
| C.                              | Vergunningenscan.....                     | 21        |
| D.                              | Archeologisch onderzoek .....             | 21        |
| E.                              | Bureauonderzoek en risicoanalyse OO ..... | 21        |
| F.                              | Natuurtoets .....                         | 21        |
| G.                              | Onderhoudsplan.....                       | 21        |
| H.                              | Stikstofdepositie-onderzoek .....         | 21        |
| I.                              | Vooronderzoek Bodemkwaliteit .....        | 21        |

# DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING

## 1. Aanleiding en doel

### 1.1 Aanleiding

In het programma 'Water-Op-Maat' (WOM) werkt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) samen met de omgeving aan schoon en voldoende water in het landelijke gebied. Met dit programma draagt het waterschap bij aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Waar mogelijk sluit het programma ook aan bij andere opgaven, zoals integraal beheer en onderhoud (IBOOM), de zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en een goed grond- en oppervlaktewaterbeheer (GGOR). In het project Nieuwe Wetering Benedenloop worden opgaven rondom de KRW integraal opgepakt met de opgaven rondom beheer en onderhoud, biodiversiteit, waterveiligheid en recreatie.

### 1.2 Doel

Het doel wat betreft KRW is om de Nieuwe Wetering Benedenloop te laten voldoen aan de landelijke vastgestelde normen voor het type KRW-waterlichaam waar het toe behoort (R20, moerasbeek). Macrofauna, vis en overige waterflora voldoen niet aan de KRW-doelen en zullen moeten voldoen aan het gewenste ecologische potentieel. Wat betreft de overige doelen wordt er voor beheer en onderhoud een nieuw onderhoudsplan voor de Nieuwe Wetering Benedenloop opgesteld.

Deze projectomschrijving heeft als doel het onderbouwen van de vergunningaanvraag en het informeren van de bestuurders van het waterschap, belanghebbenden en stakeholders.

### 1.3 Opgaven

De doelen zoals gesteld in paragraaf 1.2 zijn door het waterschap vertaald naar een opgave, de invulling van deze opgave gebeurt door maatregelen te treffen. De maatregelen worden in hoofdstuk 3 en verder toegelicht. In onderstaande tabel zijn de opgaven voor het project Nieuwe Wetering Benedenloop weergegeven.


**Tabel 1: Overzicht van doelen en opgaven van het project Nieuwe Wetering Benedenloop**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KRW (Kaderrichtlijn Water) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meer ruimte en variatie in het profiel door realisatie van een moeraszone voor de ontwikkeling van de gewenste flora en fauna passend bij een moerasbeek (R20), over een lengte van 5,1 km;</li><li>• Aanpassen 8 km onderhoudsplan regulier onderhoud.</li></ul> |
| Beheer en Onderhoud        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aanpassen van het onderhoud van de natuurvriendelijke oever: van huidige jaarlijks onderhoud met een smalspoormachine naar éénmaal in de 3</li></ul>                                                                                                              |

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | jaar met een breedspoormachine, waarbij jaarlijks 33% wordt gemaaid; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanleggen inlaatplaats voor maaiboten (vijf stuks).</li> </ul> |
| Biodiversiteit  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar mogelijk vergroten van de biodiversiteit in en langs de watergang door aanleg stapstenen.</li> </ul>                           |
| Waterveiligheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuele activiteiten moeten voldoen aan de eisen zoals verwoord in de basisspecificatie waterkeringen.</li> </ul>                 |
| Recreatie       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestaande recreatiemogelijkheden blijven behouden.</li> </ul>                                                                       |

## 2. Plangebied

Het plangebied van de NWBE ligt binnen de driehoek Zwolle-Raalte-Wijhe en ten westen van de plaats Heino in Salland (provincie Overijssel) (Figuur 1). Het plangebied kent een overwegend agrarisch karakter met een totale lengte circa 7,5 km. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Nieuwe Wetering Benedenloop in het westen, de Evenbelterwaterleiding en de Hoge Weg in het zuiden, de N35 en de Hondemotswetering in het oosten, en het Overijssels Kanaal in het noorden. Het plangebied is circa 1.612 ha groot, waarbij het KRW-waterlichaam de NWBE (zie rode lijn) een totale lengte heeft van circa 7,5 km. Startend bij de Raalterwetering en naar het noorden toe afstromend naar gemaal Langeslag. Het gebied valt binnen de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. Het tracé van de NWBE is aangewezen als KRW-waterlichaam en getypeerd als R20: moerasbeek.

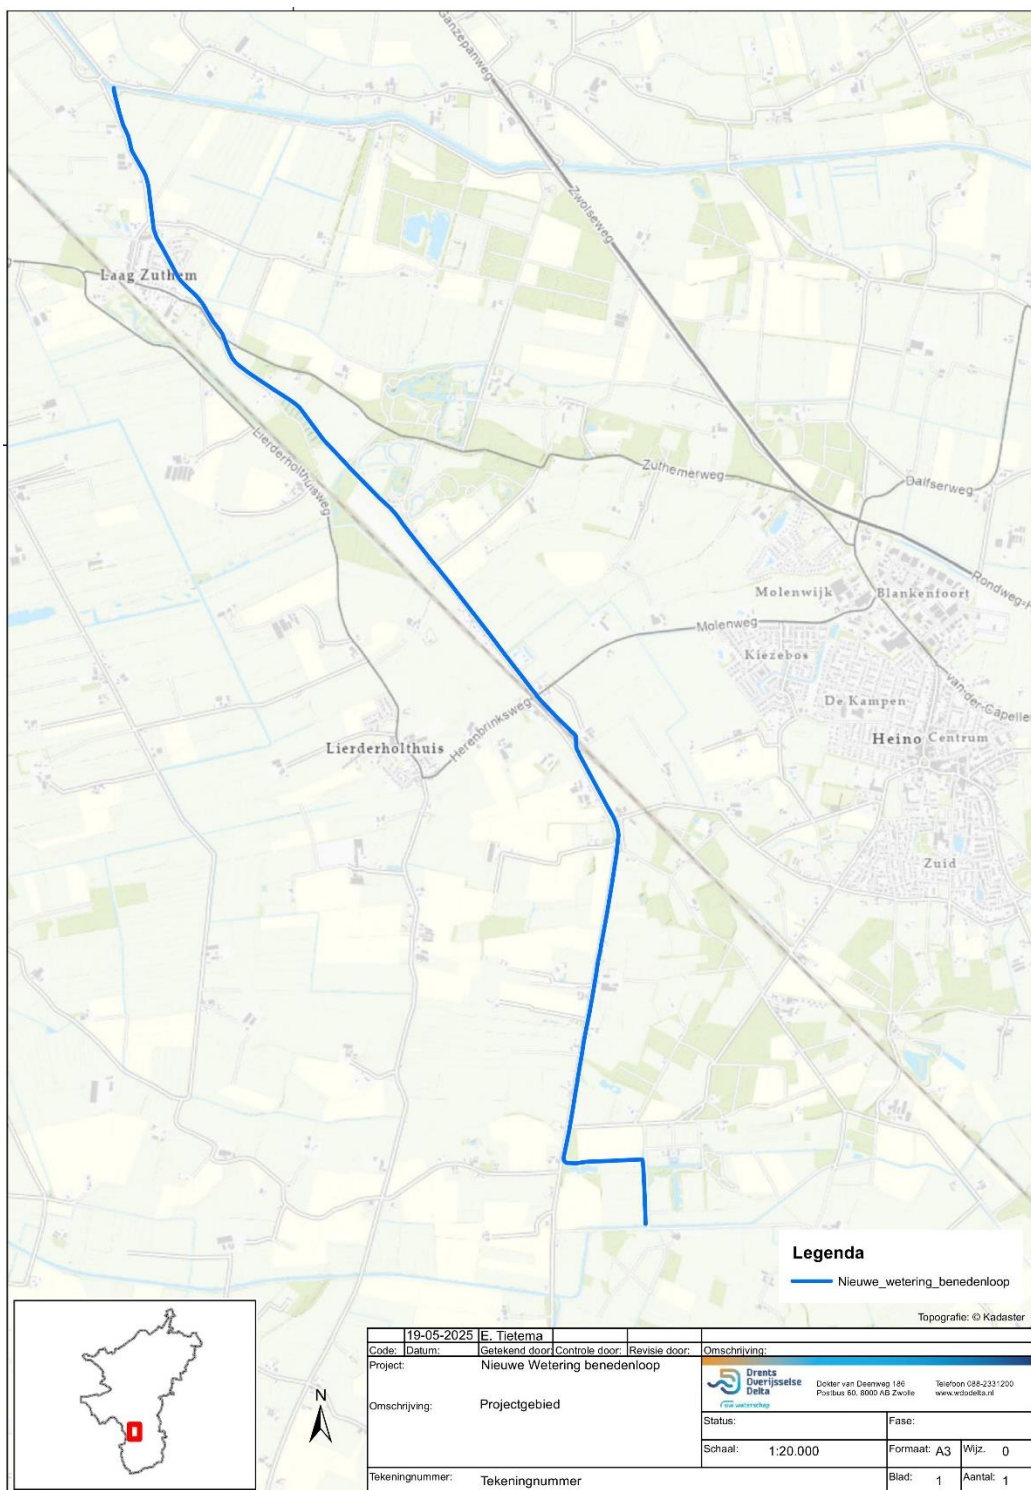

**Figuur 1 Kaart van plangebied Nieuwe Wetering Benedenloop**

### 3. Maatregelen

#### 3.1 KRW-opgave en biodiversiteit

Om het doel betreft de KRW te behalen is er een KRW-opgave geformuleerd. Deze opgave wordt ingevuld door het nemen van de volgende maatregelen:

- Moerasoever en natuurvriendelijke oever (NVO);
- Extensief beheerde oever (ExBO);
- Stapstenen (definitie volgt verderop);
- Een onderhoudsplan om het aangepaste beheer vast te leggen.

##### Moerasoever en natuurlijk-vriendelijke oever

Niet op elke locatie in het plangebied is evenveel ruimte. Op de locaties met meer ruimte wordt een moerasoever aangelegd van minimaal 3 m breed. De moerasoever wordt gerealiseerd door oevers te verondiepen tot 0,60 meter onder de waterlijn, Zowel binnen als buiten de profielen is de volgende afweging vanuit het VKA overgenomen in de verdere uitwerking. Daar waar oevers een breedte hebben van 3,0 meter (of meer) wordt deze voor 100% meegeteld in de lengte voor de KRW-opgave.

Op de locaties met minder ruimte wordt een NVO aangelegd van 1,5 tot 3 m breed. De NVO wordt gerealiseerd door oevers te verondiepen tot 0,60 meter onder de waterlijn, over een breedte van 1,5 tot 3 m. Deze oevers worden voor 100% meegeteld in de lengte voor de KRW-opgave.

Het vismigratieknelpunt bij stuw en gemaal Langeslag valt buiten dit project, deze KRW-opgaven worden meegenomen in de renovatie van de stuwen. De uitvoering hiervan staat gepland in 2026.

##### Extensief onderhouden oevers (ExBO)

Op de locaties waar geen ruimte is voor een natuurvriendelijke oever, is gekozen om minimaal eenzijdig het onderhoud van de oever te extensiveren, dus net zo vaak te maaien als de NVO's. Deze extensief onderhouden oever komt bij voorkeur aan dezelfde zijde te liggen als de moeraszone. Dit is aan de Noord- en Oostzijde van de Wetering, de zijde van de landbouwpercelen. Voor de invulling van de KRW-opgave tellen deze niet mee. Daarentegen is een extensief beheerde oever bevorderlijk voor de biodiversiteit.

##### Stapsteen

Om aan de KRW-opgave te voldoen zijn twee stapstenen toegevoegd aan het project. Een stapsteen betreft een locatie aangrenzend aan de watergang welke ook meetelt voor de KRW-opgave. In het project NWBE wordt op twee locaties een deel van een aangrenzend perceel afgegraven, zodat deze in directe verbinding staan met de watergang. De stapstenen hebben een grote toevoeging voor de invulling van de KRW-opgave. Hierbij wordt het natte oppervlak (waterdiepte variabel van 0 tot 0,8 m) van de stapsteen omgerekend naar lengtemeters moerasoever. Hiervoor wordt conform de factsheet de formule gebruikt dat 3 m<sup>2</sup> nat oppervlakte van de stapsteen voor 1 m<sup>1</sup> moeraszone meetelt.

De Moerasoever, NVO, stapstenen en ExBO-locaties zijn nader uitgewerkt waarbij ook de KRW-invulling is bepaald. Aan de KRW-opgave van 5.100 m wordt voldaan. Een beknopt overzicht van de invulling van de KRW-opgave staat in Tabel 2.

**Tabel 2 KRW-invulling.**

| Maatregel   | KRW-invulling                 | KRW-invulling effectieve lengte |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Moerasoever | 1.461 m (breedte $\geq 3$ m)  | 1.461 m                         |
| NVO         | 2.700 m (breedte 1,5 tot 3 m) | 2.700 m                         |
| ExBO        | 1.160 m (breedte $< 1,5$ m)   | 0 m                             |
| Stapsteen   | 3.900 m <sup>2</sup>          | 1.300 m                         |
| Totaal      |                               | 5.461 m                         |

### 3.2 Beheer en onderhoud

De opgave voor beheer en onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen:

- Regulier onderhoud;
- Aanleg maaibootinlaatplaatsen.

Door de inrichting van de natuurvriendelijke oever wordt het huidige jaarlijkse onderhoud met een smalspoormachine voor de oostelijke (natuurvriendelijke) oever aangepast naar onderhoud eenmaal in de 3 jaar met breedspoormachine, waarbij jaarlijks 33% wordt gemaaid. Dit geldt voor zowel de droge als natte delen. Indien nodig kunnen de droge delen ook vaker gemaaid worden. Het maaisel wordt hier afgevoerd. De oever aan de wegzijde wordt deels met een smalspoormachine en deels met een breedspoormachine onderhouden en de watergang (blauwe bakje) met de maaiboot. Om onderhoud met de maaiboot mogelijk te maken worden vijf inlaatplaatsen aangelegd. Vanwege snelle plantengroei (voornamelijk Sterrenkroos) wordt de NWBE meer dan 2 keer per jaar gemaaid.

## 4. Gevolgen van de maatregelen

### Hydrologie

De algemene stromingsrichting van de NWBE is zowel bij afvoer als bij aanvoer van zuid naar noord. Het waterlichaam stopt bij gemaal Langeslag. Gemaal Langeslag wordt gebruikt als het water benedenstrooms dusdanig hoog is dat de NWBE niet meer onder vrij verval via de stuw kan lozen. Het gemaal functioneert goed en heeft voldoende capaciteit. In het gebied zijn meerdere landgoederen aanwezig waar het peil anders wordt beheerd dan op de streefpeilenkaart van WDO Delta staat. In Peilvak 458, net benedenstrooms van stuw Bredenhorstweg, lost de Rioolwaterzuivering (RWZI) van Heino op de NWBE. Het stroomgebied is op meerdere plekken voorzien van inlaten. Ook tijdens de droogte van 2018 functioneerde het systeem goed. Door de maatregelen buiten het leggerprofiel te realiseren hebben de werkzaamheden geen invloed op de hydrologische uitgangspunten.

Op meerdere locaties is ruimte aanwezig in het huidige hydrologische profiel (blauwe bakje). Op het tracé van stuw Bredenhorst tot de zijtak van de Kolkwetering blijkt uit doorrekening dat er 1,5 m ruimte is in het huidige hydrologische profiel, wel is sprake van normopvulling. Uit berekeningen blijkt dat na alle maatregelen geen inundaties te verwachten zijn bij een T10 situatie (regenbui die statistisch eens in de 10 jaar voorkomt), er wordt dus voldaan aan de nationaal bestuursakkoord water (NBW)-norm. Bovendien wordt het profiel op vele plekken

verruimt. Hierdoor wordt het bergend vermogen van de Benedenloop groter. Dit is gunstig in het geval dat onder vrij verval afvoeren niet kan, en gemaal Langeslag moet pompen. Door de werkzaamheden veranderen de dagelijkse peilen niet, waardoor ook geen effect op het grondwaterregime wordt verwacht.

### Ecologie

Voor het plangebied van de NWBE is een volledige ecologische analyse uitgevoerd. Het tracé van de NWBE is aangewezen als KRW-waterlichaam en getypeerd als R20: moerasbeek. De aanwezige vegetatie, macrofauna en vis voldoen in de huidige situatie niet aan de KRW-normen. Het knelpunt is hier het gebrek aan stroming waardoor doelsoorten voor het type R20 ontbreken. Ook is gebrek aan ruimte voor moerasplanten die als leefgebied kan dienen voor vis. Door aanvoer van voedingsstoffen (uit inlaatwater, af- en uitspoeling aanliggende gronden, effluent van de RWZI Heino) en gebrek aan stroming ontwikkelen zich te veel onderwaterplanten en vindt er intensief maaibeheer plaats. Door het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers ontstaat meer ruimte voor andere begroeiing. De maaifrequentie kan worden aangepast, waardoor passende natuur meer ruimte krijgt om te ontwikkelen.

De NWBE kent incidenteel een slechte zuurstofhuishouding en een matige toxische druk. Het gemaal Langeslag en stuw Bredenhorstweg in de NWBE zijn nog niet vispasseerbaar. Het oplossen van deze knelpunten (buiten dit project) zorgt ervoor dat vissen nieuwe leef- en paaigebieden kunnen bereiken, en zullen naar verwachting positief bijdragen aan de KRW-doelen.

De Omgevingswet eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, en een maximale inspanning levert om de bestaande natuur te beschermen. De uitvoering staat gepland in 2026/2027. In deze periode worden de werkzaamheden zodanig gepland dat nadelige gevolgen op de flora- en fauna tot een minimum worden beperkt.

### Beheer & Onderhoud

In overleg met B&O is een onderhoudsplan opgesteld. Deze is in bijlage G bijgevoegd. De te nemen maatregelen vragen extra of andere inspanning dan in de huidige situatie. Hierbij gaat het met name om het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers en de stapstenen. Om de werkzaamheden van B&O beter uit te kunnen voeren zijn vijf nieuwe plaatsen aangewezen voor het aanleggen van een maaibootinlaatplaats. De maaibootinlaatplaatsen worden gerealiseerd op de oever. Hierbij wordt rekening gehouden met de minimale kruinbreedte van 1,5 m van de overige kering. De maaibootinlaatplaatsen zijn conform de aanlegcatalogus uitgewerkt.

### Waterveiligheid

Bij initiatieven op/bij overige keringen moet wat betreft waterveiligheid rekening worden gehouden met het volgende:

- De hoogte van de overige kering moet ten minste de huidige hoogte behouden (of anders bepaald door de specialisten van de afdeling Beheer watersysteem en dijken);
- De breedte van de overige kering moet ten minste de huidige kruinbreedte behouden, of ten minste 1,5 m kruin als de huidige kruin op dit moment meer is;
- De opbouw van de overige kering mag niet uit veen bestaan;
- Wat betreft de bekleding van de overige kering moet er (gras)bekleding aanwezig zijn;

- De taluds van een overige kering moeten een helling van 1:3 of flauwer hebben, of er moet aangetoond worden dat het stabiel is;
- Kunstwerken in een overige kering moeten een keermiddel hebben.

Bij de aan te leggen NVO's en maaibootinlaatplaatsen wordt voldaan aan de eisen die in het kader van waterveiligheid gesteld worden meegenomen. Bij de aan te leggen stapstenen wordt, daar waar de overige kering verplaatst wordt, een nieuwe overige kering aangelegd conform bovenstaande eisen. Daarmee zijn wat waterveiligheid betreft geen negatieve effecten te verwachten van de te nemen maatregelen.

### Duurzaamheid

Voor de NWBE zijn geen specifieke opgaven voor wat betreft duurzaamheid. Wel komt bij het aanleggen van de moerasoever en NVO, het aanleggen van de stapsteen en het baggeren grond en zand vrij. Door de vrijgekomen materialen zoveel mogelijk op aanliggende percelen te verwerken en daardoor transport van materialen tot een minimum te beperken wordt een substantiële invulling gegeven aan pijler 2: broeikasgasneutraal uit het beleidskader Duurzaam Doen 2022 van het waterschap. Hierdoor zijn transportafstanden zeer beperkt.

### Recreatie

Het bestaande wandelnetwerk blijft gehandhaafd.

## **5. Omgeving**

### *5.1 Beschikbaarheid gronden*

De gronden die nodig zijn voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers zijn gedeeltelijk aangekocht, en gedeeltelijk beschikbaar gekomen door afwaardering. Alle overeenkomsten zijn gesloten. Door de realisatie van de oevers verschuift de onderhoudsroute vanaf de eigen grond van het waterschap naar de aanliggende percelen.

### *5.2 Participatie*

Met de eigenaren zijn verkennende gesprekken gevoerd over de plannen van het Waterschap in dit project en de eventuele aankoop van gronden. De mensen in het gebied zijn ingelicht door middel van een nieuwsbrief in juni 2021 over de plannen. Er is een tweede nieuwsbrief uitgegaan in februari 2022 om het gebied op de hoogte te stellen van het voorkeursalternatief dat is gekozen door het dagelijks bestuur. Verder is er in juni 2021 wekelijks een digitale inloopbijeenkomst/spreekuur georganiseerd voor de omgeving en is de nut en noodzaak van het project belicht. In dezelfde periode van de nieuwsbrief en de digitale inloopbijeenkomst is ook contact opgenomen met de omliggende eigenaren om de onderhoudsroutes en het voorlopig ontwerp te bespreken. Waar nodig is een afspraak op locatie ingepland. Het omgevingsproces is in deze fase gericht om ruimtebeslag in beeld te brengen en de consequenties met betrekking tot aankoop, gebruik van onderhoud en overige concrete consequenties met de stakeholders te bespreken. In maart 2025 vond er wederom een inloopbijeenkomst plaats, voorafgegaan door een nieuwsbrief.

De stemming tijdens de gesprekken is over het algemeen positief, er is begrip voor de plannen.

Kort nadat de ontwerpvergunning met bijbehorende projectomschrijving ter inzage lagen is wederom een nieuwsbrief verstuurd, om de terinzagelegging bekend te maken bij de directe omgeving. Tevens is de terinzagelegging aangegeven op de website, met daarbij uitleg over hoe een zienswijze kan worden ingediend.

### 5.3 Samenwerking

Zowel met de gemeente Raalte, de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel is er regelmatig contact geweest over de totstandkoming van het voorlopige ontwerp van dit project.

## 6. Uitvoering

### 6.1 Uitvoeringsplanning

Na de terinzagelegging van de ontwerpvergunning wateractiviteit wordt gestart met het opstellen van een DO en vervolgens RAW-Bestek met een Uitvoeringsontwerp. Dit wordt gevolgd door het doorlopen van een aanbestedingsprocedure met doorlooptijd van circa 3 maanden. Hierna start de aannemer met de realisatie van het werk. De verwachting is dat de uitvoering begin juni 2026 zal starten. In Tabel 3 is een overzicht van de planning opgenomen.

**Tabel 3 - Overzicht planning Planuitwerking- en Realisatiefase**

| Projectfase  | Start         | Einde         |
|--------------|---------------|---------------|
| DO           | April 2025    | December 2025 |
| Bestek       | December 2025 | Maart 2026    |
| Aanbesteding | Maart 2026    | Juni 2026     |
| Uitvoering   | Juni 2026     | Maart 2027    |
| Nazorg       | Maart 2027    | Maart 2028    |

## 7. Planschade

Gedurende de uitvoering van het werk wordt de overlast voor derden zoveel mogelijk beperkt. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die conform daarvoor geldend beleid en/of wet- en regelgeving vergoed. Ook gewasderving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit project wordt vergoed. Voorafgaand aan de uitvoering wordt met alle relevante aanliggende eigenaren contact opgenomen, zodat zij rekening kunnen houden met de werkzaamheden.

Dit project brengt geen voorziene financiële schade met zich mee die de uitvoering ervan zou kunnen belemmeren. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft, kan op grond van artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15.1 van de Omgevingswet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Nadeelcompensatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019.

## **8. Legger, beheer en onderhoud**

### *8.1 Legger*

Na realisatie wordt de nieuwe situatie opgenomen in de legger van het oppervlaktewaterlichaam en de kaart bij de waterschapsverordening.

### *8.2 Beheer en onderhoud*

De nieuw te realiseren onderdelen en de huidige maatregelen zijn samen opgenomen in een onderhoudsplan. Deze is te vinden in bijlage G van deze projectomschrijving.

## DEEL II – VERANTWOORDING

### 1. Wet- en regelgeving

#### 1.1 Omgevingswet

Voor de in deze projectomschrijving genoemde aanleg of wijziging van waterstaatswerken is een omgevingsvergunning wateractiviteit nodig. In deze projectomschrijving staat een beschrijving van het werk, de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de waterschapsverordening waaronder:

- Voorkoming, en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 1.3).

#### 1.2 Kaderrichtlijn Water (KRW)

De doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het bereiken en beschermen van een goede toestand van landoppervlaktewater, overgangswateren en kustwateren. Onder de goede toestand vallen zowel een goede ecologische, als een goede chemische toestand. Daarnaast is de doelstelling van de KRW het beschermen van een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. Waterschappen hebben een belangrijke taak bij het behalen van de doelstellingen uit de KRW.

De KRW is in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Omgevingswet, de wet Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL). Op nationaal niveau worden de te treffen maatregelen opgenomen in stroomgebiedsbeheerplannen en maatregelenprogramma's en het nationale waterprogramma. Op provinciaal niveau worden de te treffen maatregelen opgenomen in het provinciale waterplan. In het provinciale waterplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. Waterschappen nemen in hun waterbeheerplannen de KRW-maatregelen op die voor hun beheergebied verplicht zijn.

### 2. Beleid

#### 2.1 Toets beleid waterschap

##### Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in een goede toestand te brengen en te houden en bevordert het duurzaam gebruik van water. De richtlijn geldt voor al het oppervlaktewater, maar alleen voor de zogenoemde waterlichamen geldt een rapportage- en resultaatsverplichting naar de EU.

De invoering van de KRW heeft ertoe geleid dat het water administratief ingedeeld is in KRW-waterlichamen en de overige wateren. De opgaven en begrenzingen van alle KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in de provinciale

omgevingsvisie. Het waterschap is verantwoordelijk voor het uitwerken van de opgaven en de maatregelen in het oppervlaktewater, de provincie voor de uitwerking van het diepe grondwater. Voor de waterlichamen heeft het waterschap een resultaatsverplichting om de maatregelen die nodig zijn om in 2027 de vastgestelde waterkwaliteitsopgaven te behalen.

In de huidige situatie voldoet de Nieuwe Wetering Benedenloop nog niet aan de in de KRW gestelde opgaven. De voorgenomen maatregelen die binnen dit project worden uitgevoerd, moeten ervoor zorgen dat deze waterloop wel aan de KRW-normen voldoen.

## 2.2 Toets overig beleid

Niet van toepassing.

## 3. Projectkeuzes

In het programma 'Water-Op-Maat' (WOM) werkt het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) samen met de omgeving aan de realisatie van de beleidsopgaven voor het watersysteem: 'Schoon en Voldoende water in het landelijk gebied'. Met dit uitvoeringsprogramma wordt gewerkt aan de doelen van de Kaderichtlijn water (KRW) en Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De overige beleidsopgaven van het waterschap, onder andere ZON en GGOR, worden waar mogelijk zo goed mogelijk integraal meegenomen in het WOM-programma. De opgaven voor project Nieuwe Wetering Benedenloop zijn belicht in een alternatievennotitie waar drie alternatieven zijn voorgesteld. Uit deze alternatieven is een Voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Het VKA is in de werksessie van 17 januari 2023 gepresenteerd, toegelicht en gekozen en op 16-3-2023 bestuurlijk vastgesteld. Het VKA is vervolgens verder gedetailleerd tot dit voorlopig ontwerp (VO), welke vervolgens tot definitief ontwerp (DO) is uitgewerkt. Hierna volgt nog een vertaalslag naar bestek en uitvoering.

Ter onderbouwing van de plannen is een aantal conditionerende onderzoeken uitgevoerd en de resultaten/uitkomsten zijn als bijlage toegevoegd:

- Archeologie (bijlage D)
- Bureauonderzoek en risicoanalyse opsporen ontplofbare oorlogsresten (OOO) (bijlage E)
- Natuurtoets (bijlage F)
- Stikstofdepositie – (bijlage H)
- Bodemkwaliteit (bijlage I)

In navolgende tabel zijn de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken weergegeven.

**Tabel 4 - Overzicht uitkomsten conditionerende onderzoeken**

| Onderzoek                              | Korte samenvatting conclusie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodemonderzoek (bureaustudie) NEN 5725 | Er is vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. Grondverzet t.b.v. moeraszones, natuurvriendelijke oevers en stapsteen 3 kan plaatsvinden op basis van de bodemkwaliteitskaart en binnen het plangebied worden toegepast. Voor grondverzet bij stapsteen 2 is een partijkeuring vereist voordat deze grond elders toegepast kan worden. |
| Archeologie (bureaustudie)             | Er zijn een aantal delen met lage archeologische verwachtingen en hier is geen verder onderzoek noodzakelijk. Er zijn ook delen met hoge archeologische verwachting. Op de locaties met hoge verwachting is een gecombineerd                                                                                                             |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | verkennd booronderzoek uitgevoerd. De verwachting op basis van de eerste resultaten is dat hier geen verdere maatregelen uit voortkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stikstofdepositie-berekening                                                                                                            | Met het rekenmodel AERIUS is de volgende maximum bijdrage op omliggende Natura 2000-gebieden van 0,00 mol/ha/jaar berekend.<br>Daarmee zijn er geen negatieve effecten te verwachten op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden ten gevolge van het project.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bureauonderzoek Opsporen Ontplobbare Oorlogsresten en Vooronderzoek Na-conflictperiode en Risicoanalyse Ontplobbare oorlogsresten (OOO) | Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek OOO en de conclusies is het onderzoeksgebied op het overgrote deel onverdacht op Ontplobbare Oorlogsresten. Op dit deel kunnen de (grond)werkzaamheden regulier uitgevoerd worden.<br><br>Een deel van het tracé is als verdacht aangemerkt. Voor dit deel is een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse wordt het volgende geconcludeerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De kans op het aantreffen van OO als gevolg van gedumpte en achtergelaten munitie is klein, maar niet volledig uitgesloten. Daarom wordt geadviseerd om in de gebieden die verdacht zijn op gedumpte/achtergelaten munitie de werkzaamheden uit te voeren onder het OOO-protocol.</li> <li>- De kans op het aantreffen van OO van afwerpmunitie als gevolg van een bombardement is aanwezig. Daarom wordt geadviseerd om voorafgaand aan eventuele werkzaamheden detectieonderzoek te laten uitvoeren of het onder OOO-begeleiding laagsgewijs te laten ontgraven.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Natuurtoets                                                                                                                             | <p><i>Natura 2000-gebieden</i></p> <p>Geen van de projectlocaties ligt in een Natura 2000-gebied. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Rijntakken is circa 4,0 km. Verstoringfactoren zoals geluid, licht en optische verstoring van de aanlegfase en gebruiksfase zorgen vanwege de afstand en kleinschalige aard van de werkzaamheden met zekerheid niet tot negatieve effecten in Natura 2000-gebieden. Ook effecten op Natura 2000-gebieden door oppervlakteverlies of versnippering zijn uitgesloten.</p> <p><i>Natuurnetwerk Nederland (Overijssel)</i></p> <p>De ontwikkeling is niet in strijd met het omgevingsplan. Tevens worden met de voorgenomen werkzaamheden geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN. Van afname van areaal is geen sprake, tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN significant aantasten. Daarnaast wordt het omgevingsplan niet gewijzigd. Een toetsing aan het NNN-beleid wordt daarom niet noodzakelijk geacht.</p> <p><i>Soortenbescherming</i></p> <p>De beoogde ontwikkeling heeft zonder voldoende voorzorgsmaatregelen mogelijk negatieve effecten op door de beschermde soorten, onder andere kievitsbloemen, marterachtigen en vleermuizen. De kievitsbloemen moeten in het voorjaar tussen april en mei geïnventariseerd worden door een ter zake kundige, het oppervlak met groeiplaatsen moet gemarkeerd worden en behouden blijven. Voor de marterachtigen is een omgevingsvergunning</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>activiteit flora en fauna vereist. Hiervoor wordt voorafgaand aan de vergunningaanvraag een habitatgeschiktheidsbeoordeling uitgevoerd. Voor vleermuizen heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Bij de inmeting van de bomen heeft de ecooloog de bomen gecontroleerd op holtes. Bomen die vanuit ecologie voor vleermuizen belangrijk zijn, blijven staan. Daarmee is verder onderzoek niet nodig. Voor overige soorten geldt de zorgplicht.</p> <p><i>Houtopstanden</i></p> <p>Er worden door Wnb beschermde houtopstanden aangetast of gekapt bij het voornemen. In overleg met provincie zal gekeken moeten worden naar compensatie en/of herplant.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen**

##### Omgevingsvergunning wateractiviteit

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet bundelt verschillende wetten en regelgevingen voor de fysieke leefomgeving. Als onderdeel van de Omgevingswet verleent het waterschap: omgevingsvergunningen wateractiviteit. Het gaat hierbij om vergunningen voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit of waterveiligheid.

Voor het project NWBE moet een omgevingsvergunning wateractiviteit aangevraagd worden voor een aantal activiteiten. Het gaat om:

- Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, waarbij de oever wordt vergraven;
- De realisatie van een oeverzone in de waterberging, waarbij de waterberging wordt vergraven.
- Het aanleggen van vijf maaibootinlaatplaatsen.

Het verlengen en verleggen van een duiker en het aanpassen van het beheer voor de realisatie van de NVO's is niet vergunningplichtig, maar is wel opgenomen in deze projectbeschrijving.

##### Vergunningenscan

In bijlage C zijn de resultaten van de vergunningenscan verzameld. Er wordt aangegeven of een vergunning, ontheffing en/of melding nodig is voor de projectwerkzaamheden. Uit de vergunningenscan blijkt dat er diverse vergunningen benodigd zijn.

## DEEL III – RECHTSBESCHERMING

### 1. Zienswijzen

Voor de voorbereiding van deze vergunning wordt, op verzoek van de aanvrager, de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat de ontwerp-vergunningen voor zes weken ter inzage gelegd worden en dat één ieder hier tijdens de terinzageperiode zienswijzen op kan indienen. Dat kan:

- Digitaal via een formulier op de website van WDO Delta;
- Schriftelijk, door een brief te sturen naar Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v. het dagelijks bestuur, Postbus 60, 8000 AB in Zwolle;
- Mondeling, door een afspraak te maken via [vergunningen@wdodelta.nl](mailto:vergunningen@wdodelta.nl).

De ontwerpvergunning en de bijbehorende stukken heeft van 17 juli 2025 tot en met 27 augustus 2025 ter inzage gelegen. In deze periode is één zienswijze en één pro forma zienswijze ingediend. De zienswijzen zijn ontvangen binnen de termijn voor het indienen van de zienswijzen en de zienswijzen zijn voorzien van de benodigde gegevens. De zienswijzen zijn daarmee ontvankelijk. De pro forma zienswijze is niet aangevuld en daarmee komen te vervallen. De zienswijzen zijn beantwoord in een anonieme reactienota, waarin ook beschreven staat hoe de tekeningen en vergunning naar aanleiding van de zienswijzen zijn aangepast.

### 2. Beroep of hoger beroep

Als de omgevingsvergunning wateractiviteit is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt via het waterschapsblad en op overheid.nl. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze zes weken (vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd) kunnen belanghebbenden en degenen die tijdig een reactie (zienswijze) hebben gegeven op de ontwerp-vergunning beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van deze projectbeschrijving.

Het is mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de site van rechtbank Noord-Nederland staan de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

### 3. Verzoek om voorlopige voorziening

Een omgevingsvergunning wateractiviteit treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de vergunde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat de maatregelen worden uitgevoerd kan degene die bezwaar of beroep instelt gelijktijdig of na het indienen van een bezwaar- of beroepschrift een zogenaamd verzoek om voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het bezwaar- of beroepschrift worden overlegd. Voor het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## DEEL IV – BIJLAGEN

- A. Overzichtskaart
- B. Dwarsprofielen
- C. Vergunningenscan
- D. Archeologisch onderzoek
- E. Bureauonderzoek en risicoanalyse OO
- F. Natuurtoets
- G. Onderhoudsplan
- H. Stikstofdepositie-onderzoek
- I. Vooronderzoek Bodemkwaliteit
- J. Notitie DO
