



## **Asbestinventarisatie**

**Prinsenbosch 39A en 39B, 5126NC Gilze**

**Projectcode: P07169-3**

**Versie: 1.0**

<b>Colofon</b>			
<b>Titel</b>	Asbestinventarisatie Prinsenbosch 39A en 39B 5126NC Gilze		
<b>Projectcode</b>	P07169-3		
<b>Versie</b>	4 juni 2024		
<b>Datum</b>	1.0		
<b>Auteur (Deskundig Inventariseerder Asbest)</b>	H.A. Seijkens		
<b>DIA-certificaatnummer</b>	04E-200922-140853		
<b>Opdrachtgever</b>	Pro Ruimte/ Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)		
<b>Uitvoerder</b>	Greenhouse Advies bv Huismanstraat 6 6851GT Huissen		
<b>Telefoon</b>	026 2020606		
<b>Email</b>	asbestinventarisatie@greenhouse-advies.nl		
<b>Website</b>	www.greenhouse-advies.nl		
<b>Certificaatnummer</b>	07-D070180		
<b>LAVS activeringscode</b>	671eec0f-57a2-41c9-88bd-f3889eb9e1eb		
<b>Onderzoekslocatie</b>			
<b>Adres</b>	Prinsenbosch 39A en 39B		
<b>Postcode</b>	5126NC		
<b>Plaats</b>	Gilze		
<b>Datum inventarisatie</b>	24 mei 2024		
<b>Technisch eindverantwoordelijke</b>	L.A. Paardekooper		
<b>DIA-certificaatnummer</b>	04E-060224-140945		
<b>Paraaf DIA/auteur</b>	<b>Paraaf technisch eindverantwoordelijke</b>		
			
<b>Datum autorisatie: 4 juni 2024</b>		<b>Datum autorisatie: 4 juni 2024</b>	
<b>Reikwijdte</b>			
het gehele bouwwerk			
<b>Geschiktheid</b>			
geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten			
<b>Risicobeoordeling</b>			
Risicobeoordeling conform NEN2991 voor het gekozen onderzoeks(deel)gebied wordt NIET geadviseerd			
<b>Geldigheid</b>			
Het rapport is geldig tot drie jaar na de datum van autorisatie welke hierboven is vermeld, mits het rapport aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving.			
<b>Versiewijzigingen</b>			
1.0	Geen		

## Samenvatting

In opdracht van Pro Ruimte/ Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Greenhouse Advies bv een asbestinventarisatie uitgevoerd op het adres Prinsenbosch 39A en 39B, 5126NC Gilze.

De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van opdrachtgever om renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan het pand.

het gehele bouwwerk is onderzocht, te weten; gebouw 39. Het onderzoeksgebied omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling. Er zijn asbesthoudende toepassingen aangetroffen.

Tijdens de inventarisatie waren geen situaties aanwezig welke beperkingen oplegden aan het uitgevoerde onderzoek. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u in veel gevallen, bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw of de vervanging van historisch glas in een raam, een omgevingsvergunning nodig.

De gemeente behandelt de aanvraag en in sommige gevallen geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) advies aan de gemeente. Bijvoorbeeld als het om een grote ingreep gaat zoals sloop of herbestemming.

Voorafgaande aan de asbestsanering/ sloopwerkzaamheden dient een sloopmelding te worden gedaan.

In veel gevallen kan voor de geplande bouw een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig zijn.

**Dit rapport is geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten.**

## Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	Aanleiding.....	4
1.2	Risicoklassen bij verwijdering asbest.....	5
1.3	Werkwijze en leeswijzer.....	5
2	Resultaten vooronderzoek.....	6
3	Overzicht geïnterviewd materiaal.....	7
3.1	Asbesthoudende toepassingen (bevestigd door analyse).....	8
3.2	Niet-asbesthoudende materialen (bevestigd door analyse).....	8
3.3	Bronblad(en).....	9
4	Conclusie en advies.....	11
4.1	Conclusie.....	11
4.2	Advies.....	11

## Bijlages

Bijlage 1: SCA Procescertificaat

Bijlage 2: Tekeningen

Bijlage 3: Analysecertificaten

Bijlage 4: SMART risicoclassificaties

# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding

Van Pro Ruimte/ Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Greenhouse Advies bv opdracht gekregen een asbestinventarisatie uit te voeren op het adres: Prinsenbosch 39A en 39B, 5126NC Gilze verder te noemen "projectlocatie" met als reikwijdte: het gehele bouwwerk en als geschiktheid: geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten.

De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan het pand. De projectlocatie is weergegeven op Afbeelding 1.1.

De inventarisatie is uitgevoerd zonder op de dag van het onderzoek geconstateerde situaties welke een beperkingen opleveren op de geschiktheid en of reikwijdte van het uitgevoerde onderzoek.



Afbeelding 1.1: projectlocatie Prinsenbosch 39A en 39B, 5126NC Gilze (Bron: "google")

## 1.2 Risicoklassen bij verwijdering asbest

De risicoklassen voor verwijdering van asbest staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Er zijn drie risicoklassen (RK) gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn als volgt ingedeeld:

RK	Blootstellingsniveau	Verwijdering	Eindcontrole
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chrysotiel vezels <math>\leq 2000</math> vezels/m<sup>3</sup></li> <li>Amfibole vezels <math>\leq 2.000</math> vezels/m<sup>3</sup></li> <li>Chrysotiel + Amfibole vezels <math>\leq 2000</math> vezels/m<sup>3</sup></li> </ul>	Verwijdering door daartoe voldoende opgeleide en voldoende geïnstrueerde medewerkers (Zie Vigerend Arbeidsomstandighedenbesluit, voorschrift 4.44 t/m 4.47).	Visuele inspectie waarbij wordt vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chrysotiel vezels <math>\geq 2000</math> vezels/m<sup>3</sup></li> <li>Chrysotiel + Amfibole vezels <math>\geq 2000</math> vezels/m<sup>3</sup> (waarvan Amfibole vezels <math>&lt; 2000</math> vezels/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	Verwijdering door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering zoals in de Staatscourant onder nummer 12702 op 18 april 2024 gepubliceerd.	Visuele inspectie en luchtmeting (2 uren meting) conform NEN2990 door een daartoe door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.
2A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amfibole vezels <math>\geq 2000</math> vezels/m<sup>3</sup></li> <li>Chrysotiel + Amfibole vezels <math>\geq 2000</math> vezels/m<sup>3</sup> (waarvan Amfibole vezels <math>&gt; 2000</math> vezels/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	Verwijdering door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering zoals in de Staatscourant onder nummer 12702 op 18 april 2024 gepubliceerd.	Visuele inspectie, kleefmonsternamen (SEM) en luchtmeting (4 uren meting SEM) conform NEN2990 door een daartoe door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.

Tabel 1.2

Indien op basis van het vigerende wettelijk certificatieschema een gecertificeerd bedrijf voor asbestverwijdering wil afwijken van de voorgeschreven verwijderingsmethode, gelden er specifieke voorwaarden. Daarbij dient het asbestinventarisatiebedrijf betrokken te worden.

## 1.3 Werkwijze en leeswijzer

De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering zoals in de Staatscourant onder nummer 12702 op 18 april 2024 gepubliceerd, hierna te noemen "het Schema". Er heeft een vooronderzoek plaatsgevonden aan de hand waarvan een asbestinventarisatieplan is opgesteld. Vervolgens is de asbestinventarisatie uitgevoerd, waarbij de te onderzoeken "projectlocatie" door de DIA is geïnspecteerd en zo nodig asbestverdacht materiaal is bemonsterd. Het bemonsterde materiaal is door een daartoe geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. Omstandigheden, geconstateerd op de projectlocatie, kunnen een beperking op de reikwijdte of geschiktheid van de asbestinventarisatie inhouden. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn in voorliggend rapport opgenomen.

Het rapport is opgebouwd uit de hieronder genoemde hoofdstukken:

Hoofdstuk 2: Resultaten vooronderzoek

Hoofdstuk 3: Overzicht geïnventariseerd materiaal

Hoofdstuk 4: Conclusie en advies



## 2 Resultaten vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft bestaan uit de analyse en interpretatie van door opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken, bestaande uit plattegronden en tekeningen.

Beschikbaar gestelde informatie

Bron:	Informatie omtrent projectlocatie:	Ontvangen informatie:
Opdrachtgever	Gebouw/object type	Woongebouw
BAG-viewer	Bouwjaar	1942
Opdrachtgever	Verbouwingen/wijzigen	Het bouwwerk is door de jaren diverse malen verbouwd.
Opdrachtgever	Ontvangen tekeningen	Plattegronden, gevelaanzichten en doorsnedetekeningen. Er zijn tekeningen van de huidige situatie aangeleverd en tekeningen met daarop de renovatiewerkzaamheden aangeven. Tevens is het logboek asbestbronnen aangeleverd, waarop geen asbesthoudende toepassingen in gebouw 39 zijn opgenomen.
Opdrachtgever	Eerdere asbestinventarisaties	Rapportage asbestinventarisatie Type A VDM, rapportnr. M10218 d.d. 16 april 2010. In deze rapportage zijn voor gebouw 39 geen asbesthoudende toepassingen weergegeven.
Opdrachtgever	Gesproken met	Mevrouw A. van der Werf geeft aan waar de rapportage voor geschikt moet zijn.
Opdrachtgever	"Onderzoekslocatie" in gebruik	Ja.

Tabel 2.1

Op basis van de informatie, verkregen uit het vooronderzoek, waren er binnen de "projectlocatie" geen asbestverdachte materialen te verwachten.

### 3 Overzicht geïnventariseerd materiaal

Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en niet asbesthoudende materialen is opgenomen in de navolgende paragrafen en bronbladen.

Ruimte/gebied	Onderzocht	Opmerkingen
Kruipruimte	Ja	De kruipruimte is van metselwerk met een zandbodem. De riolering is deels van pvc en deels van gietijzer. Onder de keukenvloer is een los restant asbesthoudend plaatmateriaal (bron 001) aangetroffen. Tussen de metselwerk wanden en bovenliggende betonvloer is een bitumenlaag aangebracht welke asbesthoudend is (bron 002).
Begane grond	Ja	De begane grondvloer is van beton met daarop tegelwerk welke in specie gezet is of een houten parketvloer. De houten kozijnen zijn voorzien van niet asbest verdachte beglazingskit.. De wanden zijn van metselwerk. Alle schoorstenen zijn gemetseld. Het plafond is van beton. In de meterkast zijn geen asbest verdachte toepassingen aanwezig. De radiatoren zijn niet asbest verdacht. De aangetroffen boilers (Inventum en Daalderop) zijn op basis van het bouwjaar niet asbest verdacht.
Eerste verdieping	Ja	De betonvloer op de verdieping is voorzien van tegelwerk welke in specie gezet is of een houten parketvloer. Het plafond betreft een verlaagd gipsplafond. Met een luik is de zolder bereikbaar. De zolder heeft geen betreedbare vloer maar alleen houten balken met daaronder de gipsbeplating. Op de zolder is het houten dakbeschot zichtbaar en e metselwerk schoorstenen.
Buitenschil	Ja	De buitenschil is van metselwerk met houten kozijnen met niet asbest verdachte beglazingskit. Het hellende dak is voorzien van dakpannen met onder de hoekkepers niet asbest verdacht vilt. De schoorsteen is van metselwerk. Onder de dakpannen is het houten dakbeschot zichtbaar.

Tabel 3.1 Overzicht onderzochte ruimten/bouwwerkdelen/gebieden

Er zijn 3 materiaalmonsters door de DIA genomen, welke bij een geaccrediteerd laboratorium zijn aangeboden om conform NEN5896 geanalyseerd te worden op aanwezigheid, soort en concentratie asbest. Uit het laboratoriumonderzoek is gebleken dat 2 materiaalmonsters asbest bevatten (zie Bijlage 3: Analysecertificaten).

Constructie /Bouwwerkdeel/inventaris	Locatie	Toepassing
N.v.t.		

Tabel 3.2 Vermoeden van in constructie/bouwwerkdeel/inventaris verborgen asbesthoudend materiaal



### 3.1 Asbesthoudende toepassingen (bevestigd door analyse)

Bron	Locatie	Materiaal	Hechtgebonden	Soort / %	Bevestiging	RK	Saneringstype	Hoeveelheid
001	Gebouw 39, woning 39A kruipruimte	beplating	H	chrysotiel: 10 - 15 %	los	1	direct verpakken	0.1m <sup>2</sup>
002	Gebouw 39, woning 39A kruipruimte	bitumen stroken	H	chrysotiel: 0,1-2%	gecoat	2	containment	Ca. 100 m <sup>2</sup>

Tabel 3.1

### 3.2 Niet-asbesthoudende materialen (bevestigd door analyse)

Bron	Locatie	Materiaal	Hoeveelheid
N.v.t.			

Tabel 3.2

### 3.3 Bronblad(en)

#### Broncode -001

<b>Toepassing</b>	beplating	<b>Opmerking</b>
<b>Soort</b>	asbestcement vlakke plaat	Geen
<b>Hechtgebondenheid</b>	hechtgebonden	
<b>Beschadiging</b>	licht	
<b>Verweerdheid</b>	licht	
<b>Bevestiging</b>	los	
<b>Binnen/buiten</b>	binnen	
<b>Wijze demontage</b>	handpicking	
<b>Risicoklasse</b>	1	
<b>Referentie</b>	n.v.t.	

#### Bronlocatie(s)

Straat	Bouwdeel	Ruimte/locatie	Hoeveelheid
Prinsenbosch 39A	Gebouw 39, woning 39A	kruipruimte	0,1 m <sup>2</sup>
		<b>Totaal hoeveelheid:</b>	<b>0,1 m<sup>2</sup></b>

#### Bepaling asbeststatus

Soort bepaling	Analyse	Certificaat/details
laboratoriumonderzoek MM001	chrysotiel: 10 - 15 %	1744073

#### Foto's



## Broncode -002

<b>Toepassing</b>	bitumen stroken
<b>Soort</b>	bitumen coating
<b>Hechtgebondenheid</b>	hechtgebonden
<b>Beschadiging</b>	licht
<b>Verweerdheid</b>	licht
<b>Bevestiging</b>	gecoat
<b>Binnen/buiten</b>	bouwkundig binnen
<b>Wijze demontage</b>	containment
<b>Risicoklasse</b>	2
<b>Referentie</b>	n.v.t.

### Opmerking

Van deze bron zijn meerdere materiaalmonsters (MM002 en MM003) genomen. Na analyse van beide monsters blijkt in 1 van de 2 monsters (MM003) asbest te zijn aangetroffen. Echter omdat bekend is dat het asbest inhomogeen is verdeeld over het materiaal wordt MM002 gelijk gesteld aan MM003 en dienen alle bitumen stroken als asbesthoudend beschouwd te worden.

### Bronlocatie(s)

Straat	Bouwdeel	Ruimte/locatie	Hoeveelheid
Prinsenbosch 39A	Gebouw 39, woning 39A en 39B	kruipruimte	Ca. 100 m <sup>2</sup>
		<b>Totaal hoeveelheid:</b>	<b>Ca. 100 m<sup>2</sup></b>

### Bepaling asbeststatus

Soort bepaling	Analyse	Certificaat/details
laboratoriumonderzoek MM002	Niet asbesthoudend	1744073
laboratoriumonderzoek MM003	chrysotiel: 0,1-2%	1744073

### Foto's



## 4 Conclusie en advies

### 4.1 Conclusie

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek wijzen uit dat binnen de projectlocatie Prinsenbosch 39A en 39B, 5126NC te Gilze asbesthoudend materiaal aanwezig is, namelijk:

- Plaatmateriaal;
- Bitumen stroken

**Dit rapport is geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten.**

### 4.2 Advies

Wij adviseren u de geïnventariseerde asbesthoudende materialen:

- niet te bewerken of zelf te verwijderen;
- duidelijk te (laten) markeren bv. Door het aanbrengen van asbestgevaarstickers;
- deugdelijk af te (laten) schermen;
- opstellen asbestbeheersplan.

De aangetroffen asbesthoudende bronnen leveren **geen** direct risico op voor de omgeving waardoor de toepassingen op termijn door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf, conform vigerende wet -en regelgeving, kan worden gesaneerd. Wij adviseren u dan wel om een asbestbeheersplan op te stellen.

Het asbestbeheersplan beschrijft welke maatregelen noodzakelijk zijn om een gebouw waarin asbest zit, veilig te kunnen gebruiken. Het asbestbeheersplan is maatwerk en moet daarom afgestemd zijn op de specifieke situatie. Het plan wordt gebaseerd op het asbestinventarisatierapport waarin een compleet overzicht dient te staan van de aanwezige asbestbronnen. Voor iedere asbestbron behoort een inschatting gemaakt te zijn van de daaraan verbonden risico's. De maatregelen in het plan behoren afgestemd te zijn op die risico's. Het doel van het asbestbeheersplan is om de blootstelling van gebruikers van een gebouw aan asbestvezels te voorkomen.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers/ gebouweigenaren de risico's voor werknemers/ gebruikers te inventariseren, te evalueren en beheersmaatregelen op te stellen. Ook moeten werkgevers/ gebouweigenaren op de werkplek gevaar voor derden voorkomen. Een asbestbeheersplan kan worden opgenomen in het preventieplan van uw bedrijf en kan als bewijsstuk worden gezien omtrent gevaarpreventie.

Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u in veel gevallen, bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw of de vervanging van historisch glas in een raam, een omgevingsvergunning nodig. De gemeente behandelt de aanvraag en in sommige gevallen geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) advies aan de gemeente. Bijvoorbeeld als het om een grote ingreep gaat zoals sloop of herbestemming.

Voorafgaande aan de asbestsanering/ sloopwerkzaamheden dient een sloopmelding te worden gedaan, waarbij o.a. een geldig asbestinventarisatie rapport moet worden toegevoegd (niet ouder dan 3 jaar en mits het rapport aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving).

In veel gevallen kan voor de geplande bouw een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig zijn.

Aanbevolen vervolgonderzoeken

Soort onderzoek	Aanbevolen
NEN 2991 onderzoek	Nee
Bodemonderzoek NEN 5707	Nee
Aanvullend onderzoek	Nee

Tabel 4.1

Ondanks de zorgvuldige werkwijze en uitvoering van de werkzaamheden door gecertificeerde medewerkers kan niet worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen dat tijdens de asbestinventarisatie niet is opgemerkt. Greenhouse Advies bv draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid, noch is hiervoor aansprakelijk. Wel geldt de verplichting dat onverhoopt niet geïnventariseerd asbest direct door het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf/opdrachtgever gemeld wordt aan het asbestinventarisatiebedrijf, waarop deze de daartoe conform schema te ondernemen stappen neemt.

## Bijlage 1: Procescertificaat Asbestinventarisatie



## Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070180

### Greenhouse Advies B.V.

Adres:	Huismanstraat 6 6851 GT HUISSEN	Datum uitgifte:	22-08-2023
Telefoonnr:	+31 26 2020606	Vervaldatum:	22-08-2026
Contactpersoon:	Dhr. L.A. Paardekooper	Datum eerste uitgifte:	22-08-2017
		KvK-nummer:	08205205
		E-mail:	algemeen@greenhouse-advies.nl

#### Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering vastgesteld door Stichting Ascert op 1 juni 2023 in overeenstemming met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

#### Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

- De certificaathouder:
  - blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema;
  - verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
  - stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
  - geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.



T. Hazenberg



Asbestinventarisatie

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op [www.ascert.nl](http://www.ascert.nl).


Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070180
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070180.01


Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde.

Nadruk verboden

Blad 1 van 1


## Bijlage 2: Tekeningen

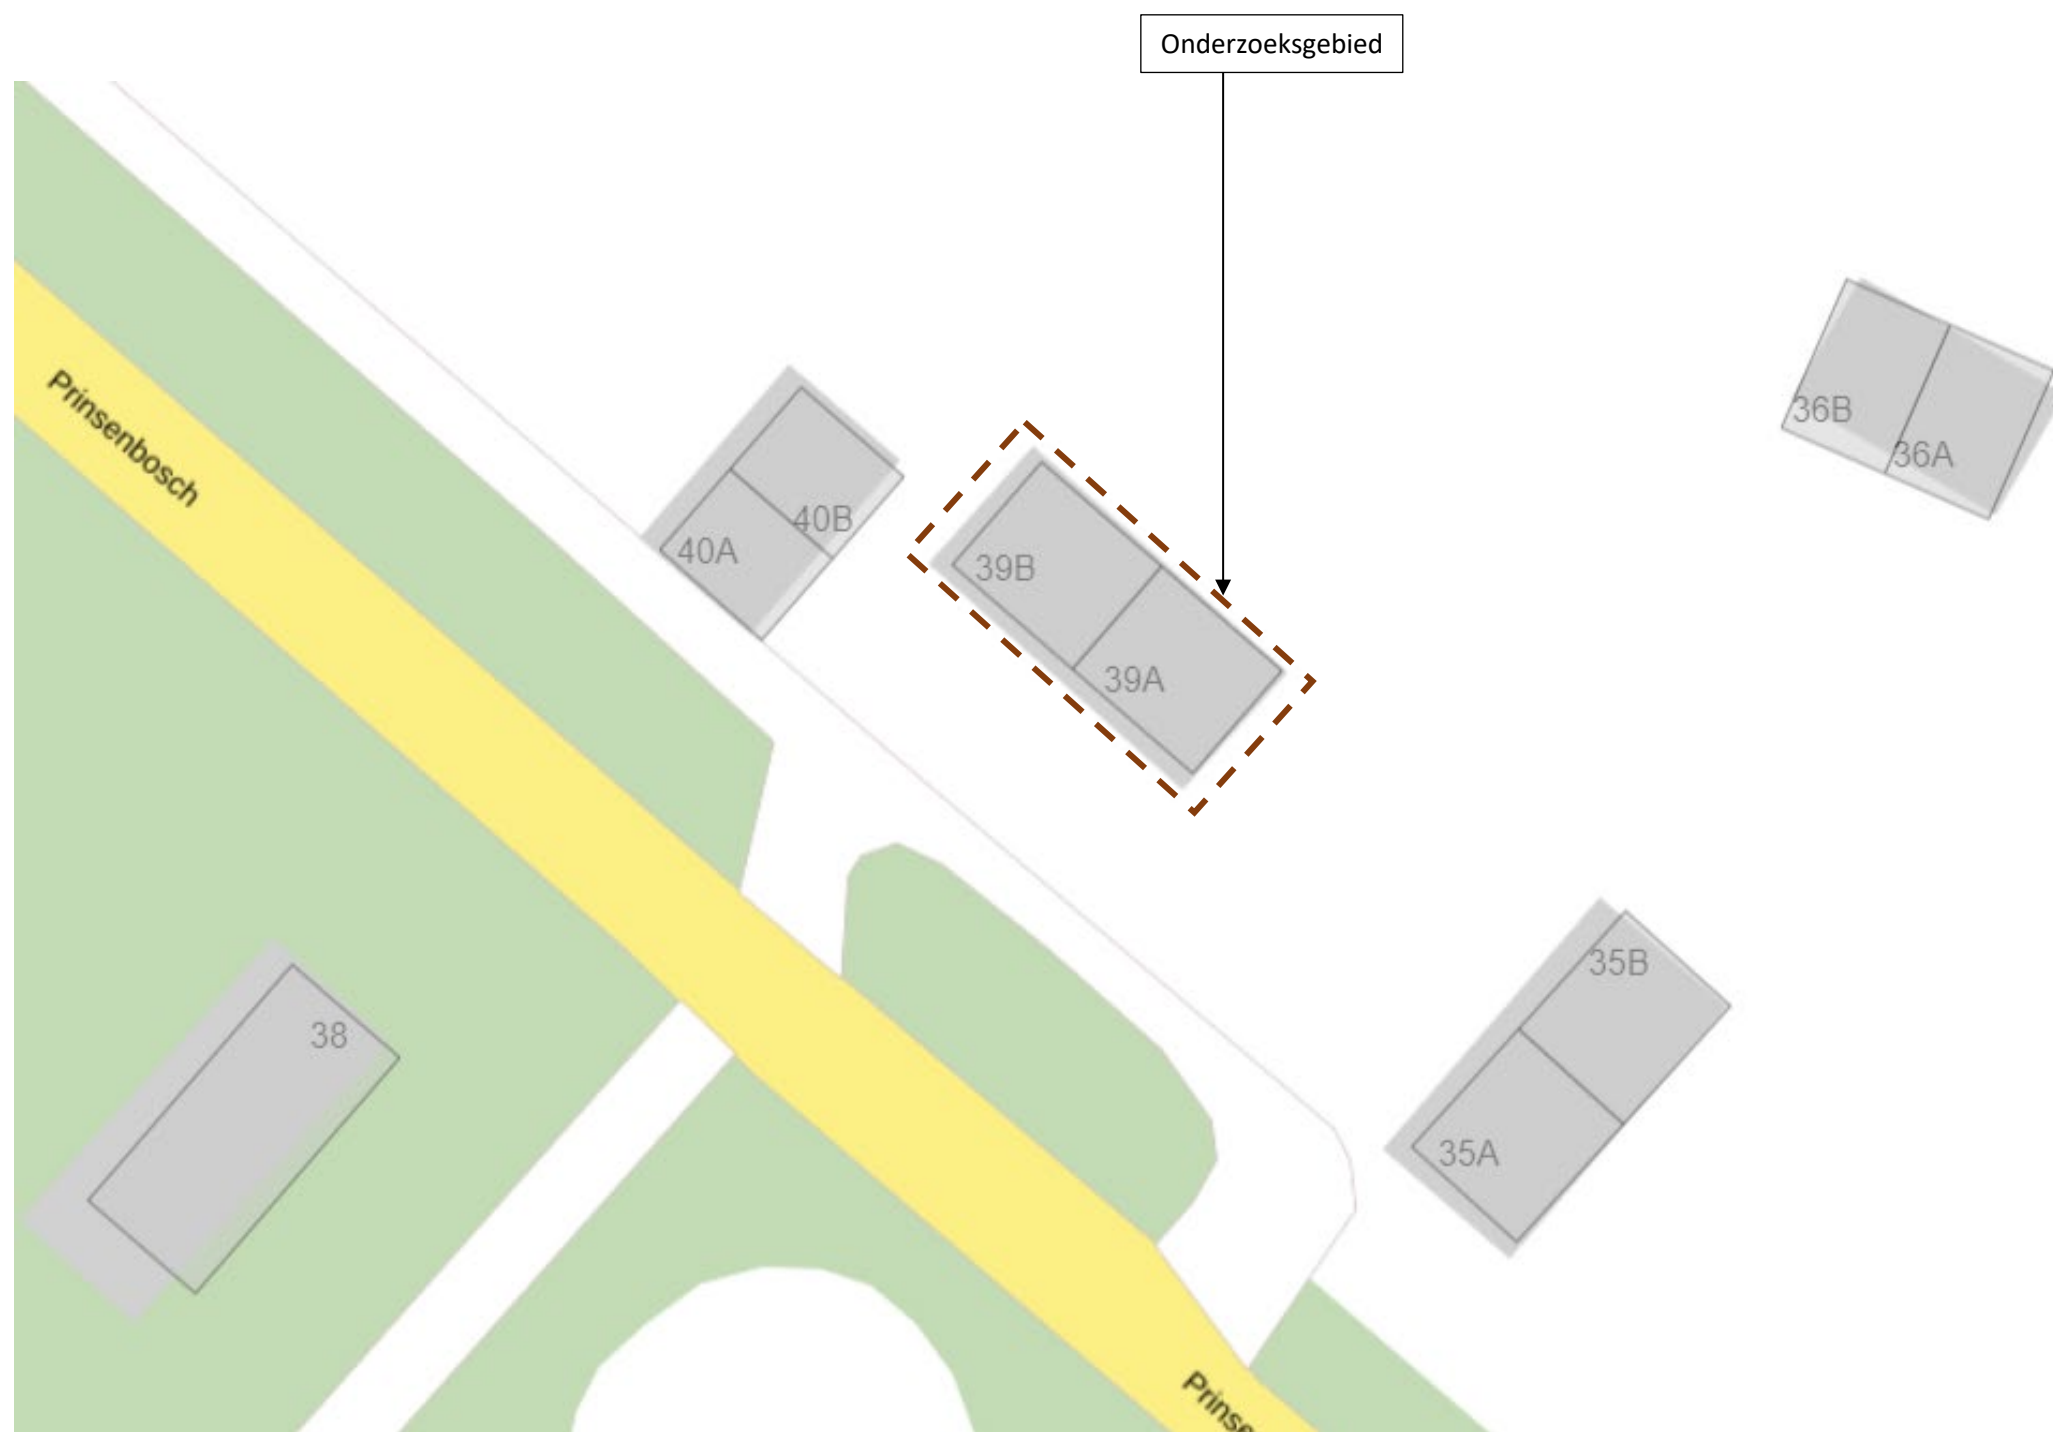

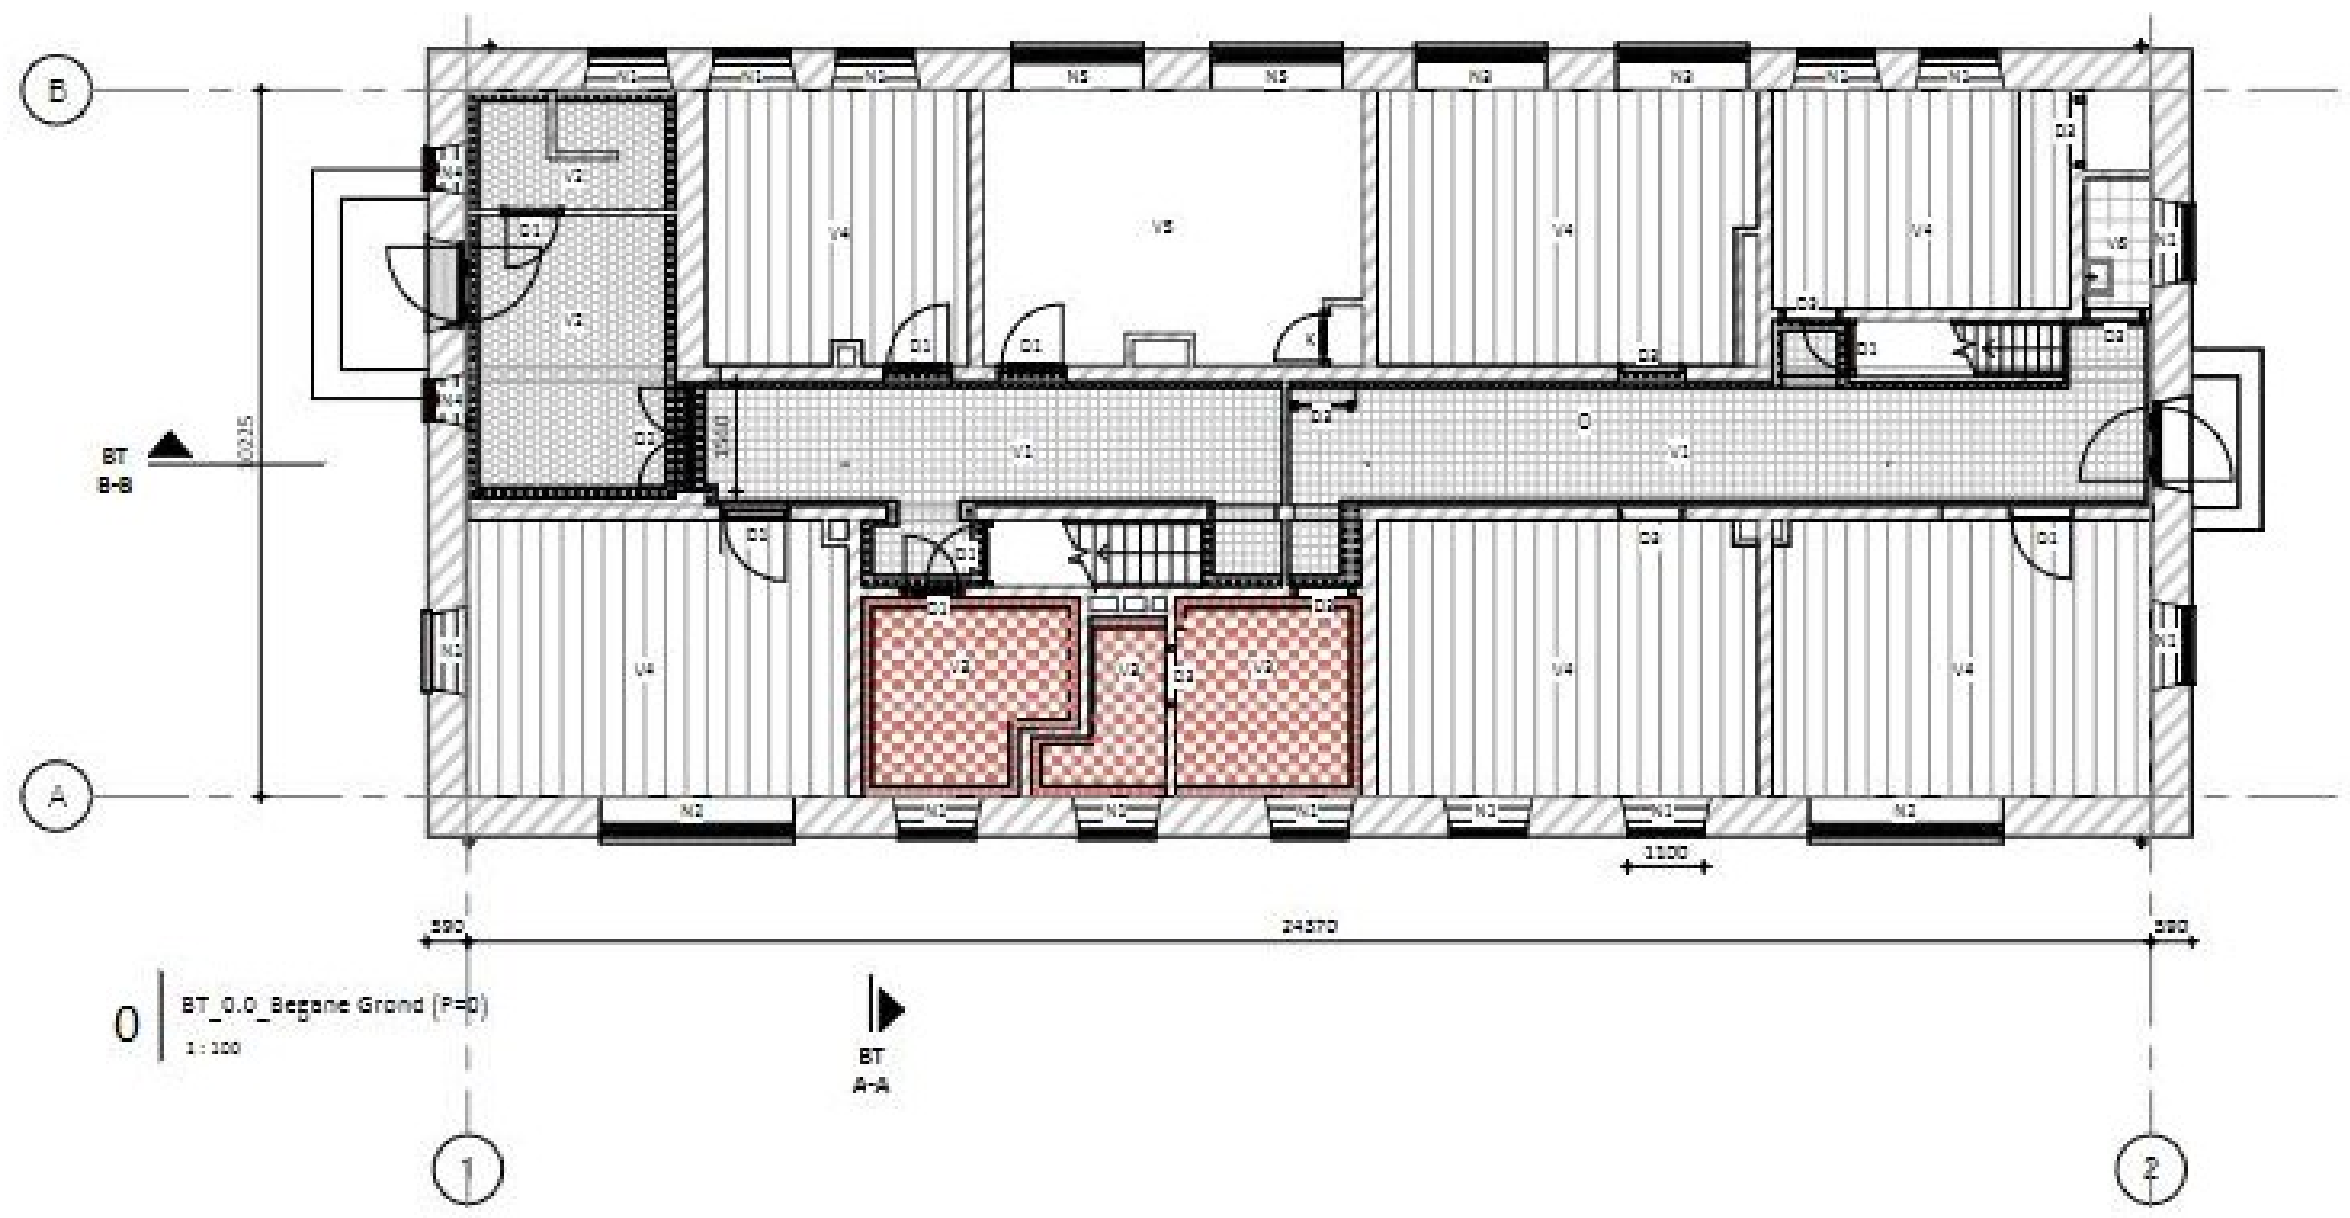


# LEGENDA

- N.T. niet toegankelijk
- asbesthoudend materiaal
- asbest verdacht
- niet asbesthoudend materiaal
- inventarisatiegrens
- niet onderzocht
- riolering

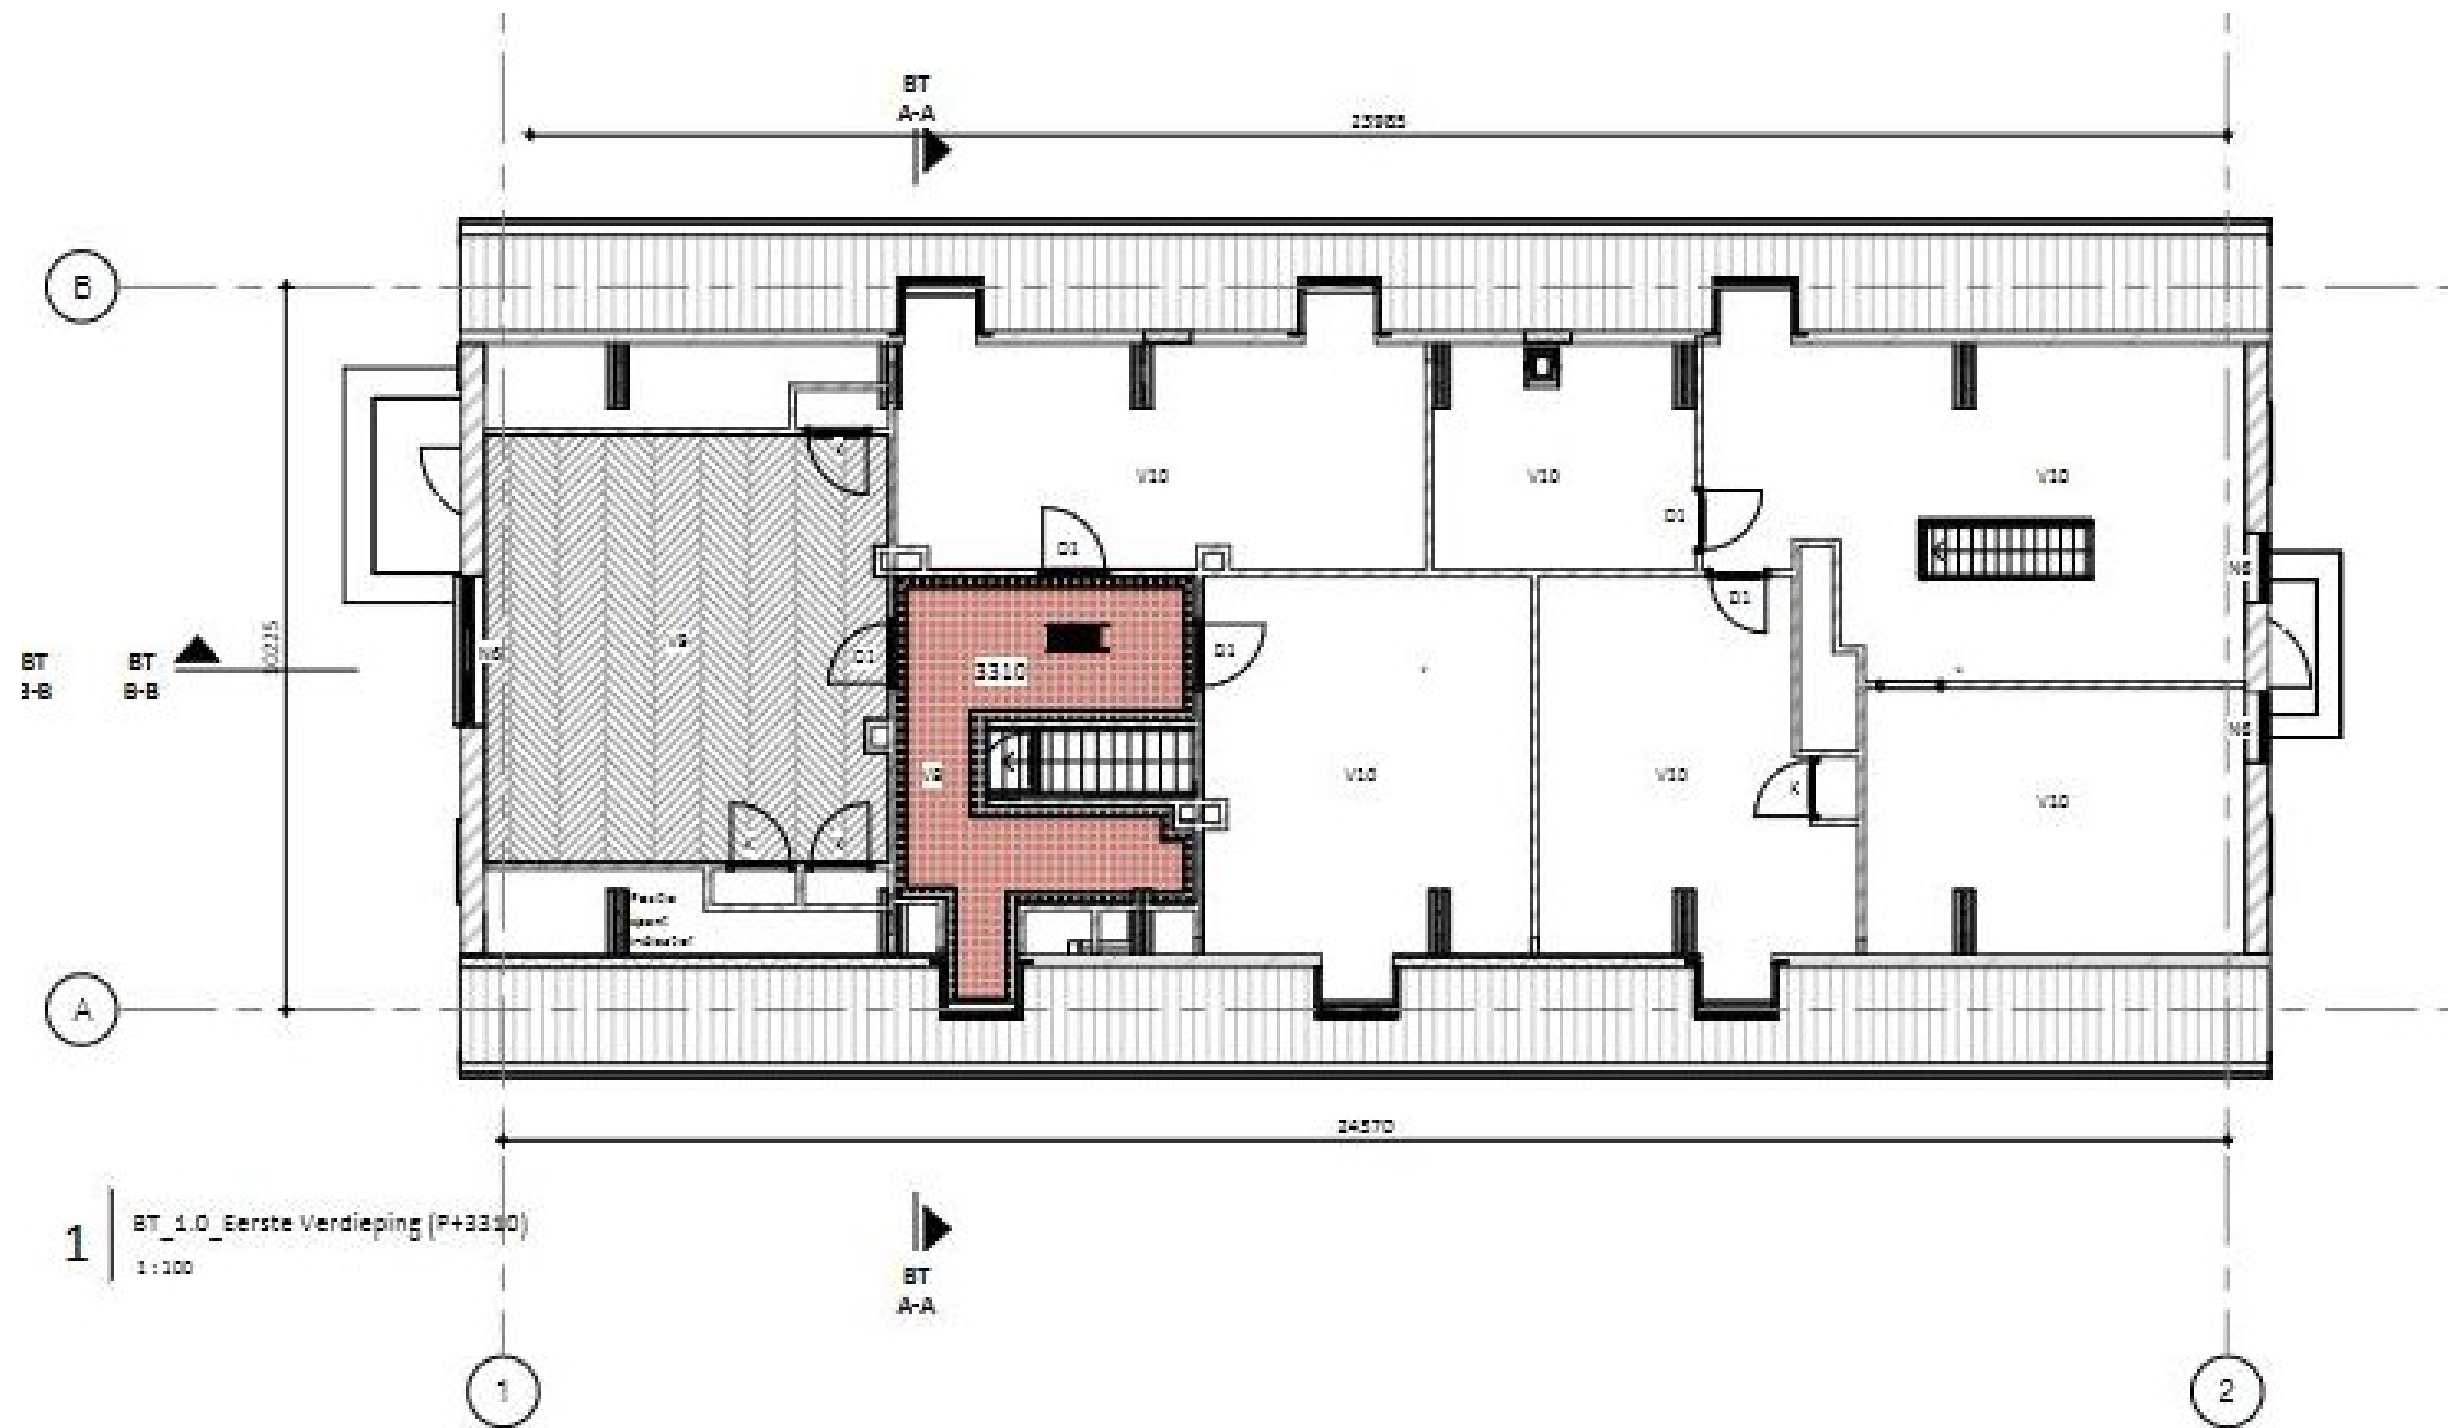

LEGENDA

- N.T. niet toegankelijk  
asbesthoudend materiaal  
asbest verdacht  
niet asbesthoudend materiaal  
inventarisatiegrens  
niet onderzocht  
riolering

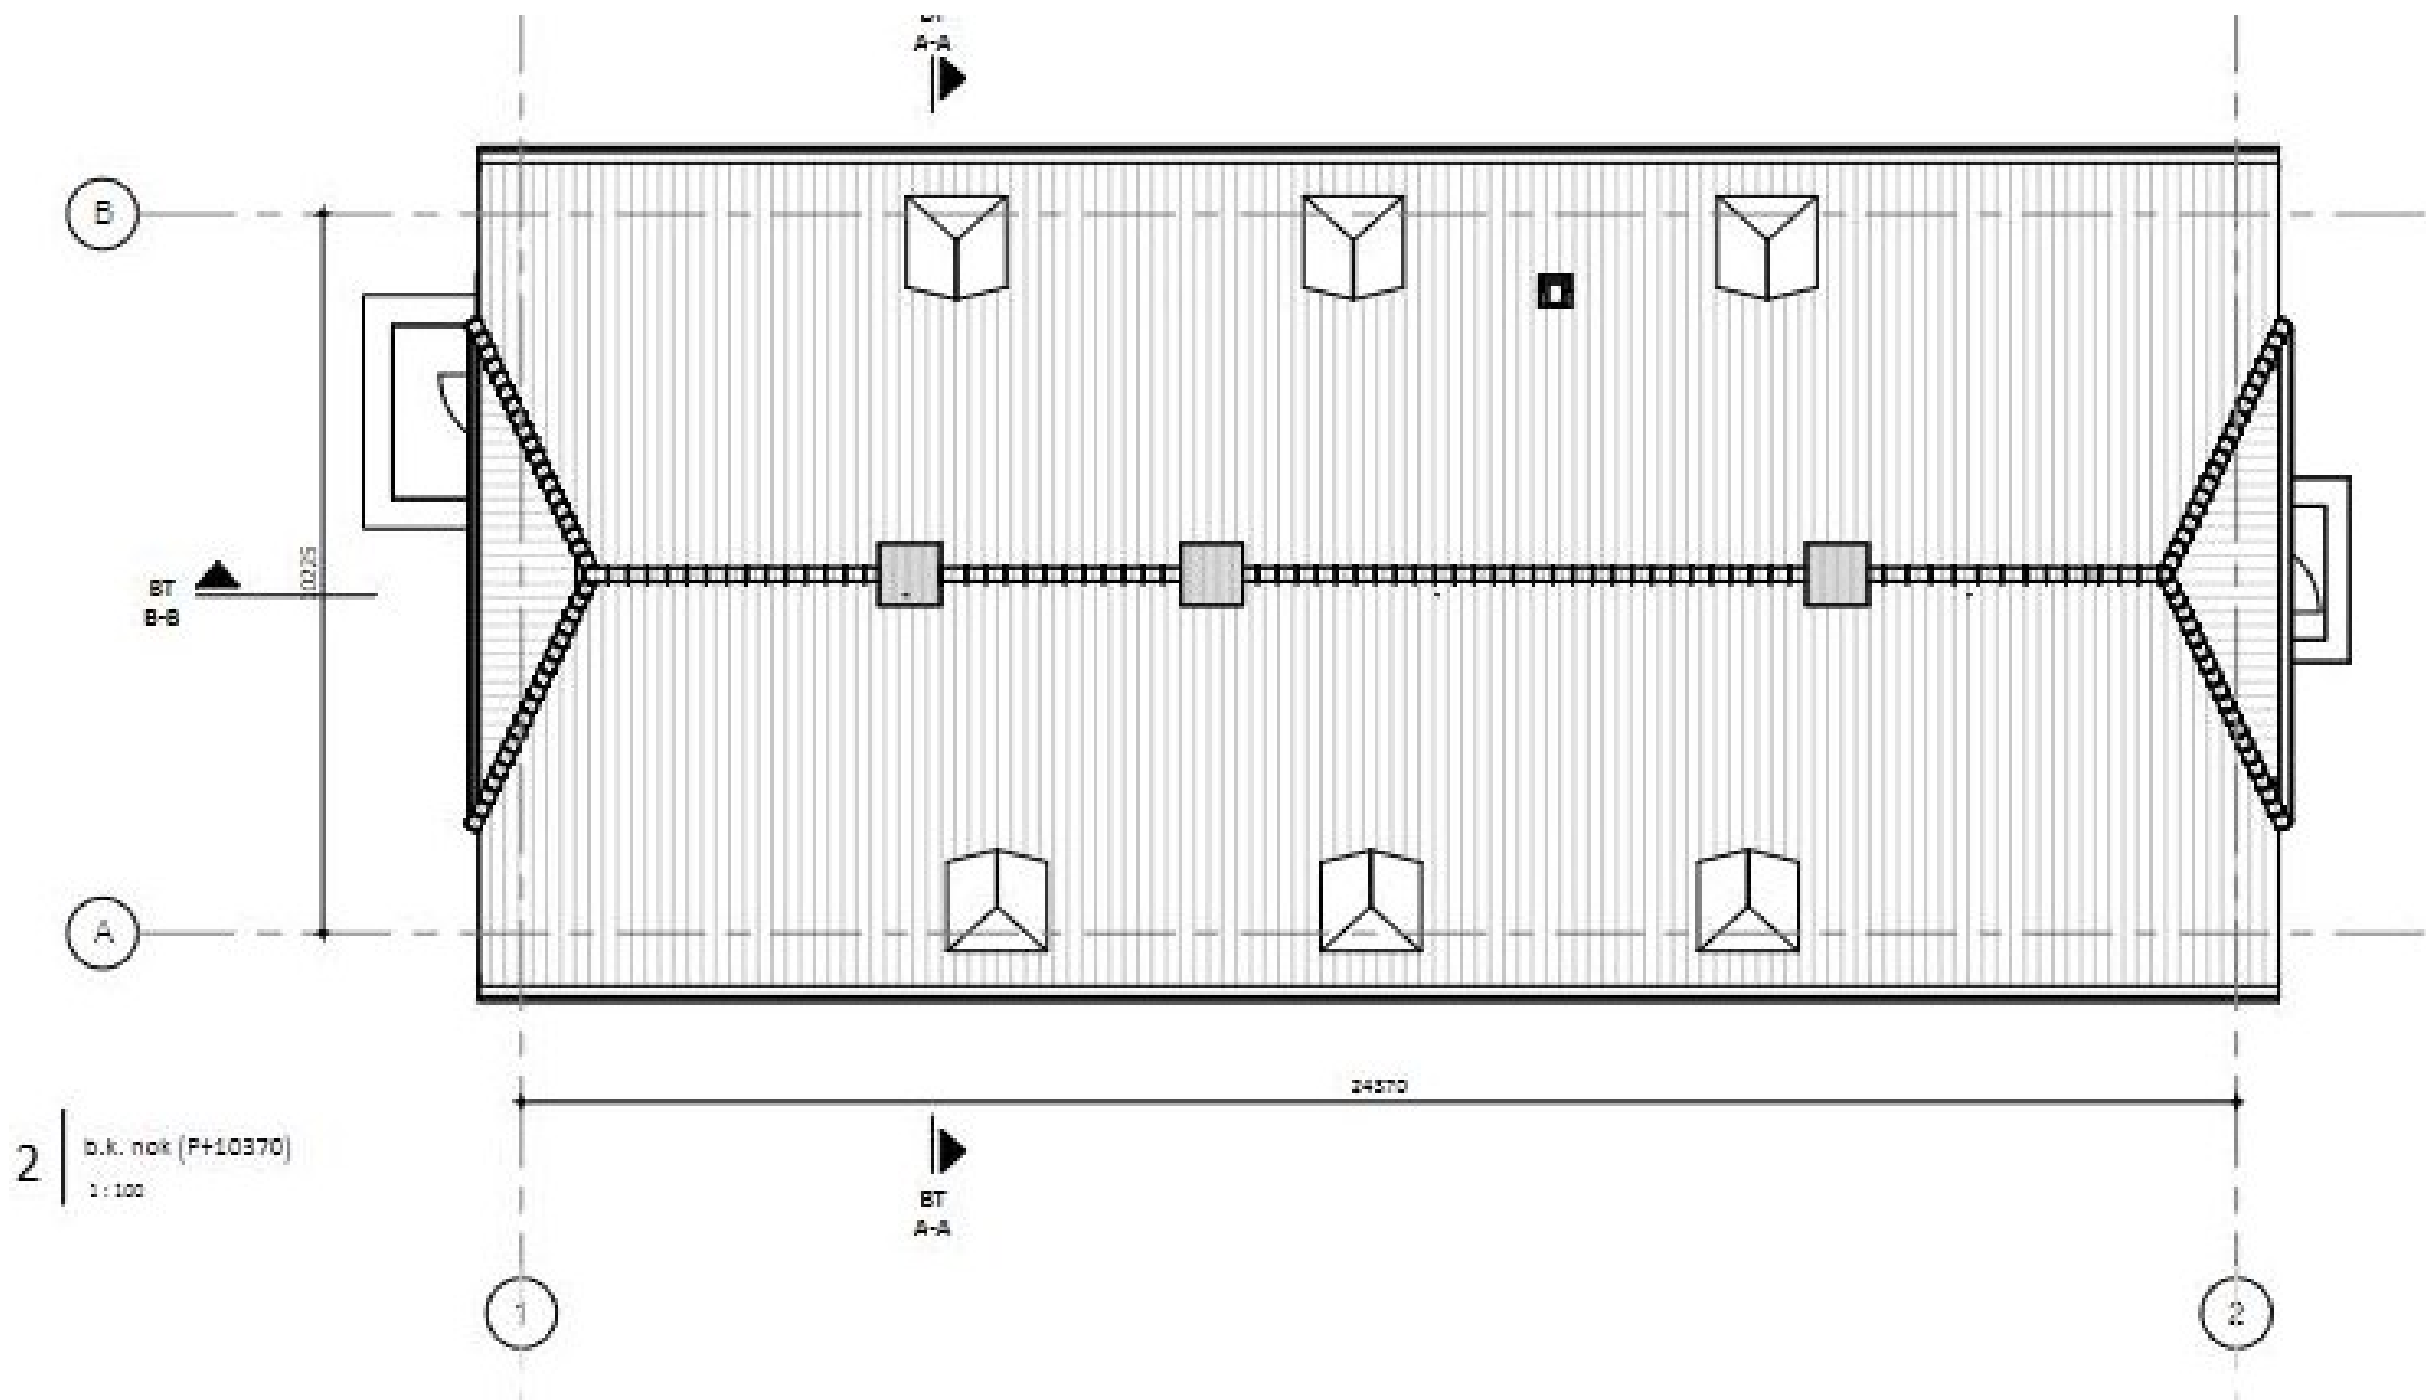

LEGENDA

- N.T. niet toegankelijk
- asbesthoudend materiaal
- asbest verdacht
- niet asbesthoudend materiaal
- inventarisatiegrens
- niet onderzocht
- riolering



RENVOOI

001

a

beplating  
Bron -001

a

Monster MM001  
Broncode -001 (monster MM001)

002


a

bitumen stroken  
Bron -002

Monster MM002  
Broncode -002 (monster MM002)

a

Monster MM003  
Broncode -002 (monster MM003)

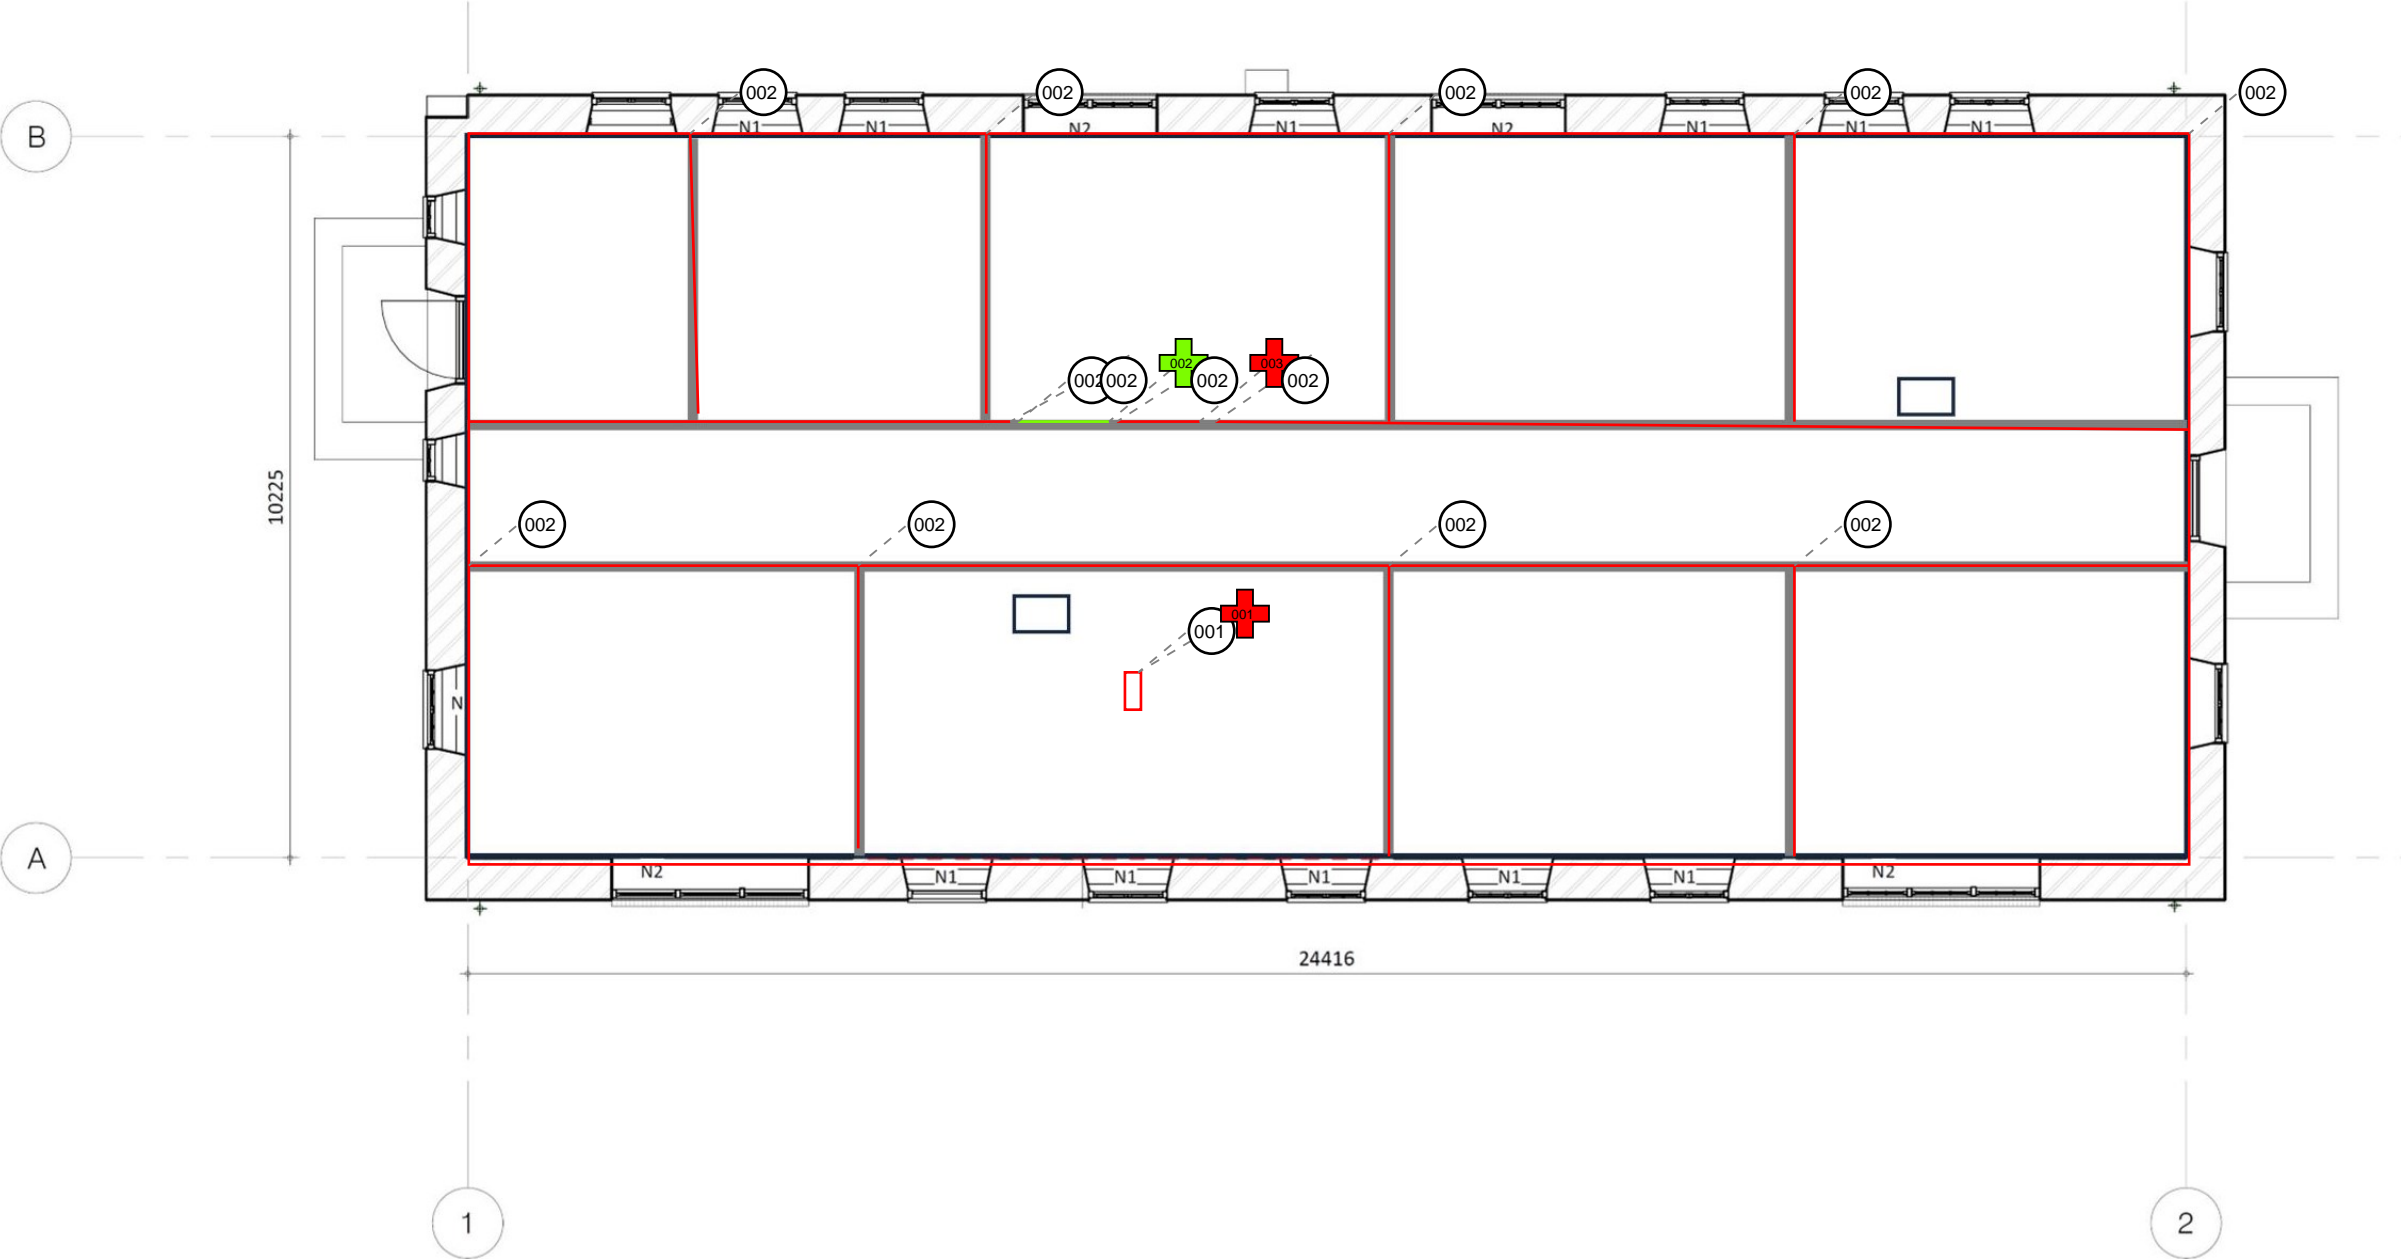

LEGENDA

N.T.

niet toegankelijk

asbesthoudend materiaal

asbest verdacht

niet asbesthoudend materiaal

inventarisatiegrens

niet onderzocht

riolering



Opdrachtgever : Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Project : P07169 Onderzoeken AZC Prinsenbosch Gilze

Onderwerp : P07169-3 AIR Prinsenbosch 39A en 39B Gilze

Locatie : Prinsenbosch 39A en 39B Gilze

Datum : 3 juni 2024

Formaat : 1190;842

Schaal : n.v.t.

## Bijlage 3: Analysecertificaten

## ANALYSECERTIFICAAT

**Opdrachtgever** : Greenhouse Advies B.V.  
**Contact** : H.A. Seijkens  
**Adres** : Huismanstraat 6, 6851GT HUISSEN

**Wijziging** : Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever

### Projectgegevens

**Projectcode** : 1744073  
**Uw project omschrijving** : P07169-3 AIR Prinsenbosch 39A en 39B Gilze  
**Validatieref.** : 1744073\_certificaat\_v3  
**Opdrachtverificatiecode** : PPNE-KRLX-SYDJ-ESHT

**Ontvangstdatum** : 27-05-2024  
**Rapportagedatum** : 30-05-2024  
**Aantal monsters** : 3  
**Aantal pagina's** : 1

### Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 (Q)

monstercode	omschrijving	schatting in gewichtsprocenten (massa%)						geschatte gebondenheid
		chrysotiel	amosiet	crocidoliet	anthophylliet	tremoliet	actinoliet	
8267133	MM001 plaatmateriaal	10-15	-	-	-	-	-	hecht
8267134	MM002 bitumen	-	-	-	-	-	-	n.v.t.
8267135	MM003 bitumen	0,1-2	-	-	-	-	-	hecht

### Analysemethode

Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien asbest niet aantoonbaar is, weergegeven als "-" in bovenstaande tabel, dient de rapportagegrens < 0.1% aangenomen te worden. Dit is in overeenstemming met NEN 5896 waarin de laagst detecteerbare concentratie aan asbest vastgesteld is op <0,1%.

### Opmerking

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever: Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker  
 Manager productie



### Disclaimer

Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
 Dit analysecertificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.  
 De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V.  
 H.J.E. Wenckebachweg 120  
 NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht  
 Nederland

T +31-(0)20-597 66 80  
 CSOmegam@eurofins.com  
 www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980  
 BIC BNPA NL2A  
 BTW nr. NL8139.67.132.B01  
 KvK nr. 34215654

## Bijlage 4: SMART risicoclassificaties

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 04 juni 2024 om 12h21 (2582346)

Greenhouse Advies BV

SCA-code: 07-D070180



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070180-P07169-3].

Identificatie

Adres	Prinsenbosch 39A en 39B, Gilze
Projectcode	P07169-3
Projectnaam	Gebouw 39
Broncode	001
Bronnaam	beplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	0,1 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1744073

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	----------------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 04 juni 2024 om 12h21 (2582364)

Greenhouse Advies BV

SCA-code: 07-D070180



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070180-P07169-3].

Identificatie

Adres	Prinsenbosch 39A en 39B, Gilze
Projectcode	P07169-3
Projectnaam	Gebouw 39
Broncode	002
Bronnaam	Bitumen stroken

Feiten

Productspecificatie	Bitumen coating
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	100 m²
Percentage Chrysotiel	0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	1744073

Situatie

Bevestiging	Gecoat
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--------------------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 16042024 (ingangsdatum 18-04-2024)

Werkplanelementen

Containment RK2 - ex RK3 (containment)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risicoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.
