



Aangesloten bij
boeren natuur

Gemeente Texel

.txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 3688373
kenmerk document: Bijlage 2/4
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer L. Graanoogst
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving a.i.


Aanvraag project: aanleg natuurvriendelijke oevers ANLV De Lieuwsche Texel

Aanvraag natuurvriendelijke oever

Locatie: 2^e perceel na Andre Bakker aan de Grie:

<https://kadastralekaart.com/kaart/perceel/TEL00/P/852>

<https://maps.app.goo.gl/UiVg46YqHBCBbAca8>

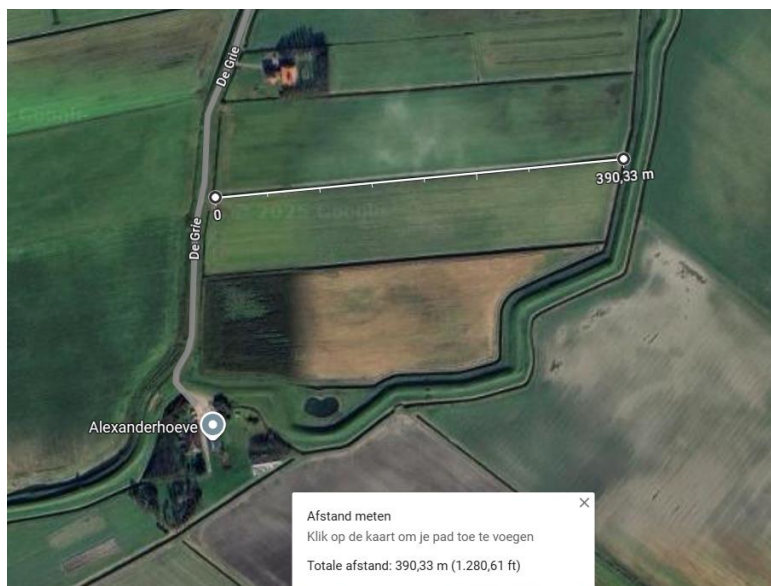



Lengte: 390 meter NVO

Eénzijdig langs watergang aan noord zijde van het perceel

Als standaard voor de natuurvriendelijke oever wordt aangehouden:

-10-15 cm onder het zomerpeil.

-Profiel 1:4.


-Schatting te vergraven grond 2 m³ per strekkende meter (op basis van nacalculatie):

780 m³

Bestemming grond:

Transport naar en verspreiden op het paardenland aan de Hoornderweg. (frezen, kilveren, inzaaien)



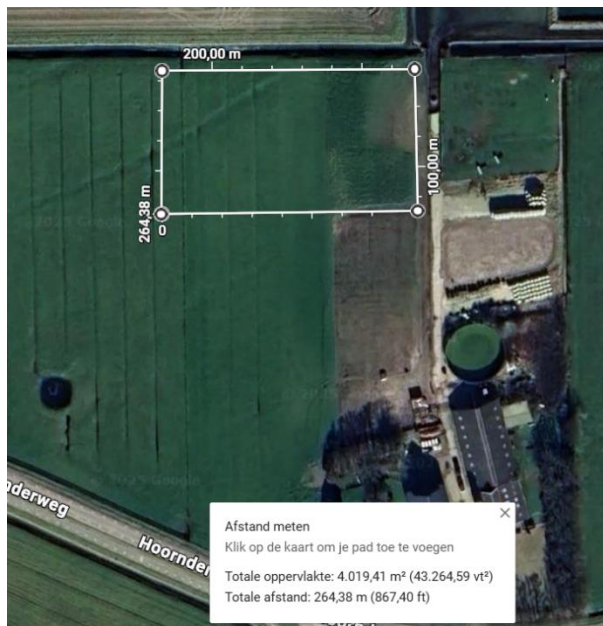

Benodigde werkzaamheden door aannemer:

- Tevoren inmeten oever
- Klicmelding
- Rijplaten om stukrijden en verdichting van de bodem te voorkomen voor te graven traject + ontsluiting.
- Rijplaten traject NVO oever: 390 meter
- Rijplaten ontsluiting: 10 meter
- Rijplaten voor bestemmingslocatie grond a.d. Hoornderweg: 20 meter
- Totaal 420 meter
- Vóór uitvoering graafwerk riet maaien
- Vóór uitvoering graafwerk frezen NVO rand
- Graven natuurvriendelijke oever 390 meter (schatting 780 m3 grond)
- Grondtransport naar bestemmingslocatie paardenland aan de Hoornderweg, schatting 780 m3
- Op bestemmingslocatie grond: frezen perceel, grond verspreiden dmv kilveren, inzaaien met kruidenrijk grasmengsel. Perceeloppervlakte: totaal 6511 m2
- Dam verleggen naar begin van de Grie. Buis en damhek weg te halen (zie foto onder), beide te herplaatsen bij nieuwe dam, nwe buisdoorsnede 600 mm.
- Stuw plaatsen aan het eind van de nieuw gegraven NVO (tbv > water vasthouden)
- Hekwerk achter stuw (zodat de schapen niet van het ene naar het andere perceel kunnen)
- Drainagepijpen zijn niet aanwezig



Te verleggen dam naar begin van dezelfde sloot vanaf de Grie gezien

Locatie nieuw aan te leggen stuw, aan achterzijde van de nieuwe natuurvriendelijke oever

ANLV De Liew Texel Ottersaat 5 1792 CC Oudeschild tel (0222) 314072
KvK 370 81 759

info@delieuw.nl www.delieuw.nl IBAN NL31 RABO 03625 03338

