

LVO A1 HRL | Knp. Beekbergen 14 juli t/m 15 juli

Samenvatting

Op de A1 zijn op aangegeven traject schades ontstaan aan het asfalt, welke op verzoek van Rijkswaterstaat moeten worden gerepareerd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de navolgende trajecten; Deventer – Arnhem en Deventer Zwolle. De uitvoeringswerkzaamheden staan gepland van 14-7-2026 t/m 15-7-2026. Plaatsen en opruimen van de vooraankondigingsborden is ca. 1 week voor en na de uitvoering. De werkzaamheden die wij aan de rijbaan (A1 HRL) willen uitvoeren bestaan uit:

1. Frezen asfaltdeklaagen;
2. Aanbrengen asfaltdeklaagen;
3. Aanbrengen markeringen.

Omgevingsscan	
Beschrijving van nevenproject, evenement, stakeholder	Nadere omschrijving van het raakvlak of conflict en de wijze waar dit beheerst wordt
Werkzaamheden Woeste Hoeve in weekend voor uitvoering	Verkeersmaatregelplannen worden op elkaar afgestemd, zodat niet dezelfde omleidingsletters worden gebruikt.
Werkzaamheden GO A1	Op de A1 tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid vinden voorbereidende werkzaamheden plaats ten behoeve van het GO. Deze worden echter uitgevoerd in de WBU, dus beide werkzaamheden kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd.

Details

Tekening;

- 62-00020-004.137 Knp.Beekbergen WP26 H-boog Concept 1

Periode			
Startdatum	Donderdag	14 juli 2026	21:30 uur
Einddatum	Vrijdag	15 juli 2026	05:00 uur


Wegnummer	A1 vwb H	Wegnummer	A1 vbw H
Wegzijde	HRL	Wegzijde	HRL
Van hm.	88,000	Naar hm.	86,900
Van	Deventer	Naar	Arnhem
Tussen	Voorst (24) A1	En	Loenen (23) A50

Van locatie		Naar locatie	
Wegnummer	A1 vwb F	Wegnummer	A1 vwb F
Wegzijde	HRL	Wegzijde	HRL
Van hm.	88,000	Naar hm.	87,500
Van	Deventer	Naar	Zwolle
Tussen	Voorst (24) A1	En	Apeldoorn (24) A1

Afgesloten toerit, afrit of verzorgingsplaats:

- Afsluiting verbindingsboog H richting Arnhem en F richting Zwolle + toerit 24d

Nr.	Doorgaand / Lokaal / Advies	Bestemming / route
1	Doorgaand	Arnhem (via N345 en toerit 24 Apeldoorn)
2	Doorgaand	Zwolle (via N345 en toerit 24 Apeldoorn)
3	Doorgaand	Arnhem/Zwolle (via aansluiting 20 Apeldoorn-Zuid)

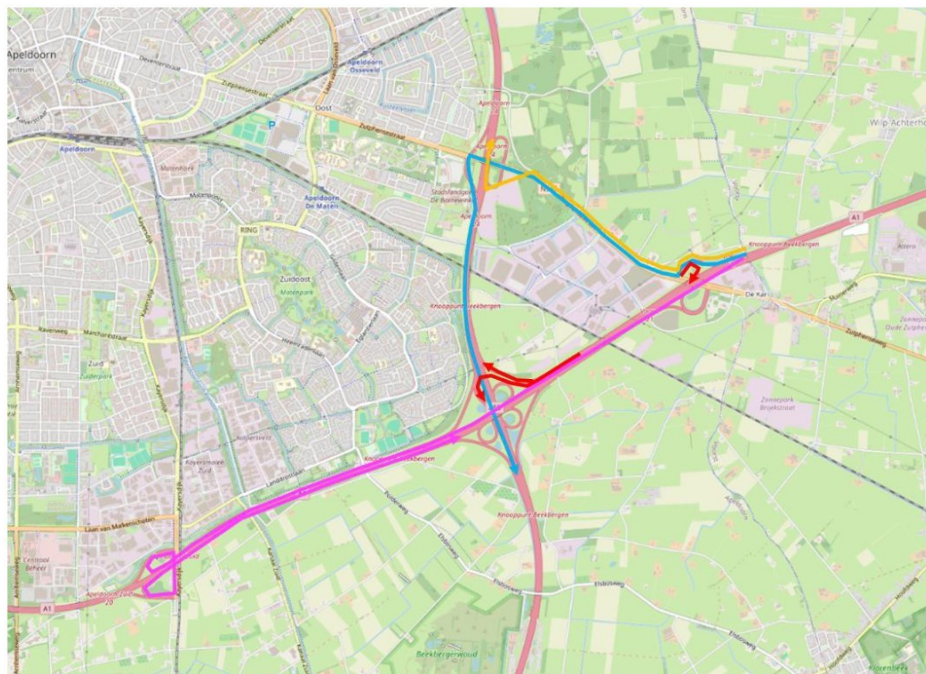

Figuur 1: Schematische kaart van het werkvak en de lokale omleidingsroutes voor doorgaand verkeer.

Betreffende wegen waar verkeersmaatregelen worden getroffen:

- **Provincie Gelderland: N345 L, 4 borden nabij hm 4.6;**
- **Provincie Gelderland: N345 L, 1 bord nabij hm 3.8;**
- **Provincie Gelderland: N345 L, 2 borden nabij hm 2.6;**

- **Gemeente Apeldoorn: Zutphensestraat, 3 borden;**
- **Gemeente Apeldoorn: Kayersdijk, 1 bord;**
- **Gemeente Apeldoorn: Ecofactorij, 2 borden;**

