

Projectplan Verbetering waterhuishouding Landje van Bremmer

Afdelingshoofd dhr. C. de Booy van Rijnland heeft op 26 april 2013 het projectplan voor Verbetering waterhuishouding Landje van Bremmer vastgesteld (13.27866).

U kunt de stukken in de periode van 1 mei 2013 tot en met 12 juni 2013 inzien op de volgende locaties:

- het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden;
- www.rijnland.net/terinzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage termijn een gemotiveerd beroepschrift indienen. Dit beroepschrift dient u, onder vermelding van kenmerk 12.80262, in bij de Rechtbank 's-Gravenhage (Sector Bestuursrecht), postbus 20302, 2500EH Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroep schort de werking van het projectplan niet op. Belanghebbenden kunnen, naast het indienen van het beroepschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht) of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Deze bekendmaking is gebaseerd op de artikelen 3:44 juncto 6:8 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift gebeurt op grond van artikel 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het vragen om een voorlopige voorziening is geregeld in artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Voor meer informatie over dit projectplan kunt u contact opnemen met mevrouw I.A. Elema, , telefoon 071-306 3345, e-mail Ina.Elema@rijnland.net

Leiden, 26 april 2013



Hoogheemraadschap van
Rijnland

**Verbetering waterhuishouding Landje van
Bremmer**

Projectplan

op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

Projectnummer: 91832

PROJECTNUMMER	PROJECTNAAM	
91832	Oegstgeest maatregelen polders Oudenhof	
VASTSTELLING	NAAM	AFDELING/ TEAM
Afdelingshoofd:	De heer C. (Cees) de Booy	Plannen en Projecten
Datum:	Handtekening	
26 april 2013		

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	3
1.1	Aanleiding en doel van het project	3
1.2	Waarom een projectplan?	3
2.	Inleiding	4
2.1	Projectgebied	4
2.2	Projectbeschrijving	4
3.	Omschrijving maatregel	6
3.1	Huidige situatie	6
3.2	Gewenste situatie	6
4.	Wijze van uitvoering	7
4.1	Werkzaamheden	7
4.2	Samenwerking	7
5.	Praktische afwikkeling	8
5.1	Financiën	8
5.2	Beheer en onderhoud	8
5.3	Leggerwijziging	8
6.	Besluitvorming en procedure	9
6.1	Procedure projectplan	9
6.2	Mededelingen over de procedure in publicatie	9
6.3	Communicatie	9
	Bijlage 1 – gegevens ten behoeve van de uitvoering	10
	Bijlage 2 – te baggeren watergangen	11

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel van het project

Dit project is onderdeel van het project overname beheer Polders Oudenhof. Voor het verbeteren van de waterafvoer vanuit de noordelijk gelegen Oranjewijk in Oegstgeest (polders Oudenhof) zijn verschillende maatregelen voorzien op het Landje van Bremmer. Het betreft de volgende maatregelen:

- Verbreden watergangen. Door veetrap zijn beide oevers van de watergangen ingezakt en zijn de watergangen zeer smal geworden. De watergang zal tot de oorspronkelijke breedte worden hersteld.
- Vergroten van twee duikers. Van beide duikers is geen vergunning bij Rijnland teruggevonden. Op beide locaties zullen grotere duikers worden aangelegd. De huidige duikers functioneren momenteel niet.

Tevens vinden er baggerwerkzaamheden plaats. Het herstellen van de breedte van de watergangen en de baggerwerkzaamheden op het Landje van Bremmer worden gecombineerd om werk met werk te maken en daarmee te besparen. Het verbreden en de aanleg van de duikers lift mee met het baggeren. Bijlage 2 geeft een overzicht van de te baggeren watergangen.

1.2 Waarom een projectplan?

In het kader van dit project gaat de waterhuishouding in het landje van Bremmer verbeterd worden. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, in dit geval verbreding van watergangen en de vervanging van twee duikers, door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.

Voor de procedure wordt verwezen naar hoofdstuk 6.

2. Inleiding

2.1 Projectgebied

De onderstaande overzichtskaart (*figuur 1*) geeft de locatie van het projectgebied weer. Het projectgebied ligt gedeeltelijk binnen de gemeentegrenzen van Oegstgeest en gedeeltelijk binnen de gemeente Leiden. De gemeente Leiden is eigenaar van de hele wei, ondanks het feit dat het grootste deel ervan in de gemeente Oegstgeest ligt.



Figuur 1


2.2 Projectbeschrijving

Figuur 2 geeft de situatie weer van één van de huidige watergangen. Zoals te zien, is de breedte van de sloot afgenomen doordat de oevers zijn vertrapt. De sloot wordt tot de oorspronkelijke breedte verbreed. Dit is een bodembreedte van 2,0 m, een diepte van 0,7 m en een talud van 1:3. De te verbreden watergangen staan met rode onderbroken lijnen weergegeven op *figuur 3*. Andere onderdelen van het project zijn het vervangen van twee duikers.



Figuur 2

De duikers die vervangen zullen worden zijn op *figuur 3* weergegeven met nummers 1 en 2. In bijlage 1 zijn details van de te vervangen duikers en te verbreden watergangen weergegeven. De blauwe lijn is de gemeentegrens. Het zuidelijke deel bevindt zich in de gemeente Leiden, het noordelijke deel in de gemeente Oegstgeest.

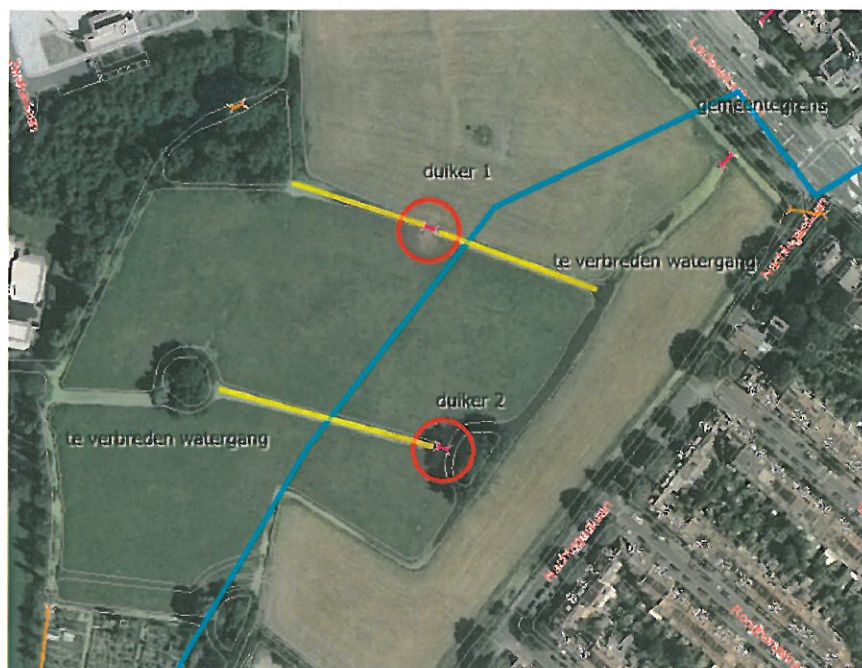

Figuur 3

3. Omschrijving maatregel

3.1 Huidige situatie

In de huidige situatie voldoen de watergangen en duikers zoals beschreven niet: de capaciteit van het watersysteem om water vanuit polders Oudenhof af te voeren is te laag. De huidige situatie wordt ook gekenmerkt door begroeide watergangen (zie *figuur 2*). De watergangen hebben een enigszins meanderend karakter.

3.2 Gewenste situatie

De gewenste situatie is zodanig dat de watergangen en de duikers worden uitgevoerd zodat deze een voldoende afvoercapaciteit hebben. Er is minder overlast als gevolg begroeide watergangen. Het meanderende karakter van de watergangen zal behouden blijven.

4. Wijze van uitvoering

4.1 Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een aannemer.

4.2 Samenwerking

Alleen de eigenaren van de grond waarop de wijzigingen plaatsvinden of die hieraan grenzen worden betrokken. Met de grondeigenaren wordt afstemming gezocht voorafgaand en tijdens de werkzaamheden. Indien nodig, wordt een overeenkomst gesloten.

Volgens de Waterwet, artikel 5.23, lid 1, zijn grondeigenaren gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan een waterstaatswerk te gedogen als dit maar tenminste 48 uur van te voren (schriftelijk) aan hen wordt medegedeeld.

Belangrijke gesprekspartner is de gemeente Leiden. Indien nodig zal de gemeente op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden.

5. Praktische afwikkeling

5.1 Financiën

De maatregelen zullen 50%-50% worden betaald door Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Oegstgeest, zoals is afgesproken binnen het project overname beheer Polders Oudenhof.

5.2 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de watergangen komen voor rekening van de gemeente Leiden.

5.3 Leggerwijziging

De nieuwe situatie zal worden opgenomen in de legger.

6. Besluitvorming en procedure

6.1 Procedure projectplan

De procedure welke gevolgd wordt voor dit projectplan is de reguliere (korte) procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De verloop van de procedure is als volgt:

- Het projectplan wordt direct vastgesteld namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
- Het besluit wordt gepubliceerd en daarna begint de termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar.
- Indien van toepassing volgt de bezwaarschriftenprocedure, de bezwaren worden behandeld door de bezwaarschriftencommissie van Rijnland.
- Bij bezwaren wordt het besluit van het dagelijkse bestuur van Rijnland heroverwogen.

Inwerkingtreding: Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door digitale publicatie in het Waterschapsblad, op het internet te raadplegen via www.rijnland.net.

6.2 Mededelingen over de procedure in publicatie

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit (het projectplan) bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de maatregel(en) en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Door het indienen van een verzoek tot een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het besluit wel te schorsen. Dit verzoek kan worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het projectplan worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

6.3 Communicatie

Het werk wordt afgestemd met de direct betrokken grondeigenaren/gebruikers.

Bijlage 1 – gegevens ten behoeve van de uitvoering

Gegevens duikers

Diameter: rond 1 m

Lengte: 5 m

Materiaal: HDPE

Baggerspecie en grond die vrijkomt uit de watergangen wordt lokaal op de kant verwerkt.


Gegevens watergangen

Figuur 1 en figuur 2 geven schetsen van de huidige situatie (groene lijn) en de gewenste situatie na verbreding van de watergangen (paarse lijn) weer. Zie bijlage 2 voor de locaties van de doorsneden (7210 en 7207). De te hanteren maatvoering is als volgt.


Diepte: 0,7 m

Bodembreedte: 2,0 m

Talud L/R: 1/3

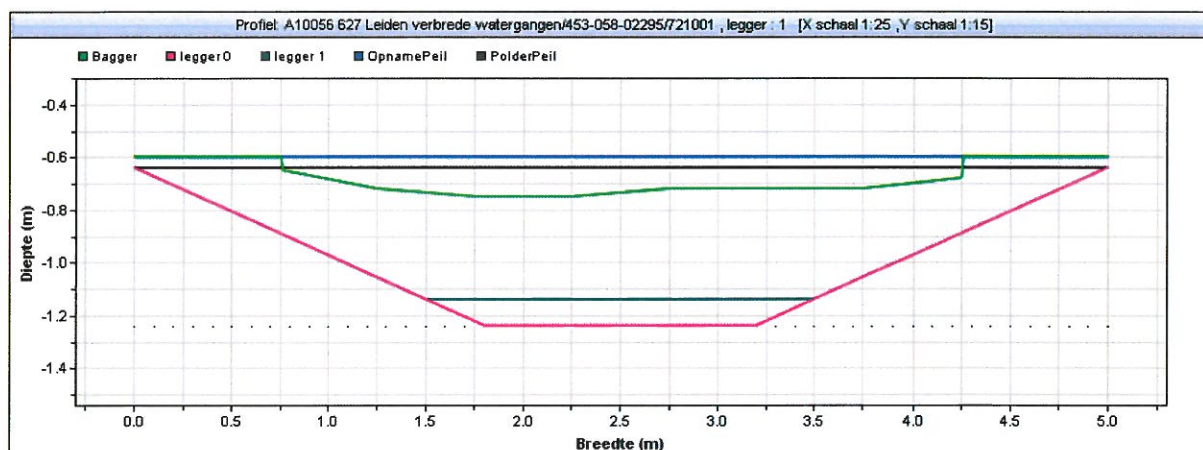


Figuur 1

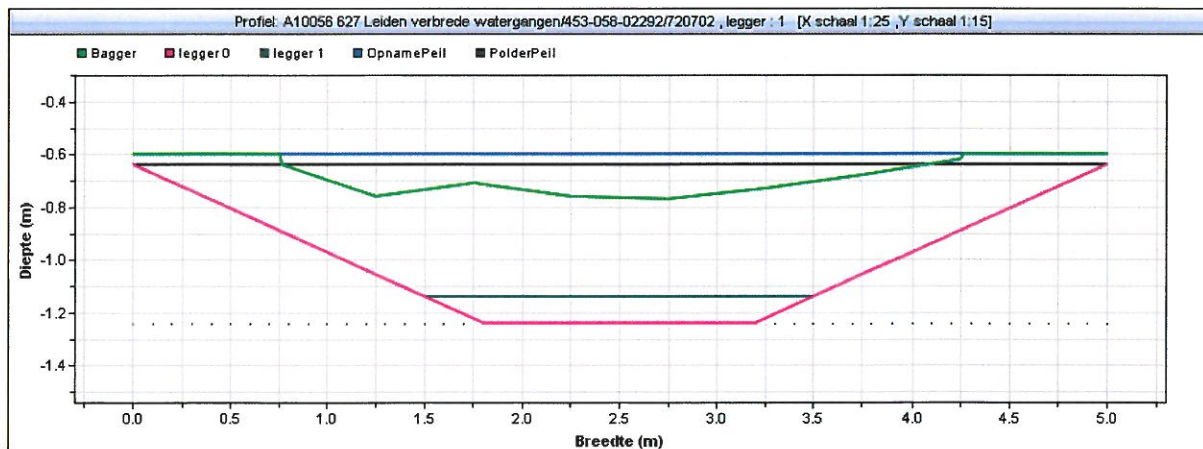

Figuur 2

Bijlage 2 – te baggeren watergangen

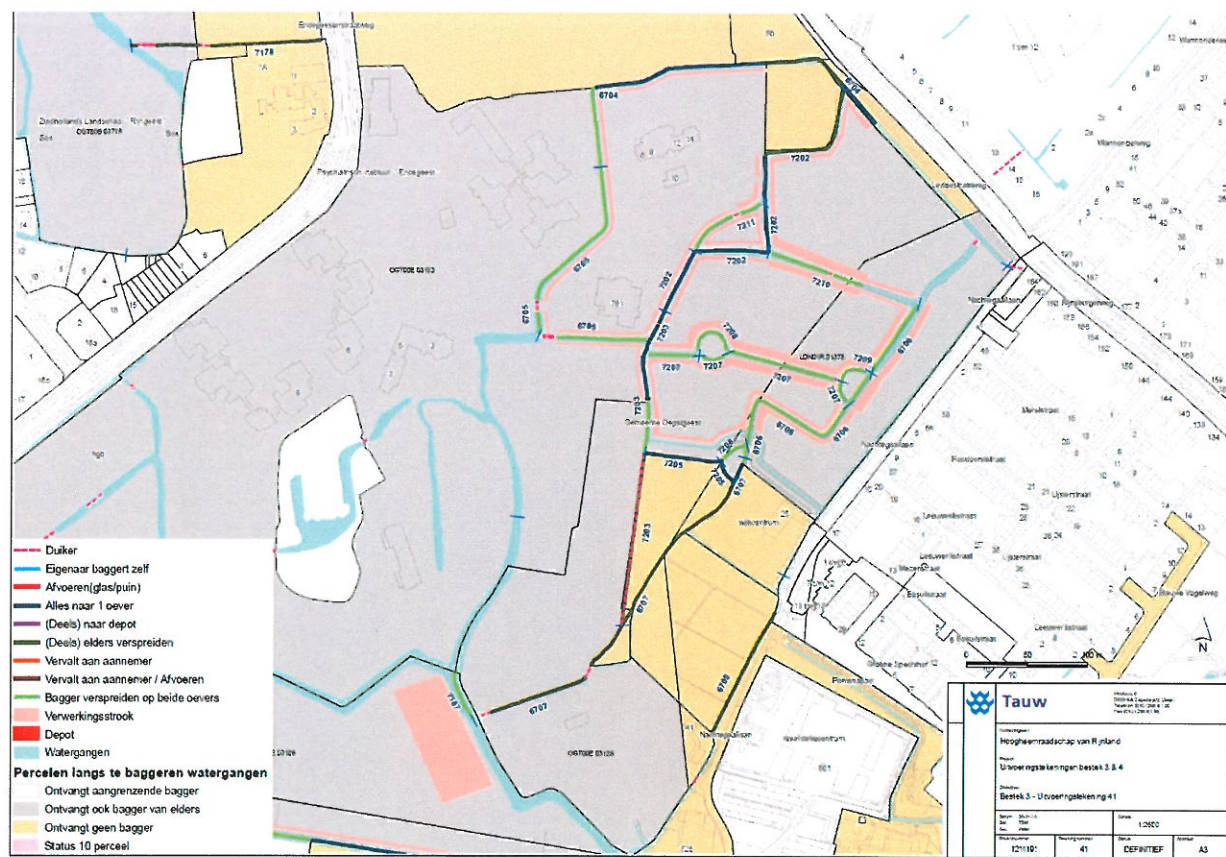

Figuur 1

De te baggeren watergangen zijn in *figuur 1* weergegeven.

