


# Projectplan

## Aanleggen Aflatstuwconstructie Wippolder Korte Noordweg Wateringen

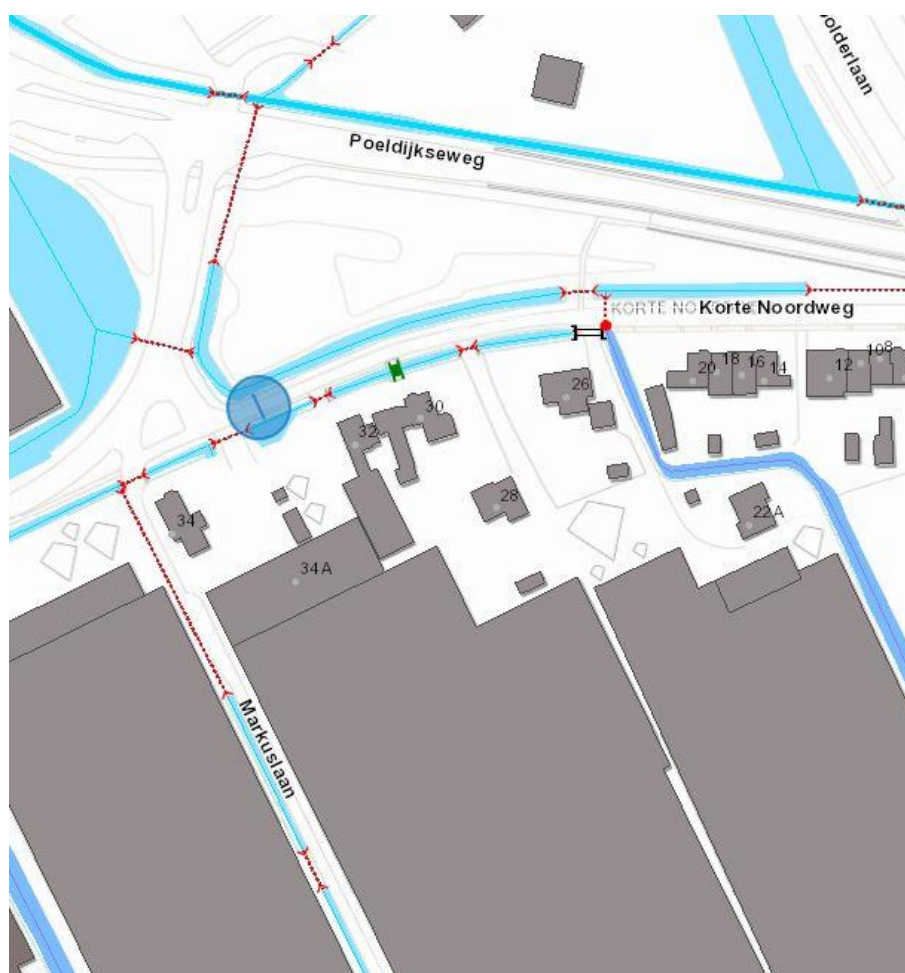

Opsteller:	P. Verhulst
Status:	Definitief
Projectfase:	DO
Projectnummer:	NVT
Datum:	03 maart 2016

## Inhoud

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2. Beschrijving van het betrokken werk 4</b>	
2.1 Locatie	4
2.2 Werkzaamheden	4
2.3 Relatie met het bestemmingsplan	4
2.4 Relatie met de legger, beheer en onderhoud	4
2.5 Relatie met de beleidregels	5
2.6 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten	5
<b>3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd</b>	<b>5</b>
3.1 Werkmethode	5
3.2 Bouwlogistiek en planning	5
<b>4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen</b>	<b>5</b>
4.1 Onderzoeken	5
4.2 Beperken nadelige effecten	6
4.3 Monitoring tijdens uitvoering	6
<b>5. Procedure</b>	<b>6</b>
5.1 Betrokken partijen/vooroverleg	6
5.2 Rechtsbescherming	6
5.3 Financieel nadeel	6
<b>6. Bijlagen</b>	<b>7</b>

## 1. Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) is belast met de zorg voor het watersysteem in zijn beheergebied. Deze zorg omvat het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, het beheer van de waterkeringen, het kwantiteitsbeheer van het grondwater en de zuivering van stedelijk afvalwater.

De Waterwet en de op grond daarvan vastgestelde Waterverordening schrijven voor dat Delfland met betrekking tot het beheer van het watersysteem een beheerplan opstelt, dat is afgestemd op het Nationale Waterplan en het Provinciale Waterplan Zuid-Holland.

Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2010-2015, het strategisch werkplan van Delfland, de doelen en maatregelen voor de periode met ingang van 22 december 2009 vastgelegd. Hieronder valt een aantal maatregelen uit het programma Voldoende water.

### Programma Voldoende water

Het programma Voldoende Water gaat over een goede waterhuishouding voor zowel grond- als oppervlaktewater. Door het watersysteem goed in te richten, te beheren en te onderhouden, verkleint Delfland de kans op wateroverlast en zorgt Delfland voor een goede aanvoer van water als daar behoefte aan is. Klimaatverandering en verstedelijking plaatsen Delfland voor nieuwe uitdagingen bij het waterkwantiteitsbeheer. Delfland hanteert onder andere de volgende doelstellingen:

- Het uitvoeren van regulier beheer om het bestaande watersysteem op orde te houden.
- Het watersysteem moet voldoen aan de normen uit de provinciale Waterverordening Delfland.

Om de doelstellingen van het programma Voldoende water zijn maatregelen geformuleerd. Daartoe moeten waterstaatswerken worden aangelegd en gewijzigd. De Waterwet schrijft voor dat de waterbeheerder (in dit geval Delfland) een projectplan moet vaststellen bij de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de waterbeheerder.

Waterstaatswerken zijn:

- een oppervlaktewaterlichaam (water, waterbodems, oevers, flora en fauna);
- een bergingsgebied;
- een waterkering;
- een ondersteunend kunstwerk, zoals stuwen, gemalen en duikers.

Het projectplan bevat ten minste de beschrijving van de te wijzigen en/of aan te leggen waterstaatswerken, de uitvoeringswijze en de voorzieningen om nadelige invloeden te beperken of te voorkomen. Bij het opstellen van het projectplan is getoetst in hoeverre deze werkzaamheden passen binnen de doelstellingen van de Waterwet.

Dit projectplan behandelt de aanleg van een aflaatstuwconstructie in de Wippolder, nabij perceel Korte Noordweg 34A te Wateringen.

De aanleg heeft als doel het verbeteren en controleren van de waterhuishouding.


### Voorgaande besluitvorming

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd naar aanleiding van het herziene peilbesluit Wippolder d.d.4 juni 2015.

## 2. Beschrijving van het betrokken werk

### 2.1 Locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Wippolder, nabij perceel Korte Noordweg 34 Wateringen, Kadastraal perceel WTR00A 6614G0000 eigendom van derden.

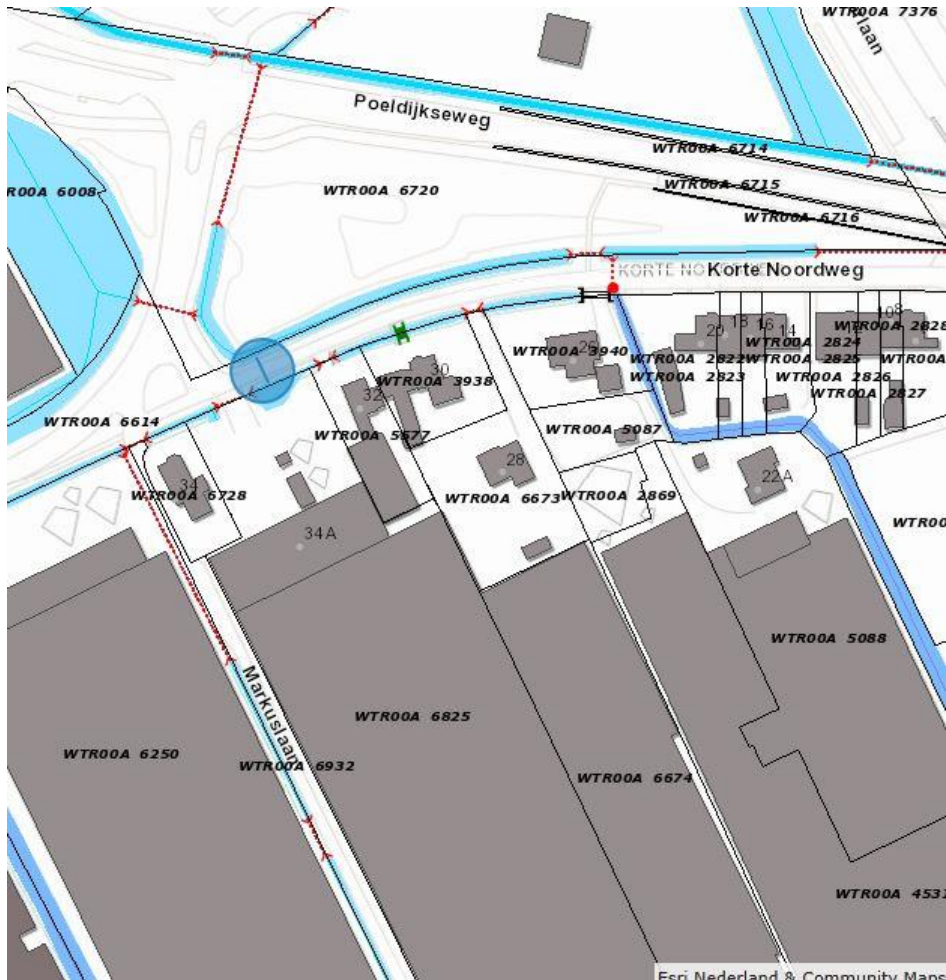

### 2.2 Werkzaamheden

De stuwconstructie wordt aangelegd d.m.v. het plaatsen van een KWT Overstortput en opbouwstuw, type KOP, overstortbreedte 1,00 m met aansluitende PVC duiker Ø 315 mm. De stuw wordt aangelegd voor het verbeteren van de waterafvoer.

### 2.3 Relatie met het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland is van toepassing. De werkzaamheden passen in de bestemming Agrarische Glastuinbouw. Het gebied kent een dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied.

### 2.4 Relatie met de legger, beheer en onderhoud

Deze aflatstuwconstructie is niet opgenomen in de Legger Wateren. Door het aanleggen van het waterstaatswerk moet de Legger worden gewijzigd.

De aflatstuwconstructie blijft in beheer en onderhoud bij Het Hoogheemraadschap van Delfland.

De aflatstuwconstructie hoeft op dit moment op grond van de waterverordening Zuid-Holland nog niet in de Legger te worden opgenomen.

## **2.5 Relatie met de beleidregels**

De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing op het project:  
Beleidsnota peilbesluiten.  
Beleidsregels Kunstwerken in Wateren  
Beleidsregel Medegebruik Regionale Waterkeringen  
Beleidsregel Veendijken

Het technisch ontwerp van het aan te leggen waterstaatswerk voldoet aan de beleidsregel

## **2.6 Relatie met vergunningen/meldingen en andere besluiten**

Voor sommige activiteiten die binnen het project vallen, dient naast het projectplan een aparte vergunningen- of meldingprocedure te worden opgestart. Deze vergunningen/meldingen zijn géén onderdeel van het projectplan en volgen een separate procedure.

Op grond van het Besluit Omgevingsrecht is geen omgevingsvergunning nodig voor de bouw van de inlaatconstructie en het in strijd handelen met het bestemmingsplan. Er is wel een omgevingsvergunning nodig voor het aanbrengen van leidingen en het ontgraven dieper van 50 cm en het aanpassen van het waterpeil.

# **3. Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd**

## **3.1 Werkmethode**

- Ter plaatse van de te maken stuwconstructie wordt een tijdelijke afsluiting geplaatst
- Aanbrengen houten damwand in de watergang
- Aanbrengen ROP Overstortput en opbouwstuw
- Verwijderen asfaltverharding met fundatie
- Graven sleuf, aanbrengen leiding, sleuf dichten
- Aanbrengen tijdelijke verharding
- Aanbrengen definitieve asfaltverharding

Als alternatief kan worden gekozen voor de aanleg van het betreffende leidingwerk door middel van een gestuurde boring.

## **3.2 Bouwlogistiek en planning**

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de openbare weg.  
Het werk wordt uitgevoerd met een mobiele kraan.  
De duur van de uit te voeren werkzaamheden wordt geschat op vijf werkbare dagen  
Ter plaatse worden waarschuwborden geplaatst.  
De materialen worden aangevoerd over de openbare weg

# **4. Beschrijving van de te treffen voorzieningen**

## **4.1 Onderzoeken**

In de voorbereiding van het project zijn geen onderzoeken uitgevoerd:  
Voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd dient de aannemer een klik melding te doen om de ligging van kabels en leidingen te bepalen. Gezien de kleinschalige aard van de werkzaamheden zijn geen andere onderzoeken uitgevoerd.

#### **4.2 Beperken nadelige effecten**

In overleg met de wegbeheerder zullen de noodzakelijke verkeersmaatregelen worden genomen.

#### **4.3 Monitoring tijdens uitvoering**

Gedurende de werkzaamheden zullen de werkzaamheden steekproefgewijs worden gecontroleerd op de juiste uitvoering.

### **5. Procedure**

#### **5.1 Betrokken partijen/vooroverleg**

De werkzaamheden worden gerealiseerd op eigendom van Derden. Voor het herzien van het bestemmingsplan zijn informatieavonden georganiseerd. Betrokkenen kunnen, indien deelgenomen aan de genoemde informatieavonden, bekend zijn met de werkzaamheden.

#### **5.2 Rechtsbescherming**

Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het digitale Waterschapsblad, met vermelding van het feit dat belanghebbenden gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift kunnen indienen bij Delfland. In de kennisgeving wordt ook vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage worden gelegd.

#### **5.3 Financieel nadeel**

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Verordening schadevergoeding Delfland.

## **6. Bijlagen**

Geen
