



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11

E info@vallei-veluwe.nl

I www.vallei-veluwe.nl

PROJECTPLAN WATERWET

Datum	25 augustus 2016
Projectnummer	CR16600
Onderwerp	projectplan voor verdrogings- bestrijding Stoutenburg
Documentnummer	851079 / 852994

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe
besluit

het projectplan verdrogingsbestrijding Stoutenburg, zoals bij dit besluit gevoegd,
vast te stellen, bekend te maken en uit te voeren in overeenstemming met het
bepaalde in dit projectplan.

Namens het college,


.....
drs. ing. K.A. Blokland
directeur

Bijlage(n):

Projectplan Verdrogingsbestrijding Stoutenburg met bijlage(n)



waterschap
**vallei en
veluwe**

Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11

E info@vallei-veluwe.nl

I www.vallei-veluwe.nl

Projectplan CR16600 Verdrogingsbestrijding Stoutenburg (definitief besluit)

1 Projectbeschrijving

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

Verbeteren waterhuishouding voor natuur

Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) heeft al geruime tijd verdrogingsbestrijdingsprojecten in voorbereiding, waaronder het verbeteren van het broekbos op landgoed Stoutenburg. Met opdrachtgever provincie Utrecht is daarbij de afspraak gemaakt dat, samen met landgoedeigenaar Utrechts Landschap (UL), maatregelen worden getroffen om de waterhuishouding te verbeteren.

Een luchtfotokaart van het gebied is als bijlage 1 bij dit projectplan gevoegd.

Onderzoeken

Voor deze projecten is veel onderzoek gedaan, zowel door de provincie Utrecht en de grondeigenaar als door het waterschap. Het onderzoek waarop de in dit plan beschreven maatregelen zijn gebaseerd, is het eco-hydrologisch onderzoek door A. van Leerdam (dd. 14 maart 2016). Het advies is als bijlage 2 bij dit projectplan gevoegd. In dit advies wordt beschreven waarom juist de aangegeven watergangen worden aangepast om de doelen te behalen.

De aanbevolen maatregelen

De aanbevolen maatregelen zijn in onderstaand luchtfotokaartje te zien, en betreffen de noordelijke en oostelijke sloot om het gebiedje:

- Baggeren om de nutriëntrijke sliblaag van de waterbodem te verwijderen en daardoor het biotoop geschikt te maken voor gewenste (kwelminnende) plantensoorten;

- De gebaggerde watergangen verondiepen met schoon zand om de watergang minder drainerend te laten werken en zo het kwelwater vast te houden in het gebied;
- Een grond dam aan de zuidkant van de oostelijke sloot om het waardevolle kwelwater aan de noordkant vast te houden en te scheiden van het regenwater in de zuidelijke sloot.

Verder wordt aanbevolen om de binnenliggende sloten te laten verlanden, maar daarvoor zijn geen specifieke uitvoeringsmaatregelen nodig.

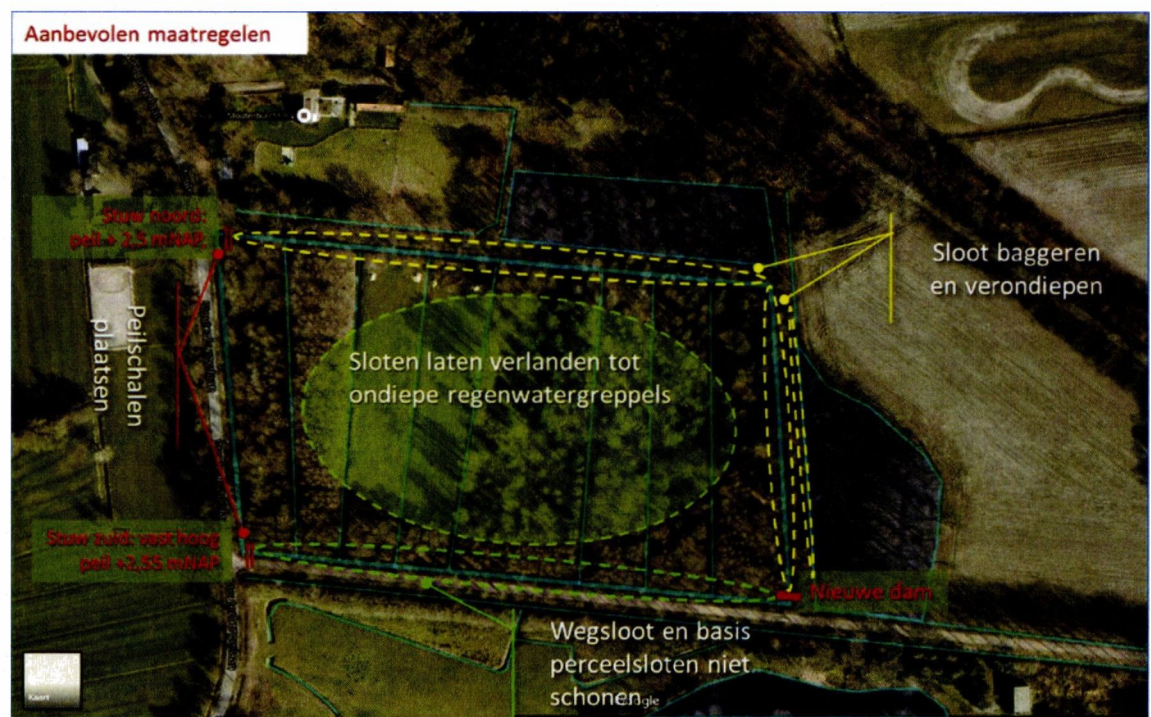


Fig. 1: aanbevolen maatregelen


1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

De te baggeren en te verondiepen watergangen worden bereikt via het pad langs de noordelijke watergang, wat doorloopt langs de oostelijke watergang.

Bij de keuze van het materieel door de aannemer dient rekening gehouden te worden met de lokale omstandigheden: een zachte ondergrond en weinig ruimte. Het gebruik van klein materieel zal de rijschade beperken.

Om de halfverharde toegangsweg naar boerderij de Korte Niep aan de zuidzijde van het plan niet te belasten wordt deze ontzien tijdens de uitvoering van de maatregelen. De rijroute blijft langs de te baggeren en verondiepen sloten met de aansluiting op de Stoutenburgerlaan aan de noordwesthoek. (zie figuur 2)

De waterafvoer van de weg naar de Korte Niep wordt geborgd door het ongemoeid laten van de aan de weg grenzende sloot, waarbij een gronddam de waterstromen scheidt.

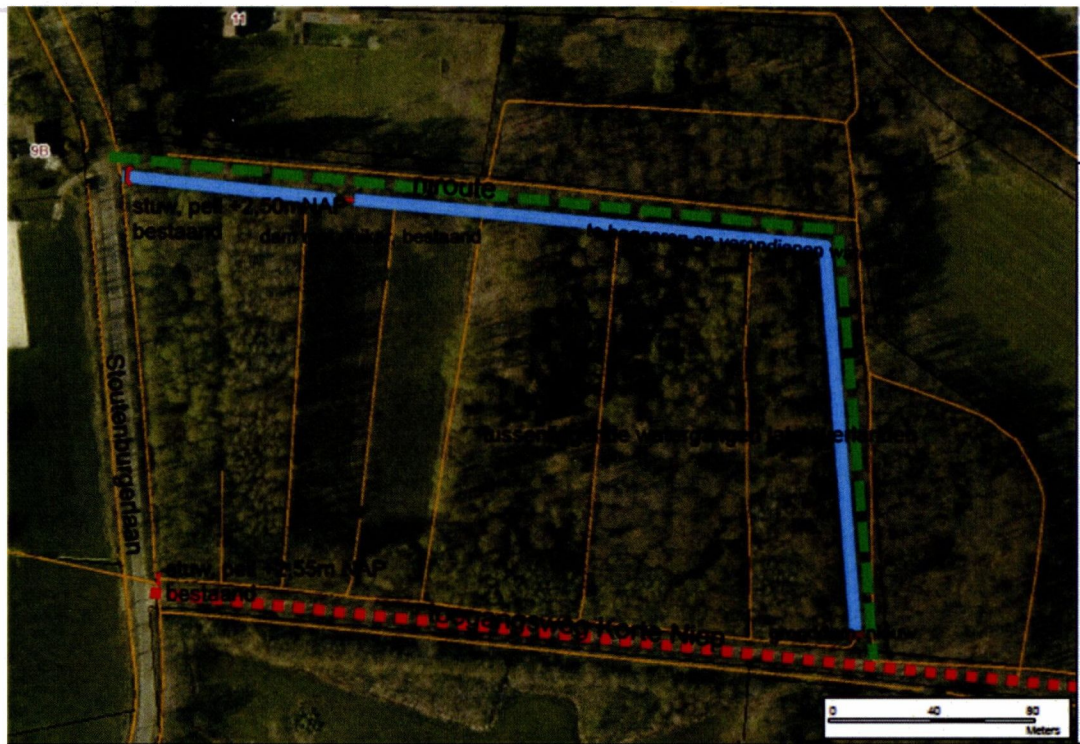

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding.

4

1.4 Beheer en onderhoud

Wijziging beheer en onderhoud

Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud als volgt zal wijzigen: Het gebied en de bijbehorende stuwen worden beheerd door Utrechts Landschap, waarbij het huidige beheer extensief is te noemen. Ook in de toekomst is Utrechts Landschap verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de gebaggerde en verondiepte watergangen om ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden een langetermijndoel dienen, en niet weer dichtslibben ten gevolge van bladval. Het toekomstige onderhoud bestaat daarom uit periodiek en gefaseerd schonen van de watergangen. De bladophoping is hiermee onder controle.

2 Samenwerking

Utrechts Landschap is eigenaar van Landgoed Stoutenburg, en de maatregelen voor het gebied zijn gezamenlijk met WSVV bepaald op basis van het eco-hydrologisch advies. Utrechts Landschap verzorgt de benodigde snoei- en kapwerkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de watergangen.

Het beheer en onderhoud is en blijft bij Utrechts Landschap, waarbij jaarlijks/regelmatig onderhoud in de toekomst en voorwaarde is voor de uitvoering van de gewenste maatregelen.

3 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie: Met verwijzing naar het gestelde in hoofdstuk 1 voldoet de voorgestelde inrichting aan de eisen gesteld in de Waterwet en past in de beleidsdoelen van o.a. Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Utrecht.

4 Uitvoerbaarheid

4.1 Samenhang met ander beleid

Stoutenburg maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, tot voor kort EHS genoemd) en meer specifiek omdat het als (sub)topgebied verdrogingsbestrijding is aangemerkt in het gelijknamige convenant uit 2008. Topgebieden zijn de gebieden binnen Utrecht met de hoogste potenties en opgaven voor natte natuur, en Stoutenburg hoort hier bij.

4.2 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd het bestemmingsplan Amersfoort Buitengebied-Oost 23-2-2009 vastgesteld.

De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan is de projectlocatie aangeduid als "landgoed".

4.3 Hydrologisch/waterstaatkundig onderzoek

Een eco-hydrologisch onderzoek is uitgevoerd door A. van Leerdam. (dd. 14 maart 2016). Het advies is als bijlage bij dit projectplan gevoegd, zie bijlage 2.

4.4 Planning

Uit de Gedragscode Flora en Faunawet voor Waterschappen volgt voor baggeren en herprofilieren, schonen, afdammen en vergraven van watergangen een voorkeursperiode tussen 15 juli en 1 november.

Voor snoei- en kapwerkzaamheden geldt de voorkeursperiode van 1 september tot 15 maart.

De uitvoering van de werkzaamheden is daarom gepland tussen 1 september en 1 november 2016.

5 Procedure

5.1 Bezwaar

Belanghebbenden bij dit projectplan kunnen daartegen een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover is te vinden in de bekendmaking. Vervolgens is beroep bij de rechtbank mogelijk.

5.2 Wettelijke basis

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. De directie is bevoegd om namens het college van dijkgraaf en heemraden dit besluit te nemen. Dit mandaat is geregeld in artikel 3 het Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis).

5.3 Verkorte procedure

Voor dit projectplan is de zogeheten verkorte procedure gevolgd. De verkorte procedure wordt gevolgd gezien de zeer geringe omvang van de maatregelen en het feit dat de maatregelen volledig worden uitgevoerd op gronden in eigendom van het Utrechts Landschap.

5.4 Medewerking eigenaren

De uitvoering van de maatregelen uit dit projectplan gebeurt zo veel mogelijk in goed overleg met de betrokken perceeleigenaar en kan waar nodig worden vastgelegd in een overeenkomst. Mocht het niet lukken om overeenstemming te bereiken, dan kan het waterschap besluiten om de benodigde gronden te onteigenen of om aan rechthebbenden een gedoogplicht op te leggen (conform de Waterwet). Het streven blijft echter om de uitvoering in goed overleg te laten plaatsvinden.

6 Contactpersoon uitvoering

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met ing. M.M. van de Vliert-Scholte (projectleider), telefoonnummer 06-29586394.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met J. Doude van Troostwijk (juridisch adviseur), telefoonnummer 06-11733137.

7 Bijlage(n)

1. kaart met maatregelen
2. Eco-hydrologisch onderzoek, A. van Leerdam dd. 14 maart 2016
