



Asbestinventarisatierapport

Onderzochte locatie: schuur
Adres: Rijksweg 97
Postcode/plaats: 6998 AG Laag Keppel
Datum rapportage: 21 maart 2017
Rapportagenummer: 17.03072

Qcount Aalten B.V.

Haartsestraat 24

7121 CX Aalten

Tel: 0543-767 277

Ascert-code: 07-D070115.01

Certificaatnummer: 07-D070115

arnhem@qcount.nl

www.qcount.nl

Opdrachtgever:

Asbest Achterhoek

t.a.v. dhr. J. Polman

Meniststraat 27

7091 ZZ Dinxperlo

Datum inventarisatie: 9 maart 2017

Datum interne autorisatie: 21 maart 2017

Geldig tot: 21 maart 2020

Dia: A.M. Hengeveld


SCA code: 04E-150216-140338

Rapporteur: M. Cornelissen

Technisch verantwoordelijke: G.H. Prinsen

SCA code: 51E-270315-410784

Status: Versie 1



Soort onderzoek

Asbestinventarisatie o.b.v. het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat

Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in de Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIIIa d.d. 30-11-2016 (Stb. 64906)

Rapportage geschikt voor*:

- ☒ Uitsluitend de verwijdering van de in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen.
- ☐ Renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten.
- ☐ Volledige renovatie of totaal sloop.
- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk

* De geschiktheid van deze rapportage wordt nader gespecificeerd in de samenvatting in dit rapport.

Omvang onderzoek*:

- ☐ Gehele gebouw of object
- ☐ Gedeelte van gebouw of object
- ☒ Het bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object

* De omvang van het onderzoek wordt nader gespecificeerd in de samenvatting in dit rapport.

Risicobeoordeling*:

- ☒ Risicobeoordeling conform NEN2991 voor het gekozen onderzoeks(deel)gebied wordt niet geadviseerd.
- ☐ Risicobeoordeling conform NEN2991 voor het gekozen onderzoeks(deel)gebied wordt wel geadviseerd.

* Dit advies wordt nader gespecificeerd in de samenvatting in dit rapport.

1 Samenvatting

In opdracht van dhr. J. Polman van Asbest Achterhoek heeft Qcount Aalten B.V. een asbestinventarisatie uitgevoerd van de schuur, gelegen bij de woning aan de Rijksweg 97 te Laag Keppel. Conform de eisen zoals is vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, versie 2016.

1.1 Specificatie omvang onderzoeksgebied

Bij de op het titelblad aangegeven onderzoeksomvang geldt de volgende specificatie:

- ☒ Het onderzoeksgebied betreft het gehele bouwwerk/object, zonder beperkingen
- ☐ betreft uitsluitend de binnenzijde van het aangegeven bouwwerk
- ☐ onderzoeksgebied wordt in de plattegrond(en) in bijlage 9.1 duidelijk gemarkeerd.
- ☐ de volgende ruimten zijn niet onderzocht:De reden hiervoor is.....
Dat betekent dat deze ruimte alsnog dient te worden onderzocht, voorafgaand aan.....
- ☒ In bijlage 9.1 is in de plattegrond van de projectlocatie duidelijk aangegeven welk (deel/delen van het) bouwwerk is/zijn onderzocht en indien van toepassing, duidelijk aangegeven wat door de inventariseerder wordt beschouwd als toekomstige saneringszone(s), c.q. onderzoeksgebied(en).
- ☐ Het onderzoeksgebied betreft een gedeelte van het bouwwerk: waarbij in de tabel 1.2 is aangegeven wat er wel en niet is onderzocht en in tabel 1.3 de uitgesloten constructies met vermoedens van asbesthoudend materiaal.

Toelichting: Het onderzoeksgebied omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van een eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitsluis en de decontaminatie-unit.

1.2 Onderzochte ruimten/bouwdelen

ruimte	indeling	Onderzocht Ja	Onderzocht nee
Schuur			
begane grond		X	
zolder		X	

1.3 Vermoeden van niet direct waargenomen asbesthoudende materialen

Tijdens het onderzoek zijn in de onderstaande tabel weergegeven de vermoede, maar in het licht van de verstrekte onderzoeksopdracht niet (direct) waargenomen asbesthoudende materialen:

constructie	locatie	Toepassing
n.v.t.		

Aanvullend onderzoek naar de in bovenstaande tabel genoemde onderdelen is noodzakelijk voorafgaand aan sloop of renovatie van desbetreffende onderdeel of waarbij de constructieve integriteit wordt aangetast.

In totaal zijn er in dit onderzoek 1 materiaalmonster door een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd conform NEN 5896 op de aanwezigheid, type en concentratie asbest. Uit het laboratorium onderzoek blijkt dat 1 materiaalmonster asbest bevat.

De volgende asbesthoudende materialen/toepassingen zijn tijdens het onderzoek aangetroffen.

Overzicht asbesthoudende bronnen

Bron	Locatie	Materiaal	Saneringstype	Risico klasse
M1	dak schuur	golfplaten	openlucht	2

Overzicht aangetroffen asbesthoudende installaties

Bron	Merk/type	Materiaal	Locatie	Aantal	Saneringstype	Risico klasse
n.v.t.						

Bron: Kenteq Kleintje Asbest/www.iad-online.nl/deskundigheid en/of ervaring inventariseerder

Kleefmonster	NEN norm	Locatie	Bevat	Certificaatnummer
n.v.t.				

1.4 Specificatie geschiktheid rapportage

Dit onderzoek is uitgevoerd indachtig het beoogde doel van de inventarisatie. Bij de op het titelblad aangegeven geschiktheid geldt de volgende specificatie:

- ☒ geen nadere specificatie dan reeds op het titelblad aangegeven noodzakelijk
- ☐ geschikt voor sloop van uitsluitend de bovenbouw van het bouwwerk

Toelichting: Indien het doel wijzigt dient de geschiktheid van deze rapportage opnieuw beoordeeld te worden.

1.5 Specificatie asbestverontreinigingen

Indien door de DIA op plaatsen binnen het onderzoeksgebied (mogelijke) verontreinigingen worden aangetroffen, zal hij in overleg met de opdrachtgever direct passende maatregelen treffen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin de DIA in zijn rapport adviseert om de aangetroffen (mogelijke) verontreinigingen nader te onderzoeken en in te kaderen. Dit kan mogelijk leiden tot het advies om een risicobeoordeling conform NEN 2991 uit te (doen) voeren.

Ruimte	n.v.t.
Waarneming	
Resultaat	
Conclusie	

1.6 Niet verdachte materialen

Overzicht niet verdachte materialen

Materiaal	Locatie	Fotonummer
n.v.t.		

Overzicht niet asbesthoudende installaties

Merk/type	Locatie	Fotonummer
n.v.t.		

Bron: Kenteq Kleintje Asbest/www.iad-online.nl/deskundigheid en/of ervaring inventariseerder

1.7 Vervolg onderzoeken

In de samenvatting van dit rapport is reeds aangegeven welke eventuele vervolgonderzoeken dienen te worden uitgevoerd om een naar de mening van Qcount Aalten B.V. zo volledig mogelijk beeld van alle asbestvoorkomens te verkrijgen. Hieronder volgen de aanbevolen vervolgonderzoeken.

Aanbevolen vervolgonderzoeken

Soort onderzoek	Aanbevolen
NEN 2991 onderzoek	nee
Bodemonderzoek NEN 5707	nee
Aanvullend onderzoek	nee

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	3
1.1	<i>Specificatie omvang onderzoeksgebied</i>	3
1.2	<i>Onderzochte ruimten/bouwdelen</i>	3
1.3	<i>Vermoeden van niet direct waargenomen asbesthoudende materialen</i>	3
1.4	<i>Specificatie geschiktheid rapportage</i>	4
1.5	<i>Specificatie asbestverontreinigingen</i>	5
1.6	<i>Niet verdachte materialen</i>	5
1.7	<i>Vervolg onderzoeken</i>	5
2	Omschrijving opdracht	7
3	Risicoklassen bij verwijdering asbest	8
4	Resultaten	9
5	Overzicht van asbesthoudende materialen	10
6	Overzicht van niet asbesthoudende materialen	10
7	Algemene Beperking	11
8	Methoden	12
9	Bijlage	13
9.1	<i>Plattegrond</i>	13
9.2	<i>Analyseresultaat</i>	15
9.3	<i>SMA-rt</i>	16
9.4	<i>Fotoblad</i>	17
9.5	<i>SCA Procescertificaat</i>	18

2 Omschrijving opdracht

In opdracht van dhr. J. Polman van Asbest Achterhoek heeft Qcount Aalten B.V. op 9 maart 2017 een asbestinventarisatie uitgevoerd betreffende de schuur gelegen bij de woning aan de Rijksweg 97 te Laag Keppel (postcode 6998 AG).

Deskresearch

Voorafgaand aan het veldwerkonderzoek is er een deskresearch uitgevoerd. Het deskresearch heeft de volgende gegevens opgeleverd:

Vooraf beschikbaar gestelde informatie

Informatiebron	Ontvangen informatie	Bron
gebouwtype	schuur	DIA
bouwjaar	onbekend	www.bagviewer.kadaster.nl
verbouwingen	nee	Dhr. J. Polman
tekeningen ontvangen	geen tekeningen beschikbaar	Dhr. J. Polman
eerdere asbestinventarisaties	nee	Dhr. J. Polman
gebouw in gebruik	momenteel niet	Dhr. J. Polman

Resultaten interview met opdrachtgever

Geïnterviewde	Informatie
Dhr. J. Polman	Inventarisatie betreft een schuur in verband met de voorgenomen dakrenovatie. Mogelijk asbesthoudende golfplaten dakbedekking. Deskresearch ingevuld retour ontvangen.

Aanleiding

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is de voorgenomen dakrenovatie van de schuur. Voor aanvang van werkzaamheden dient een bouwwerk/bouwkundige eenheid van voor 1994 geïnventariseerd te worden of op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Asbesthoudende materialen dienen (voor aanvang van renovatie of sloop) conform het vigerende wettelijke certificatieschema voor asbest verwijderen te worden verwijderd en afgevoerd.

Overzicht status rapportage

Status	Datum	Aanleiding
1	21-03-2017	Asbestinventarisatie

3 Risicoklassen bij verwijdering asbest

De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit (lit. 2 en 4). Er zijn drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn volgens het volgende globale model ingedeeld:

Risicoklasse	Beschrijving van de belangrijkste kenmerken	vrijgave conform NEN2990
1	Blootstellingsniveau Chrysotiel vezels ≤ 2000 vezels/m ³ Amfibole vezels ≤ 2.000 vezels/m ³ Chrysotiel + Amfibole vezels ≤ 2000 vezels/m ³ Lichtregime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”	Visuele inspectie
2	Blootstellingsniveau Chrysotiel vezels ≥ 2000 vezels/m ³ Chrysotiel + Amfibole vezels ≥ 2000 vezels/m ³ (waarvan Amfibole vezels < 2000 vezels/m ³)	Visuele inspectie en luchtmeting (2 uurs meting)
2A	Blootstellingsniveau Amfibole vezels ≥ 2000 vezels/m ³ Chrysotiel + Amfibole vezels ≥ 2000 vezels/m ³ (waarvan Amfibole vezels > 2000 vezels/m ³)	Visuele inspectie, kleefmonsternamen (SEM) en luchtmeting (4 uurs meeting SEM)

Op basis van het vigerende wettelijk certificatieschema voor asbest verwijderen gecertificeerd bedrijf wil afwijken van de voorgeschreven verwijderingsmethode, daarvoor specifieke voorwaarden gelden, waarbij het inventarisatiebureau mogelijk betrokken dient te worden.

4 Resultaten



Bron	M1
Certificaatnummer	STL.56929
Analyse resultaat	10-15% chrysotiel
Hechtgebonden	ja
Materiaal	golfplaten
Locatie	dak schuur
Hoeveelheid	± 63 m²
Bevestiging	geschroefd
Verwerking	licht
Beschadiging	licht
Risico klasse	2
Saneringstype	openlucht
Conclusie	hechtgebonden asbesthoudende golfplaten kans op vezelemissie gering
Aanbeveling	sanering door SC 530 bedrijf op termijn aan te bevelen
Opmerking	n.v.t.

5 Overzicht van asbesthoudende materialen

Bron	Locatie	Materiaal	Hechtgebonden ja/nee percentage en soort asbest	Hoeveelheid	Bevestiging	Risico klasse	Sanering type
M1	dak schuur	golfplaten	ja, 10-15% chrysotiel	± 63 m ²	geschroefd	2	openlucht

6 Overzicht van niet asbesthoudende materialen

Bron	Locatie	Materiaal	Hoeveelheid
n.v.t.			

7 Algemene Beperking

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de gegeven opdracht, door Qcount Aalten B.V. een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Qcount Aalten BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt Qcount Aalten B.V. hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Wel dient dit direct door een erkend SC-530 asbestverwijderingsbedrijf gemeld te worden aan het inventarisatiebedrijf.

In verband met toepassing van het asbest is het niet altijd mogelijk exacte oppervlaktes of strekkende meters op te meten. De afmetingen zijn dan ook circa en afgeronde maten. Alle aangetroffen asbesthoudende en asbestvrije materialen die bemonsterd zijn worden op een tekening vastgelegd (zie punt 9.1 Plattegrond).


Binnen deze opdracht is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de bodem. Ter bepaling hiervan kan een NEN 5707 onderzoek worden uitgevoerd.


8 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een project specifiek werkplan opgesteld. Een gecertificeerd medewerker van Qcount Aalten B.V. welke minimaal in het bezit is van het certificaat zal het gebouw inventariseren op asbestverdachte materialen op de locatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap (zonder of alleen met licht destructief onderzoek). Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamenpunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemisatie wordt voorkomen. Na de monsternamen wordt de locatie van monsternamen gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code M, kleefmonsters van de code K en luchtmonsters van de code LM. Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur, en elektriciteit gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal verwarmingsinstallaties en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie op de verwarmingsapparatuur of in diverse literatuur ontbreekt kan deze apparatuur op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt. Indien tijdens de inventarisatie een ernstige besmetting met asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie kan een advies tot een NEN 2991 onderzoek (risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt) worden gegeven. Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste certificaat testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005. De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophylit en actinoliet). Het laboratorium bepaalt tevens de hechtgebondenheid van het materiaal. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de aard en de staat waarin het bemonsterde materiaal verkeert. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemisatie onder normale toepassings en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).

9 Bijlage

9.1 Plattegrond

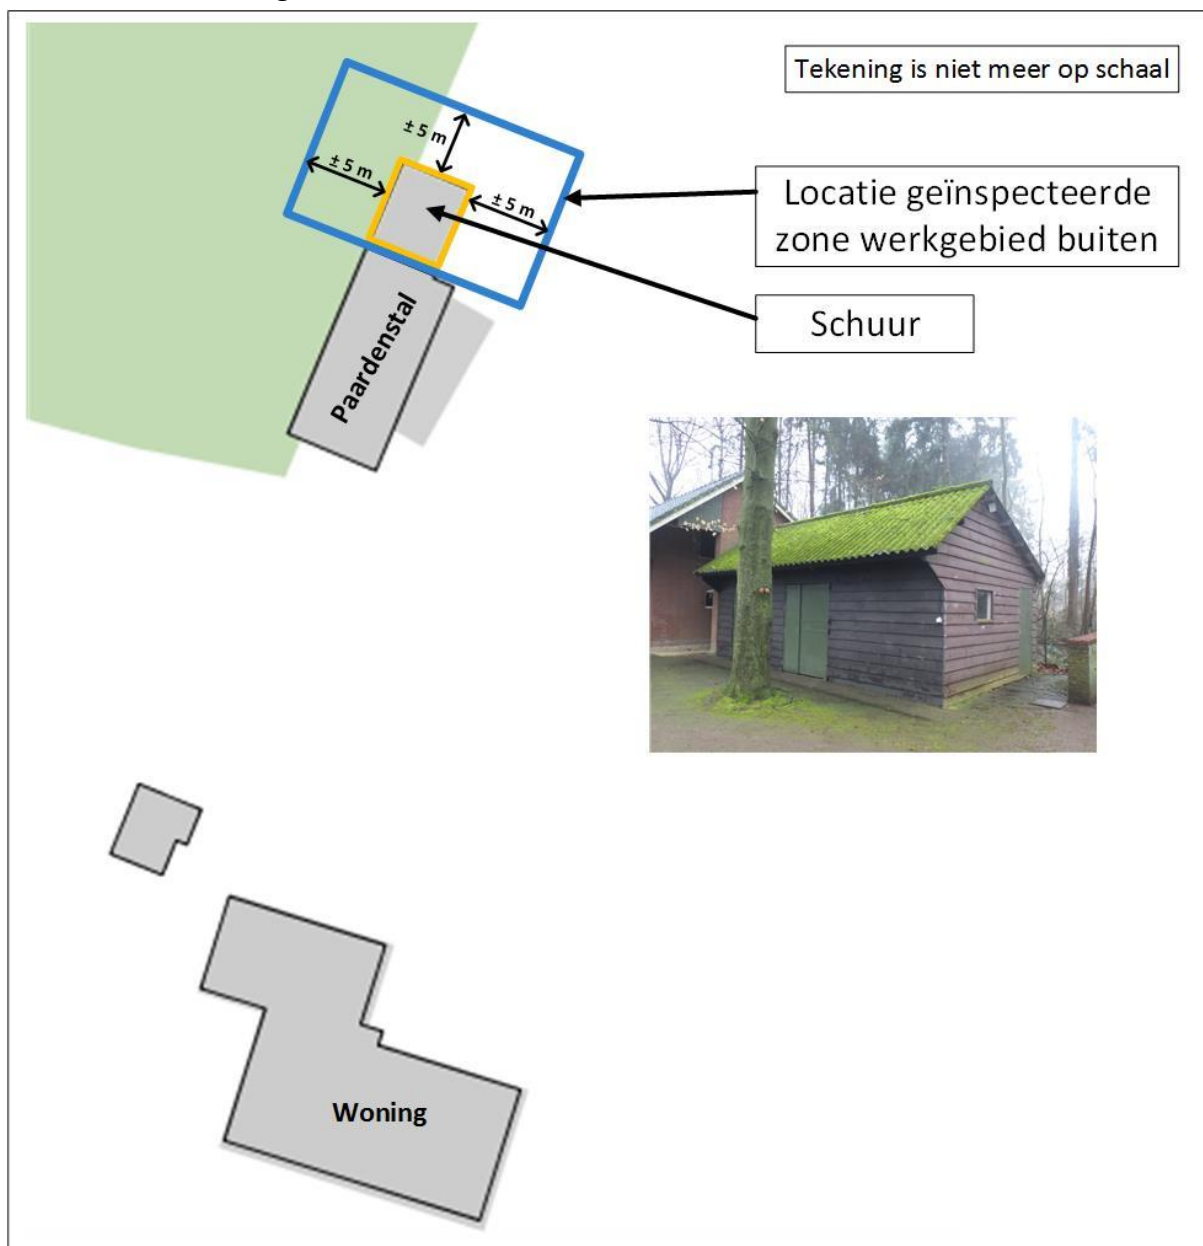

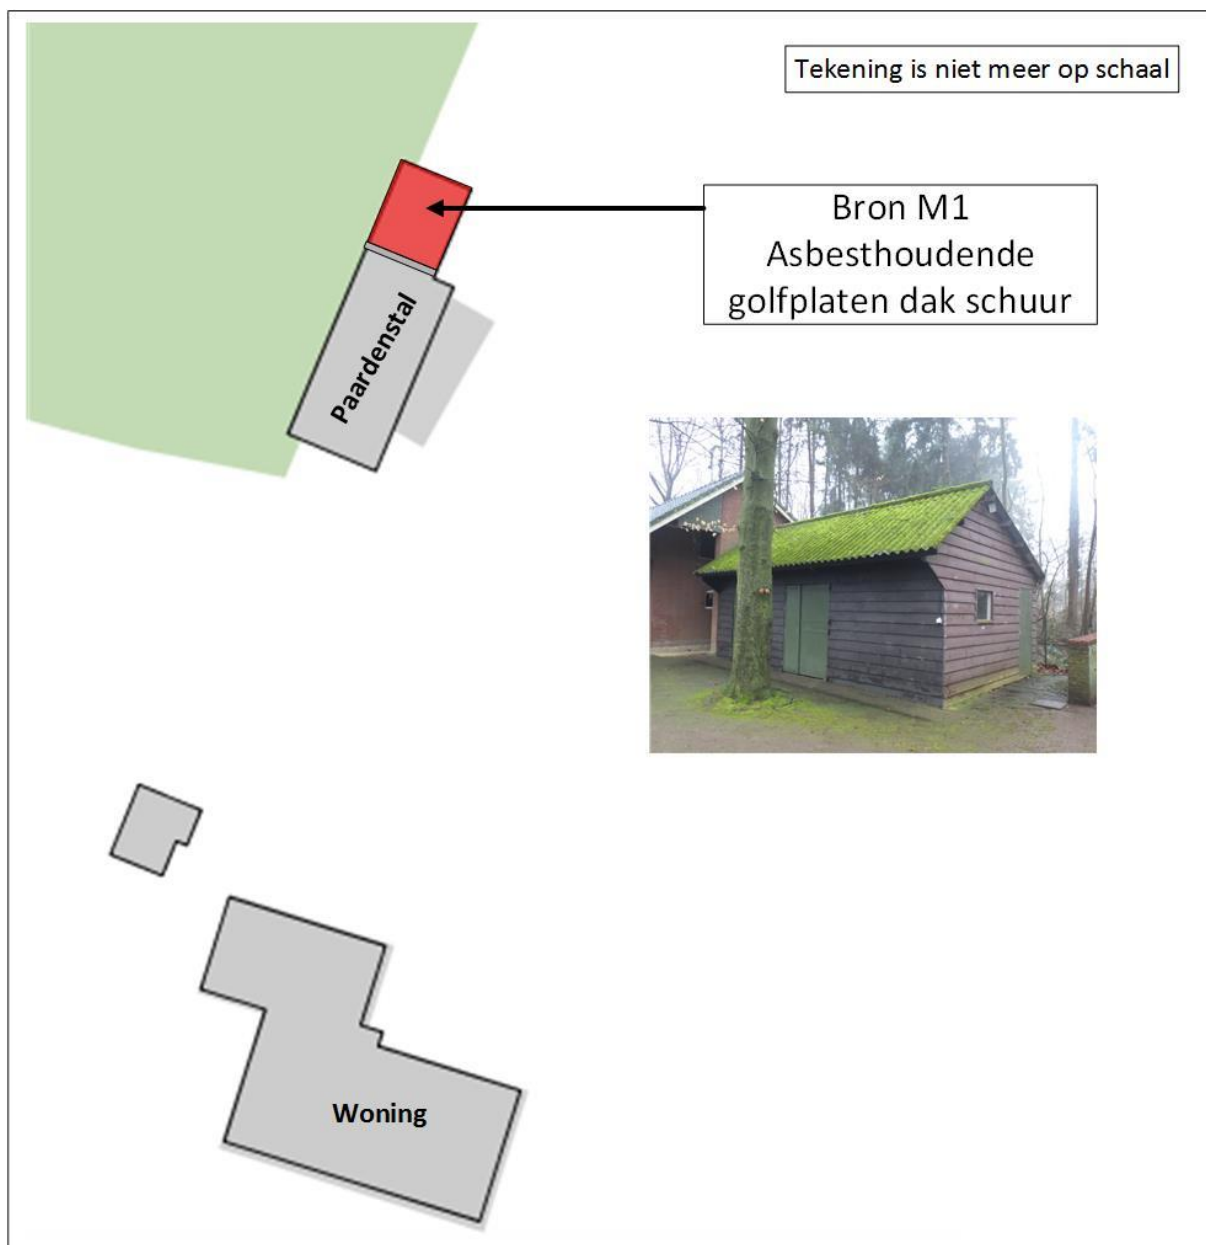

9.2 Analyseresultaat

Analyserapport

Stella projectnummer: STL56929



Opdrachtgever: Q count, Haartsestraat 24, 7121 CX Aalten
Ref. Opdrachtgever: 17.03072
Locatie monsterneming: Rijksweg 97, 6998 AG Laag Keppel
Monsterneming door: Erwin Hengeveld

Datum aanmelding: 09-03-17
Datum analyse: 10-03-17
Datum rapportage: 10-03-17 Versie 1
Aantal monsters: 1

Analyse conform NEN 5896

Aantal monsters: 1

RESULTATEN		Analyse mbv optische microscopie conform NEN 5896			
Monster nummer - omschrijving	Type	Asbest	Massa %	Binding*	Stella ID
M1 - Golfplaten	cement	chrysotiel	10-15	H	204882

*Toelichting: H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aangetoond

autorisatie:

Directie, dhr. J. van den Berg

Disclaimer:

De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591).

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Bij materiaaltype en binding zijn de waarneming van Stella Analyse BV weergegeven. Deze kunnen afwijken van de waarneming die in het veld zijn gedaan. Organisch gebonden materialen, zoals vinyltegels, lijmen en kittens, kunnen fijn verdeelde lage concentraties asbestvezels bevatten waardoor ze met de standaard PLM-methode niet gedetecteerd kunnen worden, met een vals negatief resultaat als gevolg. Hierbij wordt aanvullende analyse met SEM aanbevolen. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig.

Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@stellalab.nl ovv het projectnummer.

088 788 1788
Leidsestraatweg 235B
3443 BT Woerden
info@stellalab.nl
www.stellalab.nl

Stella Analyse BV
KvK 57825890
Raad voor Accreditatie L591
BTW NL852752957B01
IBAN NL72 ABNA 0501 3047 70



1 / 1

9.3 SMA-rt

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 21 maart 2017 om 13h22 (807741)

Qcount Aalten B.V.

SCA-code: 07-D070115.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbreeklijk onderdeel uit van het asbestinventarisatie rapport [07-D070115.01-17.03072]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bron situatie.



Identificatie

Adres	Rijksweg 97, Laag Keppel
Projectcode	17.03072
Projectnaam	Rijksweg 97 Laag Keppel
Broncode	M1
Bronnaam	Golflaten dak schuur

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	63 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	STL.56929

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)
-----------	------------------------------------

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.2 14022017 (ingangsdatum 14-02-2017)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(807741)


9.4 Fotoblad



schuur / Foto 1



achterzijde schuur met grensafscheiding / Foto 2

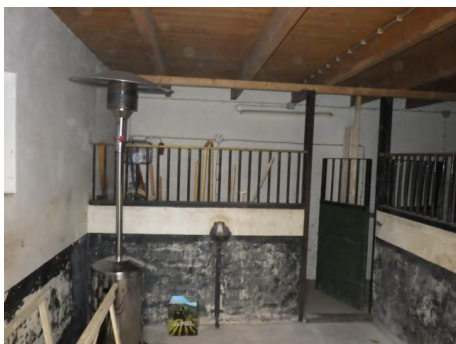

binnenzijde schuur / Foto 3



binnenzijde dakconstructie schuur / Foto 4

9.5 SCA Procescertificaat

SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070115

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025



Certificaathouder:

Qcount Aalten B.V.

Adres: Haartsestraat 24
7121 CX AALTEN
Telefoonnr: 0543-767277
Faxnummer: -
Contactpersoon: Dhr. G.H. Prinsen

Datum uitgifte: 26-01-2017
Vervaldatum: 30-07-2018
Datum eerste uitgifte: 30-07-2012
KvK-nummer: 63532794
e-mail: info@qcount.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540, conform Eerland Certification B.V. Certificatiereglement afgegeven door Eerland Certification B.V.

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:

- Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
- Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

Eerland Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de eisen van het certificatieschema geschiedt.

Voor Eerland Certification B.V.

mr. M.M.A. Prinsen



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl

Certificerende instelling:	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070115
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070115.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

Nadruk verboden

Blad 1 van 2

SC-540 Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070115

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
telnr. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025



CERTIFICAAT

Wenken voor de gebruiker

1. Bij de uitvoering van toezicht door CI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.
2. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats.
3. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats.
4. De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het asbestinventarisatiebedrijf.
5. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 par. 7.14.2).
6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par. 7.14.3);
7. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals omschreven in certificatieschema SC-540 par. 4.7).
8. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te volgen. (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).

mr. M.M.A. Princen



Stichting
Certificatie
Asbest

Ascertain



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascertain.nl

Certificerende instelling:	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070115
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070115.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

Nadruk verboden

Blad 2 van 2
