


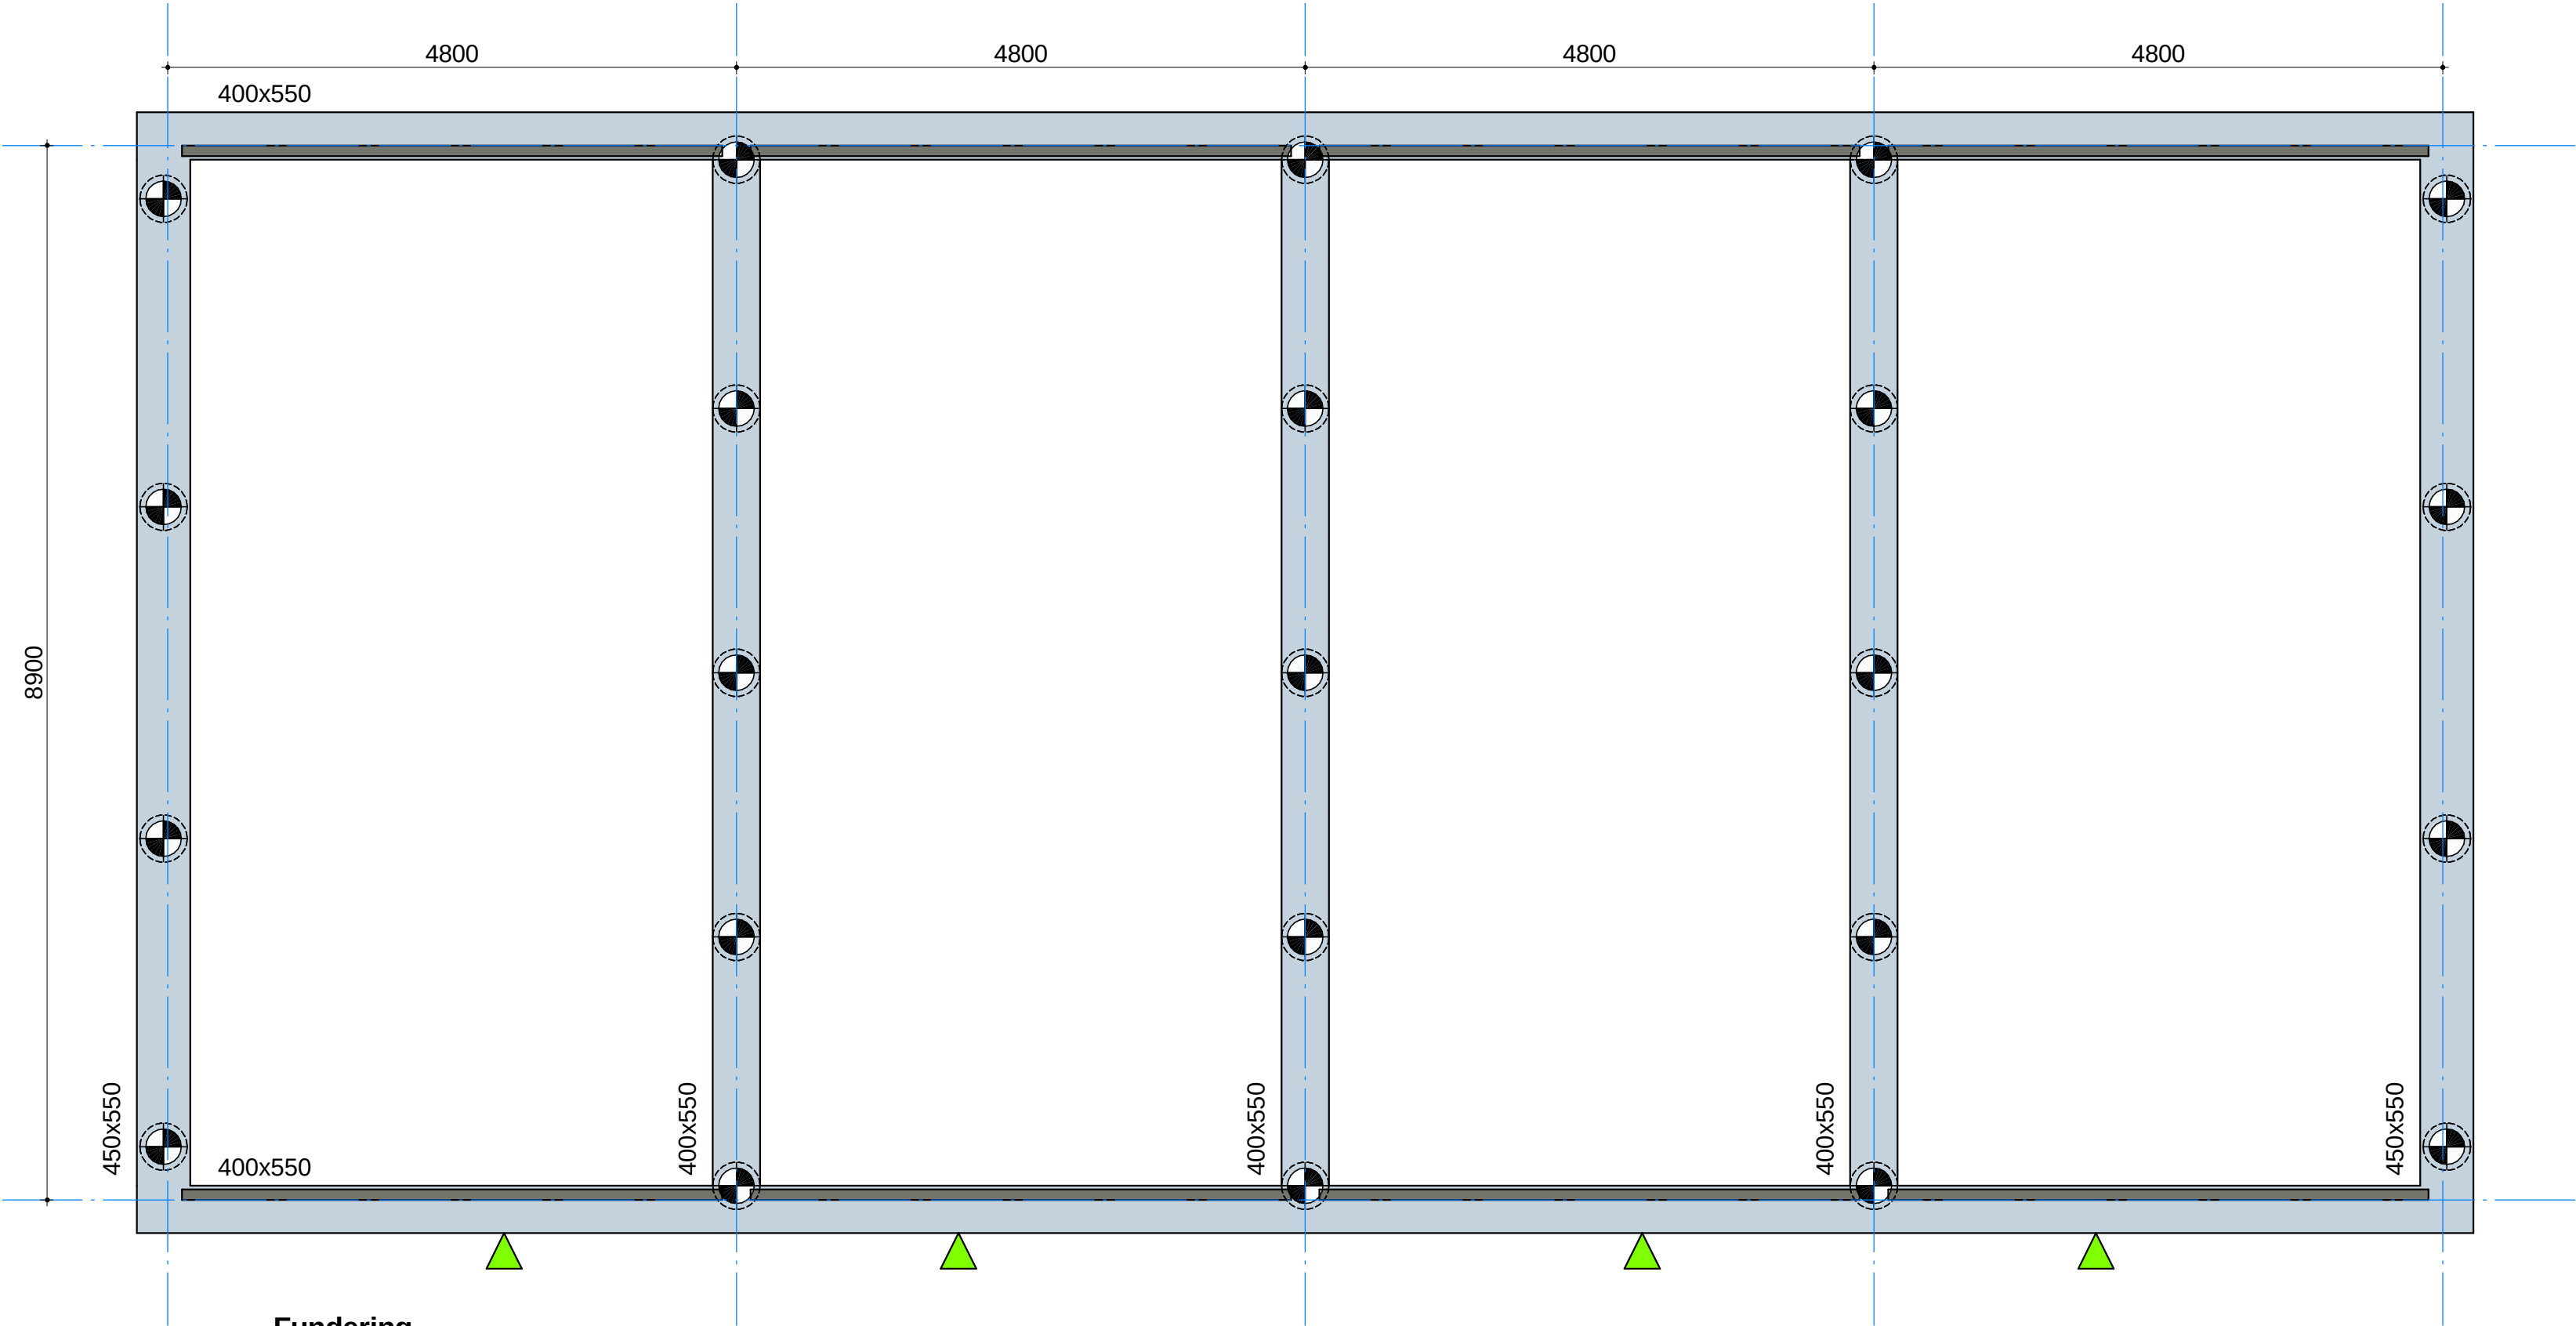


Fundering


Palenstaat blok 1							
Paalmerk	Afmeting	bk paal tov Peil	ok paal tov Peil	bk paal tov NAP	ok paal tov NAP	Lengte	Aantal
	Ø400	-950	-7000	+2550	-3500	6050	23

Palenstaat blok 3							
Paalmerk	Afmeting	bk paal tov Peil	ok paal tov Peil	bk paal tov NAP	ok paal tov NAP	Lengte	Aantal
	Ø400	-950	-5500	+2550	-2000	4550	23

Palenstaat blok 4							
Paalmerk	Afmeting	bk paal tov Peil	ok paal tov Peil	bk paal tov NAP	ok paal tov NAP	Lengte	Aantal
	Ø400	-950	-5500	+2550	-2000	4550	23

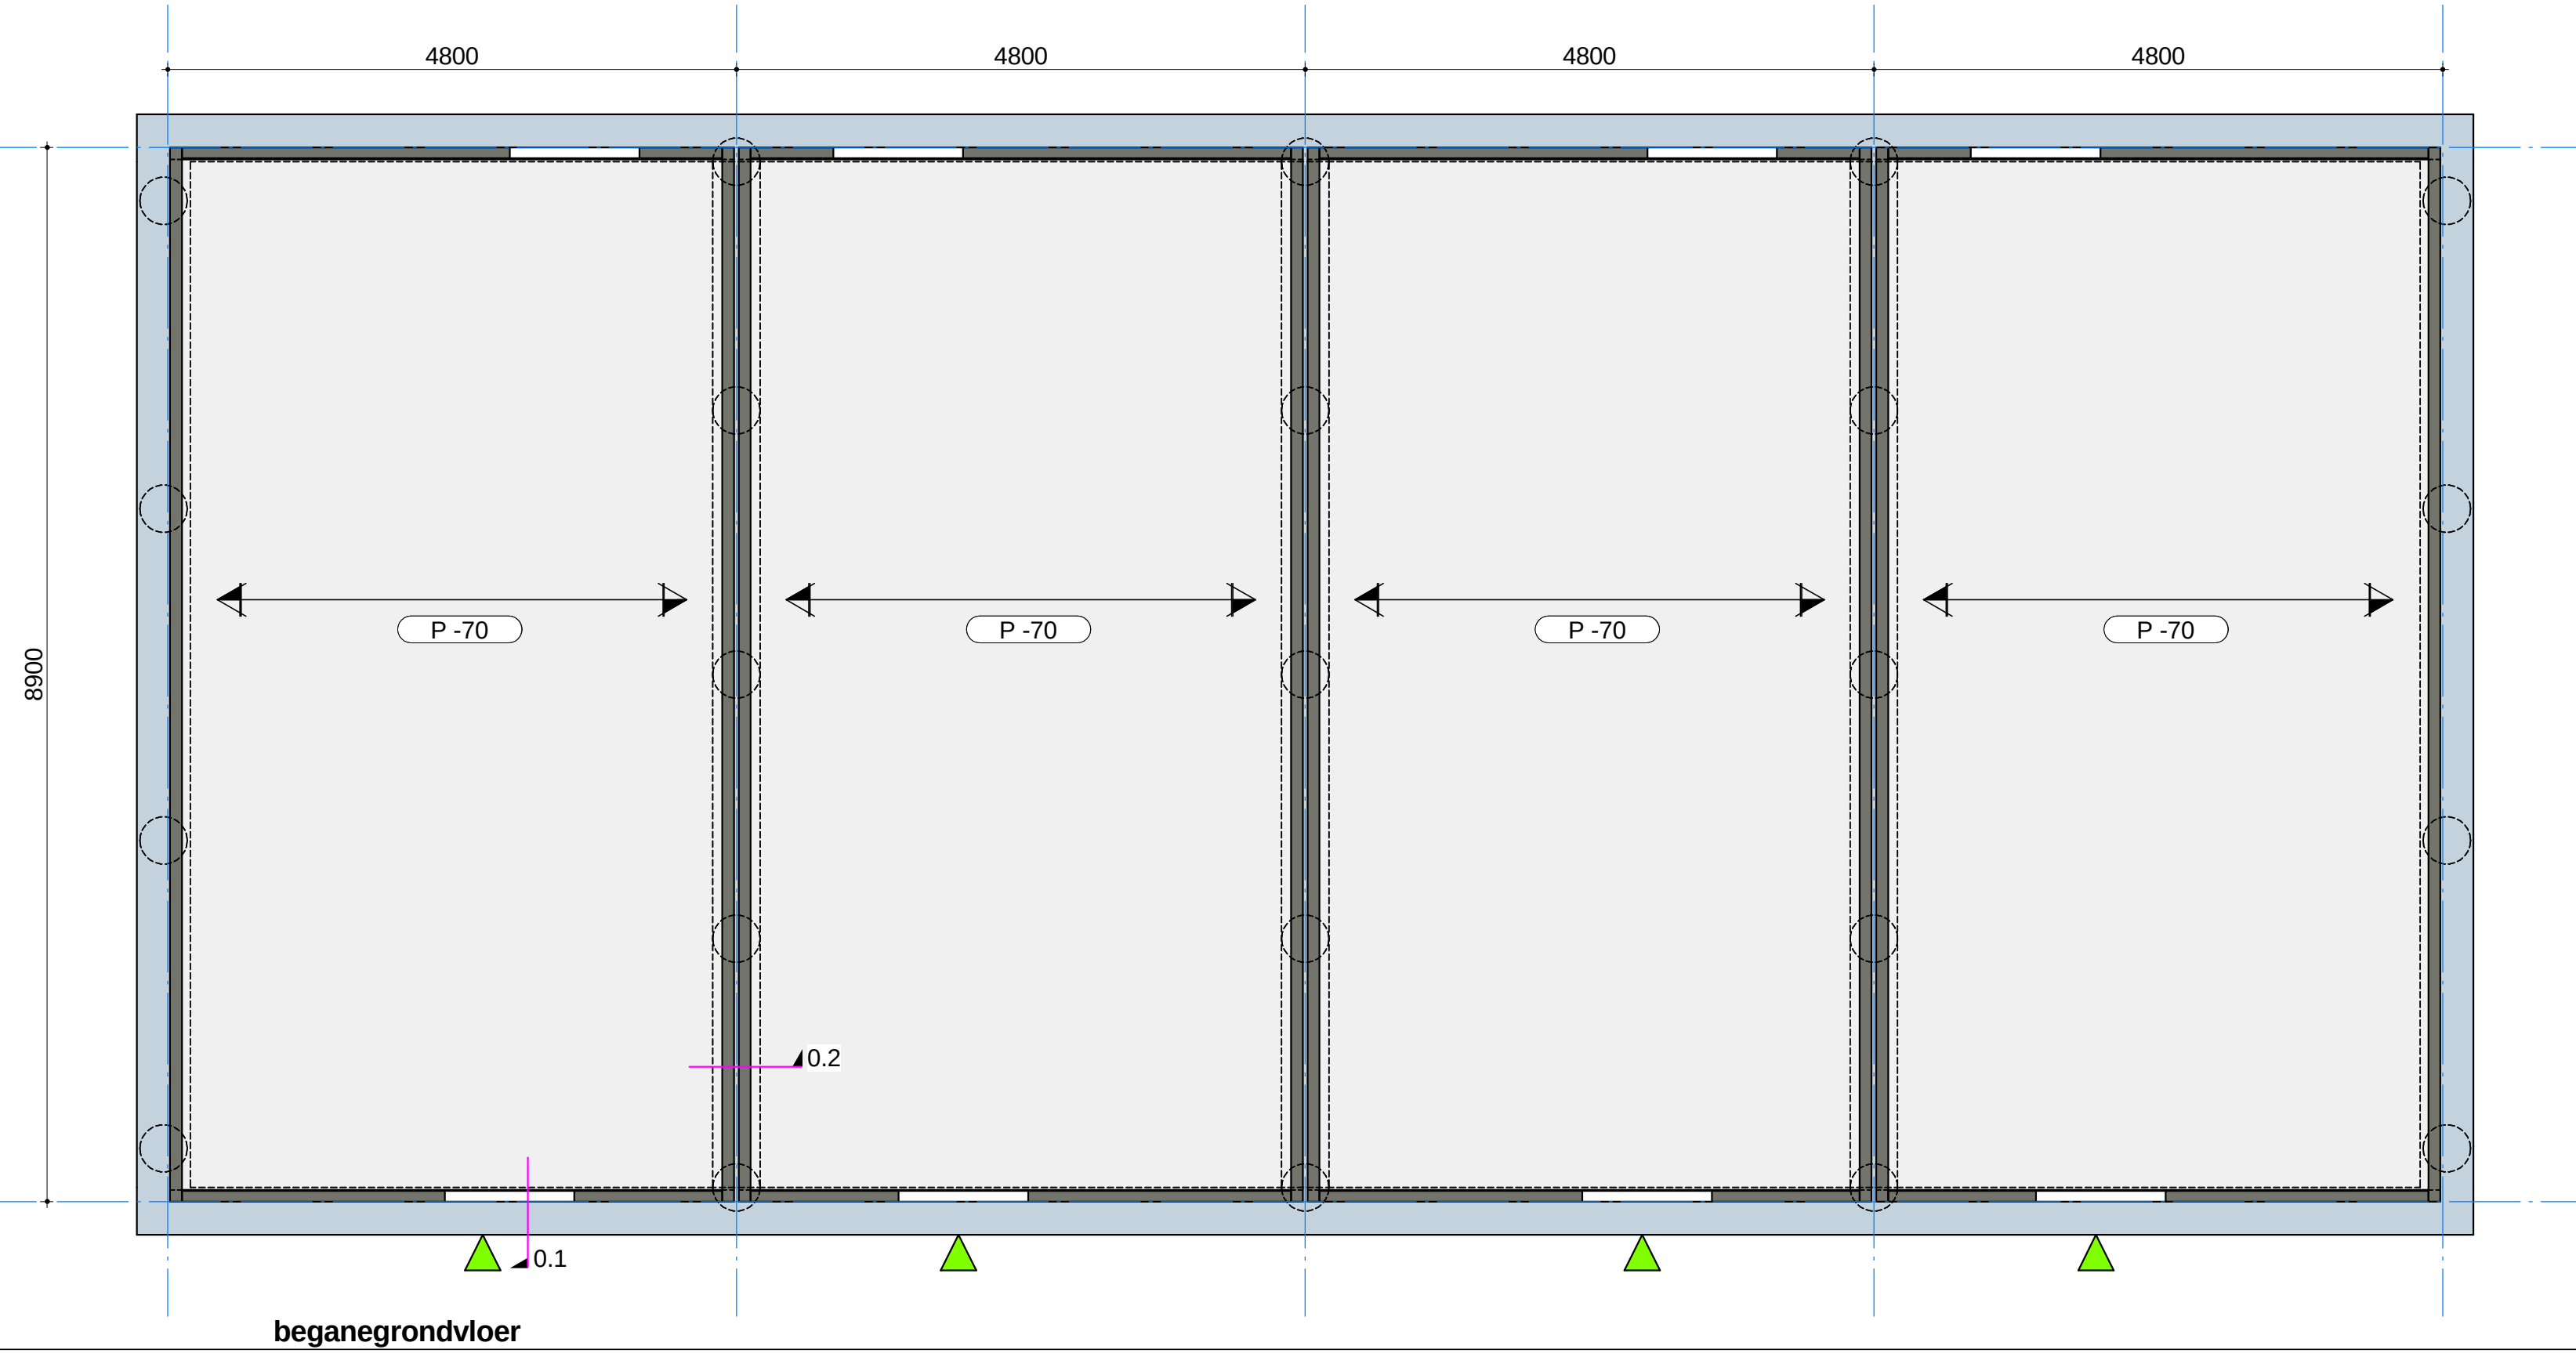

Koppeling mortelschroefpaal

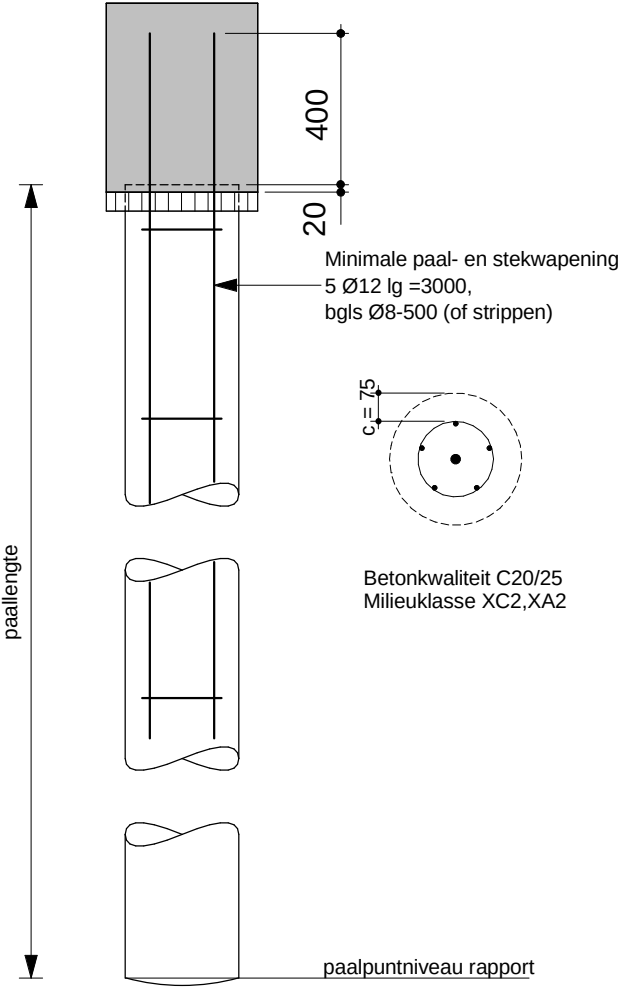

Aansluiting mortelschroefpaal - betonbalk
Indien de h.o.h. afstand van de palen minder dan 4x de (grootste) paaldiameter bedraagt, met een minimum van 2 m, dient de onderlinge tijdsduur tussen het vervaardigen minimaal 4 uur te zijn

Renvooi
↔ systeemvloer beganegrond: ribbenvloer h = 350 mm (volgens berekening en tekening leverancier).
▬ dragende betonwanden boven de vloer d = 100mm, tenzij anders aangegeven
▬ stabiliserende betonwanden (voor- en achtergevel) boven de vloer d = 90mm, tenzij anders aangegeven
▲ ingang woning


ALGEMEEN:
Algemeen constructieoverzicht voor de basiswoningen, dus niet voor woningen met opties.
Niet vloerdragende lateien (boven raam- en deuropeningen) volgens opgave leverancier.
Details zonder dimensies zijn principe details waarvan de dimensies worden bepaald door de leverancier.

FUNDERING:
Voor funderingsadvies zie rapport Koops & Romeijn Grondmechanica, opdrachtnummer: 17.3066R01 d.d.: 11 april 2017



PREFAB BETONCONSTRUCTIES:
Prefab casco-systeem volgens berekeningen en tekeningen leverancier.

Peil = 3,5m +NAP

Prefab betonconstructies (NEN-EN 1992 (serie) + NB, NEN-EN 206-1:2001, NEN-EN 10080)
alle onderdelen opleggen op oplegvlit Nevima 633 dik 8 mm o.g. (tenzij anders aangegeven of voorgeschreven door leverancier)
tenzij anders aangegeven: - voegmortel : K30, horizontale voegen prefab betonwanden, aanbrengen d.m.v. aangieten - voegmortel : K50, prefab betonkolommen en gains, aanbrengen d.m.v. aangieten - minimale sterkteklasse voor prefab beton : C35/45 Oplegging liggers en lateien minimaal 150 mm.

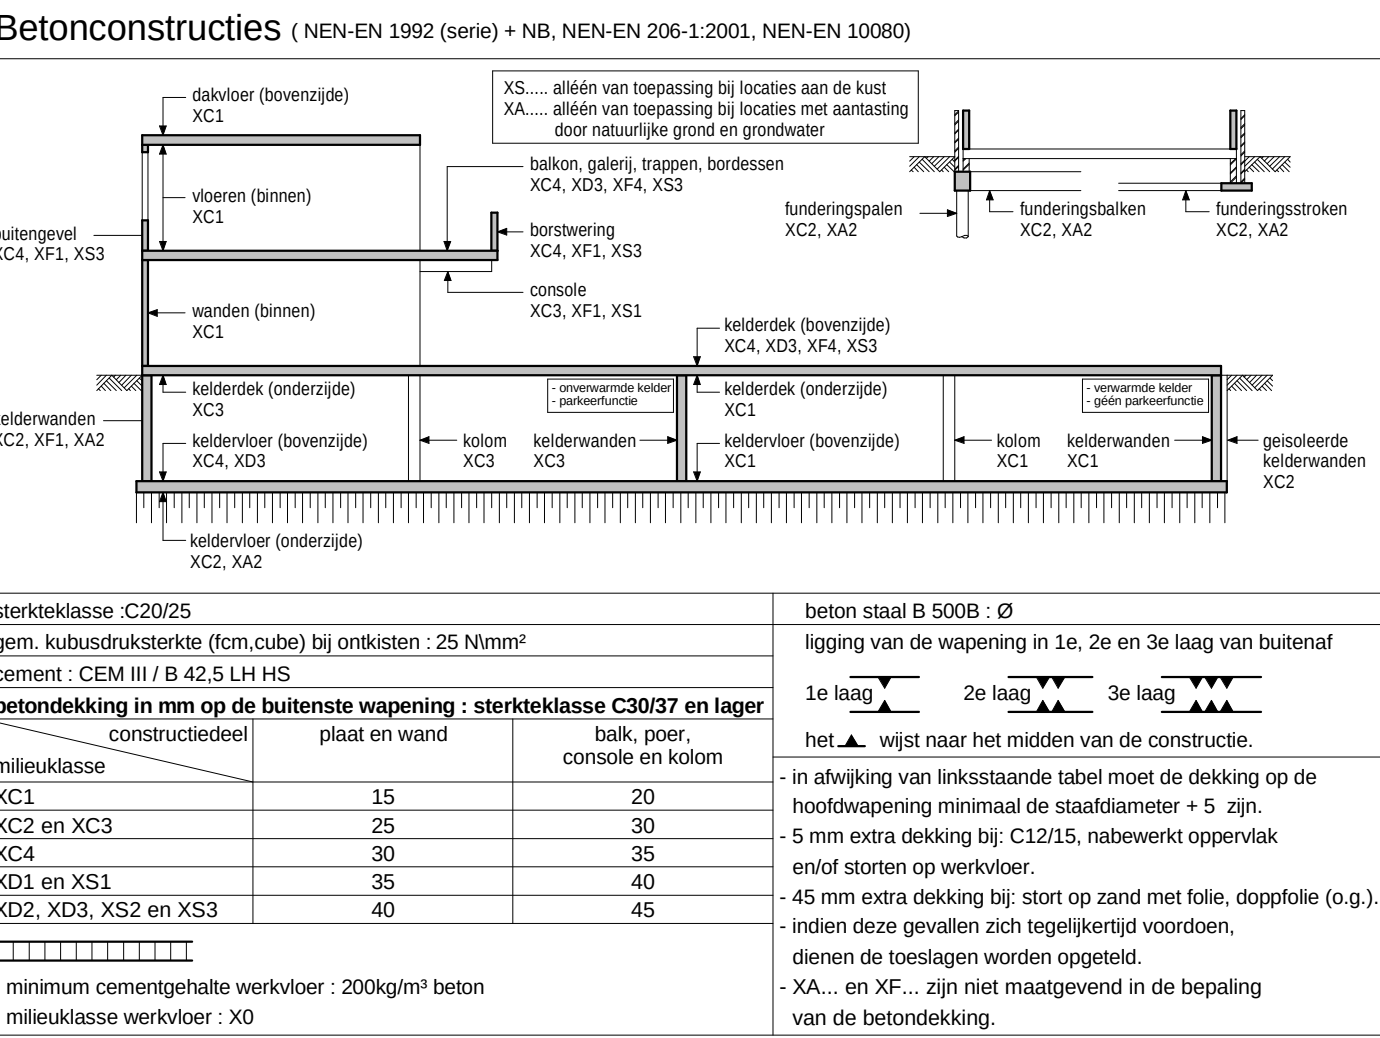

Gemeente Breda
Bijlage 33 bij besluit
2017/1107-V1

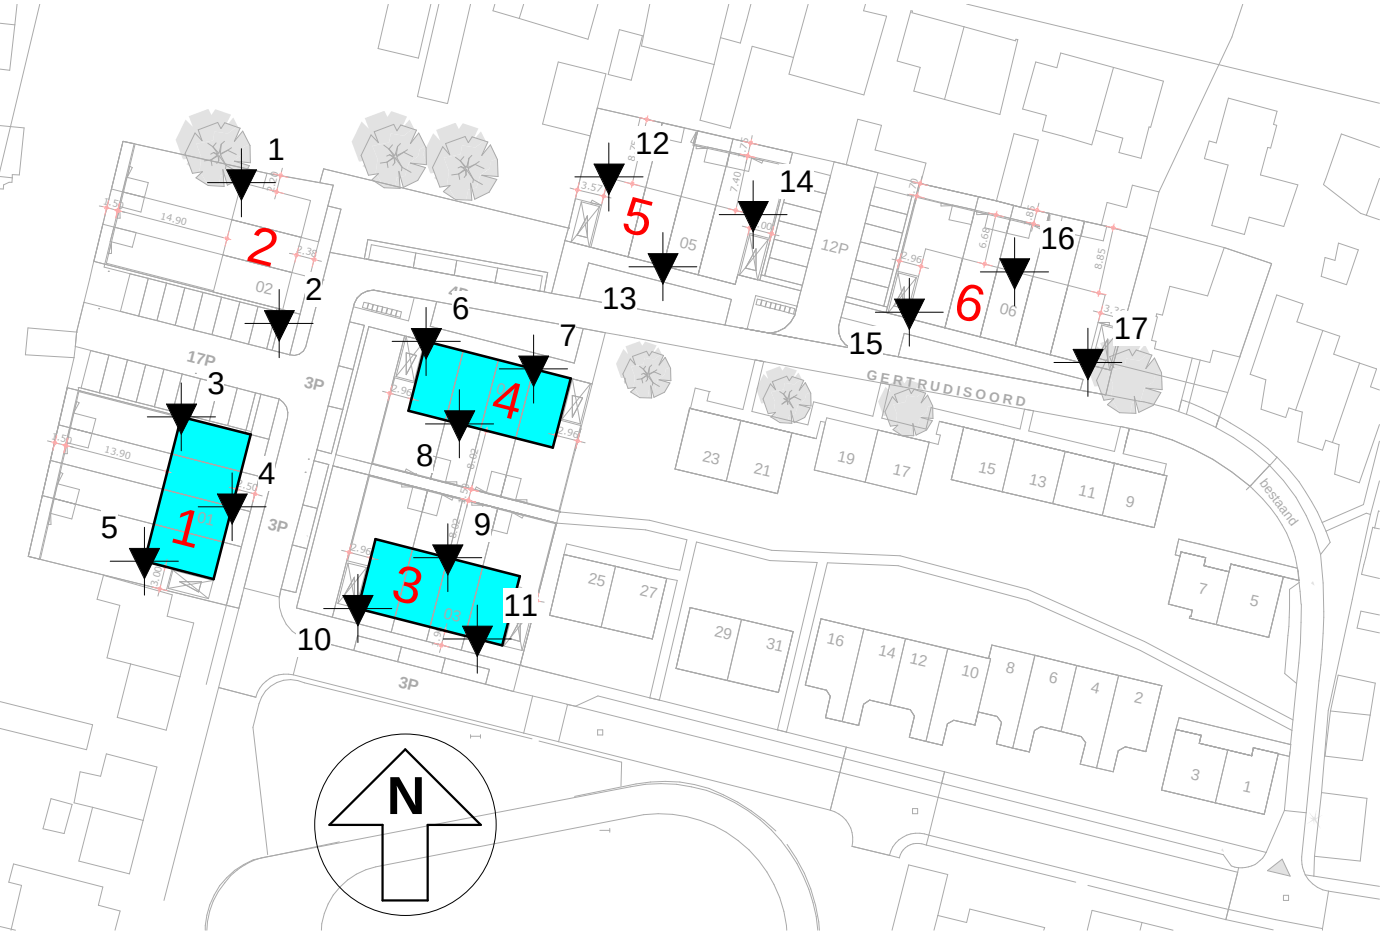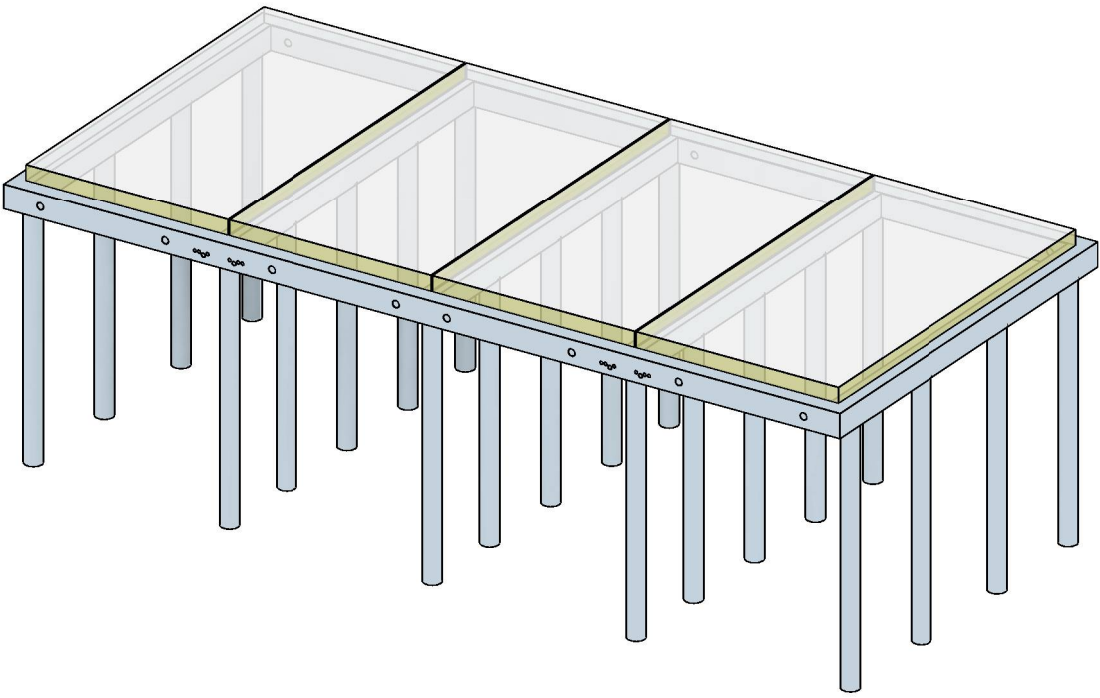

Giesbers
ontwikkelen en bouwen

DIT
is wonen

croes
Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Kerkenbos 1006 Postbus 6696 6503 GD Nijmegen 024-3721919 bureau@croes.nl www@croes.nl

15857.000 Project
630-0-101 Blad
Versie 1 21-04-2017 Definitief VJ MBr Schaal 1:50

Nieuwbouw woningen Getrudisoord
te Prinsenbeek
Constructieoverzicht onderbouw blok 1,3 & 4
Omgevingsvergunning Constructies
