


Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige ontwerp-projectplan tot realisatie van waterberging ten noorden van de kern Dussen (Ponyweide) vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit ontwerp-projectplan.

1.1 Beschrijving betrokken werk


De waterberging wordt ingericht op de percelen kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie T, nummers 239, 901 en 837. Deze percelen zijn in eigendom van de gemeente Werkendam, zie figuur 1.

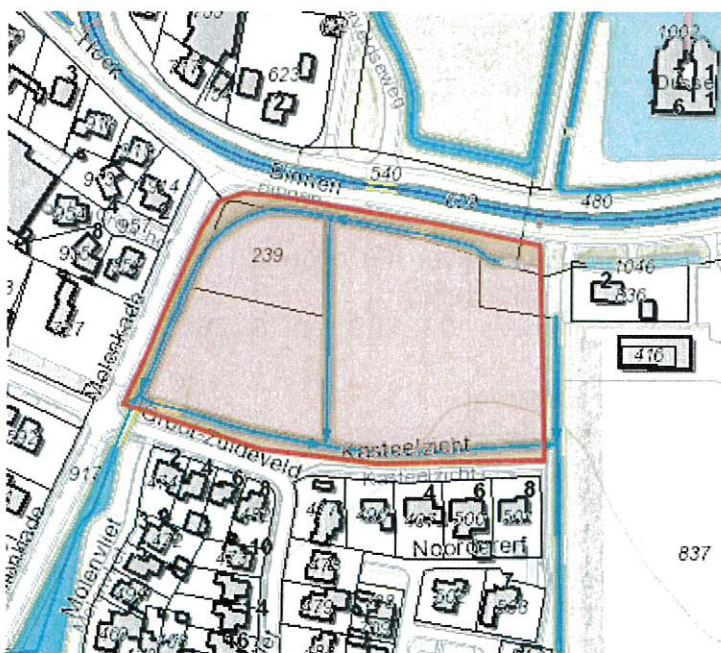

Figur 1

De waterberging wordt door middel van het (ver)graven van wateren en het afgraven van het maaiveld aangelegd en de randen van de watergangen worden voorzien van natuurvriendelijke oevers.

Voor nadere informatie aangaande de geplande vormgeving, ligging, en toe te passen constructies verwijzen wij u naar figuur 2 en bijlagen 1 en 2 van dit projectplan.

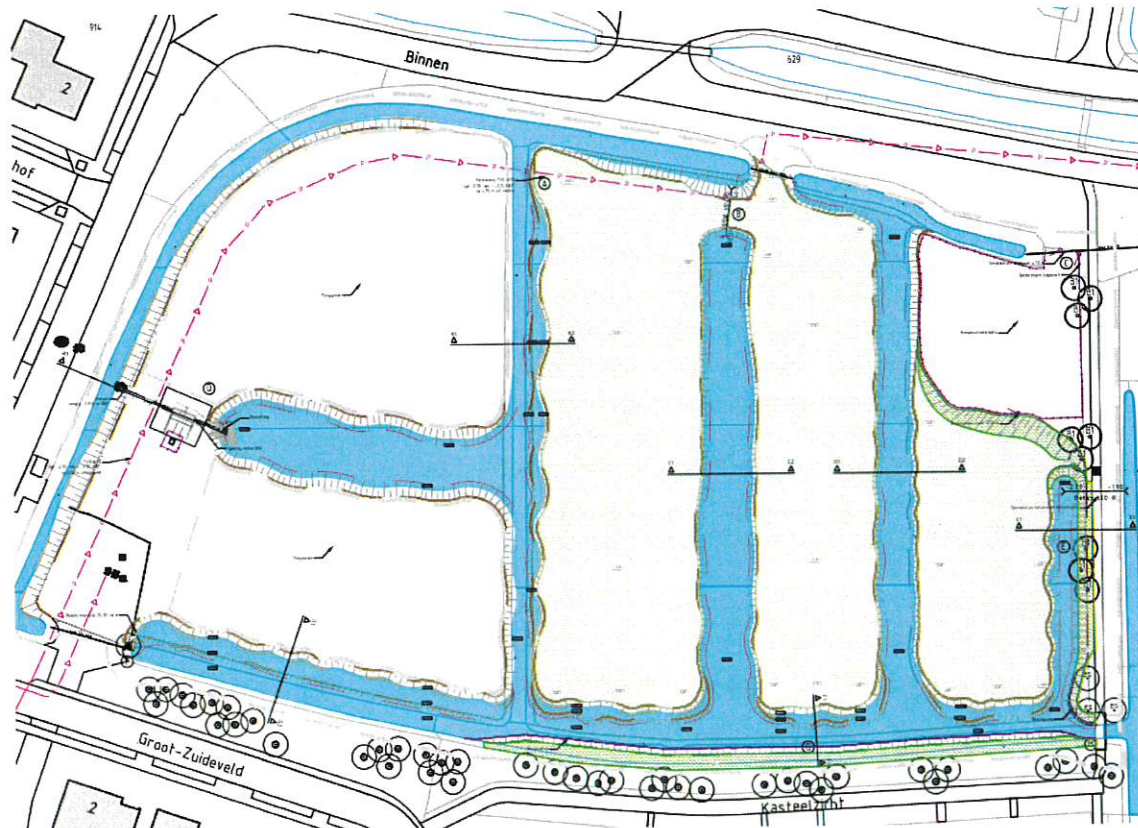

Figuur 2

1.2 Wijze van uitvoering

1.2.1 Fasering werk en werkzaamheden.

In het voorjaar van 2018 start de uitvoering van het project. In totaal omvat het project in hoofdlijnen de volgende onderdelen:

- Verleggen van B-wateren nummers 022859 en 022860 naar het noorden (ca. 120 m).
- Graven van ca. 210 m nieuwe wateren.
- Aanleg van ca. 490 m natuurvriendelijke oevers.
- Maaiveldverlaging op ca. 4790 m².
- Aanleg van ca. 0,6 ha waterbergingsgebied.
- Het ontgraven en verwijderen van ca. 9980 m³ grond.
- Aanleg van een onderhoudspad langs de te verleggen B-wateren nummers 022859 en 022860 en langs B-water nummer 022858 en de nieuwe B-water tot de overstort.

- Aanleg van een C-water langs voetpad (ca. 40 m¹) inclusief leggen van een duiker ten behoeve van 210 m² watercompensatie (t.o.v. zomerpeil) van aanleg sportvelden s.v. Dussense Boys.
- Leggen van een dam met duiker in nieuw B-water.

1.2.2. Transport en afzet vrijkomende grond.

Het werk bestaat voor een groot deel uit grondverzet dat uitgevoerd wordt op percelen in eigendom van de gemeente Werkendam. De vrijkomende grond komt te vervallen aan de aannemer en dient te worden afgevoerd. Op de openbare weg worden de geldende verkeersregels in acht genomen. Transport is met name nodig voor de aanvoer van materieel en materiaal en voor de afvoer van de grond.

1.2.3. Onderzoek rapportages.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn verschillende voorbereidende onderzoeken uitgevoerd.

Waar het gaat om milieuaspecten kunnen tijdens de uitvoering tijdelijke effecten optreden. Bijvoorbeeld voor vissen en vogels. Hier wordt rekening mee gehouden door de werkzaamheden uit te voeren volgens de gedragscode flora en fauna voor waterschappen. Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt het leefgebied voor vissen en het foerageergebied van vogels op de langere termijn verbeterd.

Grote effecten op de omgeving als gevolg van de geplande werkzaamheden zijn niet te verwachten.

1.3 *Te treffen voorzieningen*

Er zijn geen nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk op de omgeving gezien. Er worden derhalve geen voorzieningen of compenserende maatregelen getroffen.

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Dit verzoek moet worden ingediend bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

De realisatie van de waterberging is maatregel als gevolg van de wateroverlast in 2015. Met de aanleg van de waterberging komt er meer ruimte beschikbaar voor water en neemt de kans op wateroverlast af.

2b. Chemische en ecologische kwaliteit

Het oppervlaktewaterstelsel waar de waterberging deel van gaat uitmaken is niet aangewezen als waterlichaam in het kader van de KRW en kent geen specifieke ecologische doelstellingen. Het project levert een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Door de verbinding van de wateren en meer water zal stilstaand water minder voorkomen dan in huidige situatie.

Op de natuurvriendelijke oevers in het waterbergingsgebied ontwikkelt zich een grotere diversiteit water- en oeverorganismen dan in de huidige situatie mogelijk is. Het project levert tevens een positieve bijdrage aan de chemische kwaliteit van het oppervlaktewater. Op de natuurvriendelijke oevers en in het waterbergingsgebied ontwikkelen zich waterzuiverende helofyten. Deze planten zorgen voor opname van verontreinigingen uit het oppervlaktewater, welke worden verwijderd door maaien en afvoeren van de vegetatie.

De kans op muggenoverlast wordt klein geacht voor de oeverzone en het nieuw te graven water. Het diepe water vormt geen risico. Door het natte grasland (af te graven maaiveld) "bol" aan te leggen kan het regenwater makkelijk afstromen en wordt de muggenoverlast beperkt.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

Bij het ontwerp van de waterberging is aansluiting gezocht met de omgeving. Er is rekening gehouden met de belangen van omwonenden bijvoorbeeld door het open houden van een looproute buitenom de waterberging en het realiseren van een hondenuitlaatplaats.

Conclusie

Conclusie van de toetsing aan artikel 2.1 Waterwet is dat het project aansluit bij de doelstellingen zoals verwoord in de nationale, provinciale en waterschapplannen.

3. Uitvoerbaarheid

3a. Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan "Kern Dussen" met de enkelbestemming "Agrarisch", dubbelbestemming "Waarde- Cultuurhistorie" en gebiedsaanduiding "waardevolle groene ruimte" vastgesteld. Het project past binnen het geldende bestemmingsplan.

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Voor het plan is een ontgrondingsmelding ingediend, in behandeling genomen en er is reeds besloten tot het accepteren van de melding en stemmen in met de voorgenomen ontgrondings- en

inrichtingswerkzaamheden. Voor het plan is een omgevingsvergunning aangevraagd en in behandeling genomen.

Bij de uitvoering van het projectplan wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol waarmee invulling wordt gegeven aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing is niet nodig. Zo nodig wordt voor het toepassen van grond- of baggerspecie een melding Besluit Bodemkwaliteit gedaan.

Na uitvoering van het projectplan worden:

- de te vergraven B-wateren;
- het nieuwe voor 2/3 toekomstig A-water en 1/3 C-water tussen de bestaande overstort en de te verleggen toekomstig A-water;
- de te verleggen voor 2/3 toekomstig A-water en 1/3 C-water;
- de overige nieuwe C-wateren als de waterberging (C-status);

op de legger van het waterschap opgenomen op basis van de revisietekeningen.

Voor een overzicht van de legger-wateren na inrichting verwijzen wij u naar figuur 3.



Figuur 3

3c. Planning

Het project zal in het voorjaar van 2018 starten en naar verwachting in de zomer van 2018 zijn afgerond.

3d. Overige uitvoeringsaspecten

Hier dienen overige maatregelen te worden beschreven die nodig zijn om de uitvoering van het project mogelijk te maken, bijv. de verlegging van kabels en leidingen, grondverwerving (onteigening) of wegafzettingen.

4. Beheer en onderhoud

De waterberging en de wateren komen in beheer bij de gemeente Werkendam. In de toekomst krijgt de te verleggen B-watergang (tussen de bestaande overstort en de te verleggen B-water) de A-status. Deze status is van toepassing op een breedte van 8 meter gemeten vanaf de onderhoudszijde van de watergang, het resterende deel betreft een natuurvriendelijke oever, deze krijgt de C-status. Het onderhoud van A-wateren gaat naar het waterschap.

5. Procedure

Het projectplan dient op grond van de Inspraakverordening van het waterschap te worden voorbereid via de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat eerst een ontwerp ter inzage moet worden gelegd waarop zienswijzen kunnen worden gegeven. Na ontvangst van de zienswijzen wordt het projectplan definitief vastgesteld en wederom bekendgemaakt.

Er heeft op 13 december 2017 een inloopavond plaats gevonden met het voorontwerp om de input van de omgeving te ontvangen. Van de inloopavond is een reactienota opgesteld en gecommuniceerd met omgeving.

6. Contactpersoon

De heer J. Kroon treedt namens Waterschap Rivierenland op als projectleider. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0344) 649 321 of via e-mail j.kroon@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,



Caroline van der Kleij
hoofd van de afdeling Weg- en Waterbouw

Bijlagen

- Bijlage 1: Tekening nummer 2018-0414 van 21-03-2018, Situatie waterberging.
- Bijlage 2: Tekening nummer 2018-0413 van 21-03-2018, Normaalprofielen.

Zienswijze

Belanghebbenden en ingezetenen van het waterschap kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit ontwerp-besluit hun zienswijze over dit ontwerp kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als digitaal. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Voor het indienen van een digitale zienswijze kunt u het geschikte formulier vinden op: <http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-aanvragen/zienswijze.html>. Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

