



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Inrichtingsmaatregelen peilvak OR-4.12.1.17

projectnummer: 00.10009/943

ontwerp-Projectplan

Inhoudsopgave

0. Samenvatting	3
1. Inleiding en leeswijzer	4
2. Projectomschrijving (wat gaan we doen)	4
2.1 Aanleiding en doel van het project.....	4
2.2 Wat is een projectplan?.....	5
2.3 Inhoud en omvang van het project	6
3. Beleidskader (waarom gaan we het doen)	8
4. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)	9
4.1 Uitgevoerde onderzoeken	9
4.2 Uitgangspunten.....	9
4.2.1 Planning.....	9
4.2.2 Aanbesteding.....	9
4.2.3 Randvoorwaarden	9
4.2.4 Legger	10
4.3 Realisatie	10
4.4 Samenwerking	10
4.5 Graven en dempen	10
4.6 Onderhoud	11
5. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten (wat merken ingelanden van het project)	11
5.1 Impact op de omgeving	11
5.2 Beperking nadelige effecten.....	11
5.3 Nadeelcompensatie.....	12
6. Besluitvormingsprocedure	12
7. Bijlagen	12
1. Tekeningen.....	12
2. Tabel met GIS-code.....	12

0. Samenvatting

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft diverse wettelijke taken en opgaven op het gebied van waterkwantiteit en waterkwaliteit, zoals opgenomen in de Waterwet, het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Eén van deze opgaven is het herzien van peilbesluiten. Rijnland pakt deze opgaven zoveel mogelijk integraal op in een zogenaamd Watergebiedsplan. Een Watergebiedsplan is afgestemd op de verschillende belangen en wordt doorlopen in een gebiedsproces waarin ook de streek geraadpleegd wordt.

Het peilbesluit voor de Zuid- en Noordeinderpolder, onderdeel van Watergebiedsplan Midden, is in 2015 vastgesteld. Bij de voorbereidingen van de maatregelen nodig om het peilbesluit te realiseren is bezwaar ingekomen op het peilbesluit voor het voormalig peilvak OR-4.12.1.3-OOST als gevolg van nieuwe informatie. Daarop is besloten het functioneren van het watersysteem en het genomen peilbesluit opnieuw te onderzoeken en te beoordelen. Hieruit volgde een partiële herziening op het peilbesluit, waarbij voormalig peilvak OR-4.12.1.3-OOST niet werd opgeheven maar de status blijft houden van een apart peilvak: OR-4.12.1.17. Deze herziening vormt de directe aanleiding voor het opstellen van dit projectplan.

Dit projectplan voorziet in de uitvoering van een aantal maatregelen om het nieuwe peilbesluit te kunnen handhaven. De maatregelen betreffen het verbreden van een watergang, de aanleg van een nieuwe opmaalpomp met overstort en het aanpassen van een bestaande stuw.

1. Inleiding en leeswijzer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is verantwoordelijk voor het beheer van watersystemen in zijn beheergebied. Voor het verbeteren van de waterhuishouding kan het nodig zijn dat maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen bestaan in dit geval uit het wijzigen en aanleggen van waterstaatswerken.

Dit plan voorziet in de uitvoering van een aantal maatregelen om het nieuwe peilbesluit te kunnen handhaven. De maatregelen betreffen het verbreden van een watergang, de aanleg van een nieuwe opmaalpomp met overstort en het aanpassen van een bestaande stuw.

1.1 Leeswijzer

Dit projectplan dient gelezen te worden als een overzicht van maatregelen die binnen de formele verantwoordelijkheden en het bestaande beleid van Rijnland genomen moeten worden om het oplossen van de geïdentificeerde knelpunten te realiseren. Eerst worden de opgaven en de maatregelen geschetst. Daarna wordt beschreven hoe dergelijke maatregelen binnen het beleidskader vallen. Vervolgens wordt de projectuitvoering en de consequenties voor derden behandeld. Tot slot wordt er ingegaan op de besluitvormingsprocedure.

2. Projectomschrijving: Herziening peilvak 1.3-OOST

2.1 Aanleiding en doel van het project

Dit project draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Deze genoemde doelstellingen zijn:

1 De toepassing van deze wet is gericht op:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met*
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en*
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.*

2 De toepassing van deze wet is mede gericht op andere doelstellingen dan genoemd in het eerste lid, voor zover dat elders in deze wet is bepaald.

Het peilbesluit voor de Zuid- en Noordeinderpolder, onderdeel van Watergebiedsplan Midden, is in 2015 vastgesteld. Bij de voorbereidingen van de maatregelen nodig om het peilbesluit te realiseren is bezwaar ingekomen op het peilbesluit voor het voormalig peilvak OR-4.12.1.3-OOST als gevolg van nieuwe informatie over de gevoeligheid van de funderingen voor de geplande waterstandsverlaging.

Daarop is besloten het functioneren van het watersysteem en het genomen peilbesluit opnieuw te onderzoeken en te beoordelen. Uit de onderzoeken en de gesprekken met de bewoners kwamen twee problemen naar voren. Allereerst was er ongerustheid over de mogelijke effecten van een peildaling met betrekking tot de funderingen. Ten tweede bleek er sprake te zijn van wateroverlast na een fikse regenbui.

De hoofdpogaven voor peilvak 1.3-OOST zijn:

- Beperkte drooglegging in een gebied met wisselende functies.
- De afwatering van het systeem in perioden van heftige regenval.

- De bereikbaarheid van de opmaalpomp (gemaal) is door de bomen langs de provinciale weg niet veilig.
- De vervanging van de opmaalpomp.

Dit leidde tot een partiële herziening op het peilbesluit, waarbij voormalig peilvak OR-4.12.1.3-OOST niet werd opgeheven maar de status blijft houden van een apart peilvak: OR-4.12.1.17. Qua peil wordt er vastgehouden aan het huidige praktijkpeil en de afwatering van het gebied wordt verbeterd.

Deze herziening vormt de directe aanleiding voor het opstellen van dit projectplan.

2.2 Projectbeschrijving

De inrichtingsmaatregelen vinden plaats in peilvak OR-4.12.1.17. Dit peilvak is 6,2 ha groot en bestaat volledig uit veengronden. Dit betreffende deel van de Zuid- en Noordeinderpolder ligt in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het wordt begrensd door de N231 aan de zuidwestzijde en de Nieuwkoopseweg aan de oostzijde, zie figuur 1.



Figuur 1: locatie peilvak OR-4.12.1.17

In dit projectplan komt een aantal verschillende maatregelen aan de orde. Om de totale omvang van het project duidelijk te maken volgt hier een korte opsomming van het totaalpakket aan maatregelen.

In het kader van dit project is Rijnland van plan om een aantal waterstaatswerken te wijzigen en aan te leggen. De inrichtingsmaatregelen in peilvak 1.17 zijn de volgende:

- De watergang langs de provinciale weg wordt verbreed en opgewaardeerd naar hoofdwatgang.
- Een nieuwe opmaalpomp inclusief automatische stuw gerealiseerd op de huidige plaats. Deze stuw fungeert als hoofdafvoer voor de nieuwe hoofdwatgang, welke het gebied sneller kan afwateren. Bovendien wordt de bereikbaarheid en veiligheid van de locatie kan verbeterd, door de aanleg van een nieuwe parkeerplaats en pad richting de opmaalpomp.
- De stuw ten noorden van het gebied wordt opgeknapt en veilig conform arbo gemaakt. Deze stuw zal als noodoverstort gaan fungeren

Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet dient voor de aanleg of wijziging van bovengenoemde waterstaatswerken een projectplan vastgesteld te worden. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient een projectplan tenminste het volgende te bevatten:

- een beschrijving van het betrokken werk
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd en
- een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

2.3 Inhoud en omvang van het project

In het kader van het beperken van wateroverlast en de functiefacilitering van het gebied, worden er een aantal maatregelen uitgevoerd. Dit plan past binnen het bestaande bestemmingsplan.

Het plan voorziet in de uitvoering van een aantal maatregelen om het nieuwe peilbesluit te kunnen handhaven. De maatregelen betreffen het verbreden van een watergang, de aanleg van een nieuwe opmaalpomp met overstort en het aanpassen van een bestaande stuw. Deze maatregelen zijn aangeduid in kaart A1: maatregelen peilvak OR-4.12.1.17.

Het bijbehorende peilbesluit is reeds opgesteld: dit is de herziende versie van het watergebiedsplan van de Zuid- en Noordeinderpolder vastgesteld in 2015. Binnen dit kader worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Deze voldoen aan de richtlijnen.

3. Inrichtingsmaatregelen peilvak OR-4.12.1.17

3.1 Huidige situatie

In het peilbesluit van 1995 is een vast peil vastgesteld voor peilvak 1.3-OOST van NAP -2,12 m. Uit dataloggergegevens blijkt dat dit peil ondanks wat afwijkingen in eerdere jaren, vanaf half 2014 wordt gehandhaafd. De mediaan van het maaiveld ligt op NAP -1,73 m, waardoor er in praktijk 0,39 m drooglegging is.

In de huidige situatie is de aan- en afvoer van water in het peilvak niet optimaal geregeld. De afvoer vindt plaats via een watergang langs de provinciale weg en de watergang langs het noordelijkste perceel: hier loopt het water over de stuw terug kan stromen in peilvak 4.12.1.1. Deze watergangen zijn in de huidige situatie overige watergangen waarvan het onderhoud door Rijnland wordt uitgevoerd. De watergang langs de Nieuwkoopseweg is lokaal verbonden met de hoofdwatgangen, wegens dammen in de twee zuidelijkste percelen en een gedempte duiker ter hoogte van Nieuwkoopseweg 3B.

In praktijk blijkt het bij hevige neerslag meerdere dagen te duren voor het oppervlaktewatersysteem weer op orde is.

3.2 Knelpunten

De hoofdogaven voor peilvak 1.3-OOST/1.17 zijn:


- De afwatering van het systeem in perioden van heftige regenval.
- De bereikbaarheid van de opmaalpomp is door de bomen langs de provinciale weg niet veilig.
- De vervanging van de opmaalpomp wegens ouderdom.

3.3 Maatregelen

- De watergang langs de provinciale weg wordt verbreed en opgewaardeerd naar hoofdwatgang.
- De opmaalpomp wordt vervangen op de huidige locatie. Daarnaast wordt de dam daar vervangen voor een automatische stuw. Deze stuw fungeert als hoofdafvoer voor de nieuwe hoofdwatgang, waardoor het gebied sneller kan afwateren. Bovendien wordt de bereikbaarheid en veiligheid van de locatie kan verbeterd, door de aanleg van een nieuwe parkeerplaats en pad richting de opmaalpomp en de automatische stuw.
- De stuw ten noorden van het gebied wordt opgeknapt en veilig gemaakt conform arbo-vereisten. Deze stuw zal als noodoverstort gaan fungeren.

3.3.1 Opwaarderen watergang

De watergang langs de provinciale weg wordt verbreed naar 3,8 meter op de waterlijn en opgewaardeerd naar hoofdwatgang. De taludhelling onderwater bedraagt 1:2 en de taludhelling bovenwater 1:1. De dimensies zijn weergegeven in Figuur 2.

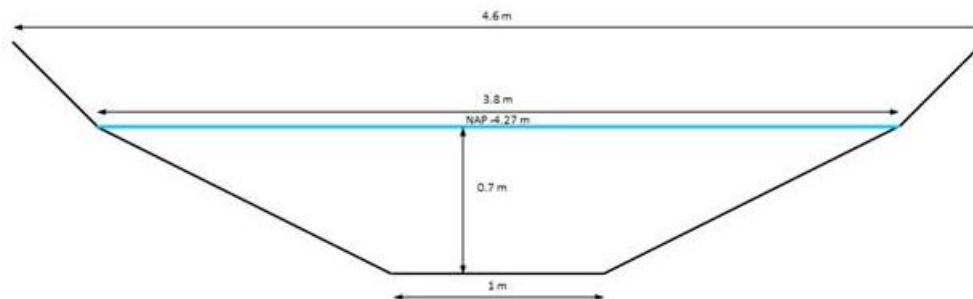

Figuur 2: Dwarsprofiel nieuw profiel watergang langs N231

De ligging van de te verbreden watergang is aangegeven in kaart A1: Maatregelen peilvak OR-4.12.1.17. Deze verbreding valt binnen de kadastrale grenzen van het kadastrale perceel van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft aangegeven om via minnelijke verwerving het eigendom aan Rijnland over te dragen.

De andere overige watergangen, waarvan nu het nat profiel wordt onderhouden door Rijnland, worden nog eenmalig opgeschoond waarna het onderhoud wordt overgedragen naar de aangelanden. Deze watergangen zijn tevens aangegeven in kaart A1.

Opgemerkt moet worden dat de beschoeiing rondom het perceel van Nieuwkoopseweg 1B verdacht wordt van asbest. Hiervan ligt circa 43 m op het kadastrale perceel van de provincie. Voor de uitvoering van de maatregelen dient rekening gehouden te worden dat er volgens de hiervoor geldende werkprotocollen wordt gewerkt. Ook moet het verdachte materiaal volgens de daarvoor geldende regels afgevoerd te worden.

3.3.2 Opmaalpomp inclusief automatische stuw

Een nieuwe opmaalpomp inclusief automatische stuw gerealiseerd op de huidige plaats. Deze stuw fungeert als hoofdafvoer voor de nieuwe hoofdwatgang, welke het gebied sneller kan afwateren. Door de aanleg van een automatische stuw ontstaat de mogelijkheid om operationeel het systeem dynamischer te beheren, bijvoorbeeld wanneer hevige neerslag wordt verwacht. Bovendien wordt de bereikbaarheid en veiligheid van de locatie kan verbeterd, door de aanleg van een nieuwe parkeerplaats en pad richting de opmaalpomp.

3.3.3 Opknappen bestaande stuw

De stuw ten noorden van het gebied wordt opgeknapt en veilig gemaakt conform de geldende arbo-richtlijnen. Deze stuw zal als noodoverstort gaan fungeren

4. Beleidskader (waarom gaan we het doen)

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van een partiële herziening van het watergebiedsplan Noord- en Zuideinderpolder, met betrekking op voormalig peilvak OR-

4.12.1.3-OOST. Met deze partiële herziening blijft dit een eigen peilvak (OR-4.12.1.17) waarbij de waterhuishouding en het peil gewijzigd worden ten opzichte van het huidige peilbesluit, maar niet ten opzichte van de huidige praktijksituatie. De verbetering komt tot stand door een grotere afvoercapaciteit in tijden van veel neerslag en een hoog peil waarmee de funderingen geen extra risico lopen.

Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Op grond van het tweede lid van artikel 5.4 dient het plan tenminste te bevatten:

- een beschrijving van het betrokken werk
- de wijze waarop het wordt uitgevoerd
- alsmede een beschrijving van de consequenties voor derden en (eventuele) compenserende maatregelen

5. Projectuitvoering (hoe gaan we het doen)

De werkzaamheden worden aanbesteed bij een aannemer. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de werkwijze baggerwerkzaamheden en kunstwerken, welke ook geldend waren bij de uitvoering van de werkzaamheden voor het watergebiedsplan in de Zuid- en Noordeinderpolder in 2015.

5.1 Uitgevoerde onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd:

- flora- en faunaonderzoek d.d. 30-11-2017 door het Hoogheemraadschap van Rijnland met kenmerk 17.101256 waarin is onderzocht wat de impact is van de uit te voeren werkzaamheden in dit peilgebied.
- KLIC-melding d.d. 14-07-2017
- Verkennend waterbodemonderzoek d.d. 10-9-2015 door Antea Group, met kenmerk 248373-20.
- Inpeilingen dwarsprofielen inclusief toetsing leggerdiepte d.d. september 2015 door Antea Group, met kenmerk 248373-20.

5.2 Uitgangspunten

In deze alinea wordt ingegaan op de geldende eisen en uitgangspunten voor dit project t.a.v. de planning, aanbesteding en beperkingen die voortvloeien uit beleid en regelgeving en uitgevoerde onderzoeken.

5.2.1 Planning

Rijnland is voornemens de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren waarbij wordt uitgegaan van kwartaal 2 en 3 van 2018.

5.2.2 Aanbesteding

Dit project wordt aanbesteed in kwartaal 1 van 2018.

5.2.3 Randvoorwaarden

In het kader van de Flora- en Faunawet is een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige dier- en plantensoorten. Door de voorgenomen maatregelen dienen geen beschermde soorten te worden geschaad. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de

werkprotocollen Flora- en faunawet van Rijnland. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat er geen flora en fauna-ontheffing nodig is.

Onder andere voor de ontgravingen is een melding in het kader van het besluit bodemkwaliteit en omgevingsvergunning nodig van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook voor het verleggen/aanleggen van kabels en leidingen (indien nodig) dient een vergunning aangevraagd te worden. De aannemer zal de benodigde vergunning/melding moeten aanvragen alvorens te starten met de werkzaamheden. De ontgravingen vinden plaats op percelen met een kleine kans op archeologische sporen. Nader archeologisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

De werkzaamheden met betrekking tot de parkeerplaats en het toegangspad naar het gemaal worden volledig uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland.

Bovenstaande werkzaamheden passen binnen het huidige bestemmingsplan: er hoeft dus geen bestemmingsplanafwijking geregeld te worden.

5.2.4 Legger

Ten aanzien van de Leggers van Rijnland geldt dat de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk kan leiden tot aanpassing van de legger. Naast dat van de Legger een update benodigd is van de huidige praktijksituatie, moeten er ook enige aanvullende zaken gewijzigd worden.

Na realisatie van de werkzaamheden in de Zuid- en Noordeinderpolder in 2015, draagt Rijnland enkel zorg voor de onderhoud van hoofdwatgangen. Om in dit deel van de polder dezelfde aanduiding te houden, wordt één watgang opgewaardeerd tot hoofdwatgang. Op kaart A1 staat weergegeven welke watgang wordt opgewaardeerd naar hoofdwatgang en op welke locaties het onderhoud wordt overgedragen naar de aangelanden. Overigens is de praktijk dat Rijnland al het onderhoud doet van de op te waarden watgang. Deze watgangen worden opgeschoond alvorens het onderhoud wordt overgedragen aan de aangelanden.

5.3 Realisatie

De wijze van uitvoering van dit project is nog grotendeels onbekend, dit wordt overgelaten aan de aannemer. De aannemer zal moeten werken volgens de werkwijze van Rijnland ten aanzien van uitlogende materialen en duurzaamheid. Overlast voor de bewoners dient te worden beperkt.

5.4 Samenwerking

Ten aanzien van de aanleg van de parkeerplaats bij de opmaalpomp aan de provinciale weg N231, wordt er samengewerkt met de provincie Zuid-Holland. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze parkeerplaats en toegangspad ligt volledig bij de provincie. Rijnland draagt de kosten voor de aanleg van deze parkeerplaats en toegangspad. Er vindt afstemming plaats tussen de provincie en Rijnland.

5.5 Graven en dempen

De watgang parallel aan de provinciale weg wordt verbreed ten behoeve van het verbeteren van de afvoer van het watersysteem, zie kaart A1. Deze afgegraven grond kan worden opgebracht op percelen in het peilgebied. Aangezien het niet wenselijk is dat

er in dit peilgebied water gedempt wordt, wordt er geen Berging Rekening Courant (BRC) opgesteld.

5.6 Onderhoud

De nieuwe automatische stuw en opmaalpomp komen in onderhoud bij Rijnland, evenals de opgeknapte stuw aan de noordkant van het peilgebied. Zoals aangegeven in kaart A1 zal het onderhoud van enkele watergangen worden overgedragen aan de aangelanden. Het onderhoud van de parkeerplaats en het toegangspad komt bij Rijnland te liggen.

6. Consequenties voor derden en beperking nadelige effecten

De realisatie van het project heeft invloed op de omgeving. Bij de uitvoering van de werkzaamheden en de aanleg of wijziging van het waterstaatswerk worden belangen van derden in het oog gehouden en waar mogelijk worden nadelige effecten beperkt.

6.1 Impact op de omgeving

De uitvoering van het project zorgt in de openbare ruimte voor enige overlast. Echter wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt door niet op de openbare weg te werken. Het is een voorschrift voor de aannemer om overlast te beperken: de exacte invulling hiervan ligt bij de aannemer.

6.2 Beperking nadelige effecten

Om nadelige effecten te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken wordt rekening gehouden met diverse belangen.

- In een vroeg stadium is de uitvoering van het project afgestemd met de gemeente Alphen aan den Rijn, de provincie Zuid-Holland en particulieren. Omwonenden zijn door middel van een informatieavond (op 18 september 2017 in De Hollandsche Leeuw te Nieuwkoop) geïnformeerd. Daarnaast zijn er in de periode in 2015 keukentafelgesprekken gevoerd met de omwonenden ten behoeve van het watergebiedsplan Noord- en Zuideinderpolder van 2015.
- Schade aan aanwezige beschermde flora en fauna wordt voorkomen door te werken volgens de 'gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen' en daarop gebaseerde werkprotocollen van Rijnland. In die werkprotocollen staat hoe in de praktijk moet worden omgegaan met beschermde soorten. Aanvullend daarop worden toegesneden ecologische werkprotocollen gevolgd bij de uitvoering. Alle daarin beschreven maatregelen zorgen ervoor dat er geen nadelige effecten zijn voor beschermde flora en fauna, waardoor er geen ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming nodig is.
- Bij de uitvoering van het werk wordt waar mogelijk overlast voor recreatie (denk aan: bereikbaarheid jachthavens, toegankelijkheid vaarwegen en voet- en fietsverkeer) voorkomen.
- Bestaande bebouwing en objecten kunnen blijven gehandhaafd, tenzij deze illegaal aanwezig zijn. Werkzaamheden mogen geen schade toebrengen aan bebouwing of wegen. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de staat van gebouwen en wegen binnen de invloedzone van het te realiseren werk opgenomen.
- Er zal overdag worden gewerkt en niet in het weekend of tijdens feestdagen.

6.3 Nadeelcompensatie

Vanwege eventuele schadelijke effecten die gepaard gaan met de uitvoering of realisatie van dit project staat het een ieder vrij om met een beroep op artikel 7.14 van de Waterwet en de nadeelcompensatieverordening van Rijnland bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden een gemotiveerd en onderbouwd verzoek in te dienen vanwege geleden schade. Dit nadeelcompensatieverzoek wordt door middel van een aparte procedure in behandeling genomen. Na het indienen van het nadeelcompensatieverzoek wordt deze beoordeeld en wordt bezien of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de geleden schade.

In plaats van het beperken van schade door middel van een eventueel toe te kennen schadevergoeding kan ook een minnelijke regeling worden getroffen. Rijnland zal hierbij aansluiting zoeken bij eventueel door Rijnland opgestelde nadeelcompensatierichtlijnen.

7. Besluitvormingsprocedure

Dit projectplan is een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit besluit is voorbereid door toepassing afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het verloop van de procedure op grond van afdeling 3.4 ziet er als volgt uit. Voorafgaand aan het vaststellen van een definitief projectplan, is eerst dit ontwerp-projectplan opgesteld. In het digitale Waterschapsblad is dit ontwerp-projectplan gepubliceerd en belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken een schriftelijke zienswijze op dit projectplan kenbaar maken bij Rijnland. Na afloop van deze termijn worden de zienswijzen beoordeeld en wordt bezien of deze aanleiding zijn het ontwerp-projectplan aan te passen. Nadat het definitieve projectplan namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden is vastgesteld, wordt het definitieve projectplan bekendgemaakt in het Waterschapsblad. Na bekendmaking treedt het projectplan in werking. Na bekendmaking in het Waterschapsblad kunnen in beginsel alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de rechtbank Den Haag. Projectplannen vallen onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld.

8. Bijlagen

Bijlage 1: **Kaart A1: maatregelen peilvak OR-4.12.1.17.**

1. Tekeningen

Deze bijlage omvat geen (extra) tekeningen.

2. Tabel met GIS-code

Object	GIS-code
n.v.t.	n.v.t.
