

# PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet<sup>1</sup>

Datum: 29 augustus 2018  
Kenmerk: 2018103081/2018104152  
Onderwerp: Ontwerp projectplan groen retentiegebied Waardenburg

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot de aanleg van een groen retentiegebied in Waardenburg vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

## **1. Projectbeschrijving**

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Het plan dient tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, aldus artikel 5.4, lid 2, Waterwet.


### *1.1 Beschrijving betrokken werk*

In het Waterplan Neerijnen is berekend dat de kern Waardenburg een wateropgave heeft. Het waterschap heeft een stuk grond in de kern aangekocht om de wateropgave op te lossen. Het betreft het perceel met de kadastrale code WDB01 W 727; zie figuur 1 en 2 voor de ligging. Deze locatie wordt in het waterplan genoemd als een geschikte locatie voor een herinrichting.

Het perceel bestaat in de huidige situatie uit een moerasbos met overwoekerende ruigtesoorten als braam en brandnetel. In het noorden is een nat gedeelte met ondiep water. Gemeente Neerijnen en Waterschap Rivierenland hebben het gezamenlijke voornemen het perceel opnieuw in te richten, waarbij een deel van het groen (ruigteplanten en bomen) wordt verwijderd om de mogelijkheid van het bergen van water te verbeteren en het gebied beter toegankelijk te maken voor het uitvoeren van onderhoud.

---

<sup>1</sup> Dit model ziet op projectplannen in de zin van artikel 5.4 van de Waterwet (aanleg of wijziging van een waterstaatswerk niet zijnde een primaire waterkering). Het gaat hierbij om werkzaamheden in het kader van de waterkwantiteit.

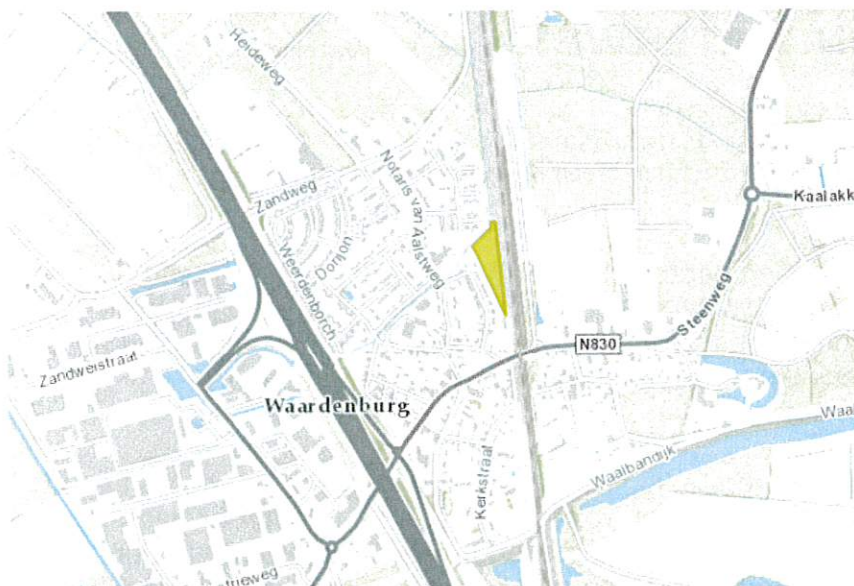

Figuur 1 Ligging perceel WDB01 W 727




Figuur 2 Ligging perceel WDB01 W 727

### 1.2 *Wijze van uitvoering*

Een deel van het retentiegebied (ook wel waterberging genoemd) zal permanent nat zijn. Het deel van het retentiegebied met kruidenrijk grasland zal functioneren als 'droge waterberging'. In de normale situatie staat hier geen water. Als gevolg van heftige neerslag, zal ook de droge waterberging worden gevuld. Zie hiervoor de inrichtingsschetsen in figuur 3 en 4 en de impressies in bijlage 1.



Figuur 3 Inrichtingsschets bovenaanzicht

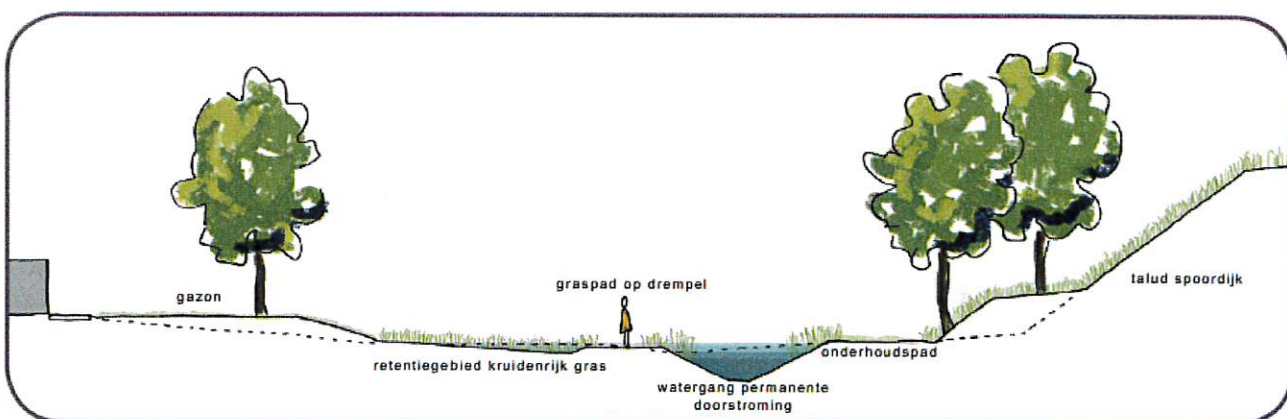

Figuur 4 Inrichtingsschets zijaanzicht

### 1.3 Te treffen voorzieningen

Zie ook paragraaf 1.2. 'Wijze van uitvoering'.

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Dit verzoek moet worden ingediend bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

## 2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

#### *2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste*

Met de herinrichting van het perceel wordt de wateropgave voor de kern van Waardenburg opgelost waarmee de kans op wateroverlast in de dorpskern wordt verkleind.

#### *2b. Chemische en ecologische kwaliteit*

Het plangebied bestaat uit een ruig, voedselrijk moerasbos. In het noorden is een nat gedeelte met ondiep water met een dikke blad/sliblaag en kroos. Door het hele gebied groeien ruigteplanten (m.n. brandnetel, bosbraam, kleeftkruid).

Door het perceel opnieuw in te richten, waarbij de ruigteplanten worden verwijderd en een deel van de bomen, wordt de mogelijkheid tot het bergen van water verbeterd.

In de huidige situatie is er geen doorstroming. Het creëren van een open verbinding met de A-watgang kan een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat het water in het plangebied nu al voedselrijk is en dat inlaten van water uit de A-watgang de waterkwaliteit niet verslechtert en mogelijk zelfs verbetert.

#### *2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem*

Het project heeft geen gevolgen voor de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.

#### *Conclusie*

Uitvoering van dit projectplan vermindert de kans op wateroverlast voor de kern Waardenburg. Het plan heeft geen negatief effect (naar verwachting positief) op de chemische en ecologische kwaliteit.

### **3. Uitvoerbaarheid**

#### *3a. Planologische inpassing*

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan 'Kern Waardenburg' vastgesteld. Het project past binnen het geldende bestemmingsplan (groen en natuur).

Voor de uitvoering van het project zijn een omgevingsvergunning en uitvoeringsvergunning aangevraagd (in behandeling).

#### *3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten*

Door uitvoering van het projectplan zal de Legger aangepast moeten worden. Waterschap Rivierenland actualiseert jaarlijks de legger van de wateren. Deze wijziging gaat mee in de volgende jaarlijkse leggerwijziging. Voordat het bestuur een besluit neemt over de leggerwijzigingen, kan iedereen reageren op de wijzigingen. Dit kan door een inspraakreactie in te dienen.

In de huidige Legger Wateren van waterschap Rivierenland heeft het water in het plangebied een C-status. Vanwege het belang van de waterberging, krijgt deze in de nieuwe situatie een B-status.

### *3c. Planning*

Op 27 augustus 2018 heeft een inloopavond plaatsgevonden waarbij de Avri, waterschap Rivierenland en inwoners met elkaar in gesprek zijn geweest over het ontwerp.

Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in het najaar van 2018 worden uitgevoerd.

## **4. Beheer en onderhoud**

Het perceel WDB01 W 727 is in eigendom van waterschap Rivierenland. Vanwege het groene karakter van het gebied en de ligging in de kern, gaat de gemeente het onderhoud (inclusief het water) uitvoeren.


## **5. Procedure**

Het projectplan dient op grond van de Inspraakverordening van het waterschap te worden voorbereid via de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat eerst een ontwerp ter inzage moet worden gelegd waarop zienswijzen kunnen worden gegeven. Na ontvangst van de zienswijzen wordt het projectplan definitief vastgesteld en wederom bekendgemaakt.

## **6. Contactpersoon**

Mevrouw E. Damen treedt namens Waterschap Rivierenland op als projectleider. Zij is bereikbaar via 0344-64 90 90 en via e-mail [e.damen@wsrl.nl](mailto:e.damen@wsrl.nl).

Hoogachtend,  
namens het college van dijkgraaf en heemraden  
van Waterschap Rivierenland,



ing. M. Wierda MPM  
hoofd van de afdeling Omgeving en Communicatie

**Zienswijze**



Belanghebbenden en ingezetenen van het waterschap kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit ontwerp-besluit hun zienswijze over dit ontwerp kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de mevrouw E. Damen via telefoonnummer 0344-64 90 90.

## Bijlage 1 Schetsontwerp



## Groen Retentiegebied • Waardenburg

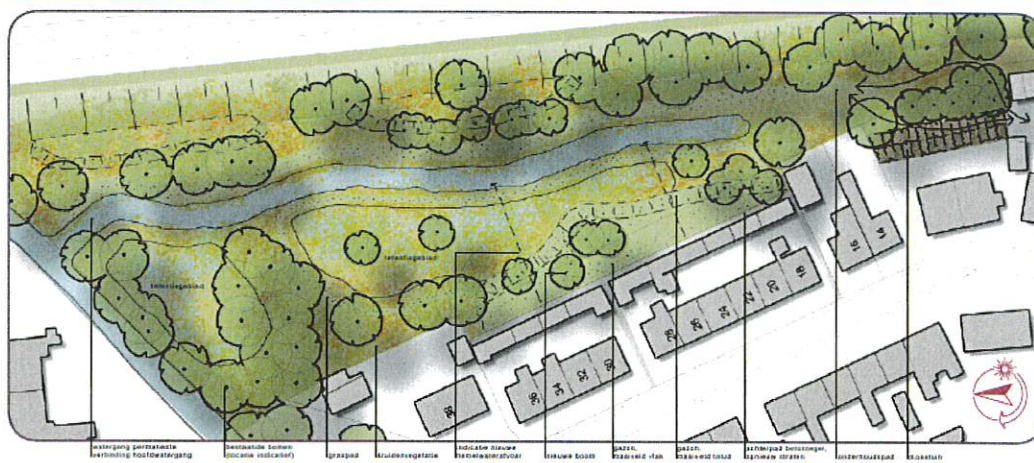

© Donkergees 2018. Aan dit schetsontwerp kunnen geen rechten worden ontleend, wijzigingen voorbehouden

Klantnr: 903960  
Datum: 17-08-2018

Projectnr: 180212  
Gutierrez CyG

Tekeningnr: 180212\_SO\_PAN\_01

