

# Projectplan

## *Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud*

**Naam: 346698 Schijndel, Gemonde, Dennensteeg, DO242: plaatsen schotbalkenstuw**

### **1. Doel**

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten. Zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Schijndel (Gemonde) ter hoogte van Dennensteeg, ligt watergang DO242. In het traject Vogelenzang - Gestelseweg zijn momenteel geen mogelijkheden om water te reguleren en te conserveren. Waterschap De Dommel is voornemens om een schotbalkenstuw te plaatsen om water langer vast te houden met als doel water te conserveren.

### **2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)**

Ter hoogte van de bestaande duiker met B.O.B. +/- 4,55 +NAP, Ø 500 mm zijn wij voornemens een schotbalkenstuw te plaatsen. Bij de bepaling van de exacte locatie voor de stuw is de hoogteligging van de watergang leidend geweest. Op deze locatie kunnen we efficiënt water opstuwen en haarvaten voeden. De voorgenomen locatie is inzichtelijk gemaakt middels bijgevoegd kaartje. De overstorthoogte van het water is handmatig regelbaar middels schotbalken. Voor de instelling van het waterniveau hanteren we een drooglegging van +/- 50 cm -MV. Voor de stuwinstelling houden we naast de drooglegging rekening met wensen van de omgeving, aangelanden en groeiseizoenen.

### **3. Effecten van het plan**

Door het vasthouden van water in watergangen wordt het water ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Door het infiltreren in de bodem wordt de grondwaterstand op een hoger niveau gehouden. Door het vasthouden van een hoger grondwaterpeil hoeft er minder snel beregend te worden en kan verdroging van percelen worden tegengegaan.

### **4. Omgevingsrecht**

N.v.t.


### **5. Rechtsmiddelen**

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.

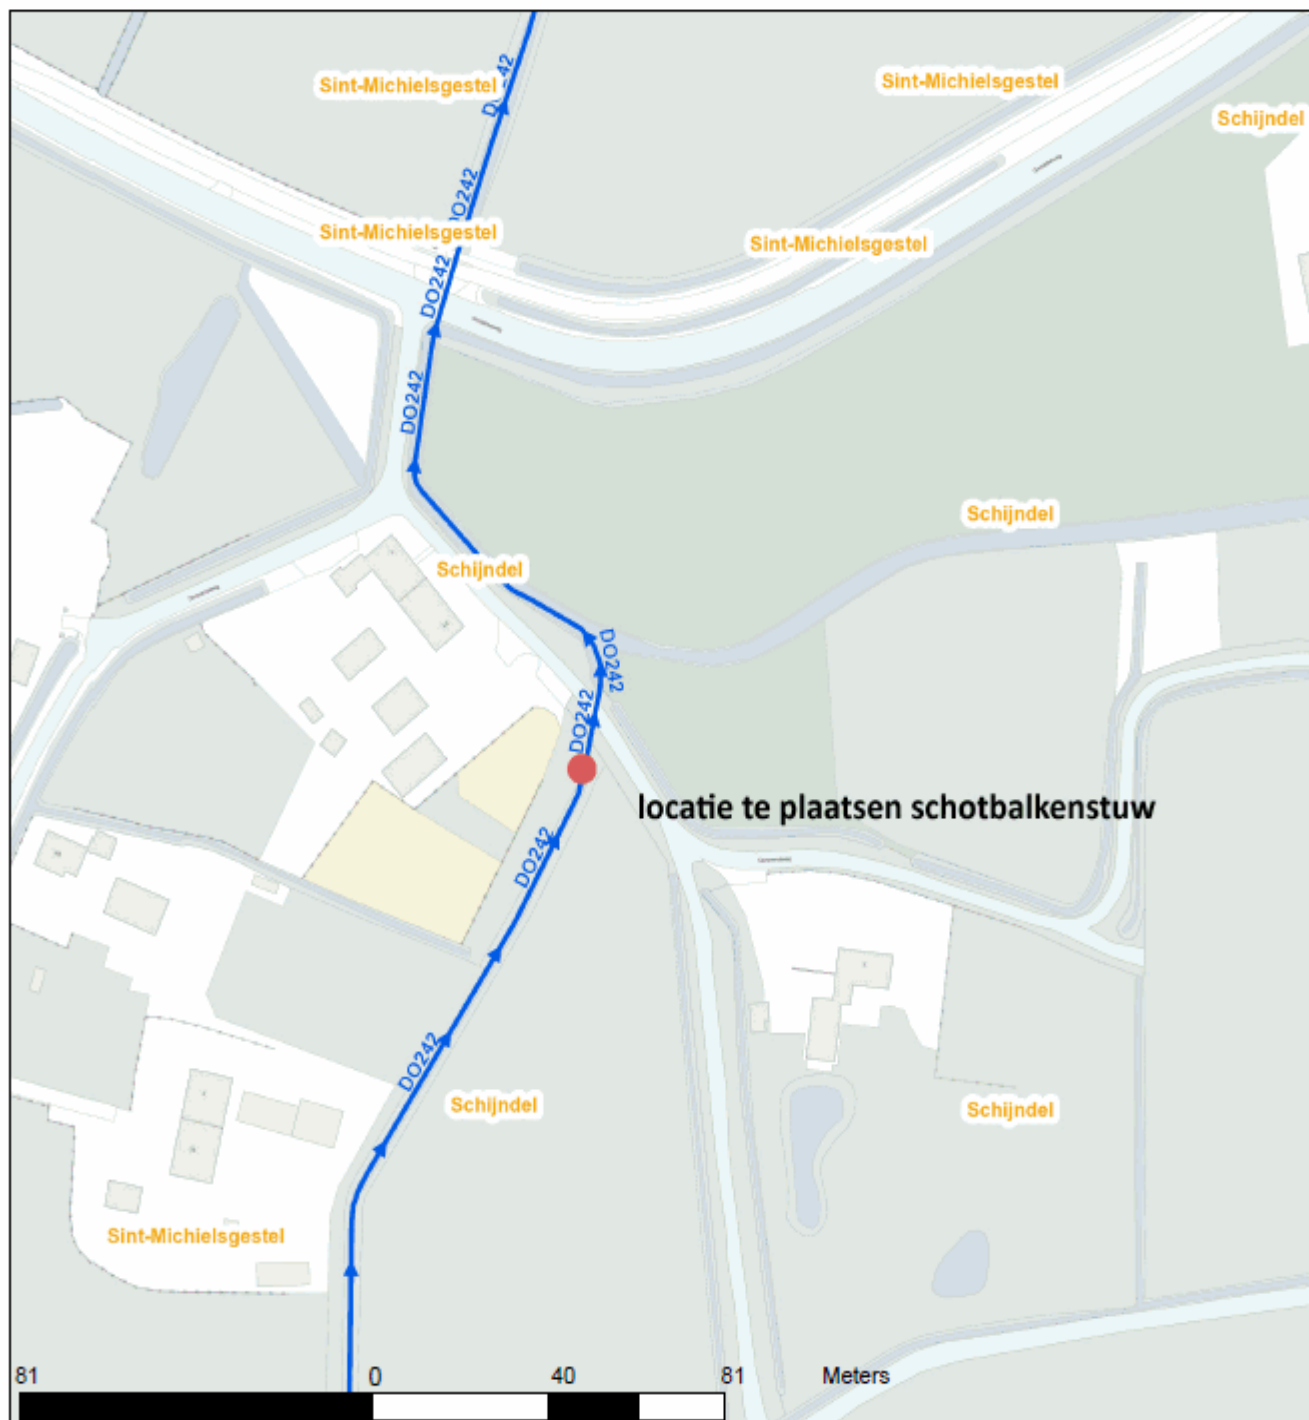

## Legenda

- Waterschapsgrens
- Stuw
  - vaste stuw met meerdere doorstroomopeningen
  - vaste stuw
  - stuw met schuif
  - stuw met klep
  - segmentstuw
  - schotbalkstuw
  - nog in te winnen
  - gecombineerde stuw
- ★ Afsluitmiddel - stuw A-wateren

## Watergang

DO242

*Nieuw aan te brengen  
schotbalkenstuw*

Auteur: WDD

Datum: 03-04-2019

