

Werkplan graven in kern en beschermingszone dijklichaam

T 2018802 – Domineeslaantje te Breukelen

Opdrachtgever André Winkel Sloopwerken B.V.



Documenthistorie

Versie	Versiedatum	Omschrijving
1.0	09-04-2019	Concept voor AKKOORD opdrachtgever

Verificatie eisen

Eisnummer	Referentie	Omschrijving

Opdrachtgever André Winkel Sloopwerken B.V.

Contract/besteknummer

Status document Concept

Sjabloonnummer SJA-004-03 dd 06-12-2016-v2.0

	Naam	Functie	Paraaf	Datum
Opgesteld	Bart de Wolff	Werkvoorbereider		09-04-2019

INHOUD

1	INLEIDING	4
2	PROJECTGEGEVENS	4
2.1	Omschrijving werkzaamheden	4
2.2	Adres/ligging van het werk	4
2.3	Documenten	4
	2.3.1 Ontwerpdocumenten	4
	2.3.2 Relevante tekeningen	4
	2.3.3 Bepalingen en vergunningen	4
3	WERKZAAMHEDEN	5
3.1	Inkoop	5
3.2	Vorbereidende werkzaamheden	5
3.3	Tijdelijke werkzaamheden	5
3.4	Werkomschrijving	5
	3.4.1 Bodemsanering tot bodemkwaliteit achtergrondwaarde, of leeflaagconstructie.	5
	3.4.2 Slopen voormalige school t.b.v. herontwikkeling van de locatie.	5
4	KEURING EN BORGING	5
4.1	Kwaliteitsregistraties	5

BIJLAGEN

1. Overzichtstekening bodemsanering
2. Overzichtstekening HD gasleiding
3. Overzichtstekening toekomstige situatie
4. Principeprofielen toekomstige situatie
5. Inmeting huidig maaiveld
6. Fundering voormalige school

1 INLEIDING

Dit werkplan beschrijft algemeen de realisatie van een bodemsanering in de kern en belemmerende zone van een dijklichaam op locatie Domineeslaantje te Breukelen.

De werkzaamheden die in dit werkplan worden beschreven, hebben betrekking op de volgende werkzaamheden, objecten en activiteiten:

- Ontgraven en aanvullen bodemsanering;
- Werkzaamheden in een waterkering en of beschermingszone;

2 PROJECTGEGEVENS

2.1 Omschrijving werkzaamheden

In opdracht van André Winkel Sloopwerken b.v. worden diverse werkzaamheden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Markus B.V. (Markus).

Een omschrijving van de werkzaamheden is opgenomen in hoofdstuk 3.

2.2 Adres/ligging van het werk

De werkzaamheden vinden plaats aan de Domineeslaantje in de gemeente Breukelen.

2.3 Documenten

Voor de in dit werkplan beschreven werkzaamheden zijn de volgende documenten van toepassing:

2.3.1 Ontwerpdocumenten

Voor de in dit werkplan beschreven werkzaamheden zijn de volgende ontwerpdocumenten van toepassing:

- Schetsontwerp Domineeslaantje VanderHelm d.d. 11-06-2018;
- Bus-melding Immobiel (Infrasoil).

2.3.2 Relevante tekeningen

Voor de in dit werkplan beschreven werkzaamheden zijn de volgende tekeningen specifiek van toepassing:

- Hortense Kwartier te Breukelen kenmerk: 1703546A00-004 DO d.d. 31-10-2018;
- Hortense Kwartier te Breukelen kenmerk: 1703546A00-006 DO d.d. 31-10-2018;
- Gasbedrijf Centraal-Nederland kenmerk: Zink-8183;
- Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht kenmerk: IB20150093_19 d.d. 24-04-2015;
- Overzichtstekening saneringslocatie kenmerk: bijlage 2 Bus-melding Immobiel;
- Inmeting bestaande situatie;
- Overzichtstekening toekomstige situatie.

2.3.3 Bepalingen en vergunningen

De navolgende vergunningsbepalingen zijn van toepassing op dit werkplan:

- Vergunning t.b.v. graafwerkzaamheden in een dijklichaam (kern en beschermingszone);
- Beschikking op een Bus-melding Immobiel t.b.v. de voorgenomen bodemsanering;
- Afstemming Stedin i.v.m. aanwezige HD-gasleiding.

3 WERKZAAMHEDEN

3.1 Inkoop

Het projectteam is belast met de aankoop en juiste levering van de betreffende materialen. De inkoop en ingangscntroles verlopen respectievelijk volgens de procedure PRO-101: 'Inkoop'.

3.2 Voorbereidende werkzaamheden

De volgende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden alvorens de in dit werkplan beschreven activiteiten gestart kunnen worden:

- Klic-melding verrichten;
- Melding BBK schone grond >50 m³;
- Het beleggen van een kick-off meeting;
- Maken van een risico-analyse;
- Maken van een V&G-plan en saneringsdraaiboek;
- Verkrijgen van de benodigde vergunningen.

3.3 Tijdelijke werkzaamheden

De volgende uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het werk(proces) en het te maken (deel)product zijn van tijdelijke aard:

- Inrit werkterrein;
- Rijplatenbaan;
- Coördinatie nuts;
- Afzetting van de locatie conform de BRL 7001.

3.4 Werkomschrijving

3.4.1 Bodemsanering tot bodemkwaliteit achtergrondwaarde, of leeflaagconstructie.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de bodemsanering:

- Ontgraven sterk verontreinigde grond, incl. graven van proefsleuven;
- Afvoer sterk verontreinigde grond met vrachtwagens;
- Aanvoer zand en klei met vrachtwagens (klasse achtergrondwaarde);
- Verwerken zand en klei (klei erosieklasse 1);
- Verdichten zand.

3.4.2 Slopen voormalige school t.b.v. herontwikkeling van de locatie.


- Slopen pand;
- Slopen fundering;
- Afbreken heipalen op circa 2 m-mv;
- Inmeten afgebroken heipalen t.b.v. vastlegging;
- Aanleveren vastlegging aan stichting AGV;

4 KEURING EN BORGING

4.1 Kwaliteitsregistraties


De kwaliteitsregistraties worden vastgelegd in het projectdossier door de projectbegeleider. De te gebruiken formulieren voor kwaliteitsregistraties zijn opgenomen in het KVGGM-systeem.

BIJLAGE 2 Details HD gasleiding

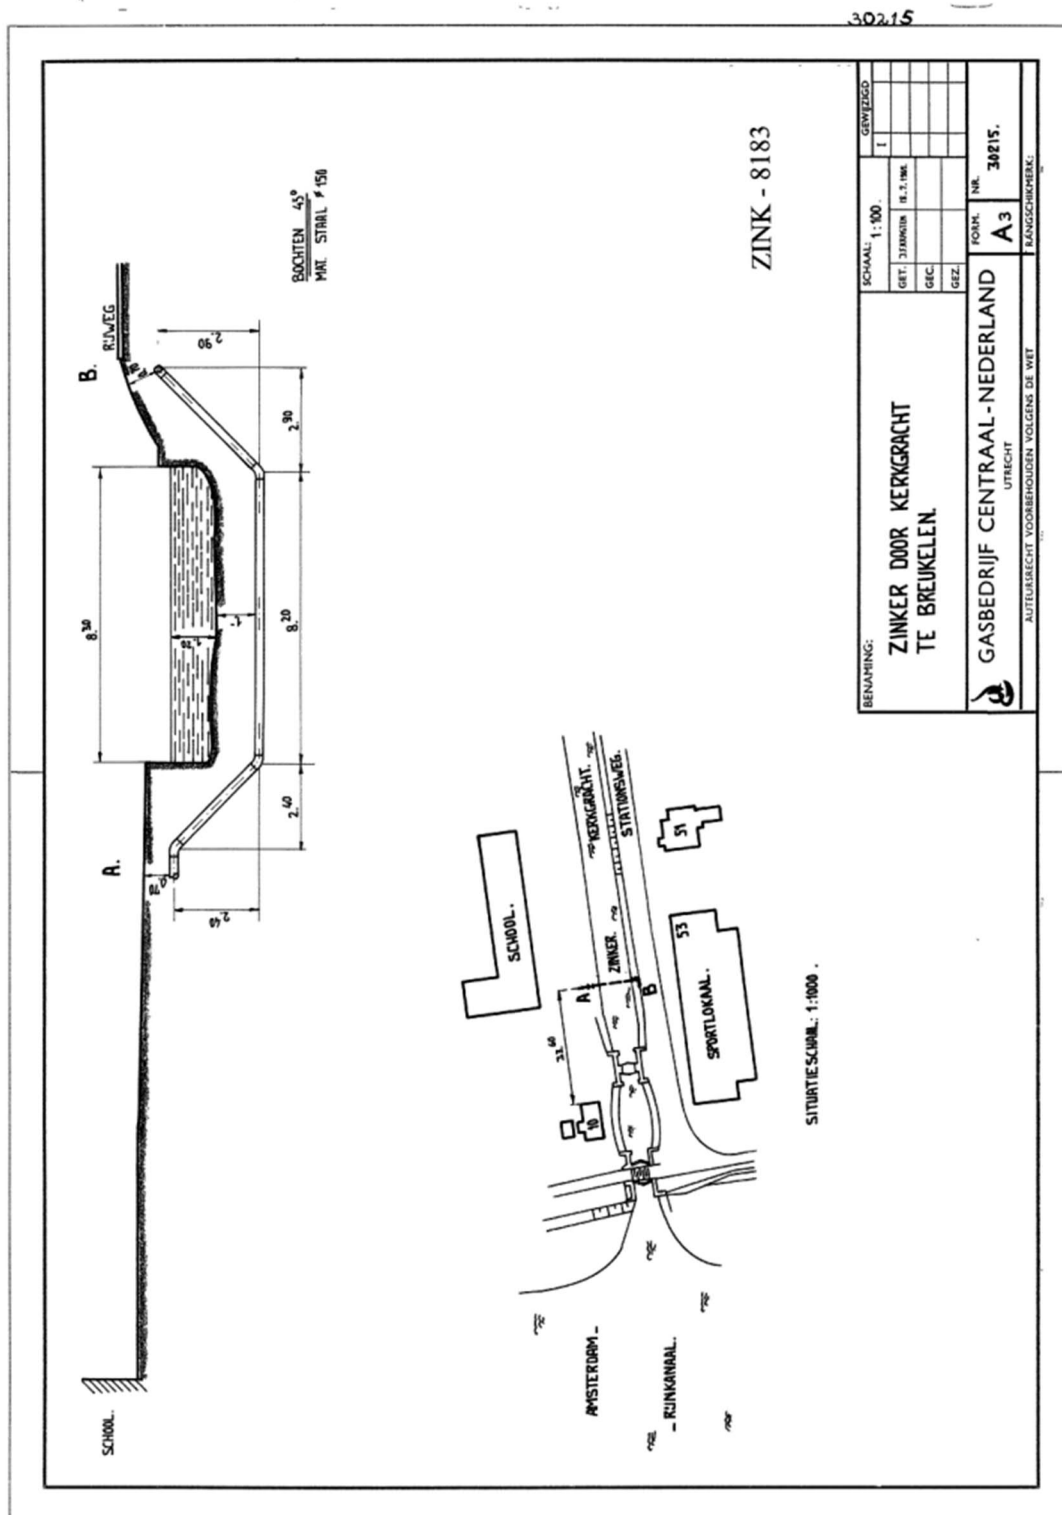

[illegible]

BIJLAGE 4 Profielen toekomstige situatie

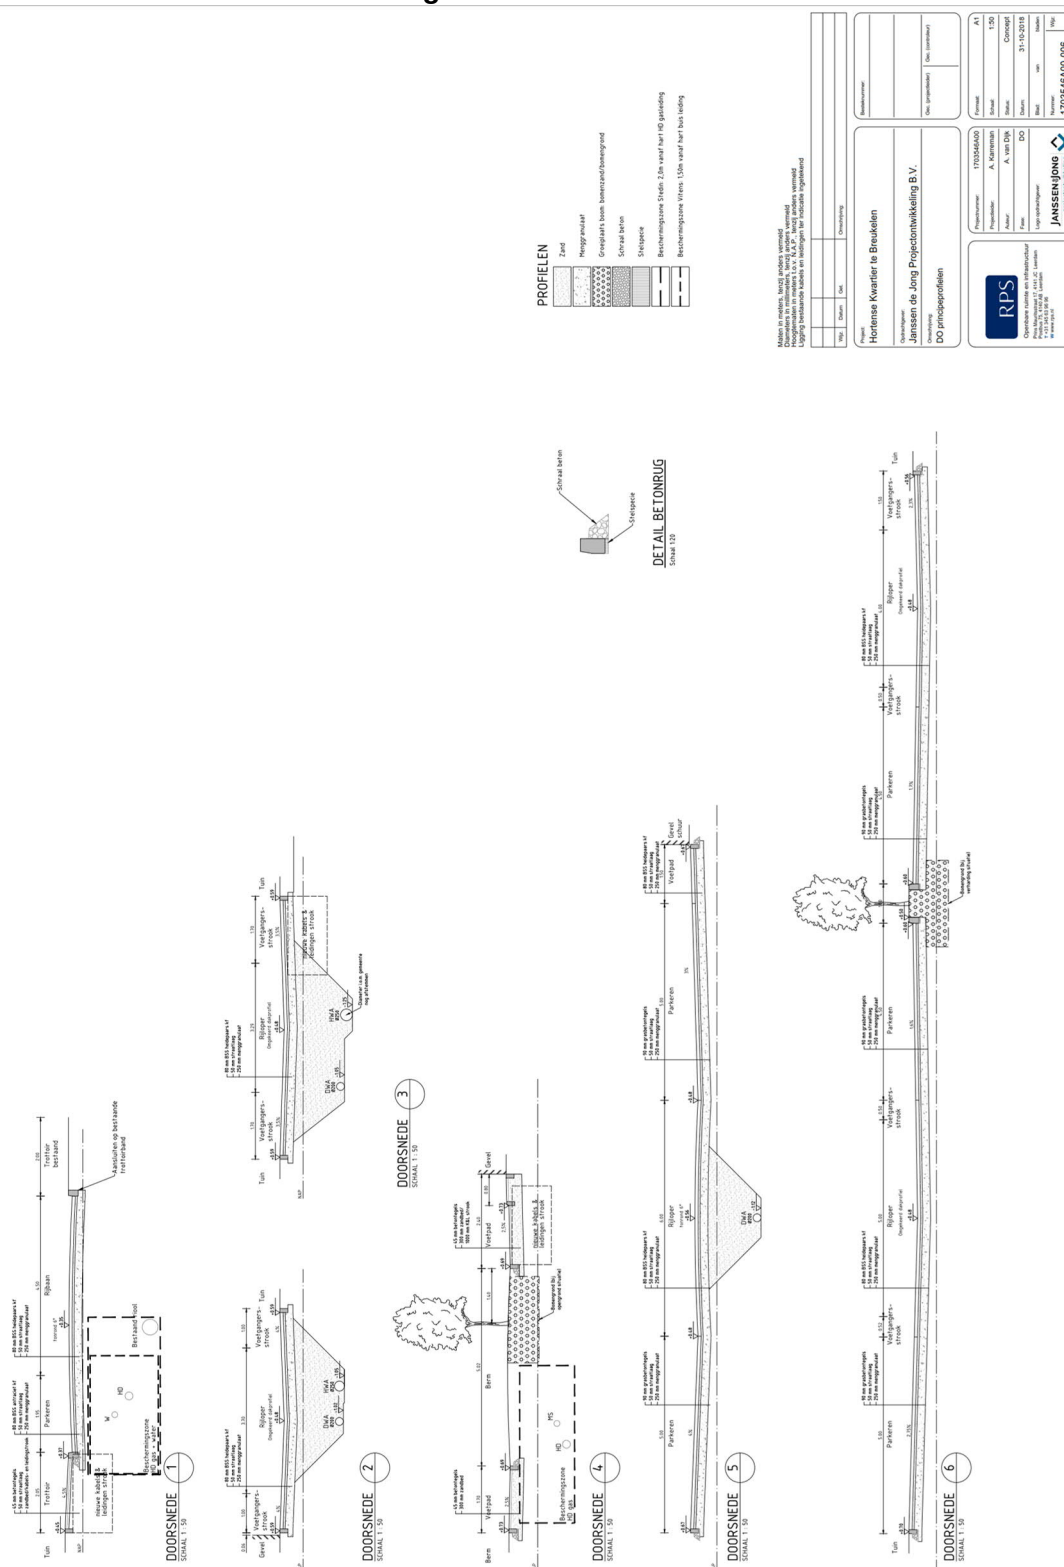

[illegible]

BIJLAGE 6 Fundering voormalig schoolgebouw

