


**PROJECTPLAN:
VERBREIDING GROOTDIEP + AANLEG VISPASSAGES**

Besluit aanleg of wijziging van een Waterstaatswerk: artikel 5.4 Waterwet, in combinatie met het Leggerbesluit:

- artikel 5.1 Waterwet – vastlegging ligging, afmeting, vorm en constructie van de waterstaatswerken
- artikel 78 lid 2 Waterschapswet – toewijzing onderhoud waterstaatswerken

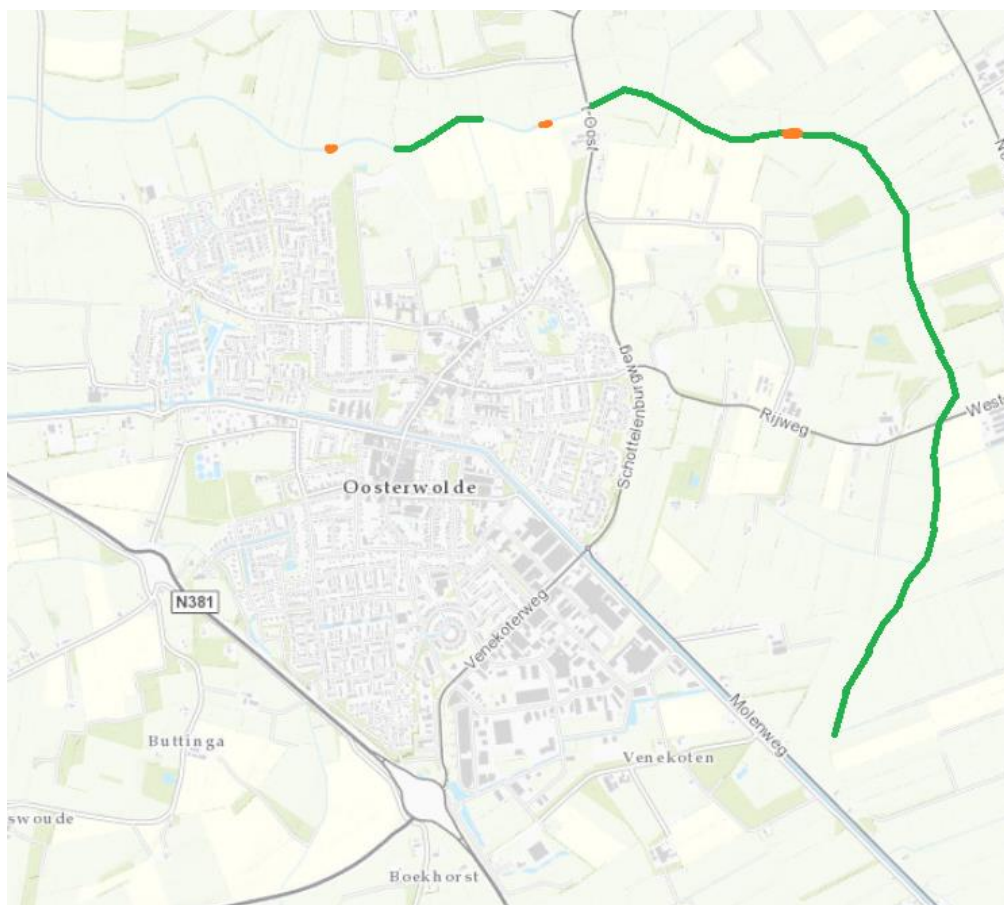

Datum:	23 april 2019
Cluster:	Cluster Projecten
OW nummer:	OW.22704
Projectleider:	Ronald van der Ploeg

Inhoud

1. Aanleiding en doel besluitvorming	3
2. Juridische status Projectplan	4
3. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming	4
4. Verbreding Grootdiep en vervanging stuwen door vispassages (de te wijzigen waterstaatswerken) en verplaatsing onderhoudsdammen - besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet	7
A. Te wijzigen waterstaatswerken	7
B. Aan te leggen waterstaatswerken / vispassages	7
C. Te verwijderen waterstaatswerken / stuwen	8
5. Legger – toewijzing van het onderhoud	8
A. Aan te leggen waterstaatswerken - vispassages	8
B. Te wijzigen waterstaatswerken – verbreding Grootdiep en onderhoudsdammen	8
6. Motivatie, onderbouwing van het besluit	9
7. Eigendomsverwerving / benodigde zakelijke rechten	9
8. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan	10
8.1. Geïntariseerde nadelige gevolgen:	10
8.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt	10
8.3. Financieel nadeel	10
9. Uitvoering, planning van het werk	13
10. Procedure (rechtsbescherming)	14
Bijlage 1 – Tekening, Ligging waterstaatswerken	15
Bijlage 2 – Tekeningen, Overzichten Kadastrale Percelen	15
Bijlage 3 – Tekeningen, Profielen Kadastrale Percelen	15
Bijlage 4 – Tekening, Vispassage 's	15
Bijlage 5 – Document, KRW Factsheet	15

1. Aanleiding en doel besluitvorming

Op basis van het [Waterbeheerplan 2016-2021](#), vastgesteld door algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân op 19 april 2016, worden de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken aangelegd, gewijzigd of verwijderd.

De wijziging betreft het verbreden van een gedeelte van het Grootdiep, de aanleg van een drietal vispassages en het verwijderen van een drietal stuwen. Tevens worden een aantal onderhoudsdammen (inclusief inliggende duikers), als gevolg van de verbreding, verplaatst. Hiervoor stelt het waterschap een Projectplan vast. De verbreding van het Grootdiep en aanleg van vispassages vinden plaats om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Wetterskip Fryslân heeft zich in het Waterbeheerplan van 2016 – 2021 vastgelegd op de uitvoering van een groot aantal inrichtingsmaatregelen om de ecologische waterkwaliteit binnen haar beheergebied te verbeteren en de waterbergingsmogelijkheden te vergroten.

In het Waterbeheerplan 2016-2021, de [KRW beslisnota planperiode 2016 -2021](#), en KRW factsheets zijn de stand van zaken, de voortgang en de nog uit te voeren maatregelen expliciet gemaakt. De KRW beslisnota en de KRW-factsheets zijn door het algemeen bestuur vastgesteld op 29 september 2015.

De KRW-factsheets zijn opgesteld in een format (tabellen) dat landelijk wordt gebruikt. Ze bevatten informatie per waterlichaam (o.a. begrenzing, ecologische en chemische toestand en doelen, maatregelen en onderbouwing). De factsheets vormen de basis voor de Stroomgebiedsbeheerplannen die door het Rijk worden opgesteld. De in de factsheets beschreven uit te voeren maatregelen zijn geen vrijblijvende inrichtingsmaatregelen; ze worden aan de EU gerapporteerd in het kader van de uitvoering van de Kader Richtlijn Water (KRW). Uitvoering van deze maatregelen is niet vrijblijvend.

De KRW-opgave voor het verbeteren van de huidige ecologische waterkwaliteit van het Grootdiep wordt vooral gezocht in maatregelen die te maken hebben met inrichting en beheer.

KRW maatregelen zijn aanleg van natuurvriendelijke oevers, inundatiezones en aanpassen van de wijze waarop het onderhoud van de wateren plaatsvindt. Deze maatregelen kunnen worden gecombineerd met het vergroten van de waterberging in boezem en/of deelsystemen, zoals beschreven in het plan Waterbeheer 21e eeuw.

Hoofddoelstelling

- Het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van het Grootdiep;
- Het opheffen van de belemmeringen voor de vrije vismigratie in het Grootdiep.

Nevendoelstellingen

- Uitbreiding bergingsmogelijkheden.

2. Juridische status Projectplan

Definitie

Een Projectplan is een besluit dat een waterschap (als waterbeheerder) vaststelt als dat waterschap waterstaatswerken (1) aanlegt of wijzigt. Het besluit vindt plaats op basis van artikel 5.4 Waterwet (2).

Legger en Algemene wet bestuursrecht

In dit document (Projectplan) is ook het besluit opgenomen voor het vaststellen van de Legger (3), voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken. Deze besluitvorming vindt zijn basis in artikel 5.1 Waterwet (vastlegging waterstaatswerken qua: ligging, afmeting, vorm, constructie) en artikel 78 lid 2 Waterschapswet (toewijzing van de onderhoudsplicht voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken). Het Projectplan is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het besluit vindt een belangenafweging plaats en wordt rechtsbescherming geboden aan belanghebbenden.

Schadebesluiten

In het Projectplan wordt ook beschreven welke nadelige gevolgen rechthebbenden (eigenaren, pachters) en eventueel andere belanghebbenden ondervinden van de besluitvorming. De afhandeling van schade wordt onder punt 8 beschreven. Tegen schadebesluiten die op grond van het Projectplan worden vastgesteld, staat aparte rechtsbescherming open.

Voor de besluitvorming (Projectplan en Legger) is het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bevoegd. Dit is geregeld in het delegatiebesluit Wetterskip Fryslân d.d. 6 juli 2010.

3. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming

Het Projectplan is als volgt voorbereid:

De aanpak van de KRW-opgave in het Grootdiep heeft een lange voorgeschiedenis. De KRW-opgave is voor het eerst door het waterschap uitgewerkt in het watergebiedsplan Appelscha en omgeving. Dit watergebiedsplan is opgesteld met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen in het gebied en er zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor de streek in september 2011 en maart 2012. Het plan heeft eind 2012 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de inspraakreacties heeft het waterschapsbestuur besloten om vaststelling van het plan aan te houden.

¹ Artikel 1.1 Waterwet: waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

² Artikel 5.4 Waterwet:

1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.
2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

³ De Legger is een besluit van een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangegeven wordt wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat. Verder wordt in de legger vastgelegd, de ligging, vorm, constructie en afmeting van het waterstaatswerk.

Uitvoerig is daarna met de ABO (LTO Noord afdeling Ooststellingwerf) gesproken hoe het plan vlot te trekken. Afgesproken is om een werkwijze te ontwikkelen waarmee zowel de wateropgaven als de knelpunten in de landbouw zijn op te lossen en daarvoor in deelgebieden samen te werken. Het plan van aanpak hiervoor is door de ABO gemaakt. Hiernaast is het watergebiedsplan aangepast. Zo is de beschrijving van de KRW-opgave voor het Grootdiep beter afgestemd op de nieuwe werkwijze voor uitvoering van het watergebiedsplan. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds de wateropgave (een luwe onderhoudsvrije strook in het Grootdiep) en anderzijds voorbeelden van maatregelen om die wateropgave te realiseren. De maatregelen kunnen dan worden bepaald en uitgewerkt in de deelgebieden met de belanghebbenden. Met deze wijzigingen heeft het waterschapsbestuur het watergebiedsplan op 15 oktober 2013 vastgesteld. In november 2013 was het plan van aanpak van de ABO klaar voor de 'pilot watergebiedsplan Appelscha' (zie www.pilotwatergebiedsplan.nl) waarin het waterschap samenwerkt met de ABO (de LTO-afdeling Ooststellingwerf) aan de gebiedsopgaven in het gebied van watergebiedsplan Appelscha.

Pilot watergebiedsplan Appelscha

Er is gewerkt in drie deelgebieden (Grootdiep, Boven-Tjonger en De Harken) met als doel om een gezamenlijk inrichtingsplan op te stellen voor elk deelgebied. In het Grootdiep is de KRW-opgave de belangrijkste opgave voor Wetterskip Fryslân. Om de belangen van de grondeigenaren bij het waterbeheer te inventariseren zijn eind 2014 alle eigenaren individueel geïnterviewd wat een lijst opleverde met 65 'waterknelpunten' die de landbouw in het gebied ervaart. Begin 2015 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen voor de KRW-opgave en de waterknelpunten besproken met de grondeigenaren met de volgende conclusies:

- De waterknelpunten kunnen separaat met de individuele grondeigenaren worden uitwerkt omdat het totaal aan knelpunten geen aanleiding geeft voor een integraal plan voor het hele stroomgebied van het Grootdiep;
- Het waterschap gaat na of de KRW-opgave is te realiseren door alleen het onderhoud van het Grootdiep aan te passen en de waterloop niet te verbreden zodat dit geen landbouwgrond kost.

De maatregelen voor de door de streek aangedragen waterknelpunten zijn in overleg met de grondeigenaren bepaald en uitgevoerd, de laatste maatregelen in 2017.

Alternatieve maatregel

Voor de KRW-opgave heeft het waterschap in de zomer van 2015 aan de grondeigenaren voorgesteld om met een gezamenlijke proef te onderzoeken of de KRW-opgave is te realiseren door alleen het onderhoud van het Grootdiep aan te passen en niet te verbreden. Dit is gematigd positief ontvangen door de grondeigenaren. Het waterschap heeft hierna de opzet van de proef uitgewerkt en de streek hierover geïnformeerd (zie www.pilotwatergebiedsplan.nl/de-drie-gebieden/grootdiep/). Op 6 juli 2016 is een bijeenkomst voor de grondeigenaren georganiseerd om afspraken te maken over de uitvoering van de proef en de risico's te bespreken. De opkomst was echter dermate laag dat er is geconcludeerd dat er te weinig draagvlak is. Uit gesprekken met een aantal grondeigenaren bleek ook dat enkele eigenaren wel willen meewerken aan verbreding van het Grootdiep. Daarom is besloten om de proef niet uit te voeren en in te zetten op verbreding van de watergang in combinatie met aangepast onderhoud. Verbreding heeft ook als voordeel dat het gebied rondom het Grootdiep minder gevoelig wordt voor wateroverlast waardoor beter rekening gehouden kan worden met klimaatverandering. De grondeigenaren zijn eind november 2016 met een brief geïnformeerd dat de proef niet doorgaat en dat het waterschap wil inzetten op verbreding van het Grootdiep voor realisatie van KRW-opgave.

In 2017 is al 2,1 kilometer Grootdiep verbreed. De ligging van die verbreding staat vermeld op Bijlage 1 Kaart, Ligging waterstaatswerken. Voor de verbreding van de overige percelen langs het

Grootdiep hebben voorafgaand aan de technische inventarisatiewerkzaamheden in 2017 en begin 2018 kennismakingsgesprekken plaatsgevonden tussen het uitvoeringsteam van het waterschap en grondeigenaren en –pachters op wiens percelen de voorgenomen verbreding geprojecteerd staat. Tijdens de genoemde gesprekken is gesproken over de nut en de noodzaak van de verbreding.

Nadat de technische inventarisatiewerkzaamheden gereed zijn gekomen, zijn de eigenaren in een gezamenlijke bijeenkomst op 16 oktober 2018 geïnformeerd over de uitkomsten. Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over eventuele alternatieven. Het Wetterskip heeft een verzoek aan de eigenaren/pachters gedaan om mogelijke niet eerder genoemde alternatieven voor 1 november 2018 kenbaar te maken. Dit verzoek heeft geen nieuwe alternatieven naar voren gebracht.

In de periode na de informatiebijeenkomst zijn de eigenaren en pachters individueel benaderd en hebben er gesprekken plaatsgevonden. Met de eigenaren en pachters is individueel gesproken om het nadelige gevolg, de vermindering van de gebruiksoppervlakte, financieel te vergoeden. Op basis hiervan zijn de gebruiksovereenkomsten met de eigenaren en pachters zijn afgesloten (zie ook 8.3).

Het waterschap heeft in dit besluit gekozen voor de onder punt 4 genoemde aanleg, wijziging waterstaatswerken, omdat:

- De KRW factsheets hebben aangetoond dat verbreding buiten het leggerprofiel nodig is voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en te voldoen aan de Kader Richtlijn Water. Het leggerprofiel met betrekking tot de water aan- en afvoer wijzigt niet.
- Op basis van de uitkomsten van de persoonlijke gesprekken, de technische haalbaarheid, de nadelige gevolgen en de financiële haalbaarheid heeft het waterschap bepaald dat er geen voorkeurszijde voor de verbreding is. Op basis het maatschappelijke aspect, het gelijk verdelen van de lusten en de lasten, is als uitgangspunt bepaald dat de verbreding van het Grootdiep gerealiseerd word over de beide oevers.

Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zijn de nadelige gevolgen van dit besluit geïnventariseerd. Onder punt 8 wordt uiteengezet wat deze gevolgen zijn en hoe die worden voorkomen of beperkt. E.e.a. conform artikel 5.4 lid 2 Waterwet. Zie voor de tekst van genoemd artikel, noot 2.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb ⁽⁴⁾).

⁴ Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

4. Verbreding Grootdiep en vervanging stuwen door vispassages (de te wijzigen waterstaatswerken) en verplaatsing onderhoudsdammen - besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet

De volgende waterstaatswerken worden gewijzigd, met de volgende specificaties (Leggerwaarden). De hier genoemde Leggerwaarden worden opgenomen in de Legger (artikel 5.1 Waterwet ⁵). Voor de toewijzing van het onderhoud van deze waterstaatswerken wordt verwezen naar punt 5.

Op de bijgevoegde kaart wordt de ligging van de onderstaande waterstaatswerken weergegeven na realisatie van het werk (bijlage 1)

A. Te wijzigen waterstaatswerken

Grootdiep, gelegen tussen de Boven-Tjonger en de Molenweg te Oosterwolde.

- Het leggerprofiel van het Grootdiep wordt met 2 meter verbreed.
- Het verplaatsen van bestaande onderhoudsdammen inclusief de aanwezige duiker. De duiker in de te verplaatste onderhoudsdam heeft een lengte van 10 meter op de waterlijn en een inwendige diameter van 400 mm.

Voor bestaande en nieuwe afmetingen van het Grootdiep wordt verwezen naar Bijlage 2 en Bijlage 3. Voor de locaties van de te verplaatsen onderhoudsdammen wordt verwezen naar Bijlage 1.

B. Aan te leggen waterstaatswerken / vispassages

In het Grootdiep worden vijf vispassages aangelegd (van west naar oost)

- Vispassage Wandelbos A (leggercode KVP0100325)
 - Vaste stuw, uitgevoerd als een bekkentrap met 6 treden .
 - De stuw heeft een V- vormige kruin van 7,20 m breed.
 - De stuw (onderpand) heeft een kruinhoogte van NAP 2.70+
 - De stuw (bovenpand) heeft een kruinhoogte van NAP 3.08+
- Vispassage Wandelbos B (leggercode KVP0100326)
 - Vaste stuw, uitgevoerd als een bekkentrap met 4 treden .
 - De stuw heeft een V- vormige kruin van 7,20 m breed.
 - De stuw (onderpand) heeft een kruinhoogte van NAP 3.15+
 - De stuw (bovenpand) heeft een kruinhoogte van NAP 3.38+
- Vispassage Wepertil A (leggercode KVP0100327)
 - Vaste stuw, uitgevoerd als een bekkentrap met 6 treden .
 - De stuw heeft een V- vormige kruin van 7,20 m breed.
 - De stuw (onderpand) heeft een kruinhoogte van NAP 3.45+
 - De stuw (bovenpand) heeft een kruinhoogte van NAP 3.82+
- Vispassage Wepertil B (leggercode KVP0100328)
 - Vaste stuw, uitgevoerd als een bekkentrap met 3 treden .
 - De stuw heeft een V- vormige kruin van 7,20 m breed.
 - De stuw (onderpand) heeft een kruinhoogte van NAP 3.90+
 - De stuw (bovenpand) heeft een kruinhoogte van NAP 4.05+

⁵ Artikel 5.1 Waterwet (Legger – Waterwet): De Beheerder (waterschap) draagt zorg voor de vaststelling van een Legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar **Ligging, Vorm, Afmeting en Constructie** moeten voldoen. Van de Legger maakt deel uit een overzichtskaart waarop de Ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven.

- Vispassage Klazinaweg (leggercode KVPo100329)
 - Vaste stuw, uitgevoerd als een bekkentrap met 4 treden .
 - De stuw heeft een V- vormige kruin van 6,40 m breed.
 - De stuw (onderpand) heeft een kruinhoogte van NAP 4.12+
 - De stuw (bovenpand) heeft een kruinhoogte van NAP 4.33+

Bij de bepaling van de locaties van de vispassages is rekening met de drooglegging en het verloop van het bestaande maaiveld.

Voor een overzicht van de vispassage wordt verwezen naar Bijlage 1 en naar Bijlage 4.

C. Te verwijderen waterstaatswerken / stuwen

In het Grootdiep worden de drie bestaande stuwen verwijderd (van west naar oost)

- Stuw Wandelbos met leggercode KST0010350;
- Stuw Wepertil met leggercode KST0010274;
- Stuw Klazingaweg met leggercode KST0011089.

Deze waterstaatswerken worden van de Legger afgevoerd.

5. Legger – toewijzing van het onderhoud

De Legger wordt als volgt gewijzigd:

a. Legger ex. artikel 5.1 Waterwet (vastlegging: Ligging, Afmeting, Vorm en Constructie)

Op onder punt 4 vermelde gewijzigde waterstaatswerken, met bijbehorende Leggerwaarden (Ligging, Afmetingen, Vorm en Constructie), worden toegevoegd aan de Legger.

De waterstaatswerken die verwijderd worden, worden van de Legger afgevoerd.

De Leggerkaart en het Leggerregister worden hierop aangepast.

b. Toewijzing van het onderhoud (Legger ex. artikel 78 lid 2 Waterschapswet)

Voor de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken geldt de volgende onderhoudstoewijzing:

A. Aan te leggen waterstaatswerken - vispassages

De aan te leggen waterstaatswerken zoals genoemd onder 4B worden door Wetterskip Fryslân overeenkomstig de functie onderhouden.

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.

B. Te wijzigen waterstaatswerken – verbreding Grootdiep en onderhoudsdammen

Voor het verbrede Grootdiep (Hoofdwater) en voor de onderhoudsdammen met duikers die verplaatst worden, wijzigt de al vastgestelde toewijzing van het onderhoud niet.

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.

6. Motivatie, onderbouwing van het besluit

Met dit Projectplan worden de volgende waterhuishoudkundige knelpunten opgelost:

1. Het Grootdiep voldoet momenteel niet aan de ecologische waterkwaliteit (KRW).
In de KRW beslisnota planperiode 2016 -2021, en in de bijbehorende KRW factsheets zijn de stand van zaken, de voortgang en de nog uit te voeren maatregelen expliciet gemaakt. Uitvoering van deze maatregelen welke genoemd zijn in de KRW factsheet onder hoofdstuk 4 is niet vrijblijvend. Op dit moment wordt het gehele onderwaterprofiel, met uitzondering van 1 talud, 2 maal per jaar opgeschoond waardoor er een kale watergang ontstaat voor de afvoer van water. Door de verbreding van het Grootdiep, in combinatie met aangepast onderhoud waarbij 2 meter watergang niet wordt opgeschoond, ontstaat er een deels begroeide watergang. Deze deels begroeide watergang bevordert op zijn beurt weer het leef- en schuilmilieu van het aanwezige onderwaterleven. De combinatie van een deels begroeide watergang in combinatie met een actiever onderwaterleven wordt voldaan aan de minimale eisen van de ecologische waterkwaliteit.
2. Belemmeringen voor de vrije vismigratie in het Grootdiep.
In de KRW beslisnota planperiode 2016 -2021, en in de bijbehorende KRW factsheets zijn de stand van zaken, de voortgang en de nog uit te voeren maatregelen expliciet gemaakt. Uitvoering van deze maatregelen welke genoemd zijn in de KRW factsheet onder hoofdstuk 4 is niet vrijblijvend. Voor het Grootdiep geldt dat de drie bestaande stuwen vispasseerbaar moeten worden gemaakt. Omdat de stuwen nagenoeg aan het einde van haar financiële levensduur zijn, worden deze vervangen door een vispasseerbaar type.

Voor dit Projectplan is de KRW-factsheet als Bijlage 5 bij dit besluit gevoegd.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee voldoende is gemotiveerd (artikel 3.46 Awb) ⁽⁶⁾.

7. Eigendomsverwerving / benodigde zakelijke rechten

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken zoals genoemd onder 4A, eerste punt, namelijk voor het waterstaatswerk "Het leggerprofiel van Grootdiep wordt met 2 meter op de waterlijn verbreed" is eigendomsverwerving gewenst. De reden hiervoor is dat het Wetterskip al eigenaar is van de ondergrond van het Grootdiep.

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken zoals benoemd onder 4A, tweede punt 4B en 4C verandert de eigendomssituatie niet. Ook is er geen reden om andere zakelijke rechten te vestigen.

⁶ Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

8. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan

8.1. Geïntervieweerde nadelige gevolgen:

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïntervieweerd, namelijk:

a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering):

- Schade door gebruik van een tijdelijk werkterrein, tgv uitvoering verbreding en aanleg vispassages;
- Schade aan lokale Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt uitgevoerd;
- Verkeershinder tijdens de uitvoering van het werk.

b. Blijvende nadelige gevolgen:

- Verlies bruikbare agrarische grond als gevolg van de verbreding van het Grootdiep.

8.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.

a. Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken:

- Het plaatsen van bebording voor o.a. snelheid beperkingen bij in- en uitritten van het werkterrein, in overleg met de wegbeheerder en eigenaren;
- Uitvoering van het werk in de nazomer om gewasschade te beperken;
- Tijdens de uitvoering van het werk wordt gewerkt conform het gestelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen;

b. Beperking/voorkoming blijvende nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen om de blijvende gevolgen als gevolg van dit Projectplan te voorkomen of te beperken:

- Doordat er land tot water wordt vergraven, zijn er blijvende nadelige gevolgen voor de rechthebbenden (perceeleigenaren en pachters). Het hieruit voortvloeiende nadelig gevolg wordt op basis van het vermelde hieronder (punt 8.3) gecompenseerd.

8.3. Financieel nadeel

Tijdelijk

- Voor het tijdelijk in gebruik hebben van grond in verband met het gebruik van rij- en werkstroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor gewassen- en mestschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van artikel 7.14 Waterwet / Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) van Wetterskip Fryslân.
- De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan rechthebbenden kenbaar gemaakt.

- Indien nodig wordt de schadevergoeding in de vorm van een besluit bekend gemaakt, waartegen rechtsbescherming openstaat.

Blijvend

- In verband met de verbreding van het Grootdiep worden in het kader van dit project gronden aangekocht;
- Het tijdelijk gebruik van de gronden en aankoop van de gronden zal het waterschap met de rechthebbenden regelen door middel van een Koopovereenkomst. In de op te stellen Koopovereenkomst wordt ook de vergoeding van de schade geregeld.
- Het waterschap baseert zich hierbij op haar Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken. Zie hiervoor: <https://www.wetterskipfryslan.nl/documenten-catalogus/algemeen/schadevergoedingsregelingen/schadevergoedingsregeling-waterstaatswerken-01-01-2019.pdf>
Het gaat daarbij om gewassenschadevergoeding, schade in verband met de mestwetgeving en de schade als gevolg van het verlies van grond in verband met de verbreding van het Grootdiep.
- Indien minnelijk overleg niet tot overeenstemming of een getekende koopovereenkomst leidt, wordt de schadevergoeding bij besluit vastgesteld (Schadebesluit).

De benodigde hoeveelheid grond voor de verbreding van het Grootdiep is af te lezen in onderstaande twee tabellen. Voor de kadastrale tekening van het projectgebied wordt verwezen naar Bijlage 2.

Noordzijde Grootdiep (van West naar Oost)

Kadastraal perceel	Oppervlakte perceel (m2)	Benodigd (m2)	% bedrijfsperceel*
OTW02D1162	22365	317	1,42
OTW02D1163	19475	300	1,54
OTW02D1164	21755	236	1,08
OTW02E724	25475	595	2,34
OTW02E725	29085	543	1,87
OTW02E728	23640	370	1,57
OTW02E729	8800	284	3,23
OTW02E730	27960	381	1,36
OTW02E736	9900	235	2,37
OTW02E737	14315	321	2,24
OTW02E750	28650	47	0,16
OTW02E751	50980	131	0,26
OTW02E782	38345	155	0,40
OTW02E753	32510	148	0,46
OTW02E754	15120	86	0,57
OTW02E755	11920	0	0,00
OTW02E756	74240	14	0,02
OTW02E347	4610	65	1,41
OTW02E757	16415	11	0,07
OTW02E758	26365	0	0,00
OTW02E759	26575	0	0,00
OTW02F682	37060	212	0,57
OTW02F105	17120	0	0,00
OTW02F104	34300	209	0,61

OTW02F102	52950	222	0,42
OTW02F101	29920	169	0,56
OTW02F100	33670	0	0,00
OTW02F161	37180	75	0,20
OTW02F160	35830	49	0,14
OTW02F159	35390	227	0,64

* Opgemerkt wordt dat in de percentage berekening is uitgegaan van het percentage van het betreffende perceel, en niet van het bedrijfsareaal. De percentage berekening op basis van het bedrijfsareaal zou nog lager uitkomen.

Zuidzijde Grootdiep (van West naar Oost)

Kadastraal perceel	Oppervlakte perceel (m2)	Benodigd (m2)	% bedrijfsperceel*
OTW02D1894	24625	206	0,84
OTW02D1155	36835	344	0,93
OTW02D1800	5807	155	2,67
OTW02D1157	25605	61	0,24
OTW02E731	31605	0	0,00
OTW02E732	28645	0	0,00
OTW02E733	30145	115	0,38
OTW02E734	45510	229	0,50
OTW02E738	29195	215	0,74
OTW02E739	32330	131	0,41
OTW02E740	49555	225	0,45
OTW02E741	13100	94	0,72
OTW02E742	26505	300	1,13
OTW02E744	30905	167	0,54
OTW02E745	21975	162	0,74
OTW02E746	6585	13	0,20
OTW02E747	24735	65	0,26
OTW02E748	24300	64	0,26
OTW02F106	32880	264	0,80
OTW02F109	45820	151	0,33
OTW02F111	34660	202	0,58
OTW02F114	34000	111	0,33
OTW02F121	20070	168	0,84
OTW02F158	67300	232	0,34

* Opgemerkt wordt dat in de percentage berekening is uitgegaan van het percentage van het betreffende perceel, en niet van het bedrijfsareaal. De percentage berekening op basis van het bedrijfsareaal zou nog lager uitkomen.

Geconcludeerd wordt dat het gebruik van de grond (de vergraving van het land voor water in verband met de verbreding van het Grootdiep) van zodanig beperkte omvang is, dat dit geen onteigening vergt. Het waterschap maakt dan ook voor de situaties dat er geen

koopovereenkomst wordt afgesloten voor de benodigde gronden, indien nodig, gebruik van de bevoegdheid benoemd in artikel 5.24 Waterwet (gedoogplicht) (7).

- Voor het overige geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit Projectplan en op basis van artikel 3:4 Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit besluit (Projectplan). In de besluitvorming is geconstateerd dat de (mogelijk) nog aanwezige nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding het te dienen doel van dit besluit.
- Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij, ondanks de belangenafweging, onevenredige schade hebben geleden als gevolg van dit besluit (Projectplan) dan kunnen zij op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek.

9. Uitvoering, planning van het werk

Het voornemen is om het project uit te voeren vanaf: 15 juli 2019 t/m 31 december 2019. De werkzaamheden vinden plaats tussen 7:00 – 18:00 uur op werkdagen.

Het Grootdiep is bereikbaar via het aanliggende schouwpad/onderhoudsstrook.

Het Grootdiep wordt voorafgaand aan de verbredingswerkzaamheden gebaggerd, waarbij de bagger in depot wordt gezet op een afstand van ca. 10 uit de insteek van de watergang.

De te maken verbreding wordt vooraf uitgezet met door middel van pikketten.

De verbreding wordt onder archeologisch toezicht uitgevoerd waarbij de vrijkomende grond op een afstand van minimaal 5 meter uit de nieuwe insteek aan de zijde van de verbreding op de kant in depot gezet. De aanliggende eigenaar kan deze grond van het Wetterskip Fryslân overnemen. De overname wordt door middel een overeenkomst met de desbetreffende eigenaar/gebruiker geregeld. Het werkterrein wordt na afloop weer hersteld en ingezaaid, indien er niets is overeengekomen.

Tijdens de aanleg van de vispassages wordt de watergang afgedamd en drooggezet. Indien er geen nadere afspraken met de grondeigenaren zijn gemaakt over de aan te voeren bouwstoffen, worden de bouwstoffen via de werkstroken langs het Grootdiep aangevoerd. Bij natte en slechte terreinomstandigheden worden er rijplaten toegepast.

⁷ De beheerder kan, voor zover dat voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig is, rechthebbenden ten aanzien van onroerende zaken de verplichting opleggen om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen, wanneer naar zijn oordeel de belangen van die rechthebbenden onteigening niet vorderen.

10. Procedure (rechtsbescherming)

Inspiraakprocedure

Dit projectplan is door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 23 april 2019 vastgesteld.

- Belanghebbenden en ingezetenen van het Beheergebied van Wetterskip Fryslân konden een zienswijze (bezwaren/bedenkingen/aanvullingen) indienen tegen het Ontwerp-Projectplan welke op 7 februari 2019 elektronisch is gepubliceerd in een Waterschapsblad (overheid.nl).
- Na de inspraakperiode heeft het dagelijks bestuur het Projectplan vastgesteld met inachtneming van de binnengekomen zienswijzen. Dit besluit is bekendgemaakt in een Waterschapsblad (overheid.nl). Tegen dit besluit staat beroep open bij de rechtbank, sector bestuursrecht en daarna hoger beroep bij de Raad van State.

Het indienen van (hoger) beroep staat uitvoering van het werk niet in de weg. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd).

Op de vaststelling van dit Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank in het beroepsschrift moet worden aangegeven wat de inhoudelijke beroepsgronden zijn (dus geen pro forma beroep).


Voor eventuele vragen over dit besluit, kan contact opgenomen worden met dhr. R. van der Ploeg en voor vragen over de procedure met dhr. A.J. Greidanus. Beide functionarissen zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 058-292 2222.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 23 april 2019, namens deze,

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,



ir. P.A.E. van Erkelens
Dijkgraaf



O. Bijlsma
Secretaris/directeur

Bijlage 1 – Tekening, Ligging waterstaatswerken

Bijlage 2 – Tekeningen, Overzichten Kadastrale Percelen

Bijlage 3 – Tekeningen, Profielen Kadastrale Percelen

Bijlage 4 – Tekening, Vispassage 's

Bijlage 5 – Document, KRW Factsheet
