

PROJECTPLAN

Realisatie krooshek Noordpolderkanaal

District Noord-Oost
Waterschap Noorderzijlvest

Ronald Koers
juli 2019

Inhoud


1	Plaatsen krooshek en verzamelbak	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	3
1.3	Omschrijving van het object	4
1.4	Effecten van het plan	4
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	4
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	5
1.6.1	Beperken nadelige gevolgen van het plan	5
1.6.2	Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering	5
1.6.3	Nadeelcompensatie	5
1.7	Legger en beheer en onderhoud	5
1.7.1	Legger	5
1.7.2	Beheer en onderhoud	5
1.8	Samenwerking	5
1.9	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	5
1.10	Verantwoording op basis van beleid	5
1.10.1	Toets beleid waterschap	5
1.11	Verantwoording van de keuzen in het project	5
1.12	Benodigde vergunningen en meldingen	5
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	6
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	6
2.2	Procedure	6
3	Rechtsbescherming	6

Figuur 1 / 2: kaarten van de locatie

1.3 Omschrijving van het object

Het rooster zal gemaakt worden van staal wat vervolgens thermisch verzinkt wordt. In het midden van het rooster komt een los deel wat in de wintermaanden eruit gehaald kan worden. Als het zoetwaterplan niet draait en er komt dusdanig veel neerslag dat gemaal Noordpolderzijl gaat draaien moet het water namelijk de andere kant op door het rooster heen. Aangezien er dan kans is dat het rooster aan de andere kant het vuil tegenhoudt kan er een deel uitgenomen worden zodat het water en drijfvuil richting Noordpolderzijl wordt afgevoerd.

De hardhouten damwand zal gemaakt worden van planken van 5 cm dik en 5 meter lang. Rondom de 3 duikers wordt dit uiteraard netjes afgewerkt. Tussen het krooshek en het eind van de duiker zal een meter of 10 tussen zitten zodat ook het deel achter het krooshek goed schoongemaakt kan worden met een maaikorf indien nodig.

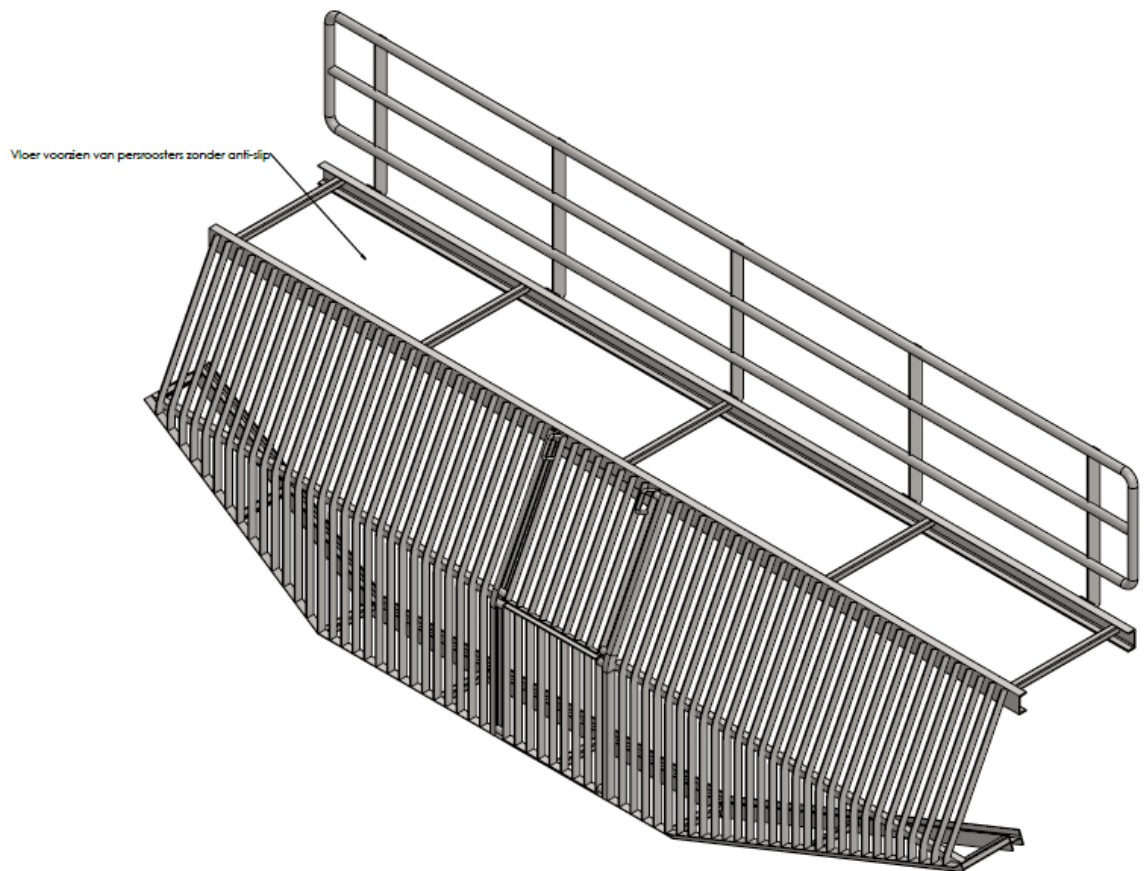

Figuur 3: tekening van het krooshek

1.4 Effecten van het plan

Qua waterdoorvoer zal dit plan een positief effect hebben. Er hoopt zich geen vuil meer op voor de duiker dus zal de doorstroom beter worden. de stroombreedte van het kanaal wordt niet smaller of ondieper dus ook dit zal geen nadelige effecten hebben.

1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Het ontwerp van het krooshek en de uitvoering ligt bij Antea Group. Zij maken de tekeningen, laten het krooshek prefab fabriceren en komen hem met eigen mensen plaatsen op locatie. Hieraan voorafgaand zal de watergang op het bewuste stuk gebaggerd worden. Ook de damwand en de stortbak zal door de mensen van Antea gerealiseerd worden. Uiteraard zullen tijdens de werkzaamheden de benodigde wegafzettingen gebruikt worden en wordt overlegd met de aangrenzende perceeleigenaar mochten we daar over het land heen moeten. Tijdens het werk

hoeft het werkvak niet drooggezet worden of het peil verlaagd te worden. Het werk wordt uitgevoerd in de maanden september/oktober dus dan is de vraag naar zoetwater ook niet meer zo aan de orde.

1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

T.a.v. de uit te voeren werkzaamheden worden geen negatieve gevolgen verwacht.

1.6.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Door een bezoek vooraf op locatie wordt de omgeving in beeld gebracht, dit voorkomt onverwachte aspecten.

1.6.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Met de aannemer is een bezoek gebracht aan de locaties.

1.6.3 Nadeelcompensatie

n.v.t.

1.7 Legger en beheer en onderhoud

1.7.1 Legger

De gemaakte wijzigingen zullen zo nodig in de beheerregister moeten worden aangepast.

1.7.2 Beheer en onderhoud

Zowel de reguliere als de bijzondere onderhoudsplicht berust bij waterschap Noorderzijlvest

1.8 Samenwerking

De uitvoerder van NZV houdt contact met de aannemer Antea Group over de voortgang van werkzaamheden en oplevering.

1.9 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Werken worden uitgevoerd binnen de kaders wet en regelgeving geldend voor Waterschap Noorderzijlvest.

1.10 Verantwoording op basis van beleid

Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beleidskader van Waterschap Noorderzijlvest.

1.10.1 Toets beleid waterschap

1.11 Verantwoording van de keuzen in het project

1.12 Benodigde vergunningen en meldingen

Voor de uitvoering van het project is een projectplan waterwet en een KLIC-melding benodigd.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt ervoor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website: www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepsschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector

Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
