

Projectplan Waterwet
Vergraven waterloop Risten te Rijsbergen
(Djuma zaak: 62361)



samen onze omgeving creëren

Opdrachtgever : Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520
4802 DZ BREDA

Projectnummer : 20150485-010

Status rapport / versie nr. : Concept 03

Datum : 13 augustus 2019


Opgesteld door : ing. W. de Beer

Gecontroleerd door : ing. C. Hoetelmans

Voor akkoord : ing. C. Hoetelmans

Paraaf : _____

Versie nr.	Datum	Omschrijving	Opgesteld door	Gecontroleerd door
C01	05-07-2019	Concept versie 1	WB	CH
C02	26-07-2019	Concept versie 2	WB	CH
C03	13-08-2019	Concept versie 3	WB	CH



INHOUD

blz.

1	LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED	1
2	BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE	2
2.1	Huidige situatie	2
2.2	Aanleiding	2
2.3	Doelstelling	2
3	BESCHRIJVING EN MAATVOERING VAN DE WATERSTAATSWERKEN	3
3.1	Aanbrengen duikers	3
3.1.1	Aanbrengen duikers diversen	3
3.2	Het (ver)graven van waterlopen (aanleggen en dempen)	3
4	WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD	4
5	LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD	4
5.1	Legger	4
5.2	Beheer en onderhoud	4
5.3	Monitoring	4
6	SAMENWERKING	4
7	WETTEN, REGELS EN BELEID	5
7.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	5
7.2	Verantwoording op basis van beleid	5
7.2.1	Keur waterschap Brabantse Delta	5
7.2.2	Beleidsregels waterschap Brabantse Delta	5
7.2.3	Toets overig beleid	6
8	ONDERZOEK EN RAPPORTAGES	6
9	FINANCIËLE HAALBAARHEID	6
10	PLANOLOGISCHE INPASSING	6
11	VERGUNBAARHEID	6
11.1	Benodigde vergunningen en meldingen, aan te vragen door het waterschap	6
11.2	Uitvoeringsspecifieke vergunningen	7
12	BESCHIKBAARHEID BENODIGDE GROND	7
13	ONDERZOEK, MITIGATIE EN COMPENSATIE VAN NADELIGE GEVOLGEN	7
14	PROCEDURE VASTSTELLEN PROJECTPLAN	8
15	BEROEP	8

BIJLAGEN


- 1 Revisietekening
- 2 Fact sheets
 - Fact sheet 'Waterloop P1'
 - Fact sheet 'Waterloop P2'
 - Fact sheet ondersteunend kunstwerk 'Duiker 01'
 - Fact sheet ondersteunend kunstwerk 'Duiker 02'
 - Fact sheet ondersteunend kunstwerk 'Duiker 03'

DEEL I – AANLEG OF WIJZIGING VAN WATERSTAATSWERKEN

1 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED

Het projectgebied is gelegen ten noordoosten van Rijsbergen, tussen de N263 en de Aa of Weerijs. Het projectgebied is weergegeven op figuur 1.1. Het figuur geeft inzicht in het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem van het projectgebied. De te vergraven waterlopen wateren onder vrij verval af op de Aa of Weerijs, welke noordelijk richting Breda stroomt – alwaar de rivier in de singels van deze stad onder de naam Mark verder stroomt.

Figuur 1.1: Locatie projectgebied (Waterschap Brabantse Delta, 2019).

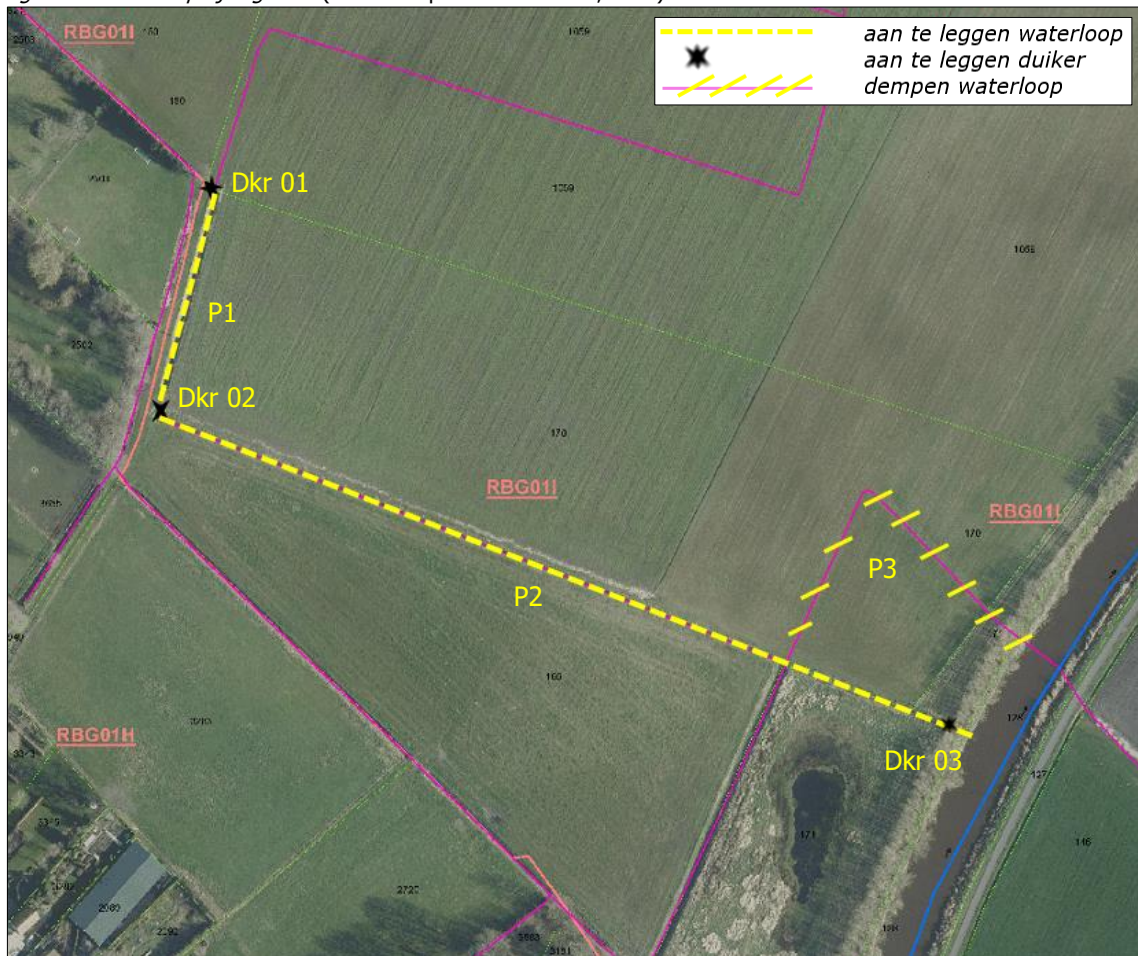

2 BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE

2.1 Huidige situatie

Figuur 2.1: Uitsnede van de Legger (Waterschap Brabantse Delta).



2.2 Aanleiding

Het waterschap wil middels een verkorte projectplanprocedure waterlopen die in 2009 zijn gegraven (met bijbehorende ondersteunende kunstwerken), legaliseren.

2.3 Doelstelling

De waterlopen zijn gegraven om de afwatering naar de Aa of Weerijs te verbeteren.

3 BESCHRIJVING EN MAATVOERING VAN DE WATERSTAATSWERKEN

Dit projectplan beschrijft en maakt enkel de werkzaamheden aan waterstaatswerken^[1] mogelijk. Voor werkzaamheden die niet waterstaatkundig van aard zijn, dient een separate vergunning aangevraagd te worden. Hieronder is een opsomming gegeven van de waterstaatswerken:

1. Aanbrengen van duikers;
2. Het (ver)graven van waterlopen (aanleggen en dempen).

3.1 Aanbrengen duikers

Er zijn drie duikers voorzien in het projectgebied. De maatregel wordt per locatie toegelicht.

3.1.1 Aanbrengen duikers diversen

Ten behoeve van de verbinding van de waterlopen van west naar oost (bovenstrooms naar benedenstrooms), zijn een drietal duikers (beton ø300 mm en PVC ø400 mm) voorzien op diverse locaties om de achterliggende percelen bereikbaar te houden, zie figuur 1.1 en bijlage 1 voor de locaties van deze duikers en zie tabel 3.1 voor de betreffende leggergegevens.

Tabel 3.1: Leggerwijziging duikers.

Leggergegevens			
Identificatie cf. bijlage 1	Duiker 01	Duiker 02	Duiker 03
b.o.b. bovenstrooms (m +N.A.P.)	5,14	5,22	3,44
b.o.b. benedenstrooms (m +N.A.P.)	5,29	5,17	3,30
Bodemhoogte bovenstrooms (m +N.A.P.)	5,22	5,18	3,46
Bodemhoogte benedenstrooms (m + N.A.P.)	5,23	5,10	2,99
Doorstroomlengte (m)	6	9	10
Hoogte of diameter (mm)	ø300	ø300	ø400
Materiaal	Beton	Beton	PVC
Vorm (opening)	Rond	Rond	Rond
Afsluitbaar	Nee	Nee	Nee
Onderhoudsplichtige bouwkundig	Waterschap	Waterschap	Waterschap

3.2 Het (ver)graven van waterlopen (aanleggen en dempen)

Om de afwatering naar de Aa of Weerij te verbeteren, zijn de waterlopen verruimd en gedempt en hebben deze een andere aansluiting op de Aa of Weerij gekregen. Het profiel van de waterlopen wordt tot aan de Aa of Weerij doorgetrokken. Hiermee wordt ca. 294 m waterloop vergraven en ca. 131 m gedempt. De vigerende B-status blijft gehandhaafd.

In onderstaande tabel zijn de gegevens ten behoeve van de leggerwijziging opgenomen. Dit betreft de maatvoering conform een revisiemeting ten behoeve van de definitieve leggerwijziging.

Tabel 3.2: Leggerwijziging waterlopen.

Leggergegevens			
Identificatie cf. bijlage 1	Waterloop P1	Waterloop P2	Waterloop P3 (demping)
Lengte	57 m	237 m	131 m
Identificatie waterloop volgens Legger	-	-	OWL35754
Categorie	B-waterloop	B-waterloop	B-waterloop
Bodemdiepte bovenstrooms (m +N.A.P.)	5,23	5,10	n.b.
Bodemdiepte benedenstrooms (m +N.A.P.)	5,18	3,46	n.b.
Bodembreedte (m)	0,50	0,50 – 0,75	n.b.
Helling talud links (1 : ...)	1,16 – 1,24	1,16 – 1,96	n.b.
Helling talud rechts (1 : ...)	0,97 – 1,37	1,08 – 1,22	n.b.
Onderhoudsplichtig	Aanliggend perceel	Aanliggend perceel	Aanliggend perceel

^[1] Definitie van een waterstaatswerk: 'Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk'.

4 WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD

Dit projectplan Waterwet is de laatste stap tot het definitief maken van de werkzaamheden. Het grondverzet en het aanbrengen van ondersteunende kunstwerken (lees: duikers) is reeds uitgevoerd.

5 LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD

5.1 Legger

Na uitvoering van het project is de nieuwe situatie ingemeten en opgetekend op revisietekeningen (zie bijlage 1). Vervolgens worden de maten of de functionele eisen in de Legger vastgelegd. Hiervoor neemt het waterschap een apart besluit: het leggerbesluit (besluit ten aanzien van de wijziging van de Legger).

Met de realisatie van dit project is het profiel van de waterlopen aangepast en wijzigt een deel van de ligging van de waterlopen. Daarnaast dienen de duikers opgenomen te worden als ondersteunende kunstwerken in de Legger.

5.2 Beheer en onderhoud

De gegraven waterlopen betreffen B-waterlopen, waarmee de onderhoudsplicht bij de aanliggende perceeleigenaren ligt.

Het waterschap controleert periodiek of de aanliggende eigenaren aan hun onderhoudsplicht voldoen. Indien blijkt dat door gebrek aan onderhoud het waterstaatswerk niet goed functioneert, zal het waterschap de aanliggende eigenaren verzoeken om dit onderhoud alsnog uit te voeren.

5.3 Monitoring

Via periodieke controle wordt de staat van het waterstaatswerk gemonitord.

6 SAMENWERKING

De aanliggende terreineigenaren en andere belanghebbenden zijn gedurende het planproces door waterschap Brabantse Delta benaderd, geïnformeerd en betrokken. In het ontwerptraject is door het waterschap in samenspraak met de belanghebbenden en gemeente Zundert tot de inpassing van de gewenste eindsituatie gekomen. Dit heeft geleid tot het gerealiseerde ontwerp. Over de exacte uitvoering van de werkzaamheden heeft afstemming plaats gevonden met de betrokkenen en de gemeente Zundert.

DEEL II – VERANTWOORDING

7 WETTEN, REGELS EN BELEID

7.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Bij een wijziging of aanleg van een waterstaatswerk dient het waterschap een projectplan vast te stellen op grond van artikel 5.4 Waterwet.

De uitvoering dient in meer of mindere mate invulling te geven aan de doelstellingen van de Waterwet. De Waterwet kent de volgende drie doelstellingen:

- Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem.

Onderhavig plan draagt bij aan de doelstelling tot het voorkomen van wateroverlast, vanwege de realisatie van een doorsteek naar de Aa of Weerij.

7.2 Verantwoording op basis van beleid

7.2.1 Keur waterschap Brabantse Delta

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Het doel van de beleidsregel bij de Keur is aan te geven hoe het dagelijks bestuur van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- en verbodsbepalingen die in de Keur zijn opgenomen en anderszins uitvoering te geven aan de Keur en de Waterwet. De Keur en de beleidsregels zijn te benaderen via www.brabantkeur.nl (Waterschap Brabantse Delta, 2019).

7.2.2 Beleidsregels waterschap Brabantse Delta

Voor het toepassen van de bevoegdheden die het waterschap heeft op grond van de Waterwet, de Keur en andere wetgeving hanteert het waterschap beleidsregels. In de beleidsregels is de algemene lijn vastgelegd die het waterschap volgt als zij een bevoegdheid uitoefent, bijvoorbeeld bij de bevoegdheid een vergunning te verlenen. Voor dit projectplan zijn de volgende beleidsregels van belang:

- **Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater:** Het doel van deze beleidsregels is aan te geven hoe het dagelijks bestuur van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- en verbodsbepalingen die in de Keur zijn opgenomen;
- **Waterlopen op orde 2011 - Beleidsregel voor het rangschikken van oppervlaktewaterlichamen en het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en onderhoudsstroken:** Het eerste doel van deze beleidsregel is aan te geven hoe het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om oppervlaktewaterlichamen bij opname in de legger, in een bepaalde categorie in te delen, al naar gelang het belang van het oppervlaktewaterlichaam. Deze categorisering heeft consequenties voor de onderhoudsplichten, keurregels en de aanwezigheid van onderhoudsstroken. Ten tweede heeft deze beleidsregel tot doel aan te geven hoe in de legger bepaald wordt wie onderhoudsplichtige is. In het verlengde daarvan is ook aangegeven onder welke condities het waterschap zelf het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen kan uitvoeren indien hier op basis van beleid voor gekozen wordt. Ten derde heeft deze beleidsregel ten doel aan te geven hoe in de legger omgegaan wordt met het aanwijzen van onderhoudsstroken langs oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud.

In Deel I is het ontwerp besproken. Hierin is aangegeven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. De werkzaamheden en activiteiten in relatie tot het waterschapsbeleid staan hieronder genoemd. Het ontwerp is getoetst aan het waterschapsbeleid en de Keur. Tabel 7.1 geeft inzicht in de geldende artikelen van de Keur en tabel 7.2 geeft inzicht in de geldende beleidsregels vanuit het waterschapsbeleid.

Tabel 7.1: Geldende keurartikelen uit de Brabantkeur.

Activiteit(en)	Keurartikel
Verrichten van werkzaamheden of activiteiten in een A-water, in de beschermingszone van een A-water of profiel van vrije ruimte van een A-water	Artikel 3.1 Vergunning oppervlaktewaterlichamen en bijbehorende beschermingszones, ondersteunende kunstwerken en profiel van vrije ruimte.
(ver)graven van waterlopen	
Aanbrengen van een duiker in een B-water	
Aanbrengen van een duiker in een B-water	

Tabel 7.2: Geldende beleidsregels uit het waterschapsbeleid.

Activiteit(en)	Beleidsregel	Verantwoording
Realisatie van duikers	Hoofdstuk 5: Beleidsregel duikers en bruggen	- Om de doorsteek te maken, is een duiker onder de Bredaseweg gerealiseerd; - Ten behoeve van toegang tot de achterliggende percelen, zijn duikers in de B-waterloop gerealiseerd.
(ver)graven van waterlopen	Hoofdstuk 6: Beleidsregel dempen en graven oppervlaktewaterlichamen	De waterlopen zijn gegraven om de route naar de Aa of Weerij op te waarderen.

7.2.3 Toets overig beleid

Er is geen overig beleid relevant voor dit project.

8 ONDERZOEK EN RAPPORTAGES

Voor het plan zijn geen conditionerende onderzoeken uitgevoerd.

9 FINANCIËLE HAALBAARHEID

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade geleden die de uitvoering van het project in de weg heeft gestaan. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Verordening schadevergoeding van waterschap Brabantse Delta.

10 PLANOLOGISCHE INPASSING

Er zijn voor de uitvoering van het werk geen belemmeringen conform het indertijd geldende bestemmingsplan.

11 VERGUNBAARHEID

In dit hoofdstuk zijn de benodigde vergunningen en meldingen beschreven.

11.1 Benodigde vergunningen en meldingen, aan te vragen door het waterschap

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig en daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die zaken geregeld die later in de Legger worden opgenomen. In dit geval wordt door het waterschap Brabantse Delta een projectplan opgesteld waarin de realisatie van de waterlopen inclusief bijbehorende ondersteunende kunstwerken mogelijk wordt gemaakt.

11.2 Uitvoeringsspecifieke vergunningen

Voor de uitvoering van het project zijn uitvoeringsspecifieke vergunningen nodig geweest. Omdat de plicht van het aanvragen afhankelijk is van de wijze van uitvoering, is de te contracteren aannemer hiervoor verantwoordelijk. Een niet-limitatieve opsomming van uitvoeringsvergunningen is weergegeven in tabel 11.2.

Tabel 11.2: Benodigde vergunningen.

Vergunningen	Bevoegd gezag	Proceduretijd	Bezwaar- of beroepstermijn	Benodigde onderzoeken
Watervergunning	Waterschap Brabantse Delta	8 weken	6 weken	Overzichtstekening, schriftelijke toelichting, machtiging

De watervergunning is nodig voor de volgende werkzaamheden:

- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam (Oppervlaktewaterlichaam graven);
 - Het graven van waterlopen ten behoeve van het waarborgen van de afstroming. Ten aanzien van beleidsregels 6 en 15 kan gesteld worden dat de voorgenomen werkzaamheden slechts invloed zullen hebben op het voorkomen van wateroverlast; de water aan- en afvoer en de benodigde berging blijven gelijk.
- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam (Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)).
 - Het plaatsen van drainage (zonder pomp), waarbij de hoogte van de drainbuis zodanig geplaatst is dat deze alleen zal werken tijdens natte omstandigheden. Hierdoor wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de drainage niet (merkbaar) verdrogend werkt op de natuur; ten aanzien van beleidsregel 15 kan gesteld worden dat de voorgenomen werkzaamheden slechts invloed zullen hebben op het voorkomen van wateroverlast; de water aan- en afvoer en de benodigde berging blijven gelijk. De voorgestelde maatregel is daarmee een effectieve maatregel om ter plaatse de grondwaterstand te beheersen.

12 BESCHIKBAARHEID BENODIGDE GROND

De gronden blijven in eigendom van de huidige eigenaren.

13 ONDERZOEK, MITIGATIE EN COMPENSATIE VAN NADELIGE GEVOLGEN

Op basis van artikel 5.4 van de Waterwet is onderzoek gedaan naar de nadelige gevolgen van het plan. Hier is uit naar voren gekomen dat hier geen sprake van is.

DEEL III – RECHTSBESCHERMING

14 PROCEDURE VASTSTELLEN PROJECTPLAN

Dit projectplan is voorbereid volgens de reguliere procedure van de Algemene wet Bestuursrecht. Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar op dit projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. De bezwaarschriftencommissie zal het bezwaar behandelen. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State (zie voor een verdere toelichting bij "Beroep" en "Verzoek om voorlopige voorziening"). In beginsel kunnen uitsluitend degenen die een bezwaar hebben ingediend, tegen het projectplan beroep instellen.

15 BEROEP

Gedurende zes weken vanaf de dag waarop het besluit op het bezwaar ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank West-Brabant te Breda. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Op de vaststelling van een projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Belanghebbenden worden verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Breda 2 sept 2019
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeling vergunningen

Ir. A.H.J. Bouten

