

PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

Datum: 20-03-2020
Kenmerk: 2019079004/2019108618
Onderwerp: projectplan voor Waterberging Werkendam

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot de aanleg van een waterberging tussen de Dijkgraaf den Dekkerweg en de Schans te Werkendam vast te stellen en uit te voeren met het bepaalde in dit projectplan.

1. Projectbeschrijving

1.1 Beschrijving betrokken werk

Waterschap Rivierenland is voornemens om een waterberging te realiseren tussen de wegen de Schans en de Dijkgraaf den Dekkerweg, ten zuidoosten van Werkendam (gemeente Altena). De realisatie van deze waterberging is een maatregel als gevolg van de wateroverlast in 2014 en 2015. Ter compensatie van wateroverlast in de kern van Werkendam tijdens perioden van hevige regenval is de inrichting van een waterbergingsgebied nodig voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.

Het waterbergingsgebied wordt ingericht op het perceel kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R, nummer 613 (Figuur 1) en grenst aan A-water nummer 001495. Het perceel is in eigendom van Waterschap Rivierenland.




Figuur 1

De waterberging wordt door middel van het afgraven van het maaiveld en het (ver)graven van wateren aangelegd. Op het perceel wordt een berging met een capaciteit van ruim 18.200 m³ gerealiseerd.

In totaal bestaat het gebied dat gebruikt gaat worden voor waterberging uit circa 33.850 m². Het maaiveld van de waterberging wordt verlaagd naar gemiddeld -1.05 m NAP. Na de vergraving zal het terrein worden ingericht en beheerd als nat/vochtig bloemrijk grasland. Binnen het projectgebied worden zes watergangen gerealiseerd, waarvan vijf met een duiker verbonden zijn

met het A-water ten zuiden van het projectgebied. Rondom het volledige plangebied wordt een onderhoudspad aangelegd zodat het waterschap de waterberging en watergangen kan onderhouden. De vastgestelde waterpeilen (zomerpeil -1.20 m NAP, winterpeil -1.40 m NAP) worden niet gewijzigd.

Voor nadere informatie aangaande de geplande vormgeving, ligging, en toe te passen constructies verwijzen wij u naar Figuur 2 en bijlage 1 van dit projectplan.

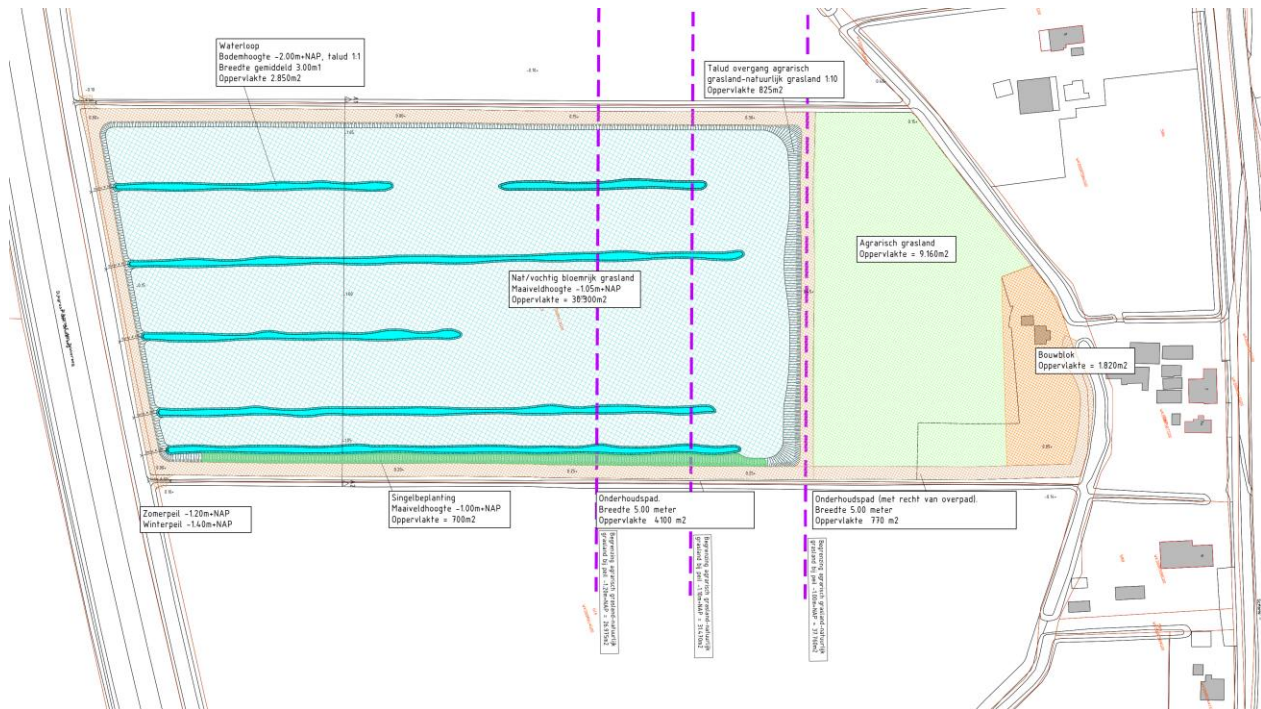

Figuur 2

1.2 Wijze van uitvoering

1.2.1 Fasering werk en werkzaamheden.

In totaal omvat het project de volgende werkzaamheden:

- Aanleg van circa 33.850 m² waterbergingsgebied.
- Bestaande maaiveldniveau met circa 1.1 meter verlagen naar -1.05 m NAP over een oppervlakte van circa 30.300 m².
- Graven van circa 2.850 m² nieuwe watergangen.
- Vergraven natuurvriendelijke oever aan zijde waterberging B-wateren nummer 018973 en nummer 018976.
- Aanleggen van vijf duikers beton rond 600 mm en twee duikers beton rond 800 mm, aansluitend op A-water nummer 001495.
- Aanleg van een 5 meter breed onderhoudspad rondom het waterbergingsgebied.
- Singelbeplanting aanbrengen bestaande uit elzenbroekbos-karakter (circa 700 m²) aan oostzijde van het projectgebied.

1.2.2 Transport en afzet vrijgekomen grond.

Bij het realiseren van dit project komt er grond vrij. Het afgegraven materiaal (dekgrond en klei) kan grotendeels niet worden toegepast binnen het projectgebied. De vrijgekomen grond wordt afgevoerd.

1.2.3 Onderzoek rapportages

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn verschillende voorbereidende onderzoeken uitgevoerd.

- Er is een vooronderzoek explosieven uitgevoerd. Het hele plangebied is aangeduid als onverdacht gebied.
- Er is een vooronderzoek bodem uitgevoerd. In de boven- en ondergrond worden geen chemische verontreinigingen of verontreinigingen met asbest verwacht. Geadviseerd wordt om de klei- en zandgrond die vrijkomt op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Altena elders binnen de gemeente her te gebruiken.
- Er is een verkennend flora en fauna onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van plant- en diersoorten binnen het plangebied. Hieruit blijkt dat tijdens de uitvoering mogelijk tijdelijke effecten optreden voor vissen en vogels. Hier wordt rekening mee gehouden door de werkzaamheden uit te voeren volgens de gedragscode Flora en Fauna voor waterschappen en de zorgplicht in acht te nemen. Na gereedkomen van de waterberging zal het foerageergebied van (weide)vogels verbeteren.

Grote effecten op de omgeving als gevolg van de geplande werkzaamheden zijn niet te verwachten. Vrijkomende grond wordt per as afgevoerd. Om hinder en overlast voor de direct omwonenden aan de Schans te voorkomen vindt het grondtransport plaats via de Dijkgraaf Den Dekkerweg.

1.3 Te treffen voorzieningen

Er zijn geen nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk op de omgeving gezien. Er worden derhalve geen voorzieningen of compenserende maatregelen getroffen.

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Dit verzoek moet worden ingediend bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

De realisatie van waterberging is een maatregel als gevolg van wateroverlast in 2014 en 2015. Met de aanleg van het waterbergingsgebied komt er meer ruimte beschikbaar voor de opvang van overtollig hemelwater en neemt de kans op wateroverlast af.

2b. Chemische en ecologische kwaliteit

Het oppervlaktewaterstelsel waar de waterberging deel van gaat uitmaken is niet aangewezen als waterlichaam in het kader van de KRW en kent geen specifieke ecologische doelstellingen.

Het plangebied zal bijdragen aan een grotere biodiversiteit van het overwegend agrarische gebied. De singelbeplanting welke aan de oostzijde van het plangebied wordt aangebracht, zal open stukken bevatten waardoor het een aantrekkelijker gebied wordt voor (weide)vogels.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

Door het realiseren van dit waterbergingsgebied zal de kans op wateroverlast in de kern van Werkendam worden verkleind. De klimaatbestendigheid van het bebouwde gebied wordt hiermee vergroot. Om de oorspronkelijke landschappelijke en cultuurhistorische structuur te versterken, zijn extra sloten en singelbeplanting (elzenbroekbos-karakter) in het plangebied ontworpen.

Conclusie

Conclusie van de toetsing aan artikel 2.1 Waterwet is dat het project aansluit bij de doelstellingen zoals verwoord in de nationale, provinciale en waterschapplannen.

3. Uitvoerbaarheid

3a. Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Altena vastgesteld, met de ter plaatse geldende bestemmingen: enkelbestemming "Agrarisch", dubbelbestemming "Waarde-Archeologie-2", gebiedsaanduiding "overige zone – zeekleilandschap - eerste aanwasplolders", gebiedsaanduiding "overige zone – waarde cultuurhistorie - erfgoed nhw", gebiedsaanduiding "vrijwaringszone – molenbiotoop".

Het project past niet binnen het geldende bestemmingsplan. In dit kader is een aanvraag voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik en uitvoeren van werkzaamheden aangevraagd waarbij de realisatie van waterberging mogelijk wordt gemaakt.

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Voor het plan is een omgevingsvergunning en een ontgrondingsvergunning aangevraagd en in behandeling genomen.

Bij de uitvoering van het projectplan wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol waarmee invulling wordt gegeven aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing is niet nodig. Zo nodig wordt voor het toepassen van grond- of baggerspecie een melding Besluit Bodemkwaliteit gedaan.

Na de uitvoering van het Projectplan worden de waterberging (C-status) als de te nieuw te graven watergangen C-wateren op de legger van het waterschap opgenomen op basis van de revisietekeningen.

3c. Planning

Het project zal naar verwachting in de zomer van 2020 starten en in de najaar van 2020 zijn afgerond.

3d. Overige uitvoeringsaspecten

Voor de waterberging heeft het waterschap het in te richten perceel verworven. Voor de uitvoering van het project is geen verlegging van kabels en leidingen nodig. Vrijkomende grond wordt per as afgevoerd via de Dijkgraaf den Dekkerweg. Tijdelijke verkeersmaatregelen, benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de aannemer, dienen volgens geldende wet- en regelgeving plaats te vinden en in overleg met de wegbeheerder.

4. Beheer en onderhoud

De waterberging komt in beheer bij het waterschap Rivierenland. Het terrein wordt ingericht en beheerd als nat/vochtig bloemrijk grasland. De nieuw te graven watergangen binnen het waterbergingsgebied krijgen de C-status. De bestaande watergangen, aan west en oostzijde direct grenzend aan de waterberging, behouden de B-status. De status van de watergangen zal worden vastgelegd in de legger.

5. Procedure

Het projectplan dient op grond van de Inspraakverordening van het waterschap te worden voorbereid via de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat het ontwerp van het projectplan ter inzage heeft gelegen gedurende een periode van zes weken van 3 september tot en met 14 oktober 2019 voor het indienen van mogelijke zienswijzen. Op het ontwerp-projectplan is één zienswijzen ingediend. Hiervoor is een zienswijzennota opgesteld. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het projectplan. Het college heeft het projectplan ten opzichte van het ontwerp dan ook ongewijzigd vastgesteld.

Het project wordt in samenwerking met de gemeente Altena gerealiseerd. Daarnaast is het inrichtingsplan besproken met de vereniging Altenatuur.

6. Contactpersoon

De heer J. Kroon treedt namens Waterschap Rivierenland op als projectleider. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0344) 649321 en via e-mail j.kroon@wsrl.nl.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,

Caroline van der Kleij
hoofd van de afdeling Weg- en Waterbouw

Bijlagen:

- Bijlage 1: Tekening nummer 2018-2765 van 30-04-2019, fase definitief ontwerp, 'Schetsontwerp waterberging Werkendam'.

Beroep

Tegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

- belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).
