

Projectplan

Natuurontwikkeling perceel HZE00 F4317

Opdrachtgever : Jarno de Jonge
Projectleider : Marcel van den Broek
Auteur : Marjolein Lemmens
Datum : 24 december 2019
Status : definitief
Projectnummer : P034602
Join-nummer : Z60155

Akkoord:

Opdrachtgever		Projectleider	
Paraaf	Datum	Paraaf	Datum

Inhoudsopgave

LEESWIJZER	2
DEEL I ONTWIKKELING PERCEEL HZE00 F4317.....	3
1 INLEIDING.....	3
1.1 AANLEIDING	3
1.2 DOELSTELLINGEN	3
2 GEBIEDSBESCHRIJVING	4
2.1 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED	4
2.2 HOOGTELIKKING	4
2.3 BODEMOPBOUW EN -CHEMIE	5
2.4 OPPERVLAKTEWATER	6
2.5 (GEO)HYDROLOGIE	7
2.6 ECOLOGIE EN LANDSCHAP	8
2.7 LANDBOUW	8
2.8 ARCHEOLOGIE, CULTUURHISTORIE EN AARDKUNDIGE WAARDEN	9
3 BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN (GEWENSTE SITUATIE)	10
3.1 DOEL VAN DE MAATREGELEN	10
3.2 STREEFBEELD	10
3.3 DE MAATREGELEN	11
4 BESCHIKBAARHEID GRONDEN	11
5 EFFECTEN VAN DE MAATREGELEN	12
6 WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD.....	12
7 LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD MONITORING	13
7.1 LEGGER	13
7.2 BEHEER EN ONDERHOUD	13
7.3 MONITORING	13
DEEL II VERANTWOORDING	14
8 VERANTWOORDING OP BASIS VAN WET- EN REGELGEVING.....	14
8.1 WATERWET	14
8.2 WET NATUURBESCHERMING	14
8.3 PROVINCIAAL MILIEU- EN WATERPLAN NOORD-BRABANT 2016 – 2021	15
8.4 PROVINCIAAL NATUURBEHEERPLAN	15
8.5 INTERIM OMGEVINGSVERORDENING	15
8.6 WATERBEHEERPLAN 'WAARDEVOL WATER' 2016 – 2021	16
8.7 KEUR WATERSCHAP DE DOMMEL	16
8.8 BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE HEEZE-LEENDE	16
DEEL III RECHTSBESCHERMING.....	17
DEEL IV BIJLAGEN	18

LEESWIJZER

Het Projectplan natuurontwikkeling HZE00 F4317 (vanaf hier Projectplan F4317) bestaat uit vier delen, welke onderverdeeld zijn in hoofdstukken. Onderstaand is per deel toegelicht welke informatie het bevat.

Deel I

In deel I wordt beschreven wat Waterschap De Dommel gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel I bestaat uit hoofdstuk 1 tot en met 7.

Deel II

Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is in feite de onderbouwing van het plan.

Deel III

Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures.

Deel IV

In deel IV zijn de bijlagen opgenomen.

DEEL I ONTWIKKELING PERCEEL HZE00 F4317

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Waterschap De Dommel werkt sinds begin 2016 aan de natuurontwikkelingsopgave van de Rielloop en nabij gelegen natte natuurparel. Daartoe heeft het Dagelijks Bestuur op 12 december 2017 het projectplan definitief vastgesteld (bijlage 1). Ten tijde van de bestuurlijke vaststelling was perceel F4317 nog in particulier eigendom. In het projectplan natuurontwikkeling Rielloop zijn technische maatregelen beschreven om de hydrologische omstandigheden van dit perceel te handhaven. Nadat het projectplan definitief was vastgesteld, heeft Waterschap De Dommel het laatst overgebleven particuliere perceel (F4317) kunnen aankopen. Dit perceel (rood gearceerd) ligt midden in het projectgebied (groen omlijnd) van de Rielloop in Heeze, weergegeven op figuur 1.



Figuur 1, ligging perceel F4317 te midden in projectgebied Rielloop

De uitvoering van project Rielloop is voorzien in het derde kwartaal van 2020. De herinrichting van perceel F4317 wordt bij voorkeur gelijktijdig uitgevoerd. De maatregelen sluiten naadloos aan op de maatregelen die op omliggende percelen uitgevoerd worden waardoor de natte natuurparel integraal hersteld wordt en er geen restopgave meer is. De beschreven technische (hydrologische) maatregelen rondom perceel F4317 in projectplan Rielloop worden achterwege gelaten.

1.2 Doelstellingen

Het project heeft de doelstelling om natuur te ontwikkelen in het beekdal van de Rielloop. Met de herinrichting van perceel F4317 wordt 0,56 ha natte natuurparel ontwikkelt. Deze ontwikkeling sluit aan bij de herinrichting van de omliggende 12 ha natte natuurparel zoals beschreven in projectplan Rielloop.

De natuurdoelstellingen voor de natte natuurparel zijn opgenomen op de herziene ambitiekaart natuurbeheer (10 mei '16) van de provincie Noord-Brabant. Voor perceel F4317 (en omliggende percelen) dient Groot Zeggenmoeras ontwikkelt te worden. Waterschap De


Dommel is verantwoordelijk om de juiste hydrologische omstandigheden te creëren voor dit type, de terreinbeherende instantie voert vervolgens het beheer uit.

2 GEBIEDSBESCHRIJVING

In dit hoofdstuk zijn beknopt de belangrijkste gebiedskenmerken beschreven voor perceel F4317. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het Projectplan Rielloop in bijlage 1. Perceel F4317 ligt in het projectgebied van de Rielloop en wordt daar dus ook beschreven.

2.1 Ligging en begrenzing plangebied


Perceel F4317 bevindt zich tussen de Rielloop en de Kleine Dommel. Aan de oostkant ligt de dorpskern Heeze, aan de westkant N2000 gebied Strabrechtse Heide. Het perceel heeft een oppervlakte van 0,56 ha en maakt onderdeel uit van het Strabrechts broek. Het Strabrechts Broek is het gebied dat in het kader van project Rielloop afgeplagd wordt, zie groene omkadering op figuur 2. Perceel F4317 is rood gearceerd op onderstaand figuur.

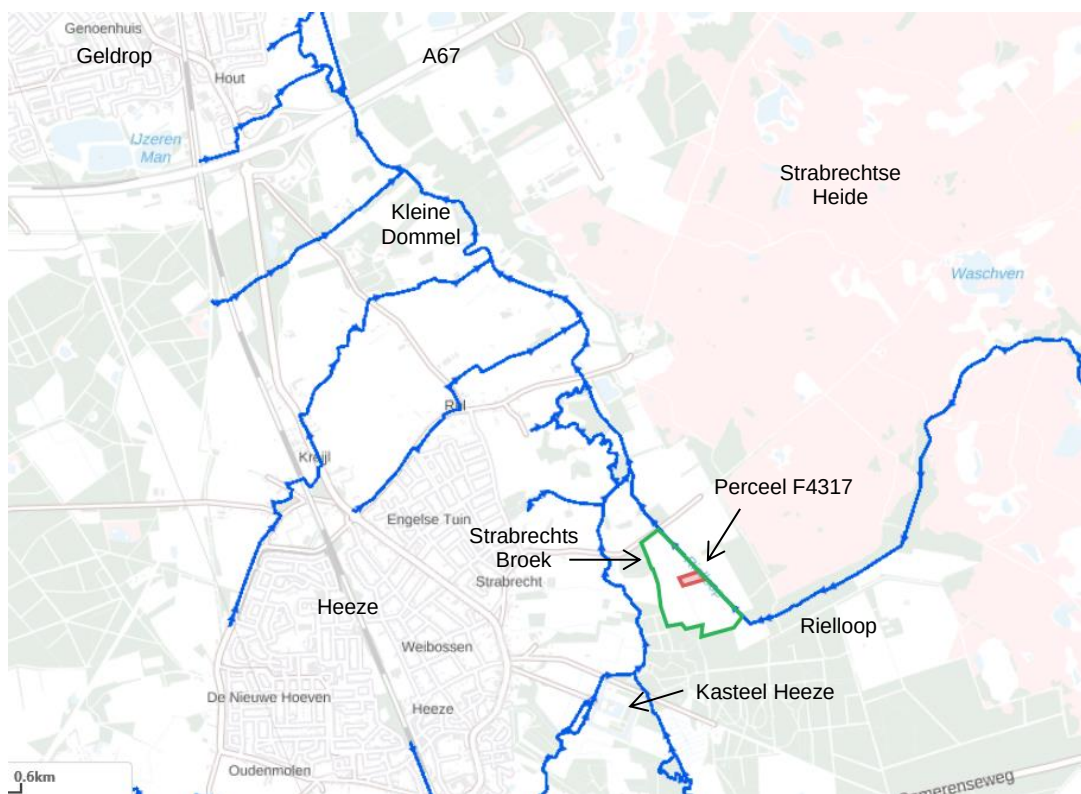


Figuur 2, ligging perceel F4317

2.2 Hoogteligging

De Rielloop stroomt vanaf de Strabrechtse Heide richting het beekdal van de Kleine Dommel. Perceel F4317 ligt direct ten westen van de Rielloop (rode kader). Op **Fout!** **Verwijzingsbron niet gevonden.** zijn de huidige maaiveldhoogten van perceel F4317 en de directe omgeving weergegeven. De hoogte van perceel F4317 varieert van 18,83 m +NAP in het westen tot 19,15 m +NAP in het oosten.

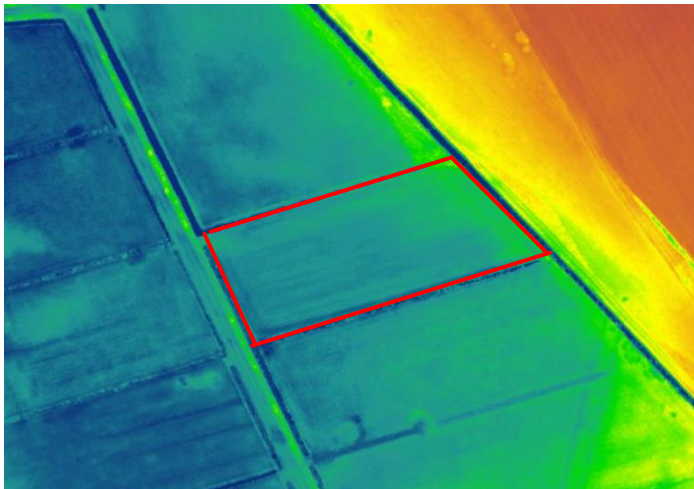

Figuur 3, hoogtekaart (bron ahn.nl)

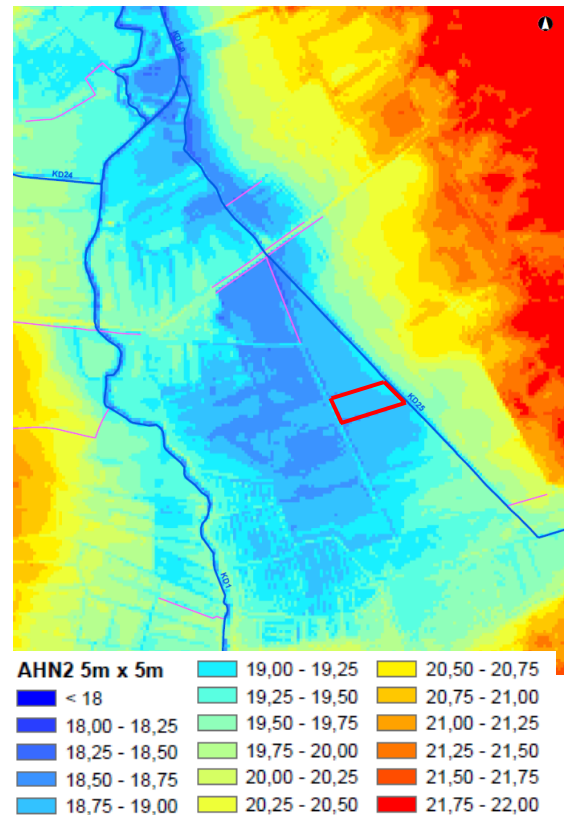

2.3 Bodemopbouw en -chemie

Bodemopbouw

De bodem van perceel F4317 bestaat uit moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand. (maps.bodemdata.nl).

In oktober 2019 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op perceel F4317¹. Op basis van de onderzoeksresultaten is gebleken dat maximaal licht verhoogde gehalten aan onderzochte parameters (waaronder PFAS) in de bovengrond zijn aangetroffen, tot maximaal 0,62 µg/kg. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte parameters aangetroffen. De licht verhoogde gehalten in de bovengrond zijn mogelijk te verklaren door overstroming vanuit de Kleine Dommel dan wel de Rielloop in het verleden.

Op basis van de aangetroffen gehalten is er geen noodzaak nog aanvullend onderzoek uit te voeren. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor het afplaggen.

Voedselrijke bodems door landbouwkundig gebruik

Op basis van het fosfaatonderzoek² kan worden geconcludeerd dat de fosfaatgehalten van de percelen die agrarisch in gebruik zijn of zijn geweest, waaronder perceel F4317, in het dal van de Rielloop zeer hoog zijn. Het verwijderen van de bovenste 30 cm voedselrijke grond is nodig om de ambitie in het provinciaal Natuurbeheerplan, Groot zeggenmoeras, tot ontwikkeling te kunnen laten komen. Zeggenmoeras ontwikkelt zich optimaal onder matig voedselrijke (mesotroof) omstandigheden. Het afplaggen maakt dat het maaiveld dicht bij het grondwater wordt gebracht.

¹ Verkennend bodemonderzoek, Locatie aan de Kleine Dommel Heeze-Leende (perceel F, 4317), Sweco, 9 oktober 2019

² Fosfaatonderzoek Kleine Dommel, Bodemchemisch onderzoek naar natuurpotenties, Royal Haskoning, 21 juli 2011


2.4 Oppervlaktewater

Watergangen

Perceel F4317 wordt aan de oostkant begrensd door de Rielloop (A-watergang) en aan de westkant door een schouwsloot. Ten noorden en zuiden van het perceel liggen greppels die in natte perioden voor de afwatering zorgen.

Inundatie

Jaarlijks inundeert een groot deel van het beekdal van de Kleine Dommel en de Rielloop. Figuur 4 geeft het inundatievlak weer dat gemiddeld eens per jaar optreedt ($T=1$) zodra alle meanders in de Kleine Dommel gerealiseerd zijn (Q3 in 2020). Het rode kader geeft perceel F4317 weer.

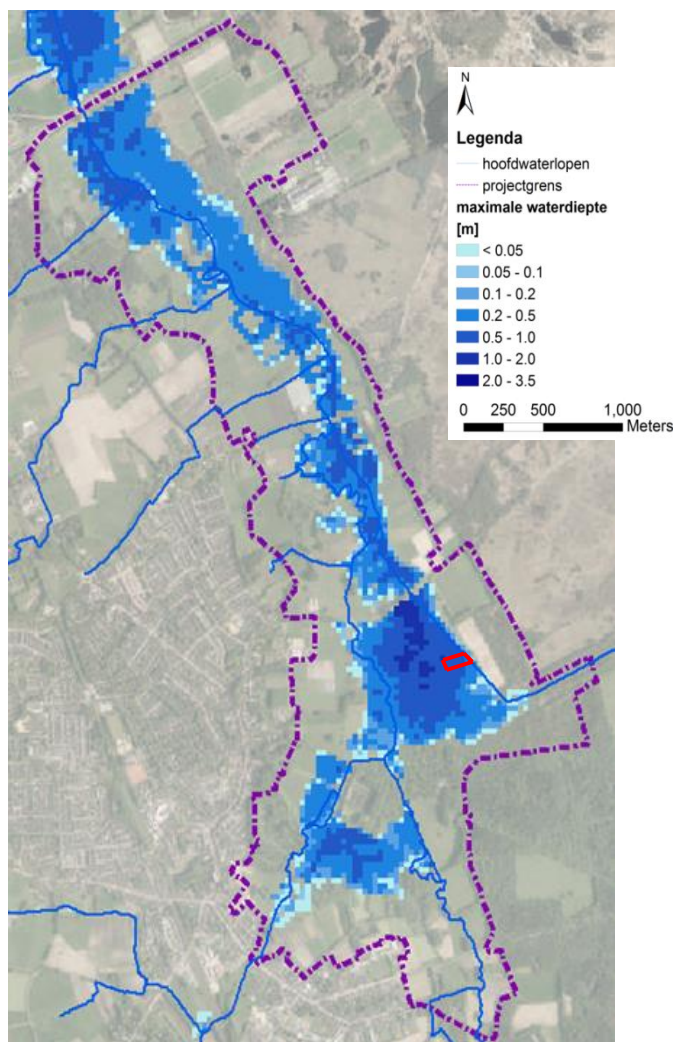

Figuur 4, jaarlijkse inundatievlak ($T=1$)


2.5 (Geo)hydrologie

Kwel

De kweldruk op perceel F4317 loopt uiteen van matige kweldruk (1-5 mm/dag) tot een zeer sterke kweldruk (>10 mm/dag) in zowel voorjaar als gemiddeld per jaar. Figuur 5 laat de kweldruk in het projectgebied zien.



Figuur 5, kweldruk

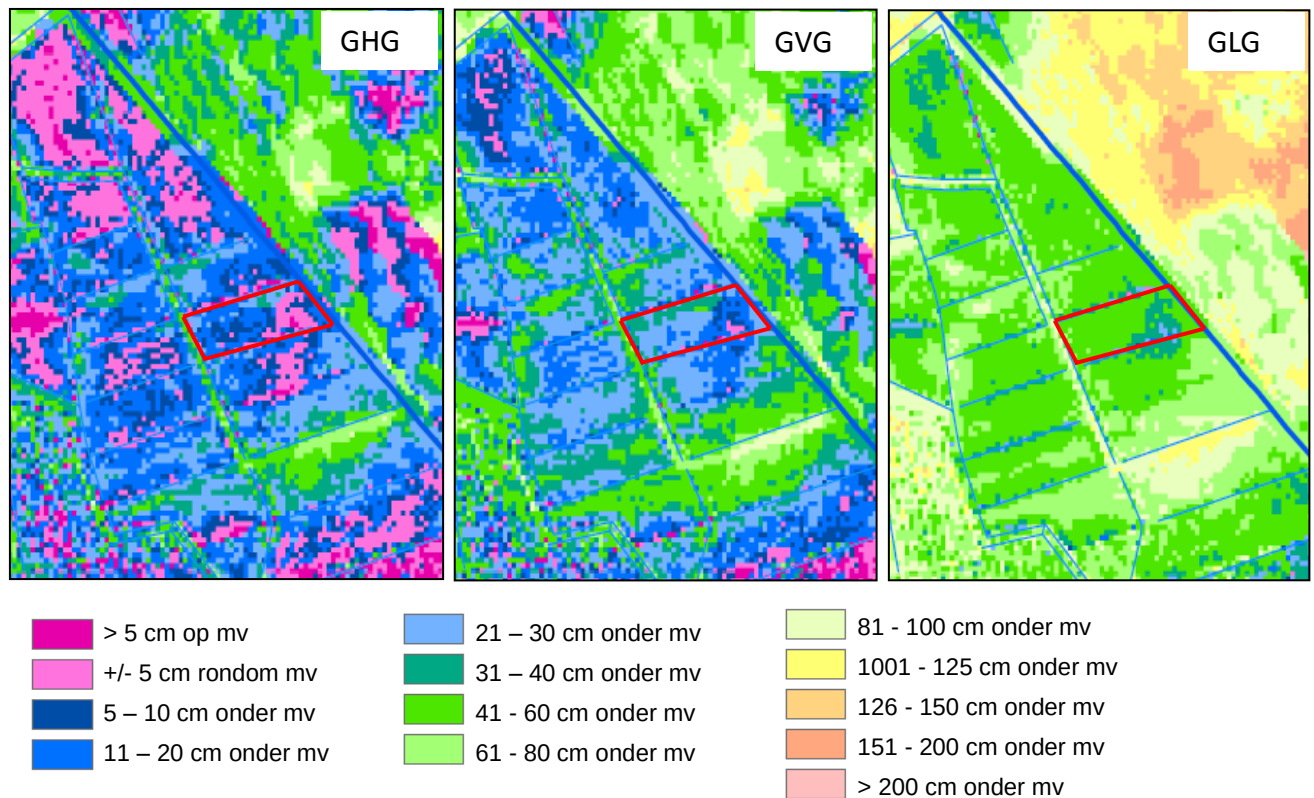

Figuur 6, gemiddelde grondwaterstanden

Grondwaterstanden

De GVG van perceel F4317 varieert tussen de 30 cm – mv in het westen en 5 cm – mv in het oosten van het perceel. In de natte perioden (GHG) komt het grondwater tot aan maaiveld. In de droge perioden (GLG) zakt het grondwater uit tot 60 cm onder maaiveld. Figuur 6 geeft de situatie op kaart weer. Let op, deze situatie doet zich voor zodra de meanders in de Kleine Dommel allemaal gegraven zijn. Dat wordt gelijktijdig gedaan met de herinrichting van perceel F4317. In de huidige situatie zijn de grondwaterstanden maximaal enkele decimeters lager.

2.6 Ecologie en landschap


Perceel F4317 is tot op heden in gebruik als agrarisch grasland en wordt af en toe begraasd met jongvee. Ecologisch waardevolle elementen en soorten zijn niet aanwezig. N2000 gebied 'Strabrechtse Heide en Beuven' bevindt zich op circa 200 m afstand van het perceel F4317.

2.7 Landbouw

Met behulp van de Watnood-systematiek is bepaald in hoeverre de landbouwgrond in het projectgebied geschikt is voor agrarische doeleinden. Op Figuur 7 is de doelrealisatie voor landbouw weergegeven in de uitgangssituatie.

De doelrealisatie is de uitkomst van de vergelijking tussen de opbrengst onder het optimale grond- en oppervlaktewaterregime (Cultuurtechnisch Vademecum) en de opbrengst onder het berekende grond- en oppervlaktewaterregime. De uitkomst is in percentages uitgedrukt. Bij een 100% doelrealisatie wordt de maximale opbrengst van het perceel gehaald. Bij lagere percentages is de opbrengst minder als gevolg van te natte of te droge omstandigheden.

De doelrealisatie voor perceel F4317 is laag, grotendeels tussen de 0 en 60%. Echter, bij de berekening is uitgegaan van een meanderende Kleine Dommel, waarbij de grondwaterstanden in het dal van de Kleine Dommel en de Rielloop hoger zullen worden t.o.v. de huidige situatie.

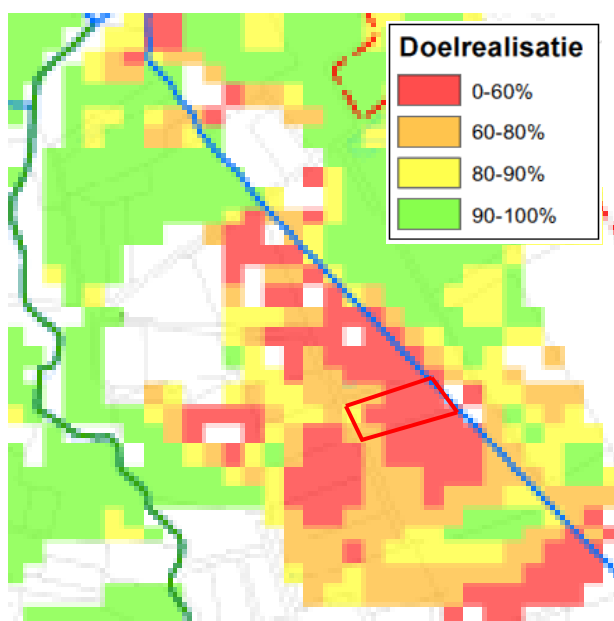

Figuur 7, doelrealisatie landbouw

2.8 Archeologie, cultuurhistorie en aardkundige waarden

In de rapportage "*RAAP, Onderzoeksgebied Kasteel Heeze-Rietbeemden, Een cultuurhistorisch bureauonderzoek, veldinspectie en verkennend booronderzoek, Rapport 2063, 8 juni 2010*" is de archeologische en cultuurhistorische situatie in het plangebied in beeld gebracht. Aanvullend op het onderzoek van RAAP heeft SB4 in maart 2016 een cultuurhistorische waardering opgesteld voor de Rielloop waar perceel F4317 ligt. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen uit de rapporten opgenomen.

Archeologie

In het dal van de Rielloop komen enkele vindplaatsen voor. Ten oosten van de Rielloop betreffen dat diverse kampementen van jager-verzamelaars.

Cultuurhistorie

De opbouw van het landschap is typerend voor een gebied met nederzettingen op de zandgronden, waarbij de dorpsbebouwing zich uitstrekt langs de weg, op de rand van het beekdal. De akkers bevonden zich op de hogere gronden ten westen van het dorp, terwijl de lagere gronden langs de beek afwisselend in gebruik waren als veld (bouw- of weiland), weide- of hooiland voor het vee. Buiten dit complex lagen de woeste gronden die werden gebruikt voor het verzamelen van nuts-, bouw- en brandhout, steken van plaggen ter verrijking van de bouwlanden en begrazing door het vee. Door overbelasting van de woeste gronden konden hier stuifzanden ontstaan.

Hedendaags bezit het gebied de karakteristieke kenmerken van een beekdallandschap, zoals: weinig tot geen bebouwing; minimale ontsluiting of via doodlopende, onverharde paden, afwisseling van grasland, perceelrandbeplanting en loofbosjes, en ontleent hier als geheel waarde aan. Het gebied kent zodanige karakteristieken, en met name ensemblewaarde, dat zorgvuldig met de hoofdstructuur zou moeten worden omgegaan en waar mogelijk de verschijningsvorm te versterken. Aangezien het geen statisch landschap betreft, zijn er eveneens mogelijkheden voor ontwikkeling en toevoeging van nieuwe kwaliteiten. Aanbevolen wordt om tijdens de planvorming aansluiting te zoeken bij de historische karakteristieken van het beekdallandschap.

Aardkundige waarden

Onder aardkundige waarden worden onderdelen van het landschap verstaan, die iets vertellen over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van het landschap. Grote delen van het oorspronkelijke landschap in Nederland zijn al verdwenen door bebouwing, doorsnijding, ruilverkaveling, herinrichting, egalisatie, afgraving, etc. De Strabrechtse Heide en het beekdal van de Kleine Dommel waarbinnen perceel F4317 ligt, zijn door de provincie Noord-Brabant aangewezen als aardkundig waardevol gebied.


3 BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN (GEWENSTE SITUATIE)

3.1 Doel van de maatregelen

Met de herinrichting van perceel F4317 wordt 0,56 ha natte natuurparel ontwikkelt. Dit sluit aan bij de herinrichting van de omliggende 12 ha natte natuurparel zoals beschreven in projectplan Rielloop waardoor het gebied integraal tot ontwikkeling kan komen en er geen restopgave meer is.

3.2 Streefbeeld

De natuurdoelstellingen voor de natte natuurparel zijn opgenomen op de herziene ambitiekaart natuurbeheer (10 mei '16) van de provincie Noord-Brabant. Voor perceel F4317 (en omliggende percelen) dient moeras ontwikkelt te worden. Op basis van de abiotische omstandigheden heeft de terreinbeheerder de doelstelling nader gespecificeerd tot groot zeggenmoeras. Een uitsnede van de ambitiekaart met daarop de beheertypen is weergegeven in Figuur 8.

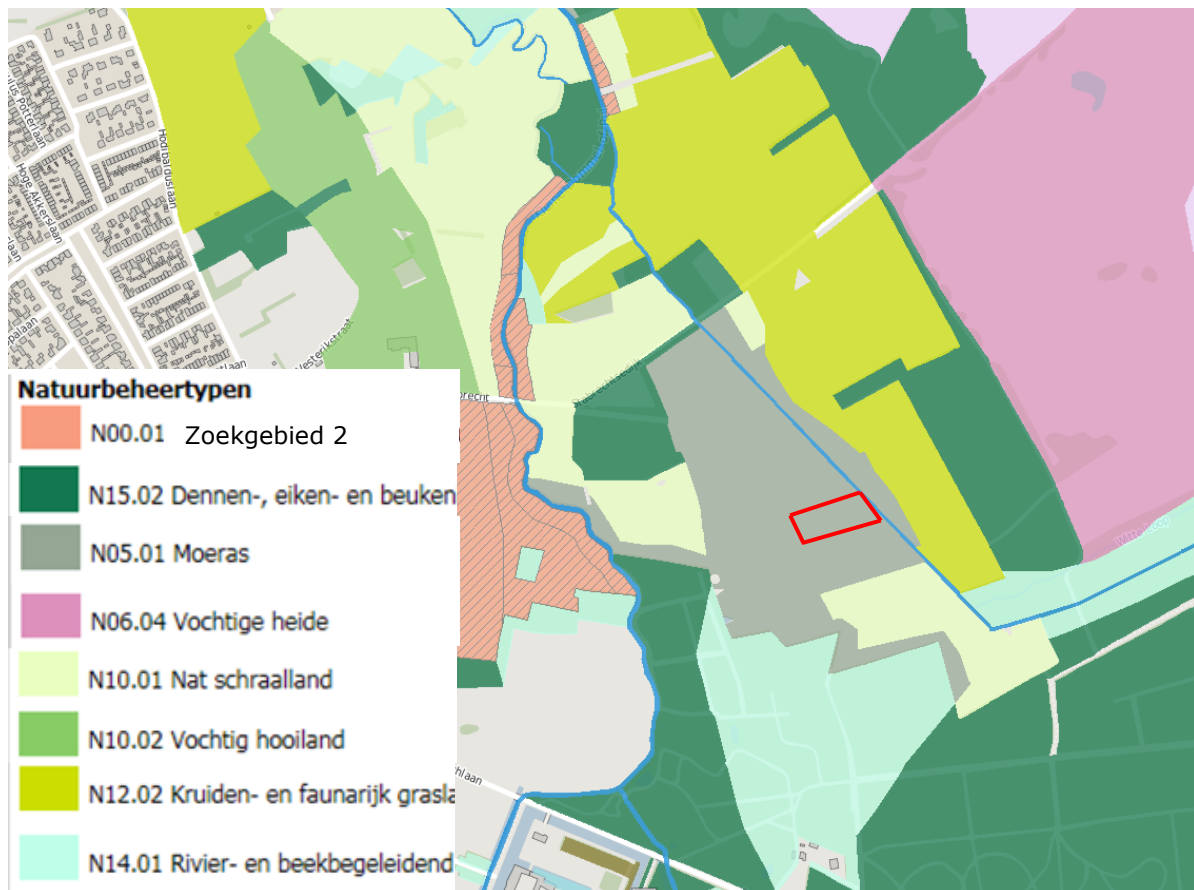

Figuur 8, uitsnede herziene ambitiekaart (mei 2016) met daarop de beheertypen

3.3 De maatregelen

Ten behoeve van de realisatie van de doelstelling is het volgende voorzien:

Maatregel die wel uitgevoerd wordt op perceel F4317 is:

- Afplaggen voedselrijke toplaag (30 cm) van perceel F4317, in aansluiting bij het overige 12 ha van de natte natuurparel.

Maatregelen die opgenomen zijn in het projectplan Rielloop, d.d. 25 augustus 2017 die niet uitgevoerd worden zijn de volgende:

- Herprofileren ontwateringssloot rondom perceel F4317;
- Aanleggen grondwal rondom perceel F4317;
- Pomp bij perceel F4317 plaatsen;
- Verleggen Rielloop en watergang OWL31307 ter hoogte van perceel F4317;
- Nieuwe toegangsweg en duiker aanleggen voor perceel F4317 ten oosten van Rielloop.

De betreffende maatregelen zijn weergegeven op Figuur 9.



Figuur 9, weergave technische maatregelen die komen te vervallen

4 BESCHIKBAARHEID GRONDEN

Perceel F4317 is onlangs door Waterschap De Dommel verworven, nadat het projectplan Rielloop vastgesteld was. Na de herinrichting wordt het perceel door geleverd naar Brabants Landschap.

5 EFFECTEN VAN DE MAATREGELEN

Door het verwijderen van de voedselrijke toplaag worden de juiste omstandigheden gecreëerd voor de ontwikkeling van groot zeggenmoeras. Het maaiveld wordt dicht bij het grondwater gebracht (nattere omstandigheden) en de grond is stukken minder voedselrijk. Daarnaast kan de gehele natte natuurparel in één werkgang heringericht worden en is integraal herstel van de natte natuurparel mogelijk. Vanwege de aanwezig cultuurhistorische waarden, en de mogelijkheid om het gebied te kunnen afwateren, worden de aanwezige kavelsloten behouden.

De technische maatregelen rondom perceel F4317, zoals beschreven in projectplan Rielloop en weergegeven op Figuur 9, zijn niet meer nodig en komen te vervallen.


6 WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD

Het afplaggen van perceel F4317 gebeurt gelijktijdig met de rest van het Strabrechts Broek. De vrijkomende grond wordt vervoerd naar perceel F4711, enkele honderden meters westwaarts naar een ander perceel van de voormalige eigenaar van F4317.

Voor wat betreft de wijze van uitvoering geeft het waterschap kaders mee waarbinnen de aannemer het werk uit moet voeren. De daadwerkelijk invulling binnen deze kaders, werkvolgorde, etc. is aan de aannemer zelf.

Enkele belangrijke kaders zijn:

- Periode van uitvoering is 15 juli 2020 t/m 31 oktober 2020. Na het broedseizoen en voordat de natte periode aanbreekt;
- De machines waarmee gewerkt wordt moeten jonger zijn dan 2015 waardoor de stikstofuitstoot tot het minimum wordt beperkt. Zie ook paragraaf 8.2 die dieper ingaat op de natuurtoets en uitgevoerde Aeries-berekening;
- Bij de uitvoering van project Rielloop incl. perceel F4317 komt in totaal komt er ca. 30.000 m² grond vrij. De transportroute(s) dienen de bebouwde kom te mijden. Dit wordt afgestemd met de gemeente Heeze-Leende en als randvoorwaarde aan de aannemer meegegeven;
- De aannemer dient te werken conform het ecologisch werkprotocol;
- De graafwerkzaamheden dienen archeologisch te worden begeleid. Perceel F4317 grotendeels intensief, zie Figuur 10.

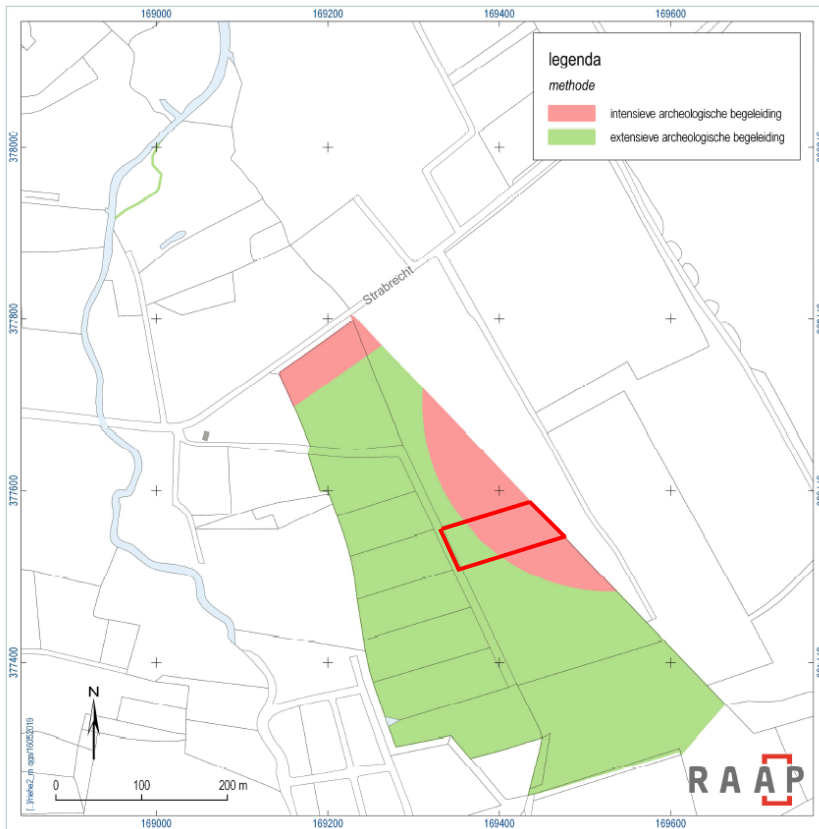

Figuur 10, archeologische begeleiding tijdens de uitvoering

7 LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD MONITORING

7.1 Legger

Na uitvoering meet het waterschap alle gerealiseerde en aangepaste waterstaatswerken in en legt deze vast op tekeningen. Vervolgens legt het waterschap de maten of de functionele eisen in de legger vast. Hiervoor neemt het waterschap een apart besluit: het leggerbesluit. Na uitvoering van dit project wordt de legger voor het projectgebied herzien.

7.2 Beheer en onderhoud

Na de herinrichting van perceel F4317 wordt het perceel door geleverd aan Brabants Landschap. Dan zijn zij eigenaar van alle percelen in het Strabrechts Broek. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dit perceel.

7.3 Monitoring

Monitoring van de terrestrische natuur dient te worden uitgevoerd door de terreinbeheerder.

DEEL II VERANTWOORDING

8 VERANTWOORDING OP BASIS VAN WET- EN REGELGEVING

Beleid, wetten, regels en afspraken op allerlei niveaus zijn van invloed op de planvorming en realisatie van het projectplan. Het vormt een kader waarbinnen keuzes gemaakt worden. In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen relevante wetten, regels en beleid vanuit de overheden en dit project gelegd. Deze wet- en regelgeving bieden het kader en de rechtvaardiging van het project.

Dit projectplan levert primair een bijdrage aan de doelstellingen uit de Waterwet. Verder houdt het projectplan rekening met omgevingsbeleid en -regelgeving. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met archeologische, cultuurhistorische en natuur- en landschappelijke waarden. Het betreft zowel beleid van het waterschap, als beleid en regelgeving van andere overheden zoals de Europese Unie, de rijksoverheid en de provincie. In dit hoofdstuk worden van hogere (Europees en het Rijk) naar lagere (waterschap/gemeente) overheid de relevante beleidstukken en regelgeving beschreven.

8.1 Waterwet

De uitvoering van dit plan past binnen de Waterwet. Vanuit de Waterwet zijn een aantal doelstellingen waaraan binnen dit plan in meer of mindere mate invulling is gegeven.

De Waterwet heeft drie doelstellingen, namelijk:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (waterkwantiteit);
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit);
3. het vervullen van overige maatschappelijke functies van het watersysteem.

8.2 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is van kracht en regelt zowel de bescherming van planten- en diersoorten, als de bescherming van natuurgebieden en houtopstanden.

Eind 2017 is er voor het projectgebied Rielloop, inclusief perceel F4317, een natuurtoets uitgevoerd om de impact van de voorgenomen ingreep op beschermde soorten en gebieden vast te stellen. Met de verwerping van de PAS is de natuurtoets eind 2019 geüpdatet en is er een aanvullende notitie opgesteld m.b.t. de stikstofdepositie.

Op basis van de natuurtoets is voor wat betreft de soortenbescherming geconcludeerd dat het afplaggen van perceel F4317 mogelijk negatieve effecten kan hebben op kleine marterachtigen en broedvogels. De negatieve effecten worden voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen voorafgaand of tijdens de werkzaamheden zoals beschreven in het ecologisch werkprotocol. Dit protocol wordt verstrekt aan de aannemer.

Voor wat betreft de gebiedsbescherming is geconcludeerd dat de natuurontwikkeling van project Rielloop, waaronder perceel F4317 niet tot (significant) negatieve effecten leidt op aangewezen habitats en -soorten van het Natura 2000-gebied 'Strabrechtse Heide en Beuven' dat op circa 200 m afstand ligt. Dit is eind 2019 nader onderbouwd m.b.v. Aeries-berkeningen.

De stikstofdepositie van de eenmalige inrichtingswerkzaamheden voor het Strabrechts Broek, waaronder perceel F4317, zijn bepaald op 0,27 mol. Daarnaast is in beeld gebracht van welke percelen het agrarisch gebruik is of wordt beëindigd in het Strabrechts Broek en wat dat voor

een reductie aan stikstofemissie betekent. In het Strabrechts Broek wordt 6,2 ha agrarisch gebruik beëindigd, waaronder ook perceel F4317. Dit staat gelijk aan het beëindigen van jaarlijks 4,87 mol stikstofemissie.

Omdat de stikstofemissie van de 6,2 ha agrarisch grasland, als gevolg van bemesting wordt beëindigd, kan de functieverandering als interne saldering bij de bepaling van de stikstofdepositie van de natuurontwikkeling worden gebruikt. Met de interne saldering is geen sprake is van netto stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats binnen Natura 2000-gebied als gevolg van de voorgenomen natuurontwikkeling Rielloop. Een Wnb-vergunning is derhalve niet nodig.

8.3 Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant 2016 – 2021

Het Provinciaal Milieu- en Waterplan staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. Doelen uit het plan zijn:

- voldoende water voor mens, plant en dier;
- schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht);
- bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico's;
- verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening.

De provincie wil deze doelen realiseren in samenwerking met de partners op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Waterschap De Dommel geeft met de maatregelen voor perceel F4317 invulling aan deze doelstelling.

8.4 Provinciaal Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant zijn de beheertypen vastgelegd. In dit Natuurbeheerplan staat aangegeven waar en welke natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijkheden er worden geboden voor landschapsonderhoud. De ambitiekaart geeft de toekomstige gewenste situatie weer en daarmee de natuurdoelen op termijn. Figuur 8 geeft de beheertypen weer voor perceel F4317.

De maatregelen zoals beschreven in het projectplan zijn erop gericht om de ambitietypen uit het Natuurbeheerplan te realiseren.

8.5 Interim omgevingsverordening

De Interim omgevingsverordening (voorheen de Verordening ontgrondingen) van provincie Noord-Brabant stelt in artikel 2.33 (in de Verordening ontgrondingen was dit artikel 9a) dat, krachtens artikel 7 lid 2 van de Ontgrondingenwet, geen vergunning vereist is voor ontgrondingen in het kader van ecologische verbindingzones en overig natuurontwikkelingsprojecten die in overeenstemming zijn met het provinciale beleid. Voorwaarde daarbij is, dat de ingrepen zijn opgenomen in een plan waarover via een openbare inspraakprocedure besluitvorming heeft plaatsgevonden.

De ontwikkeling van perceel F4317 past in het provinciale beleid. Op het voorliggende projectplan vindt besluitvorming plaatsvinden via een openbare inspraakprocedure. Zodoende voldoet het project aan de in artikel 2.33 van de Interim omgevingsverordening neergelegde eisen voor vrijstelling van vergunningplicht. Het aanvragen van een Ontgrondingsvergunning is derhalve niet nodig. De ontgroning moet wel worden gemeld bij Gedeputeerde Staten. De

melding moet minimaal acht weken voorafgaand aan de start van de ontgrondingswerkzaamheden worden ingediend en met de werkzaamheden mag pas worden gestart wanneer deze door Gedeputeerde Staten zijn geaccepteerd.

8.6 Waterbeheerplan 'Waardevol Water' 2016 – 2021

In het Waterbeheerplan geeft Waterschap De Dommel aan wat de doelen zijn voor de periode 2016-2021 en hoe die worden bereikt. Aan de basis van dit Waterbeheerplan staan de 6 waterprogramma's. Deze kwamen tot stand, in samenwerking met andere overheden en belangenorganisaties in het gebied. Ze richten zich op alle waterdoelen in het beheergebied. Het Waterbeheerplan is afgestemd op het Stroomgebiedsbeheerplan Maas, het Nationaal Waterplan en het Provinciaal Waterplan. Het projectplan F4317 geeft invulling aan het thema Voldoende water en Mooi Water.

Voldoende water'

Met de realisatie van maatregelen in de verdroogde natuurgebieden gaat Waterschap De Dommel aan de slag. Met dit project wordt invulling gegeven aan de doelen met betrekking tot ontwikkeling van het perceel F4317 in het Strabrechts Broek dat in zijn geheel aangewezen is als natte natuurparel.

'Mooi Water'

Bij 'Mooi gaat het om het behoud en versterking van vier waarden, te weten: cultuurhistorie, beleving, esthetiek en ontmoetingsplek. Dit project geeft invulling aan het aspecten cultuurhistorie door rekening te houden met de huidige cultuurhistorische waarden.

8.7 Keur Waterschap De Dommel

Op grond van de Keur van Waterschap De Dommel is het verboden om handelingen te verrichten in oppervlaktewaterlichamen, de bijbehorende beschermingszones en kunstwerken. Hiervoor dient een vergunning aangevraagd te worden, of – in geval het waterschap zelf initiatiefnemers is – een Projectplan Waterwet opgesteld te worden. Het voorliggende projectplan geeft invulling aan deze verplichting op grond van de Keur.

8.8 Bestemmingsplan gemeente Heeze-Leende

Het huidige bestemmingsplan dat van toepassing is op perceel F4317 is het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Heeze-Leende 2017. Het perceel kent de enkelbestemming Natuur en de dubbelbestemming Waterberging. Daarnaast zijn er diverse gebiedsaanduidingen toegekend, te weten:

- Aardkundig waardevol gebied;
- Cultuurhistorisch waardevol gebied;
- Cultuurhistorisch vlak;
- Natuur Netwerk Nederland;
- Attentiezone Natuur Netwerk Nederland;
- Behoud en herstel watersystemen;
- Beperking veehouderij.

Het afplaggen van perceel F4317 en het achterwege laten van de technische maatregelen zoals beschreven in projectplan Rielloop zijn niet strijdig met de bestemmingsplanregels die van toepassing zijn. Vanuit de verschillende gebiedsaanduidingen geldt voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden wel een omgevingsvergunningplicht.

DEEL III RECHTSBESCHERMING

Dit plan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en waarden en in afstemming met de kaders vanuit wetgeving en beleid. Toch kan het zijn dat belanghebbenden opmerkingen hebben op dit plan en/of vinden dat hun specifieke belang onvoldoende is meegenomen. Daarvoor voorziet de wet in een inspraak- en rechtsbeschermingsprocedure.

Zienswijze

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen.

Vervolgens wordt een nota van wijzigingen toegevoegd aan dit projectplan waarin de wijzigingen ten aanzien van zienswijze en ambtshalve wijzigingen worden toegevoegd.

Beroep en hoger beroep

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.

DEEL IV BIJLAGEN

Onderstaande bijlage zijn digitaal beschikbaar op aanvraag.

1. Projectplan Natuurontwikkeling Rielloop, d.d. 25 augustus 2017.
