



Projectplan Waterwet

Aansluiting hydrofoor Nansum op waterleiding van
Waterbedrijf Groningen t.b.v. veedrinkleiding

- Dijkverbetering Delfzijl-Eemshaven

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen





Inhoud

blz.

1	Aansluiting hydrofoor Nansum t.b.v. veedrinkleiding op waterleiding	
	Waterbedrijf Groningen.....	3
	Traject Delfzijl-Eemshaven.....	3
1.1	Aanleiding en doel.....	3
1.2	Ligging en begrenzing plangebied.....	3
1.3	Beschrijving van de werkzaamheden.....	4
1.3.1	<i>Aansluiting waterleiding op de hydrofoor</i>	4
1.3.2	<i>Aanvullende maatregelen</i>	5
1.4	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd.....	5
1.5	Legger en beheer en onderhoud.....	6
1.5.1	<i>Legger</i>	6
1.5.2	<i>Beheer en onderhoud</i>	6
1.6	Samenwerking.....	6
1.7	Benodigde vergunningen en meldingen.....	6
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	6
2.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan.....	6
2.2	Procedure.....	6
3	Rechtsbescherming	7

Bijlage 1: lengteprofiel gestuurde boring



Aansluiting hydrofoor Nansum op waterleiding Waterbedrijf Groningen t.b.v. veedrinkleiding

Traject Delfzijl-Eemshaven

1.1 Aanleiding en doel

Project dijkverbetering Delfzijl-Eemshaven

De afgelopen jaren is dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven versterkt in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, om de dijk daarmee te laten voldoen aan de meest recente normen voor primaire keringen.

Onderdeel van de werkzaamheden vormde het amoveren de opstallen en wegen van de locatie 'Dijkpost Nansum', waarmee tevens het gebouwtje met daarin hydrofoor ten behoeve van de veedrinkleiding op die locatie is komen te vervallen. Om het functioneren van de veedrinkleiding d.m.v. de hydrofoor opnieuw mogelijk te maken is ca. 300m in zuidoostelijke richting, naast de aansluiting van de Dijkweg op de onderhoudsweg langs de kering een nieuw onderkomen geplaatst.

Voor het functioneren van de veedrinkleiding dient de hydrofoor opnieuw te worden aangesloten op de nabij gelegen hoofddrinkwaterleiding van Waterbedrijf Groningen.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De locatie van het werkgebied is gelegen aan het einde van de Dijkweg in Nansum (Holwierde).





1.3 Beschrijving van de werkzaamheden

1.3.1 Aansluiting waterleiding op de hydrofoor

Gestuurde boring

Vanaf de hoofdwaterleiding (100 AC) gelegen in het landbouwperceel van de fam. Bos zal doormiddel van een gestuurde boring/persing een nieuwe leiding (materialisatie SDR11, volgens NEN3650) worden gelegd naar een nieuw te plaatsten watermeetpunt op de binnenberm van de kering. Het traject van de leiding is aangegeven in onderstaande tekening. De nieuwe aansluiting heeft een capaciteit van 3m³/uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Waterbedrijf Groningen.




Watermeetput

In de binnenberm van de kering zal een nieuwe watermeetput (zie bijgevoegde specificatie) worden aangebracht (zie tekening hierboven), waarop de geboorde leiding zal worden aangesloten. Plaatsing van de put wordt uitgevoerd door Ploeger Infra BV.

Aansluiting hydrofoor

Vanaf de watermeetput zal door middel van een 32L HDPE leiding worden aangesloten op de hydrofoor (zie tekening hieronder). De leiding komt te liggen op een diepte van ca. 80cm onder het maaiveld, over een lengte van ca. 25m.

Zie bijlage 1 voor het lengteprofiel van de boring.

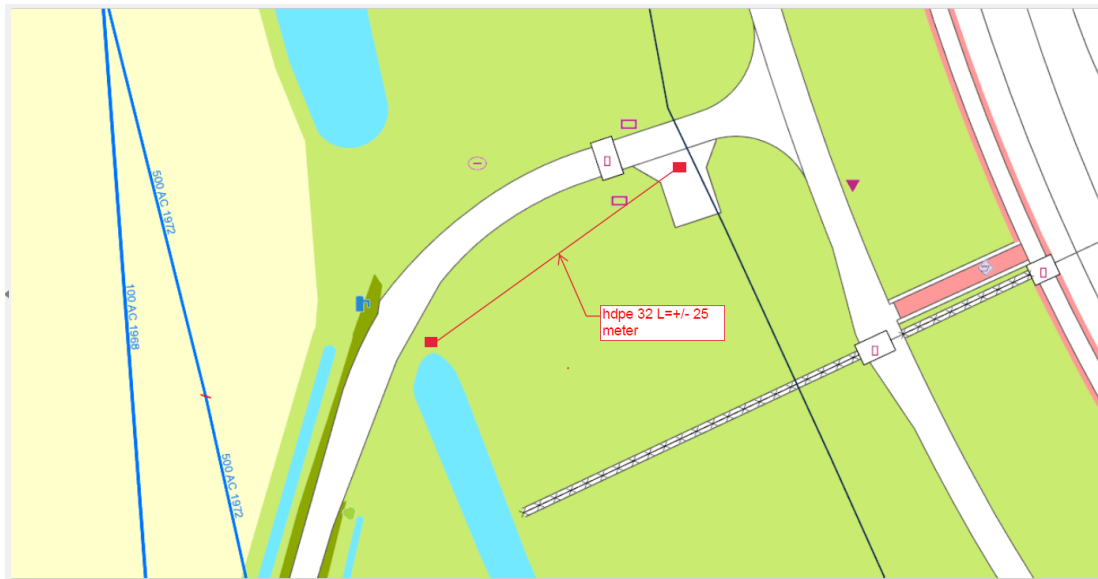

1.3.2 Aanvullende maatregelen

Schade

Schade aan de van de waterkering wordt (zoveel mogelijk) voorkomen. Het in te zetten materieel zal hierop gericht zijn, inclusief het eventueel gebruik maken van rijplaten. Schade ten gevolge van de uitvoering van werkzaamheden zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

In alle gevallen wordt de schade aan het dijklichaam en belendingen tot een minimum beperkt (eventueel d.m.v. schade beperkende maatregelen). De onderzoekslocaties worden achterlaten zoals aangetroffen, (rij-) schade wordt hersteld.

Calamiteiten (hoogwater op zee)

Bij verwachte waterstanden boven +3.00m NAP worden er geen werkzaamheden op of nabij de dijk uitgevoerd. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer hiervan uiterlijk 24 uur voor de werkzaamheden op de hoogte.

Beheer en onderhoud

- Gesloten hekken worden weer afgesloten en daarbij wordt rekening gehouden met eventueel aanwezige schapen;
- Bij start van de werkzaamheden wordt contact opgenomen met de beheerder, de uitvoerder primaire kering de heer H. Rijploeg.

1.4 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Uitvoering op hoofdlijnen:

Zie 1.3.

Planning:

Start van de werkzaamheden: tweede helft april.

Uitvoeringsduur:

Het werk duurt ca. 2 dagen .



1.5 Legger en beheer en onderhoud

1.5.1 Legger

De aangelegde voorzieningen dienen te worden opgenomen in het beheerregister. Een aanduiding ervan op de legger is niet nodig.

1.5.2 Beheer en onderhoud

Onderhoud aan de watermeetput en leiding tussen put en hydrofoor zal worden uitgevoerd door B&O waterschap, dan wel in opdracht van het waterschap door derden. Het beheer en onderhoud van de waterleiding tussen de hoofdwaterleiding (100 AC) en de watermeetput berust bij Waterbedrijf Groningen.

1.6 Samenwerking

B&O primaire kering Noorderzijlvest wordt op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. Daar waar nodig zal om ondersteuning worden verzocht.

1.7 Benodigde vergunningen en meldingen

Voor het uitvoeren van de onderzoeken is een projectplan ikv de Waterwet noodzakelijk.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.



3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen. Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld..
