

Micro Projectplan Verleggen BZ35

*Onderdeel van Herinrichting beekdal Groote Beerze – traject 1
door Waterschap De Dommel*



Micro Projectplan

Verleggen BZ35

*Onderdeel van Herinrichting beekdal Groote Beerze – traject 1
door Waterschap De Dommel*

Auteur:

Waterschap De Dommel
Dhr. J. van Abeelen

Projectmedewerker



Versie:

Definitief

Datum:

22 februari 2021

Versie:

1.0

Controle:

T. van Paassen

Inhoud

1	INLEIDING	1
1.1	Achtergronden en doel van dit plan	1
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	2
1.3	Details verleggen BZ35	3
1.4	Details recreatieve verbinding	7
2	OMGEVINGSRECHT EN COMMUNICATIE	8
2.1	Omgevingsvergunning	8
2.2	Communicatie	8
3	RECHTSMIDDELEN	9
3.1	Verkorte procedure	9
3.2	Beroep	9
3.3	Verzoek om voorlopige voorziening	9

1 INLEIDING

1.1 Achtergronden en doel van dit plan

Dit (micro) projectplan is onderdeel van het project 'Herinrichting beekdal Groote Beerze – traject 1'. De herinrichting van het beekdal van de Groote Beerze vindt (gefaseerd) in trajecten plaats, de volgende doelstellingen zijn hierop van toepassing:

- Het verbeteren van de Groote Beerze in het kader van de Kaderrichtlijn Water;
- Verdroging wordt tegen gegaan, kwetsbare natuur versterkt en wateroverlast beperkt;
- Natuurherstel in het kader van Natura 2000;
- Het inrichten van percelen in het Natuurnetwerk Brabant;
- Het gebied wordt toegankelijker voor recreanten

Het hoofddoel van dit microplan is dat de BZ35 wordt verlegd in zuidelijk richting. De oude BZ35 staat hieronder in het paars weergegeven. De nieuwe BZ35 (blauw) wordt ten zuiden van het bos aangelegd en sluit daarmee aan op de huidige duiker onder de Schipstaarten en direct op de Groote Beerze. Aan de andere zijde van de Groote Beerze loopt de BZ34, deze blijft in de oude/ bestaande situatie gehandhaafd tussen de Groote Beerze en De Biezegoren.

Parallel aan de nieuwe BZ35 en bestaande BZ34 komt een nieuw wandel- en fietspad met ruiterpassage welke tevens geschikt is voor minder validen.

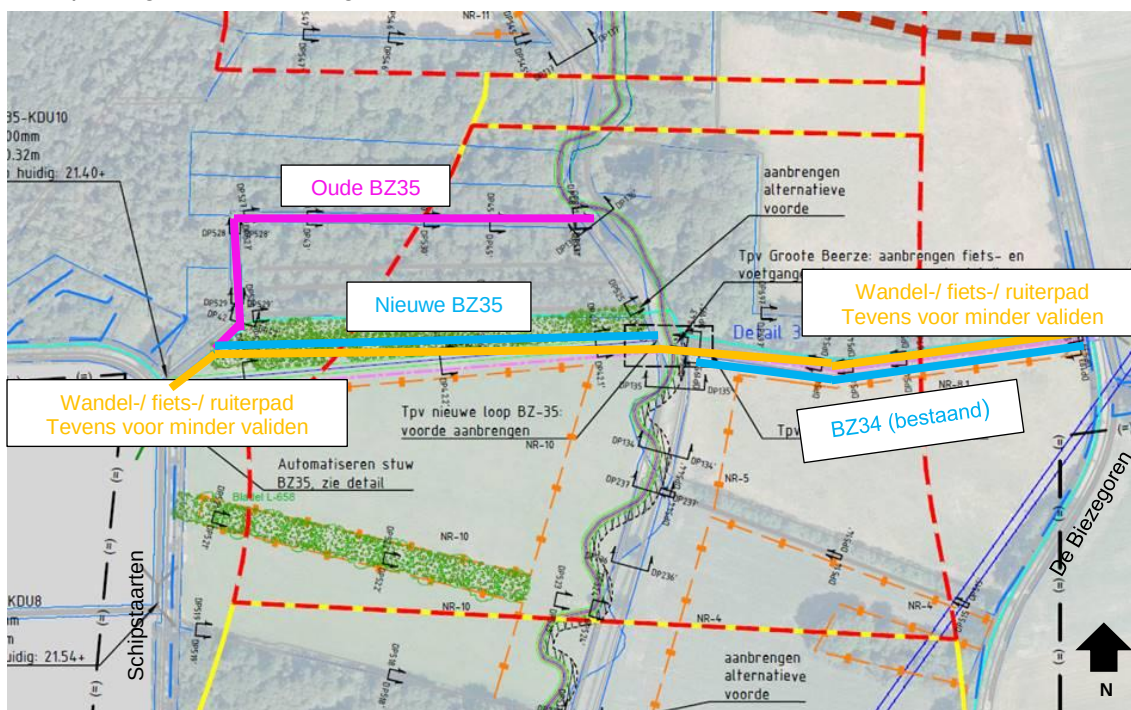


Fig. 1: Uitsnede definitief projectplan Herinrichting beekdal Groote Beerze Traject 1 (vastgesteld op 25 februari 2020).

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van het project 'Herinrichting Beekdal Groote Beerze' loopt van het zuiden van Hapert tot iets ten noorden van Westelbeers (zie rood omkaderde trajecten 1 t/m 3) en ligt binnen de Kempen-gemeenten Oirschot en Bladel.

De locatie waar de BZ35 wordt verlegd ligt tussen de weg Schipstaarten en de Groote Beerze. De locatie ligt aan de rand van de kern van Netersel.

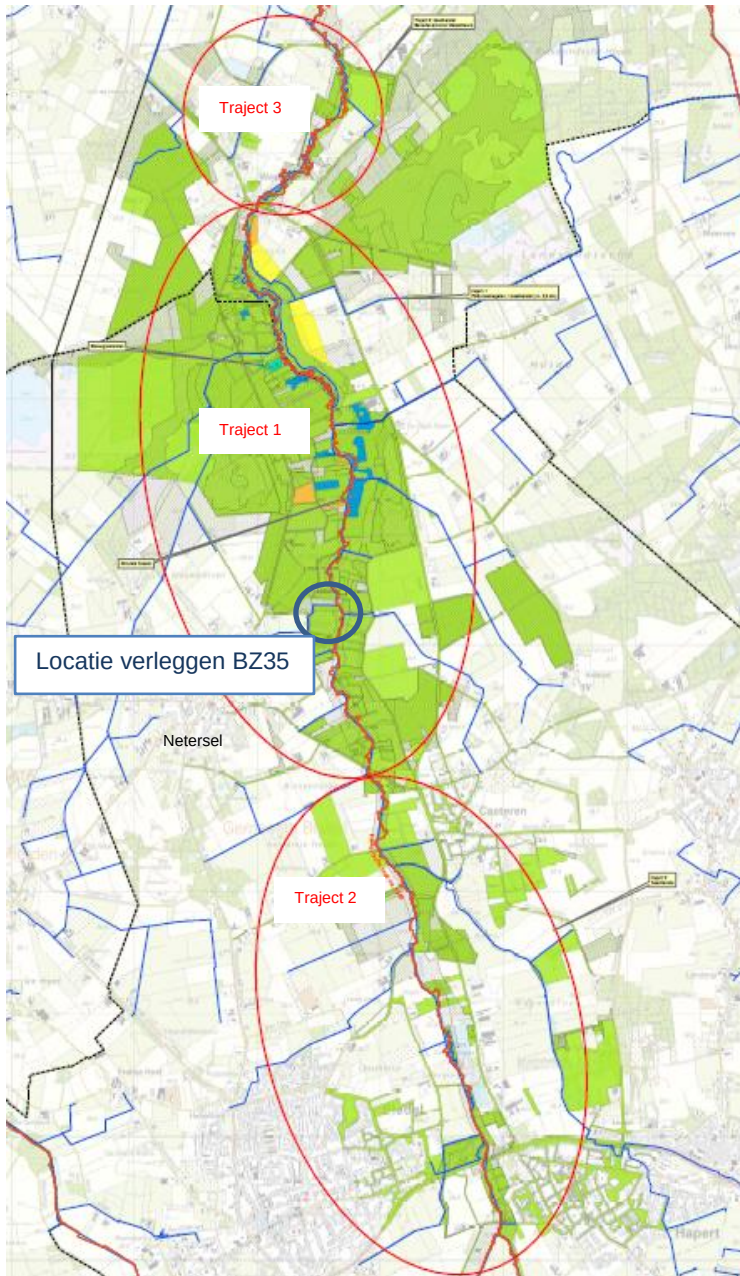


Fig. 2: Ligging perceel waar BZ35 wordt verlegd, binnen projectgebied Groote Beerze

1.3 Details verleggen BZ35

De huidige BZ35 stroomt middels diverse haakse bochten door een bosperceel. De beheer- en onderhoud situatie van de huidige watergang is niet optimaal. De oude (huidige) BZ35 wordt na de omlegging gedempt waardoor deze ook geen verdrogende werking op het bosperceel meer heeft. Onderstaande afbeeldingen tonen de situatie in december 2020.



Fig. 3: BZ35 door bosperceel (oude situatie)

Omdat er tevens een wandelpad gecreëerd wordt op het perceel van Brabants Landschap (kenmerk sectie L, nr. 658), is besloten om de BZ35 tevens te verleggen naar een meer toegankelijke positie met minder belemmeringen voor beheer en onderhoud. Tevens worden de doorstroming en de onderhoud mogelijkheden verbeterd omdat er geen duikers meer in de loop verwerkt worden.

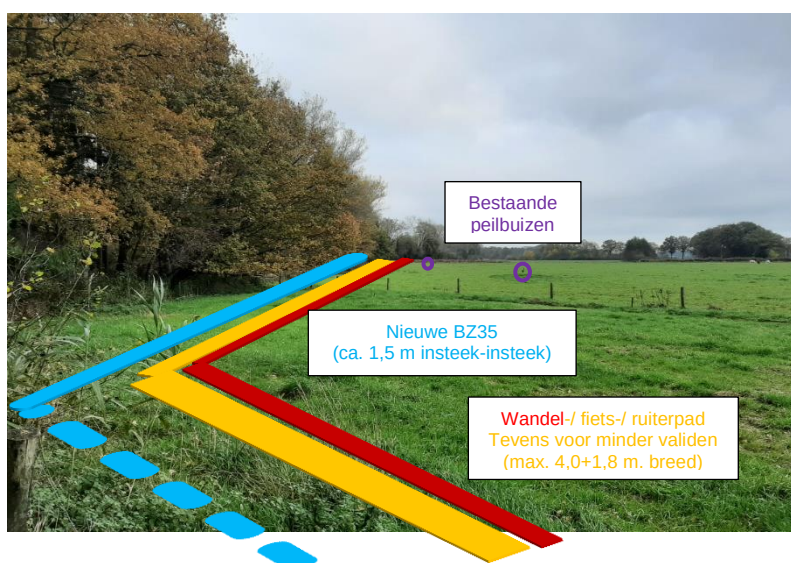


Fig. 4: Nieuwe situatie door huidig weiland Brabants Landschap



Fig. 5: Luchtfoto uitsnede verleggen watergang BZ35 en aanleg wandel- ruiterspad richting Groote Beerze

Het in te richten perceel (BDL01L658) is eigendom van Brabants Landschap en is in gebruik als grasland. Het wordt nog verpacht, maar is reeds bestemd als (nieuwe) natuur. Het perceel is aangewezen als Natte Natuurparel.

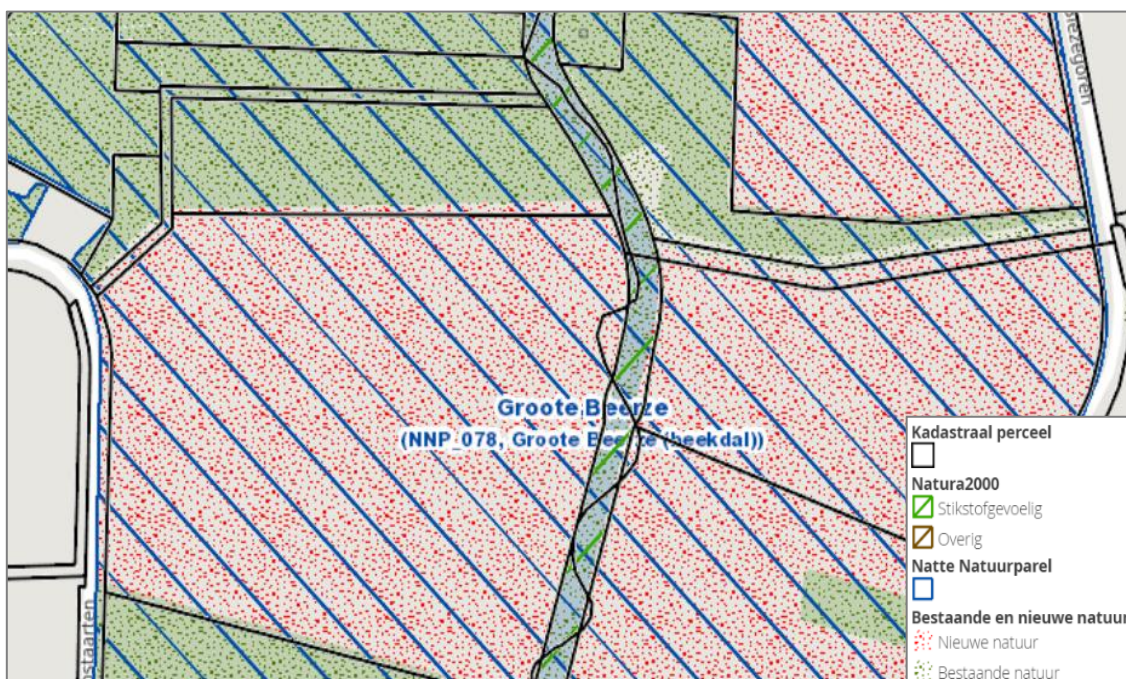


Fig. 6: Natuurnetwerk binnen projectgebied

Effecten

Het verleggen van de BZ35 is geen ingrijpende wijziging voor de bestaande waterstaatkundige situatie. Buiten het plangebied is er geen effect, echter in het plangebied wordt de omgeving wat natter. Dit omdat het afschot naar de beek vanaf Schipstaarten wat omhoog getrokken wordt waardoor de nieuwe loop minder diep ingesneden wordt in het maaiveld en daardoor lokaal wat minder verdrogend werkt.



Er is enkel een uitvoeringstechnisch aandachtspunt omdat er een tweetal projectpeilbuizen van het waterschap in de nabijheid van het tracé aanwezig zijn. Deze dienen in tact te blijven om de effecten van het beekherstel te monitoren. in. De peilbuizen zijn tevens zichtbaar in figuur 5 en 7. Het tracé wordt hierdoor dichter tegen de bosrand gelegd dan eerder voorzien, dit betreft een wijziging ten aanzien van het projectplan Waterwet en de bestekstekening. De doorsneden in figuur 9 (tevens uit het bestek) geven hierdoor niet meer exact de juiste NAP-hoogten weer. Figuur 7 is een weergave van de maaiveldhoogte met daarin de beoogde bodemhoogten van de nieuwe BZ35 vermeld.

Technische details en onderhoud

Het profiel zal aan weerszijden een talud-verhouding van 1:1 hebben. Insteek-insteek gemeten krijgt de nieuwe loop een bovenbreedte van ca. 1,5 meter. De bodem wordt ongeveer een halve meter breed. De nieuwe BZ35 kan eenzijdig, vanuit het (halfverhard) fiets- ruitpad onderhouden worden, waardoor er geen separate onderhoudsstrook hoeft te worden ingericht. Enkele voordelen van het eenzijdig maaien is dat de kraan het profiel van de sloot minder belast, omdat de kraan niet zo kort op de slootkant (insteek) hoeft te rijden. Daarnaast is dit tevens een veiligere werkmethode dan de voorheen smalle, natte onderhoudsstrook door het bos. Het wandel- en ruitpad wordt obstakelvrij ingericht en heeft een breedte van maximaal 5,8 meter (4 m. ruitpad, 1,8 m wandelpad). De halfverharding bestaat uit gecertificeerd (gebroken) puin. Dit betreft schoon granulaat (0/32 mm) welke tevens is toegepast aan de overzijde van de beek.

Tijdens de graafwerkzaamheden moet er extra aandacht worden besteed aan de aanwezige data- en middenspanning kabel, welke tevens gelegen is aan de bosrand, iets noordelijker van het te graven tracé.



Fig. 8: Ligging datatransport- en middenspanning (KLIC)

Hieronder volgen enkele doorsneden van het in te richten wandelpad met aangrenzende sloot. Deze details staan benoemd in figuur 1, pagina 1.

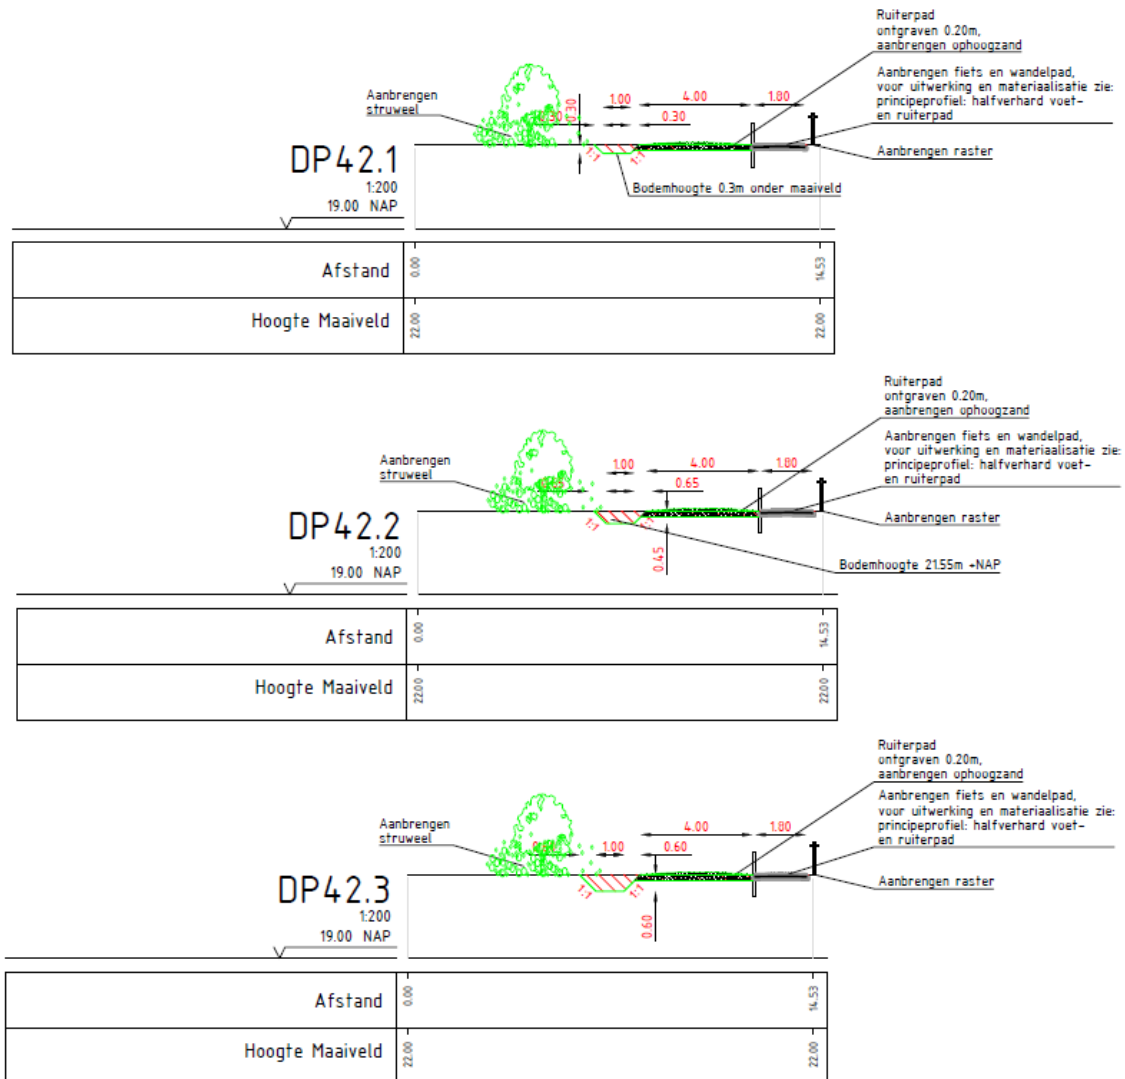


Fig. 9: Doorsnede fiets- en wandelpad en sloot Groote Beerze (*NAP-hoogte bodem hier incorrect)

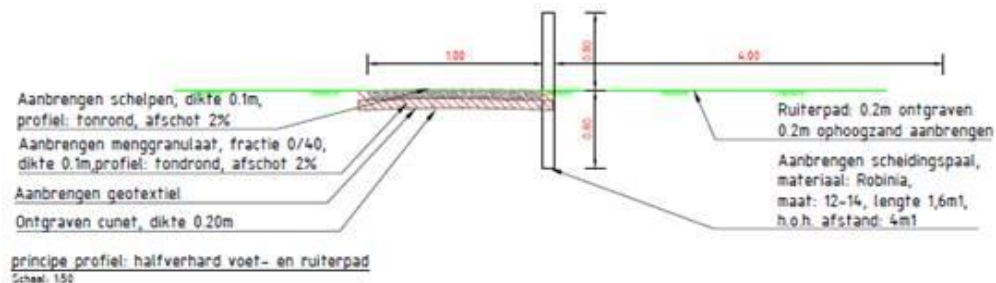


Fig. 10: Profielopbouw fiets- en wandelpad en sloot Groote Beerze

Details recreatieve verbinding

Zoals omschreven zal dit (totaal) project ook voorzien in het behoud en versterken van recreatieve verbindingen rondom de Groote Beerze. Om het mogelijk te maken dat recreanten de Groote Beerze kunnen oversteken worden er, in traject 1, twee nieuwe oversteken gerealiseerd, naast een reeds bestaande voetgangersbrug.

De oversteek welke te relateren is aan dit microplan, is de verbinding tussen Schipstaarten en De Biezegoren. Deze bestaat uit een fiets- en wandelbrug (ook voor minder validen) en een voorde voor ruiters/menners. Het pad naar deze oversteek loopt parallel aan de nieuwe BZ35.

Voorde, fiets- en wandelbrug

Het betreft een voorde met een taludsteilte van 1:7 en een bodembreedte van 2 meter. De breedte van de voorde is 5 meter. De hoogte van de bodem van de beek en de voorde is gelijk aan elkaar, hierdoor vormt de voorde geen belemmering in de stroming van de Groote Beerze. Bij 'T1' is er een waterdiepte van 53 centimeter ter plaatse van de voorde.

Hieronder volgen enkele afbeeldingen uit het bestek van de Groote Beerze. Deze beelden staan in relatie met de te verleggen BZ35, maar vormen geen beoordelingscriterium voor dit microplan omdat ze reeds zijn vastgesteld middels het projectplan waterwet.

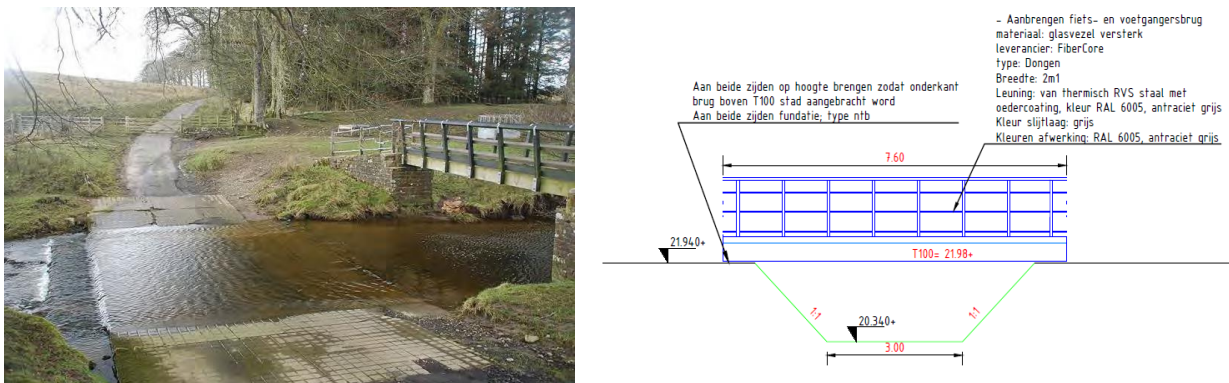


Fig. 11: Principe weergave van de voorde en doorsnede fiets- en wandelbrug brug

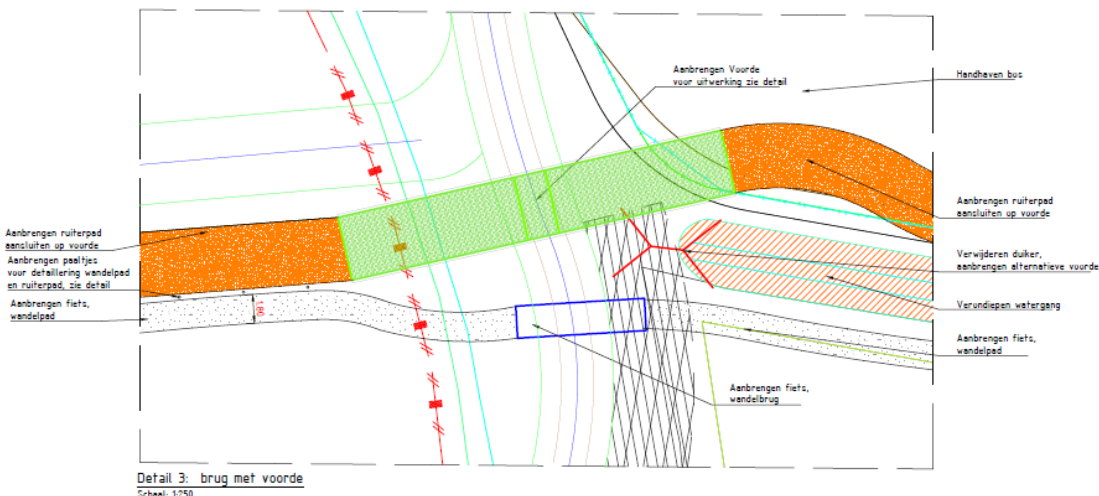


Fig. 12: Bovenaanzicht oversteek voorde en brug Groote Beerze

2 OMGEVINGSRECHT EN COMMUNICATIE

2.1 Omgevingsvergunning

De maatregelen vallen binnen het bestemmingsplan van de gemeente Bladel in de zones 'attentiegebied natuur', 'regionaal Waterbergingsgebied' en gedeeltelijk 'behoud en herstel watersystemen'. Bij het aanleggen of in dit geval vergraven van een watergang/ sloot is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (aanleggen) nodig, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor zal dan ook een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de gemeente.

Binnen het waterschap wordt dit plan als een separaat projectplan behandeld waarover een projectplanbesluit wordt genomen middels een 'ppww-procedure'. De wijzigingen passen binnen de doelstellingen van het waterschap (verondiepen, minder verdrogen) en worden na realisatie opgenomen in de legger van Waterschap De Dommel.

De vaststelling van het projectplan Waterwet staat in feite los van de omgevingsvergunning, echter zullen gemeente en waterschap hierin wel de stappen met elkaar afstemmen.

Legger

Het waterschap zal de nieuwe BZ35 opnemen in de legger en krijgt daarin de status van A watergang. Het waterschap draagt de onderhoudsplicht van deze waterloop. Het traject wat nu door het bosperceel gaat zal worden gedempt en vervalt van de legger.

Eigendom en financiering

Het waterschap zal ook de nieuwe BZ35 in eigendom krijgen omdat dit een 'A-watergang' betreft. Het traject wat nu door het bosperceel gaat zal worden gedempt en komt in eigendom van Brabants Landschap. Omdat één gezamenlijk doel wordt nagestreefd en het in feite een evenredige ruil betreft, zal er geen financiering aan te pas komen. Waterschap verzorgt de kadastrale en notariële verplichtingen.

De kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden maken onderdeel uit van de begroting voor het projectplan waterwet 'Herinrichting Beekdal Groote Beerze'

2.2 Communicatie

De communicatie over het project 'Herinrichting beekdal Groote Beerze' wordt verzorgd door Waterschap De Dommel. De ontwikkeling op dit perceel maken hier onderdeel van uit. Hierover vindt geen aanvullende communicatie in de omgeving plaats, enkel via de reguliere kanalen (website, nieuwsbrieven, verplichte meldingen etc.).

3 RECHTSMIDDELEN

3.1 Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar op dit projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. De bezwaarschriftencommissie zal het bezwaar behandelen. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State (zie voor een verdere toelichting bij “Beroep en hoger beroep”, “Crisis- en herstelwet” en “Verzoek om voorlopige voorziening”). In beginsel kunnen uitsluitend degenen die een bezwaar hebben ingediend, tegen het projectplan beroep instellen.

3.2 Beroep

Gedurende zes weken vanaf de dag waarop het besluit op het bezwaar ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Op de vaststelling van een projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Belanghebbenden worden verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

3.3 Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd ‘verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.
