

Ligging manco (bron bing maps)




Foto's `manco




Toegang vanaf de Keverdijk



Veldwerk

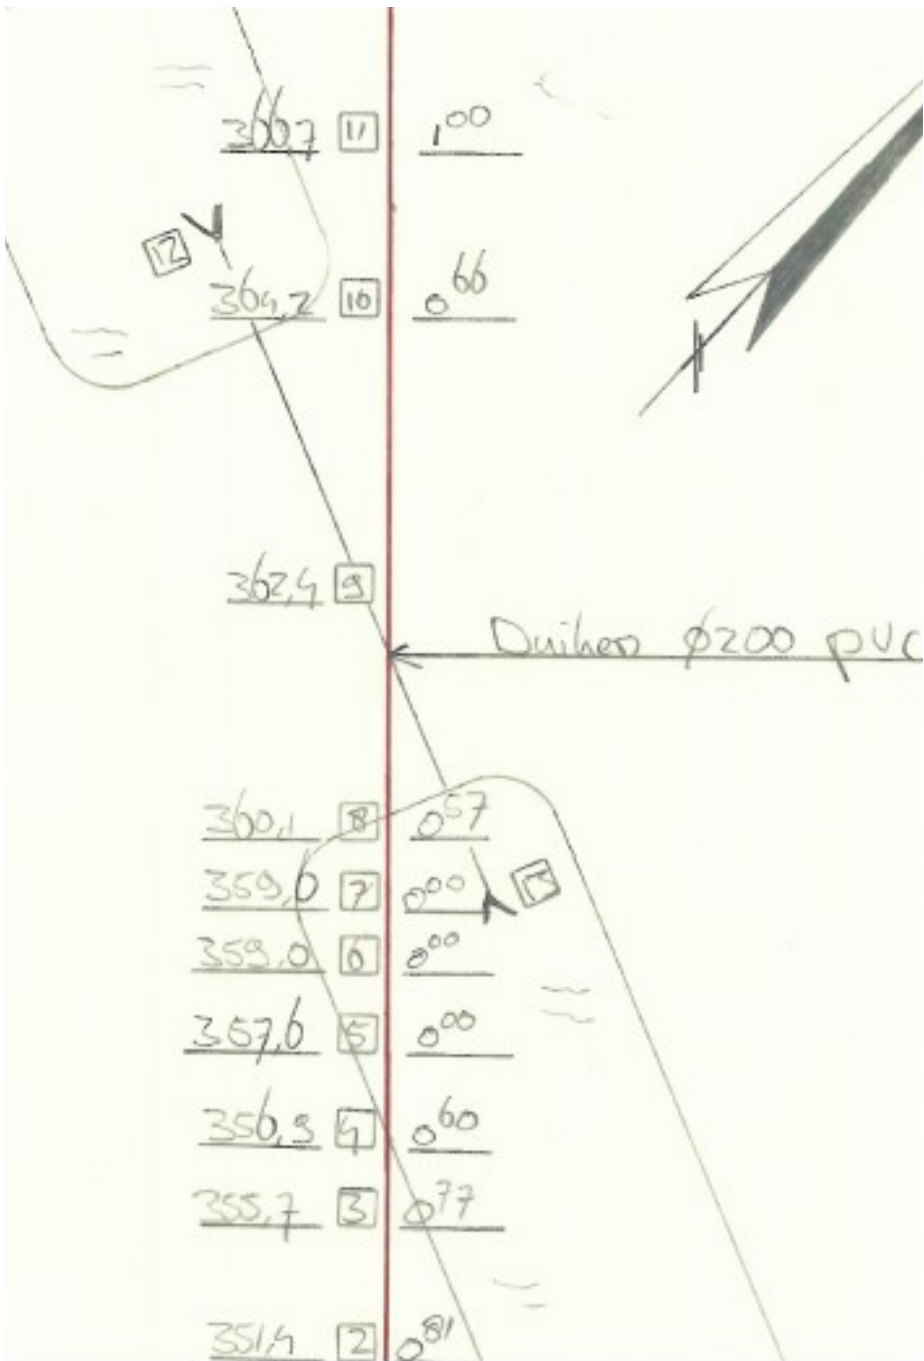

Dwarsprofiel

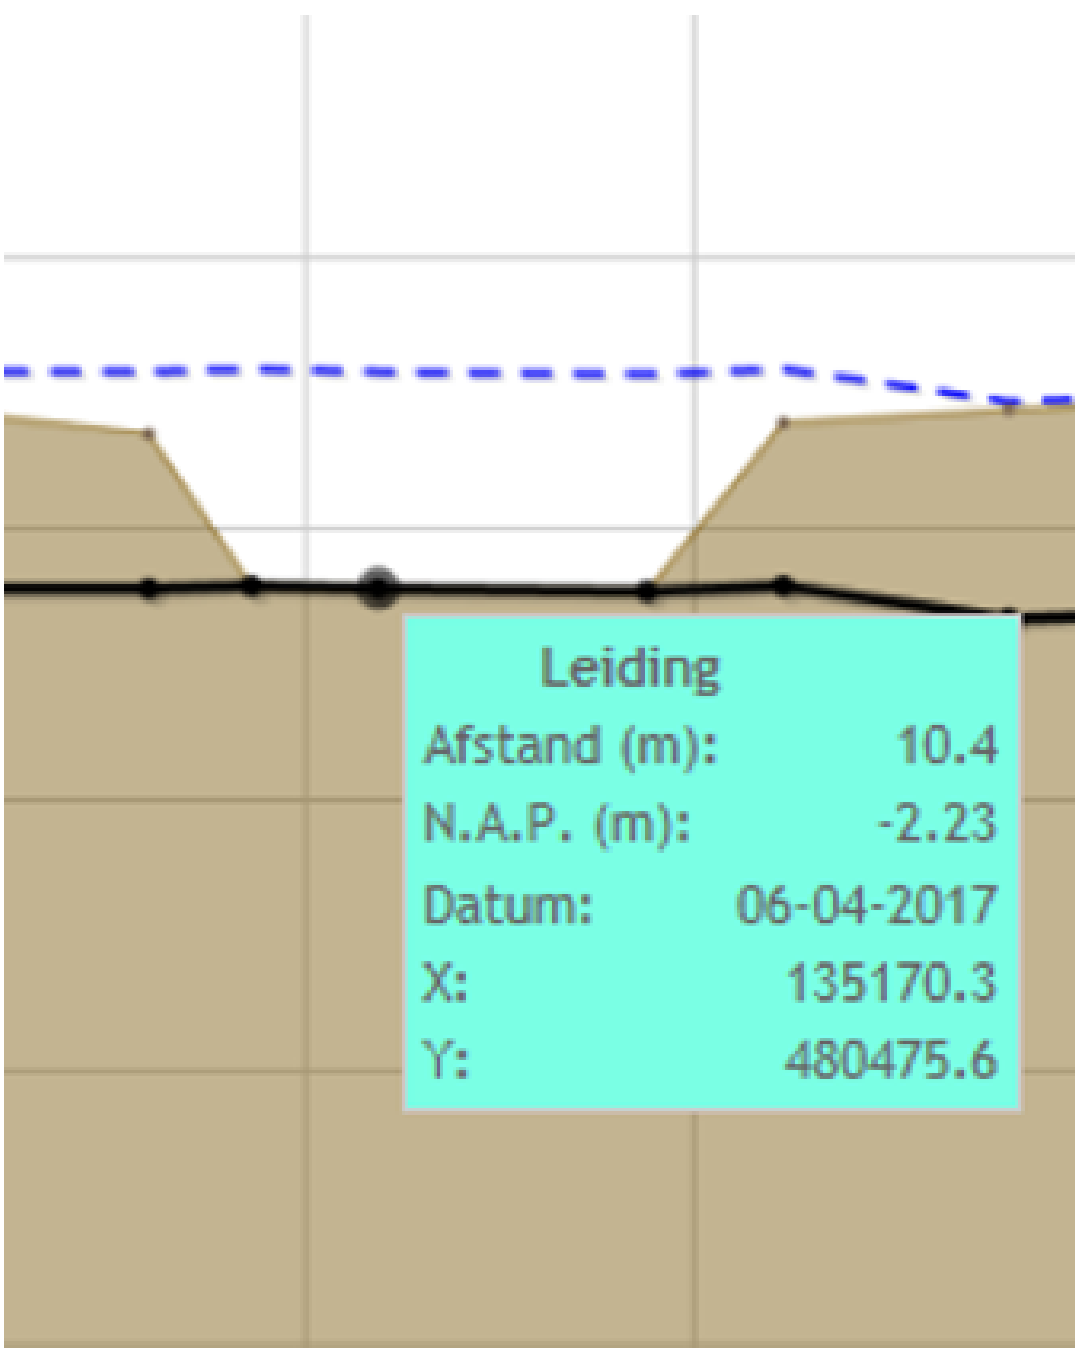

Plan van aanpak

Plan van aanpak KDM 1704001742

W-533-01-KR-026

Weesp, Keverdijk thv nr. 21

* Maatregel: verlengen bestaande dam+duiker

- Terrein: landbouw/natuur

- Ligging: in sloot, naast bestaande dam+duiker

Uitvoering:

-Plaatsen slootSchotten (2 stuks);

-Droogpompen werkgedeelte;

-Verlengen bestaande PVC duiker ø200;

-Verbreden bestaande dam (ca. 7 m.);

- Ophogen bestaande dam;

- Afwerken taluds met stapelzoden;

-Verwijderen slootSchotten;

-Graven watercompensatiestrook;

-Afwerken terrein.

LET OP: aslastbeperking 6 ton en aanvragen ontheffing Keverdijk

* Inzet materieel:

• Graafmachine;

• Tractor+dumper;

• SlootSchotten (2 st);

• Pomp;

• Mobiele schafteet;

• Rijplaten.

* Uitvoeringsduur: ca. 2 dagen

* Uitvoeringsperiode: medio 2021, na broedseizoen (in nader overleg met grondeigenaar af te stemmen).

C	24-11-2020	Aanpassen details	AJS
D	23-2-2021	Aanpassen details (watercompensatie)	RK

Opdrachtgever									
Gasunie N.V.									
Project									
Manco 1704001742 te Weesp									
Onderdeel									
Plan van aanpak									
Tekeningnummer:	1742-OA-1-D	nvt	Schaal:	A3	For:	Sheet	van	Status	Definitief
Datum revisie A (origineel):	31-05-2017		Getekend door:	AJS					
Plotdatum tekening:	23-2-2021		Gecontroleerd:	RP					
Besteknummer:									Het copyright van deze
