

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 448627 RS326, Esbeek, plaatsen schotbalkenstuw

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, onderhouden en in te richten, zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In Esbeek, gemeente Hilvarenbeek, begint bij de Scheidijk de RS326 deze loopt ter hoogte van de Hogeindsestraat het Spruitenstoompje in. In deze watergang hebben we als waterschap verschillende rijplaten geplaatst om water vast te houden. De afgelopen maanden is gebleken dat sowieso een rijplaat efficiënt werkt: het houdt water vast zonder dat het overlast veroorzaakt. Het gaat om de rijplaat in 'het park' waar de RS326 bij de Gagellaan afbuigt naar links en parallel loopt aan de N269. We willen deze rijplaat gaan omzetten in een schotbalkenstuw, zo kunnen we water vast houden maar ook sturen in de hoogte en dus waterpeil.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

Voorgenoemde locatie is inzichtelijk gemaakt middels bijgevoegd kaartjes. De overstorthoogte van het water is handmatig regelbaar middels schotbalken. Voor de instelling van het waterniveau houden we onder andere rekening met de gewenste drooglegging ingegeven door de omgeving en het groeiseizoen. We zullen eerst een jaar kijken hoe de stuw functioneert, na de evaluatie zullen we het streefpeil vaststellen.

3. Effecten van het plan

Door het vasthouden van water in watergangen wordt het water in watergangen ter plaatsen geïnfiltrerd in de bodem. Door het infiltreren in de bodem wordt de grondwaterstand op een hoger niveau gehouden. Door het vasthouden van een hoger grondwaterpeil kunnen we verdroging van aangrenzende percelen verminderen. Daarnaast kunnen we d.m.v. de stuw de waterhuishouding beter te reguleren is. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de waterbehoefte van het gebied in zowel droge als natte perioden.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen


Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.



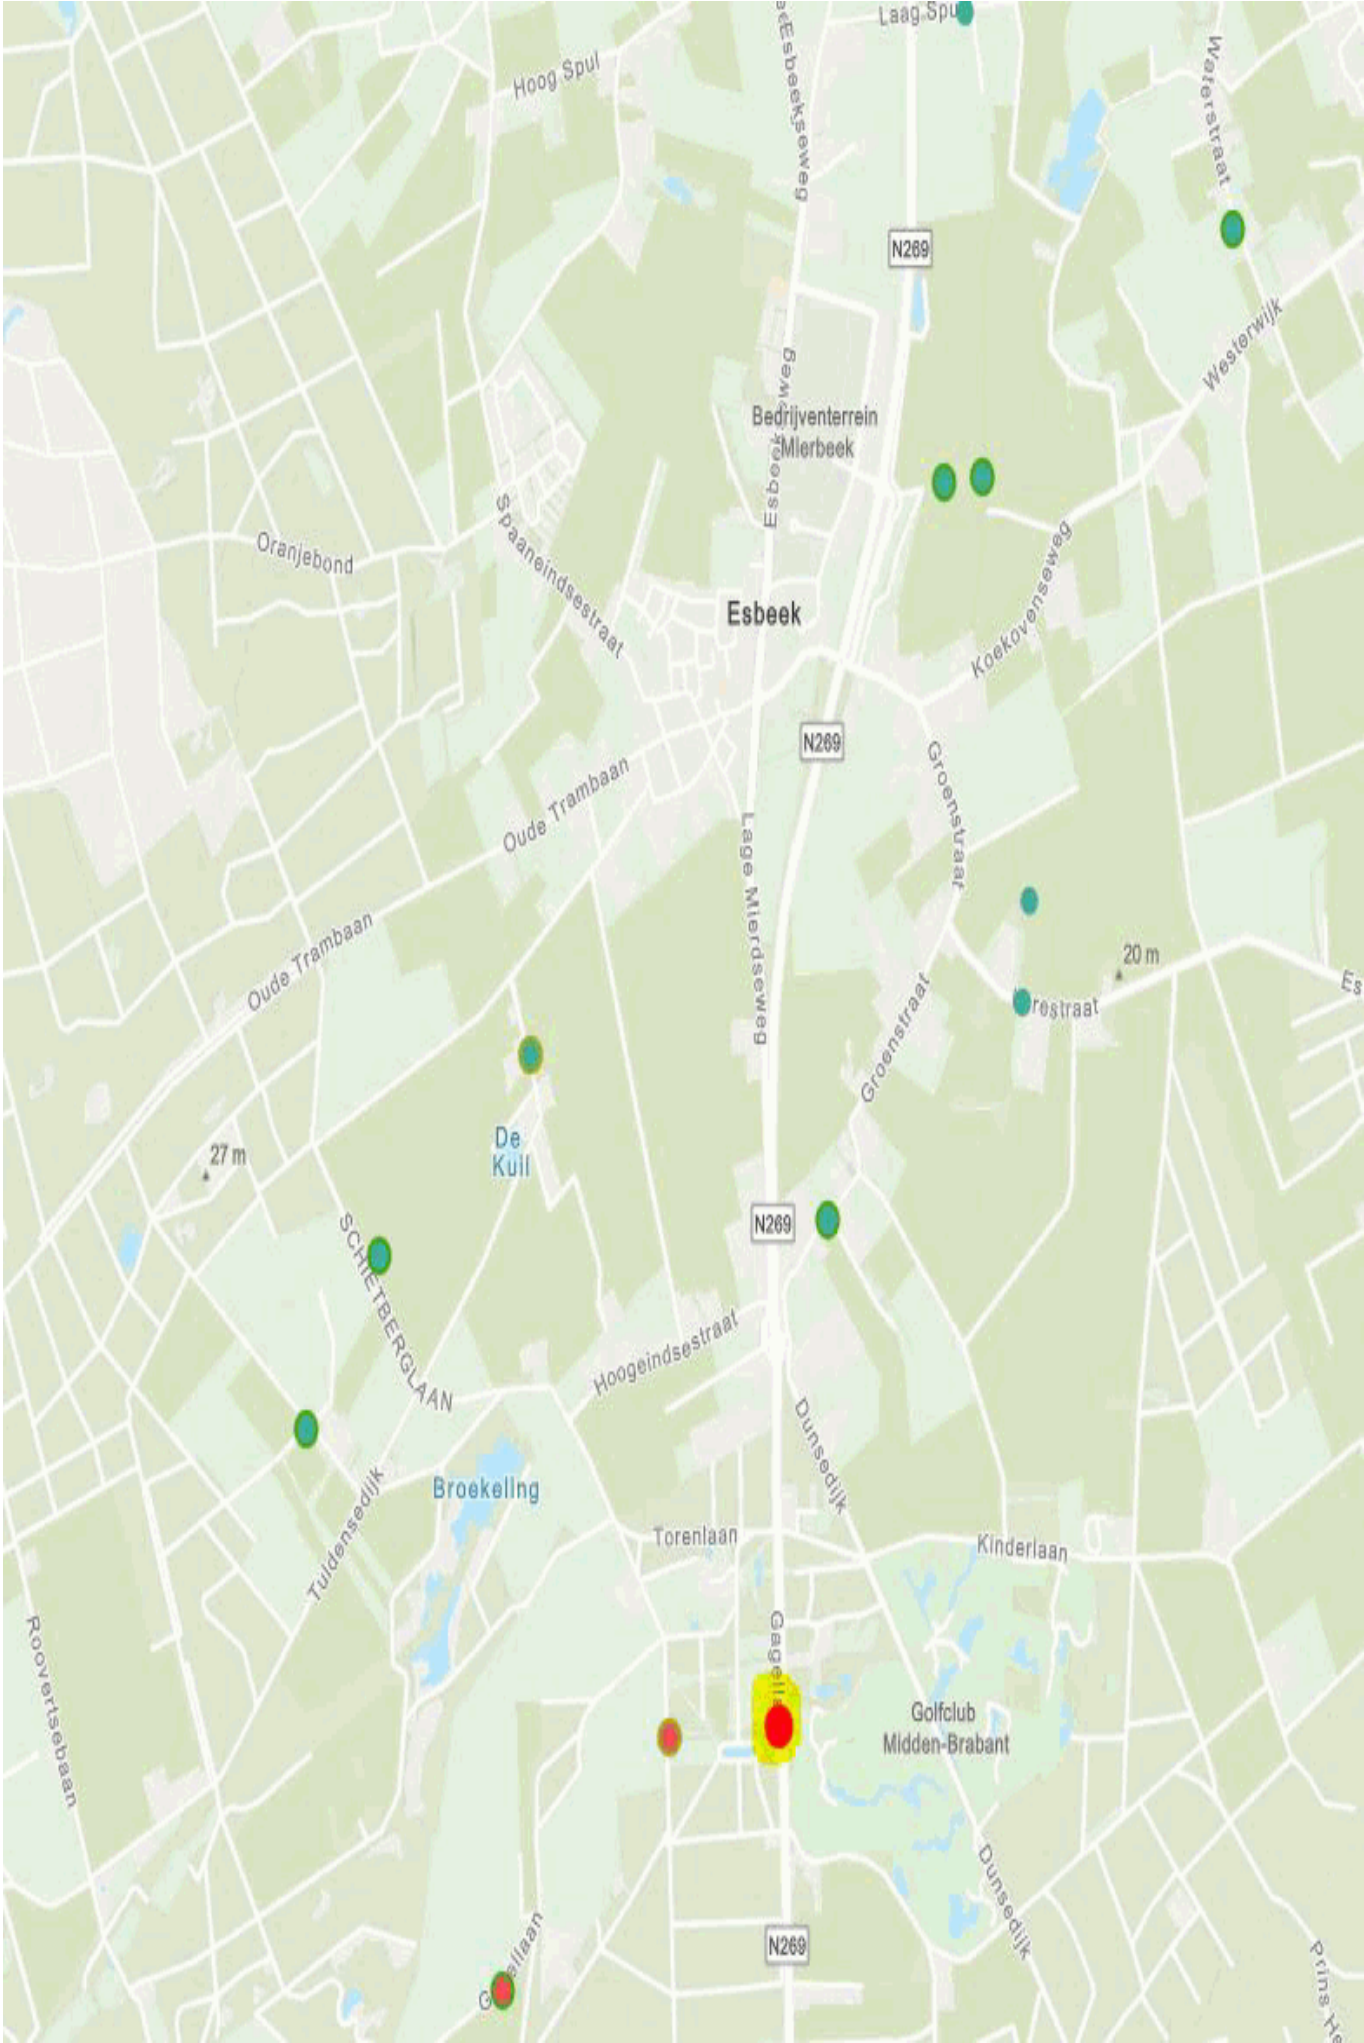

20200327GE-DP623

