


ONTWERP PROJECTPLAN:

RUIM BAAN VOOR WATER, NIJE WIELEN

Besluit aanleg of wijziging van een Waterstaatswerk: artikel 5.4 Waterwet, in combinatie met het Leggerbesluit:

- artikel 5.1 Waterwet – vastlegging ligging, afmeting, vorm en constructie van de waterstaatswerken
- artikel 78 lid 2 Waterschapswet – toewijzing onderhoud waterstaatswerken

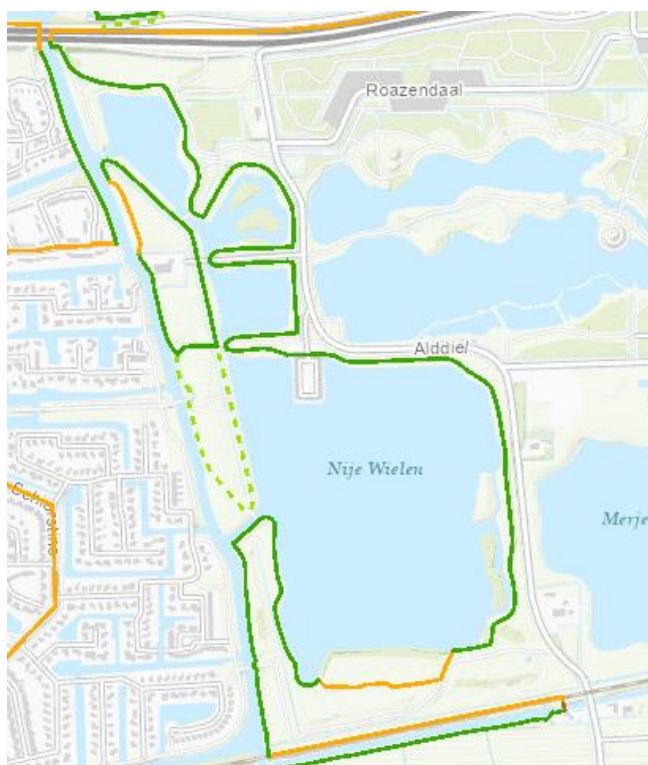

Datum:
Vakgroep:
OW nummer:
Projectleider:

28 april 2021
Vakgroep Plannen en Projecten
OW.13907
Libbe Zijlstra

Inhoud

1. Aanleiding en doel besluitvorming	4
2. Juridische status Projectplan	4
3. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming	5
4. De aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken (besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet).....	8
A. Aan te leggen waterstaatswerken	8
B. Te wijzigen waterstaatswerken	10
C. Te verwijderen waterstaatswerken	11
D. Aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen werken.....	12
5. Legger – toewijzing van het onderhoud	13
6. Motivatie, onderbouwing van het besluit	13
7. Benodigde zakelijke rechten.....	14
8. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan.....	14
8.1. Geïntariseerde nadelige gevolgen:	14
8.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.....	14
8.3. Financieel nadeel en belangenafweging.....	15
9. Uitvoering, planning van het werk.....	16
10. Procedure (rechtsbescherming).....	16
Bijlage – kaart - Ligging waterstaatswerken	17

1. Aanleiding en doel besluitvorming

Op basis van het Waterbeheerplan 2016-2021 Wetterskip Fryslân, het Verbeterprogramma Oevers en Kaden en het project Ruim Baan voor Water, worden de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken aangelegd, of gewijzigd. De aanleg of wijziging vindt plaats, omdat het waterstaatswerk, zijnde een regionale waterkering, niet voldoet aan de door de provincie vastgestelde hoogte en/of stabiliteitsnorm.

Hiervoor stelt het waterschap een Projectplan vast.

Het waterstaatswerk in onderhavig Projectplan betreft de regionale waterkering langs de Nije Wielen (Oostzijde Leeuwarden).

- A. Er is beoordeeld of een deel van de Nije Wielen (noordzijde) bij hoog water afgesloten kan worden van de boezem (beheersbare boezem). De bescherming van het achterland tegen overstromingsgevaar -wat uiteindelijk het doel is- blijft daarmee gewaarborgd. Dit heeft als voordeel dat de regionale waterkering minder hoog aangelegd hoeft te worden dan een kering die niet afgesloten kan worden. De gewijzigde afmetingen worden verwerkt in de legger.
- B. Er is tevens beoordeeld of een deel van de regionale kering (zuidzijde Nije Wielen) kan worden ingekort i.c.m. boezemuitbreiding. De inkorting van de kering wordt in dit projectplan geregeld. De daadwerkelijke boezemuitbreiding (namelijk het verhogen van het huidige peil naar boezemniveau) valt daarbuiten. Voor deze boezemuitbreiding wordt een peilbesluit genomen. Dit peilbesluit treedt naar verwachting in juli of (uiterlijk) september 2021 in werking. Hiertegen staat afzonderlijke rechtsbescherming open.

Zie voor de ligging van de trajecten afbeelding 1.

2. Juridische status Projectplan

Definitie

Een Projectplan is een besluit dat een waterschap (als waterbeheerder) vaststelt als dat waterschap waterstaatswerken (1) aanlegt of wijzigt. Het besluit vindt plaats op basis van artikel 5.4 Waterwet (2).

Legger en Algemene wet bestuursrecht

In dit document (Projectplan) is ook het besluit opgenomen voor het vaststellen van de Legger (3), voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken. Deze besluitvorming vindt zijn basis in

¹ Artikel 1.1 Waterwet: waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

² Artikel 5.4 Waterwet:

1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.
2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

³ De Legger is een besluit van een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangegeven wordt wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat. Verder wordt in de legger vastgelegd, de ligging, vorm, constructie en afmeting van het waterstaatswerk.

artikel 5.1 Waterwet (vastlegging waterstaatswerken qua: ligging, afmeting, vorm, constructie) en artikel 78 lid 2 Waterschapswet (toewijzing van de onderhoudsplicht voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken). Het Projectplan is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het besluit vindt een belangenafweging plaats en wordt rechtsbescherming geboden aan belanghebbenden.

Schadebesluiten

In het Projectplan wordt ook beschreven welke nadelige gevolgen rechthebbenden (eigenaren, pachters) en eventueel andere belanghebbenden ondervinden van de besluitvorming. De afhandeling van schade wordt onder punt 8 beschreven. Tegen schadebesluiten die op grond van het Projectplan worden vastgesteld, staat aparte rechtsbescherming open.

Voor de besluitvorming (Projectplan en Legger) is het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bevoegd. Dit is geregeld in het delegatiebesluit Wetterskip Fryslân d.d. 6 juli 2010.

Besluit MER

Naast Projectplan, Leggerbesluit en Schadebesluit moet het dagelijks bestuur bij Kadeprojecten, op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer / Besluit Milieueffectrapportage (Besluit MER), bijlage C. onderdeel D 3.2, ook een besluit nemen over een MER-beoordeling. Het dagelijks bestuur kan besluiten om daarvan af te zien. De keuze om dit te doen hangt af van overwegingen die vermeld staan in de Europese richtlijn 2011/92/EU. Een MER-beoordeling hoeft pas plaats te vinden als er aanzienlijke effecten zijn op het milieu.

Aangezien de beschreven maatregelen in dit projectplan vanwege haar aard en schaal geen aanzienlijke effecten op het milieu hebben is besloten af te zien van een MER-beoordeling.

3. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming

Ten behoeve van de voorbereiding zijn de volgende vooronderzoeken uitgevoerd:

1. Landmeetkundige werkzaamheden;
2. Inventarisatiewerkzaamheden in het veld;
3. Natuurtoets Flora en Faunawet;
4. Onderzoek Kabels en Leidingen;
5. Onderzoek naar de inlaat zwemwater Lytse Wielen.

Op basis van de resultaten van deze vooronderzoeken en overleg met de gemeente Leeuwarden (kadastraal eigenaar) en haar bewoners is het definitief ontwerp tot stand gekomen.

A. Locatie A

Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat er alternatieven zijn om de waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen. Deze alternatieven zijn:

1. Huidige toestand in stand houden. De huidige regionale waterkering zou dan verhoogd moeten worden;
2. Beheersbare boezem (een deel van de boezem afsluitbaar maken, zodat de achtergelegen regionale kering een lagere afkeurhoogte krijgt);
3. Een deel polder (o.a. Alddiel 9) beschermen met een lokale waterkering, en de regionale waterkering over het Alddiel leggen.

Het waterschap heeft in dit besluit gekozen voor 2. beheersbare boezem, omdat een lagere afkeurhoogte van de regionale waterkering goedkoper is en het beschermingsniveau van het

achterland gelijk blijft. De huidige toestand in stand houden (1.) is qua kosten dus niet efficiënt. Het derde alternatief biedt minder bescherming voor het betreffende deel van de polder.

De Provincie Fryslân is bevoegd gezag voor het aanwijzen van een regionale waterkering. De provincie bepaalt in haar waterverordening de ligging van regionale waterkeringen, maar ook aan welke norm voldaan moet worden. Er is overleg gevoerd met de provincie over dit projectplan. De provincie heeft ingestemd met deze werkwijze van het waterschap, namelijk het afsluitbaar maken van een deel van de Nije Wielen, waardoor de regionale waterkering een lagere afkeurhoogte krijgt dan een "normale" regionale waterkering die niet aan een afsluitbare boezem ligt. De lagere afkeurhoogte mogen we vaststellen op basis van ons eigen "beheerdersoordeel".

B. Locatie B

Voor wat betreft de locatie B in het zuidelijk deel van het projectgebied is tijdens de voorbereiding geconstateerd dat er alternatieven zijn om de waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen. Deze alternatieven zijn:

1. Huidige toestand in stand houden. De huidige regionale waterkering zou dan verhoogd moeten worden; ;
2. De gehele polder tussen Nije Wielen, Alddeel, spoorlichaam en Alddiel voor de boezem leggen, i.c.m. boezemuitbreiding en natuurlijke oevers.
3. Een deel van de genoemde polder voor de boezem leggen, i.c.m. boezemuitbreiding en natuurlijke oevers, en de spoorloot en het spoorlichaam beschermen met een nieuwe regionale waterkering.

Het waterschap heeft in dit besluit gekozen voor 3. boezemuitbreiding met natuurlijke oevers en een nieuwe regionale waterkering voor de spoorloot en het spoorlichaam. In de nieuwe situatie ontstaat een kortere regionale waterkering. Dit heeft een positief effect op de exploitatiekosten terwijl het beschermingsniveau van het achterland gelijk blijft. De boezemuitbreiding en de nieuwe natuurvriendelijke oever draagt bij aan een klimaatbestendig boezemsysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit.

De huidige toestand in stand houden (1.) is qua kosten niet efficiënt en heeft niet de genoemde voordelen van boezemuitbreiding en natuurvriendelijke oever. Het tweede alternatief biedt minder bescherming voor het spoorlichaam, hetgeen bezwaarlijk is voor de eigenaar van het spoorlichaam (ProRail).

De status en vastgestelde afmetingen (zie hierna onder 4.) worden opgenomen in de legger. Voor de toetsing en het beheer en onderhoud van lokale waterkeringen wordt verwezen naar de "Beheernota waterkeringen".

Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zijn de nadelige gevolgen van dit besluit geïnventariseerd. Onder punt 8 wordt uiteengezet hoe deze gevolgen worden voorkomen of beperkt. E.e.a. conform artikel 5.4 lid 2 Waterwet. Zie voor de tekst van genoemd artikel, noot 2.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb ⁽⁴⁾).

Op afbeelding 1 is de locatie weergegeven.

⁴ Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.



AFBEELDING 1 LOCATIE PROJECTGEBIED.

4. De aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken (besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet)

De volgende waterstaatswerken worden aangelegd of gewijzigd, met de volgende specificaties (Leggerwaarden). De hier genoemde Loggerwaarden worden opgenomen in de Logger (artikel 5.1 Waterwet (⁵)). Voor de toewijzing van het onderhoud van deze waterstaatswerken wordt verwezen naar punt 7.

A. Aan te leggen waterstaatswerken

A1 Regionale waterkering, kunstwerk, type duiker van beton, afm. (uitw.) ca 3,50x2,50x2,50 m (lxbxh) met klepstuw breed (inw.) ca 2,00 m, afkeurhoogte +0,25 m NAP, ter plaatse van de bestaande voetgangersbrug over de Nije Wielen, ten noorden van het adres Alddiel 9.

A2 Regionale waterkering, type polderdijk (dam), afkeurhoogte +0,25 m NAP, lengte ca. 10 m1, conform standaard profiel, ter plaatse van het Groenestepad, ten westen van de Wielendwinger.

A3 Regionale waterkering, type polderdijk, afkeurhoogte +0,25 m NAP, lengte ca. 850 m1, conform standaard profiel*, ten noorden van het spoor en aansluitend op de bestaande regionale waterkering oostelijk van de Nije Wielen.

A4 Overig water, boezem, streefpeil -0,52 m NAP, aanlegdiepte -1,50 m tot -1,00 m NAP, oppervlak ca. 22000 m2, in het zuidelijk deel van het projectgebied.

A5 Natuurvriendelijke oever, (grotendeels) tweezijdig over een lengte van ca. 2200 m1, breedte ca 3,00 - 5,00 m, talud 1:3 of flauwer, aanlegdiepte -1,00 m NAP, voorzien van onderhoudspad, breed ca 5,00 m, in het zuidelijk deel van het projectgebied, langs de aan te leggen boezem.

A6 Inlaat, Ø 300 mm, lengte ca. 70 m1, van de Nije Wielen naar de Merjedobben, ten zuiden van het adres Alddiel 10.

A7 Duiker, Ø600 mm, 2 st, lengte ca. 6 m1, ten behoeve van de boezemuitbreiding, in het zuidelijk deel van het projectgebied.

* De regionale waterkering voldoet minimaal aan het standaard profiel. De kruinbreedte en taluds kunnen afwijken in verband met de aanleg van fiets- en voetpaden en/of de aansluiting op de omgeving.

In afbeelding 2 is de locatie van de aan te leggen waterstaatswerken weergegeven.

⁵ Artikel 5.1 Waterwet (Logger – Waterwet): De Beheerder (waterschap) draagt zorg voor de vaststelling van een Logger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar **Ligging, Vorm, Afmeting en Constructie** moeten voldoen. Van de Logger maakt deel uit een overzichtskaart waarop de Ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven.



AFBEELDING 2 TE REALISEREN WATERSTAATSWERKEN

B. Te wijzigen waterstaatswerken

B1 Regionale waterkering (leggercode DWK0123818):

wijzigt over een lengte van ca. 220 m1 van (type) polderdijk naar hoge grond;

B2 Regionale waterkering (leggercode DWK0123818):

wijzigt over een lengte van ca. 265 m1 van (type) polderdijk naar hoge grond;

wijzigt over een lengte van ca. 265 m1 van (hoogte) afkeurhoogte +0,25 m NAP naar +0,01 m NAP volgens beheerdersoordeel.

B3 Regionale waterkering (leggercode DWK0126842):

wijzigt over een lengte van ca. 1000 m1 van (hoogte) afkeurhoogte +0,25m NAP naar +0,01 m NAP volgens beheerdersoordeel.

B4 Regionale waterkering (leggercode DWK0121847):

wijzigt over een lengte van ca. 20 m1 van (type) polderdijk naar hoge grond;

wijzigt over een lengte van ca. 20 m1 van (type) polderdijk standaard profiel naar polderdijk 1:3, 1,50 m, 1:3.

In afbeelding 3 is de locatie van de te wijzigen waterstaatswerken weergegeven.



AFBEELDING 3 TE WIJZIGEN WATERSTAATSWERKEN

C. Te verwijderen waterstaatswerken

C1 Duiker met inlaat (leggercode KDU0047436) vervalt.

C2 Regionale waterkering (leggercode DWK0124679), type polderdijk, langs het Alddeel en de Nije Wielen, ca. 900 m¹, vervalt.

C3 Regionale waterkering (leggercode DWK0125340), type hoge grond, langs de Nije Wielen, ca. 300 m¹, vervalt.

C4 Regionale waterkering (leggercode DWK0126842), type polderdijk, langs de Nije Wielen, ca. 80 m¹, vervalt.



AFBEELDING 4 TE VERWIJDEREN WATERSTAATSWERKEN

Deze waterstaatswerken worden van de Legger afgevoerd.

D. Aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen werken

In het project worden de volgende werken (niet zijnde waterstaatswerken) aangelegd, gewijzigd of verwijderd. Benoemd wordt of deze activiteiten op basis van de Keur vergunnings- of meldingsplichtig zijn:

- D1: De aanleg van voetpaden op de regionale en lokale waterkeringen.
- D2: De aanleg van fietspaden op de regionale en lokale waterkeringen.
- D3: De aanleg van halfverharding en brugleuningen op de duiker met klepstuw.

De gemeente Leeuwarden vraagt voor de aanleg van bovenstaande werken een watervergunning aan.

Op de onderstaande afbeelding is de **Ligging** van de bovengenoemde werken weergegeven, na realisatie van het werk.



AFBEELDING 5: AAN TE LEGGEN, TE WIJZIGEN OF TE VERWIJDEREN WERKEN

5. Legger – toewijzing van het onderhoud

De Legger wordt als volgt gewijzigd:

a. Legger ex. artikel 5.1 Waterwet (vastlegging: Ligging, Afmeting, Vorm en Constructie)

Op onder punt 4 vermelde aangelegde of gewijzigde waterstaatswerken, met bijbehorende Leggerwaarden (Ligging, Afmetingen, Vorm en Constructie), worden toegevoegd aan de Legger. De waterstaatswerken die verwijderd worden, worden van de Legger afgevoerd. De Leggerkaart en het Leggerregister worden hierop aangepast.

b. Toewijzing van het onderhoud (Legger ex. artikel 78 lid 2 Waterschapswet)

Voor de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken geldt de volgende onderhoudstoewijzing:

Waterstaatswerk	Onderhoudsplichtige	Onderhoudsplicht
Duiker/klepstuw	Wetterskip Fryslân	(buiten)gewoon onderhoud
Verharding/leuning*	Eigenaar	(buiten)gewoon onderhoud
Regionale waterkering	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud
Regionale waterkering	Eigenaar	gewoon onderhoud
Boezem	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud
Boezem	Eigenaar	gewoon onderhoud
Natuurvriendelijke oever	Wetterskip Fryslân	(buiten)gewoon onderhoud
Inlaat	Wetterskip Fryslân	(buiten)gewoon onderhoud
Duiker	Wetterskip Fryslân	buitengewoon onderhoud
Duiker	Eigenaar	gewoon onderhoud

* Betreft (half)verharding op de duiker en leuning/toebehoren aan de duiker.

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.

6. Motivatie, onderbouwing van het besluit

Met dit Projectplan worden de volgende waterhuishoudkundige knelpunten opgelost:

De regionale waterkeringen langs de Nije Wielen voldoen in de huidige situatie niet aan de door de provincie gestelde veiligheidsnormen. In het noordelijk deel van het plangebied wordt door de aanleg van een nieuwe regionale kering ter plaatse van het Groenestepad en een duiker met klepstuw ten noorden daarvan, in combinatie met groot onderhoud aan de bestaande regionale waterkering, weer voldaan aan de norm. De boezem achter de klepstuw wordt beheersbare boezem. Het beschermingsniveau van het achterland gelijk blijft. Het functioneren van de inlaat voor zwemwater in de Kleine Wielen blijft ongewijzigd.

In het oostelijk deel van plangebied wordt de bestaande regionale waterkering opgehoogd (groot onderhoud), zodat ook deze weer voldoet aan de norm.

In het zuidelijk deel van het plangebied wordt een deel van de huidige polder boezem met een natuurvriendelijke oever. Dit draagt bij aan een klimaatbestendig boezemsysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Een deel van de huidige regionale waterkering die niet aan de norm voldoet, kan door deze ingreep komen te vervallen. Een nieuwe regionale waterkering is ingepast in het ontwerp.

Met de wijzigingen aan de regionale waterkeringen wordt invulling gegeven aan doelstelling artikel 2.1 lid 1 a Waterwet, namelijk voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen en wateroverlast.

Bovendien wordt door de aanleg van de natuurvriendelijke oever bijgedragen aan het doel van artikel 2.1 lid 1 b Waterwet, namelijk het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee voldoende is gemotiveerd (artikel 3.46 Awb) ⁽⁶⁾.

7. Benodigde zakelijke rechten

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken benoemd bij punt 4 verandert de eigendomssituatie niet. Ook is er geen reden andere zakelijke rechten te vestigen.

8. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan

8.1. Geïntariseerde nadelige gevolgen:

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïntariseerd, namelijk:

a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering):

1. Overlast voor aanwonenden en gebruikers van de openbare ruimte als gevolg van de werkzaamheden op de percelen waar de werkzaamheden vermeld onder hoofdstuk 4 worden uitgevoerd.
2. Mogelijke schade aan Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt uitgevoerd.
3. Schade aan de openbare ruimte (groen, verharding, inrichtingselementen).

b. Blijvende nadelige gevolgen:

De bergingsafname van de boezem bij het (incidenteel) afsluiten van de boezem door de klepstuw, bij een waterpeil boven maatgevend boezempeil, is een blijvend nadelig gevolg.

8.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.

a. Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen teneinde de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken:

1. Doorgaande fietsroutes worden zo kort mogelijk gestremd.
2. De fasering wordt afgestemd met de kadastraal eigenaar/beheerder van de openbare ruimte (gemeente Leeuwarden).

⁶ Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

3. Tijdens de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met het gestelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.
4. Er wordt gebruik gemaakt van rijplaten, de aanleg van rij- en werkstroken, overslaglocaties e.d.
5. Voor zover mogelijk wordt schadeherstel tijdens de uitvoering van het werk uitgevoerd.
6. Na de werkzaamheden worden de werkstroken hersteld en opnieuw ingezaaid.

b. Beperking/voorkoming blijvende nadelige gevolgen:

De volgende maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen als gevolg van dit Projectplan werk te voorkomen of te beperken:

- Door het afsluitpeil van de beheersbare boezem gelijk te stellen aan het maatgevend boezempeil, met een statistische kans van voorkomen van 1x in de 100 jaar ($T=100$ jaar), betekent dit dat alleen bij nog extremere situaties een geringe hoeveelheid berging verloren gaat. Dit is in beginsel geen wenselijke situatie. In een dergelijk situatie is het waterbeheer erop gericht een verdere stijging van de boezemwaterstand (en daarmee ongecontroleerde inundatie vanuit de boezem) te voorkomen door de inzet van een maalstop in de deelsystemen en het inzetten van waterbergingsgebieden. In de praktijk stijgt de boezemwaterstand nauwelijks verder dan het maatgevend boezempeil, waardoor het bergingsverlies nihil is. Bij toenemende waterbelasting door neerslag in de opvaart wordt water uitgelaten naar het achterliggende deelsysteem.
- Op het moment dat de opvaart wordt afgesloten en er nog steeds neerslag valt moet deze extra neerslag in het deelsysteem worden opgevangen. Dit is in principe een extra belasting van het deelsysteem. Het effect hiervan is gering, ten opzichte van het effect van de neerslag die op dat moment in het deelsysteem zelf valt; de waterstandstijging in het deelsysteem door de extra afvoer komt ongeveer overeen met de gevallen neerslag in het deelsysteem (1 mm neerslag = 1 mm stijging).

8.3. Financieel nadeel en belangenafweging

- Indien sprake is van schade door tijdelijke rij- en werkstroken ontvangen rechthebbenden (eigenaren / pachters) een vergoeding voor gewassen- en mestschade. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van artikel 7.14 Waterwet / Schadevergoedingsregeling waterstaatswerken (onderhoud, aanleg en wijziging) van Wetterskip Fryslân.
- De hiervoor bedoelde vergoeding wordt na afloop van de werkzaamheden, aan de hand van de werkelijk in gebruik genomen oppervlakte, per groeiseizoen, bepaald en schriftelijk aan rechthebbenden kenbaar gemaakt.
- Indien nodig wordt de schadevergoeding in de vorm van een besluit bekend gemaakt, waartegen rechtsbescherming openstaat.
- Naar onze inschatting is er geen sprake van financieel nadeel doordat wij blijvend gronden anders inrichten. Mochten rechthebbenden en eventueel andere belanghebbenden menen dat zij onevenredige schade hebben geleden als gevolg van dit besluit (Projectplan) dan kunnen zij op basis van artikel 7.14 Waterwet een verzoek om schadevergoeding indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. In een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit wordt vervolgens een beslissing genomen op het ingediende verzoek.
- Voor het overige geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit projectplan en op basis van artikel 3:4 Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit besluit (Projectplan). In de besluitvorming is geconstateerd dat de (mogelijk) nog aanwezige nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding het te dienen doel van dit besluit,

namelijk het achterland beschermen tegen wateroverlast en de ecologische waterkwaliteit verbeteren.

9. Uitvoering, planning van het werk

Het voornemen is om het project uit te voeren vanaf oktober 2021 t/m april 2022. De werkzaamheden vinden plaats tussen 700 en 1700 uur op werkdagen.

10. Procedure (rechtsbescherming)

Inspiraakprocedure

Op 25 mei 2021 heeft het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besloten dit ontwerpprojectplan ter zinzage te leggen op

- Belanghebbenden en ingezetenen van het Beheergebied van Wetterskip Fryslân kunnen een zienswijze (bezwaren/bedenkingen/aanvullingen) indienen tegen het ontwerpprojectplan, volgens de procedure vermeld in de bekendmakingsadvertentie. Deze bekendmakingsadvertentie wordt elektronisch gepubliceerd in een Waterschapsblad (overheid.nl).
- Na de inspraakperiode stelt het dagelijks bestuur het Projectplan vast met inachtneming van eventueel binnengekomen zienswijzen. Vervolgens wordt dat besluit ook bekendgemaakt in een Waterschapsblad. Tegen dat besluit staat beroep open bij de rechtbank, sector bestuursrecht en daarna hoger beroep bij de Raad van State.

Het indienen van (hoger) beroep staat uitvoering van het werk niet in de weg. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd).

Op de vaststelling van dit Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank in het beroepsschrift moet worden aangegeven wat de inhoudelijke beroepsgronden zijn (dus geen pro forma beroep).

Voor eventuele vragen over dit besluit, kan contact opgenomen worden met L. Zijlstra en voor vragen over de procedure met mevrouw R. Doting. Beide functionarissen zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 058-292 2222.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân op 25 mei 2021, namens deze,

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

L.M.B.C. Kroon
Dijkgraaf

O. Bijlsma
Secretaris-directeur

Bijlage – kaart - Ligging waterstaatswerken
