



T (055) 527 29 11
E info@vallei-veluwe.nl
I www.vallei-veluwe.nl


Projectplan verdrogingsaanpak Allemanskamp (definitief besluit)

P3108

1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd?

- Dempnen van een deel van de Munnikenbeek;
- Aanleg (graven) van de omleiding Munnikenbeek;
- Dempnen van C-watergangen (interne kavelsloten);
- Aanleg regelbare stuw met als stuwpeil 6,10 m + NAP.

In onderstaande figuur zijn de beoogde 'watermaatregelen' aangegeven.

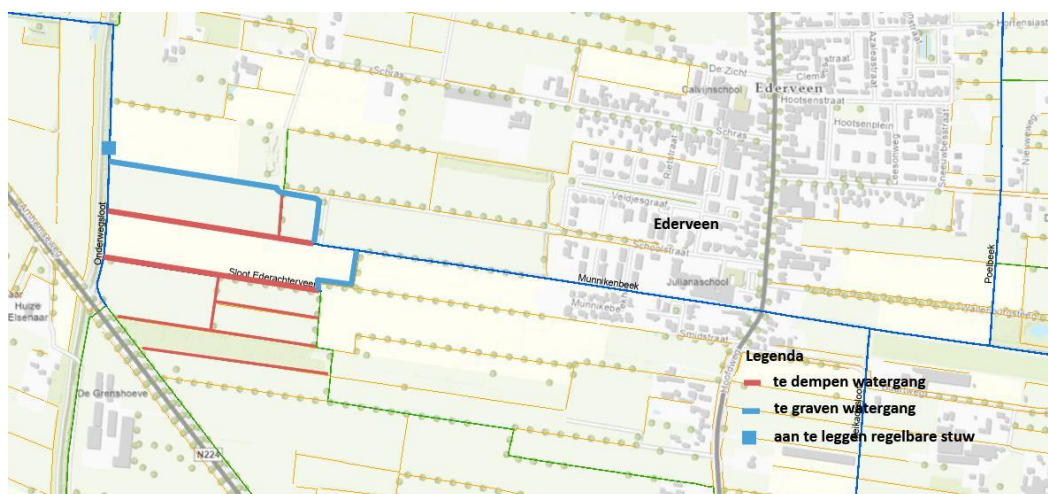


Model_ontw_d&h_regulier_aug_17

1.2 Hoe wordt het project uitgevoerd?

Het project wordt als volgt uitgevoerd. Allereerst wordt de omleiding van de Munnikebeek gegraven. Daarna wordt de Munnikenbeek benedenstrooms het bruggetje gedempt. Daarna wordt de stuw aangelegd. Tenslotte worden de kavelsloten in de percelen van de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer verondiept tot ondiepe greppels.

1.3 Welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken?

Tijdens de planvoorbereiding is berekend wat het effect op de grondwaterstand is van de voorgenomen maatregelen op de omliggende percelen. Onderstaande figuur betreft een noord-zuid dwarsdoorsnede met daarin aangegeven in en buiten de natuurpercelen de verwachte wijziging van de grondwaterstand in een gemiddeld voorjaar.

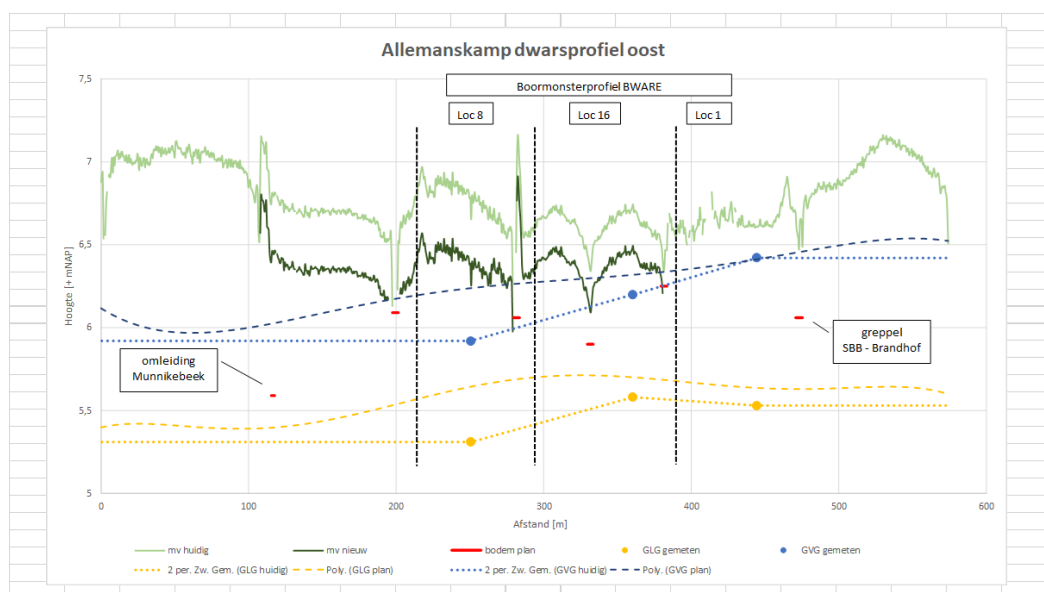

Figuur: noord-zuid dwarsprofiel met blauwe gestippelde lijn de berekende grondwaterstand bij een situatie gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (ca. 1 april)

Bij het noordelijk deel van het landbouwperceel direct ten zuiden van het natuurgebied Allemanskamp is een waterstandsverhoging berekend. Om zeker te zijn dat deze waterstandsverhoging niet leidt tot schade, wordt voorgesteld het noordelijk deel van het landbouwperceel met 20 cm grond op te hogen. Daarmee wordt de mogelijke schade ruimschoots gecompenseerd.

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in de weg staat. Belanghebbenden die onverhoopt toch

(onvoorziene) schade lijden, kunnen verzoeken om schadevergoeding. Het waterschap tracht dan in eerste instantie in minnelijk overleg met de betrokkene tot overeenstemming te komen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan geldt de Schadevergoedingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014.

1.4 Legger, beheer en onderhoud

Legger

Naar aanleiding van dit projectplan met daarin o.a. de wijzigingen van de A-watergang Munnikenbeek dient de legger gewijzigd te worden. Ter toelichting: de legger bestaat uit kaarten en teksten; in de legger vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging en afmetingen van watergangen. Ook worden daarin de zogeheten kunstwerken vermeld zoals stuwen.

Voor deze leggerwijziging zal nog een apart besluit worden genomen. Zolang dit besluit niet is genomen, geldt dit projectplan als legger (zie daarvoor artikel 2.12 lid 2 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De keur is te vinden op <https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/>

Wijziging beheer en onderhoud

Dit projectplan heeft tot gevolg dat het beheer en onderhoud als volgt zal wijzigen:

- De omleiding van de Munnikebeek en de nieuwe aansluiting van de zogeheten sloot Ederachterveen op de Munnikebeek krijgen de status van A-watergang. Deze zullen door het waterschap worden onderhouden.
- De status van A-watergang komt te vervallen voor het te dempen traject van de Munnikenbeek en het te dempen, meest bendedenstroomse deel van de zogeheten sloot Ederachterveen.
- De aan te leggen regelbare stuw komt in eigendom, beheer en onderhoud van het waterschap.

2 Samenwerking

Het inrichtingsproject Verdrogingsaanpak Allemanskamp wordt getrokken door het waterschap Vallei en Veluwe. De projectpartners zijn Staatsbosbeheer en de Provincie Gelderland.

3 Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Conclusie: dit projectplan beoogt de waterschaarste (verdroging) conform lid a in het beoogde gebied van de Gelders NatuurNetwerk (GNN) te verminderen.

4 Uitvoerbaarheid

4.1 Samenhang met ander beleid

In het provinciaal Natuurbeleidsplan 2021 is het gebied Allemanskamp aangegeven als Gelders NatuurNetwerk. Dit betekent dat de provincie op vrijwillige basis gronden verworft om deze vervolgens als natuur in te richten.

4.2 Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project wordt uitgevoerd het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied Ede 2012 vastgesteld. Het gebied heeft de dubbelbestemming "Waarde Ecologische Hoofdstructuur" en "Natuur". Voorts is er een "beschermingszone Natte Natuur". De voorgenomen activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan.

4.3 Hydrologisch onderzoek

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige grondwaterstanden. Het projectplan leidt tot een verhoging van de grondwaterstanden in de beoogde natuurpercelen. Hierdoor kunnen de beoogde natuurdoeltypen zich ontwikkelen. In het gebied zijn in 2019 aanvullende grondwaterstandsbuizen geplaatst die vanaf plaatsing dagelijks de grondwaterstand meten. Deze grondwaterstandsmonitoring zal ook na uitvoering van de inrichtingsmaatregelen worden voortgezet.

Verder zijn de volgende overige vergunningen en besluiten van belang:

- omgevingsvergunning voor het afgraven van het maaiveld van enkele beoogde natuurpercelen;
- melding ontgronding voor het afgraven van het maaiveld van enkele beoogde natuurpercelen.

4.4 Planning

September-december 2022: uitvoering van het inrichtingsplan

4.5 overige uitvoeringsaspecten

De vrijkomende bovengrond zal uit het beoogde natuurgebied worden afgevoerd. Indien aanliggende eigenaren behoefte hebben aan deze grond kunnen zij dat kenbaar maken.

5 Procedure

5.1 Inspraakreacties

Over dit ontwerp-projectplan kunnen belanghebbenden hun zienswijze (reactie) geven tijdens de inspraakprocedure. Meer informatie hierover is te vinden in de bekendmaking. In het definitieve projectplan zal worden aangegeven hoe met de eventuele zienswijzen is/wordt omgegaan.

5.2 Beroep bij de rechtbank

Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben gegeven, beroep bij de rechtbank instellen.

5.3 Wettelijke basis

Dit besluit betreft een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Het college van dijkgraaf en heemraden is bevoegd tot het nemen van dit besluit in verband met artikel 7, aanhef en sub c van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013. De projectprocedure van artikel 5.5 en volgende van de Waterwet is niet van toepassing (dit is een uitgebreide procedure voor waterstaatswerken van bovenlokale betekenis).

5.4 Medewerking eigenaren

De voorbereiding en uitvoering van de beoogde maatregelen uit dit projectplan gebeurt zo veel mogelijk in overleg met de betrokken perceeleigenaren en kan waar nodig worden vastgelegd in overeenkomsten. Met bijna alle in- en omliggende eigenaren zijn keukentafelgesprekken gevoerd.

6 Contactpersoon uitvoering

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer M. van Betuw (projectleider), telefoonnummer 055-5272911.

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doude van Troostwijk (juridisch adviseur), telefoonnummer 055-5272911.

7 Bijlagen

1. Definitief inrichtingsplan
2. Principe dwarsprofiel te graven omleiding Munnikebeek
