

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 469806 RS26, Gemeente Reusel-De Mierden, Hooge Mierde, plaatsen stuwconstructie

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, te onderhouden en in te richten., zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Reusel-De Mierden, te Hooge Mierde loopt de RS26 nabij de Lemenweg. We proberen op zo veel mogelijk plekken water vast te houden zonder overlast te veroorzaken. Deze locatie biedt zo'n mogelijkheid. Daarom willen we graag in de RS26 nabij de Lemenweg een stuwconstructie plaatsen. Deze sloot komt van Hooge Mierde af en stroomt in oostelijke richting uiteindelijk na de Hoolstraat in de Reusel. Deze sloot is ook erg diep en daarom willen we deze met 40cm verondiepen d.m.v. het aanbrengen van zand. De sloot zal ondanks het verondiepen en het plaatsen van de stuw nog steeds water kunnen afvoeren. Het waterniveau in de RS26 zal door het Waterschap worden gereguleerd met schotbalken die in de stuwconstructie worden geplaatst. Over het plaatsen van de stuw en de locatie is overleg geweest met de belanghebbenden in het invloedsgebied.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

Voorgenoemde locatie is inzichtelijk gemaakt middels bijgevoegd kaartje . Na het plaatsen van de stuw en het verondiepen middels aanbrengen van zand zal de sloot een diepte hebben van 75 – 100 cm i.p.v. 115 – 140 cm. Op basis van berekeningen en gebiedskennis is de verwachting dat er bovenstrooms van de stuw geen problemen zullen optreden. Voor de instelling van het waterniveau houden we onder andere rekening met de gewenste drooglegging ingegeven door de omgeving en het groeiseizoen.

3. Effecten van het plan

Door het vasthouden van water in watergangen wordt het water in watergangen ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Door het infiltreren in de bodem wordt de grondwaterstand op een hoger niveau gehouden. Door het vasthouden van een hoger grondwaterpeil kunnen we verdroging van aangrenzende percelen verminderen. Daarnaast kunnen we d.m.v. de stuw de waterhuishouding beter reguleren. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de waterbehoefte van het gebied in zowel droge als natte perioden. Met de stuw zullen we wanneer mogelijk maximaal stuwen en hierbij zullen we de stuwinstelling op 27,20 m+NAP zetten.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure


Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.





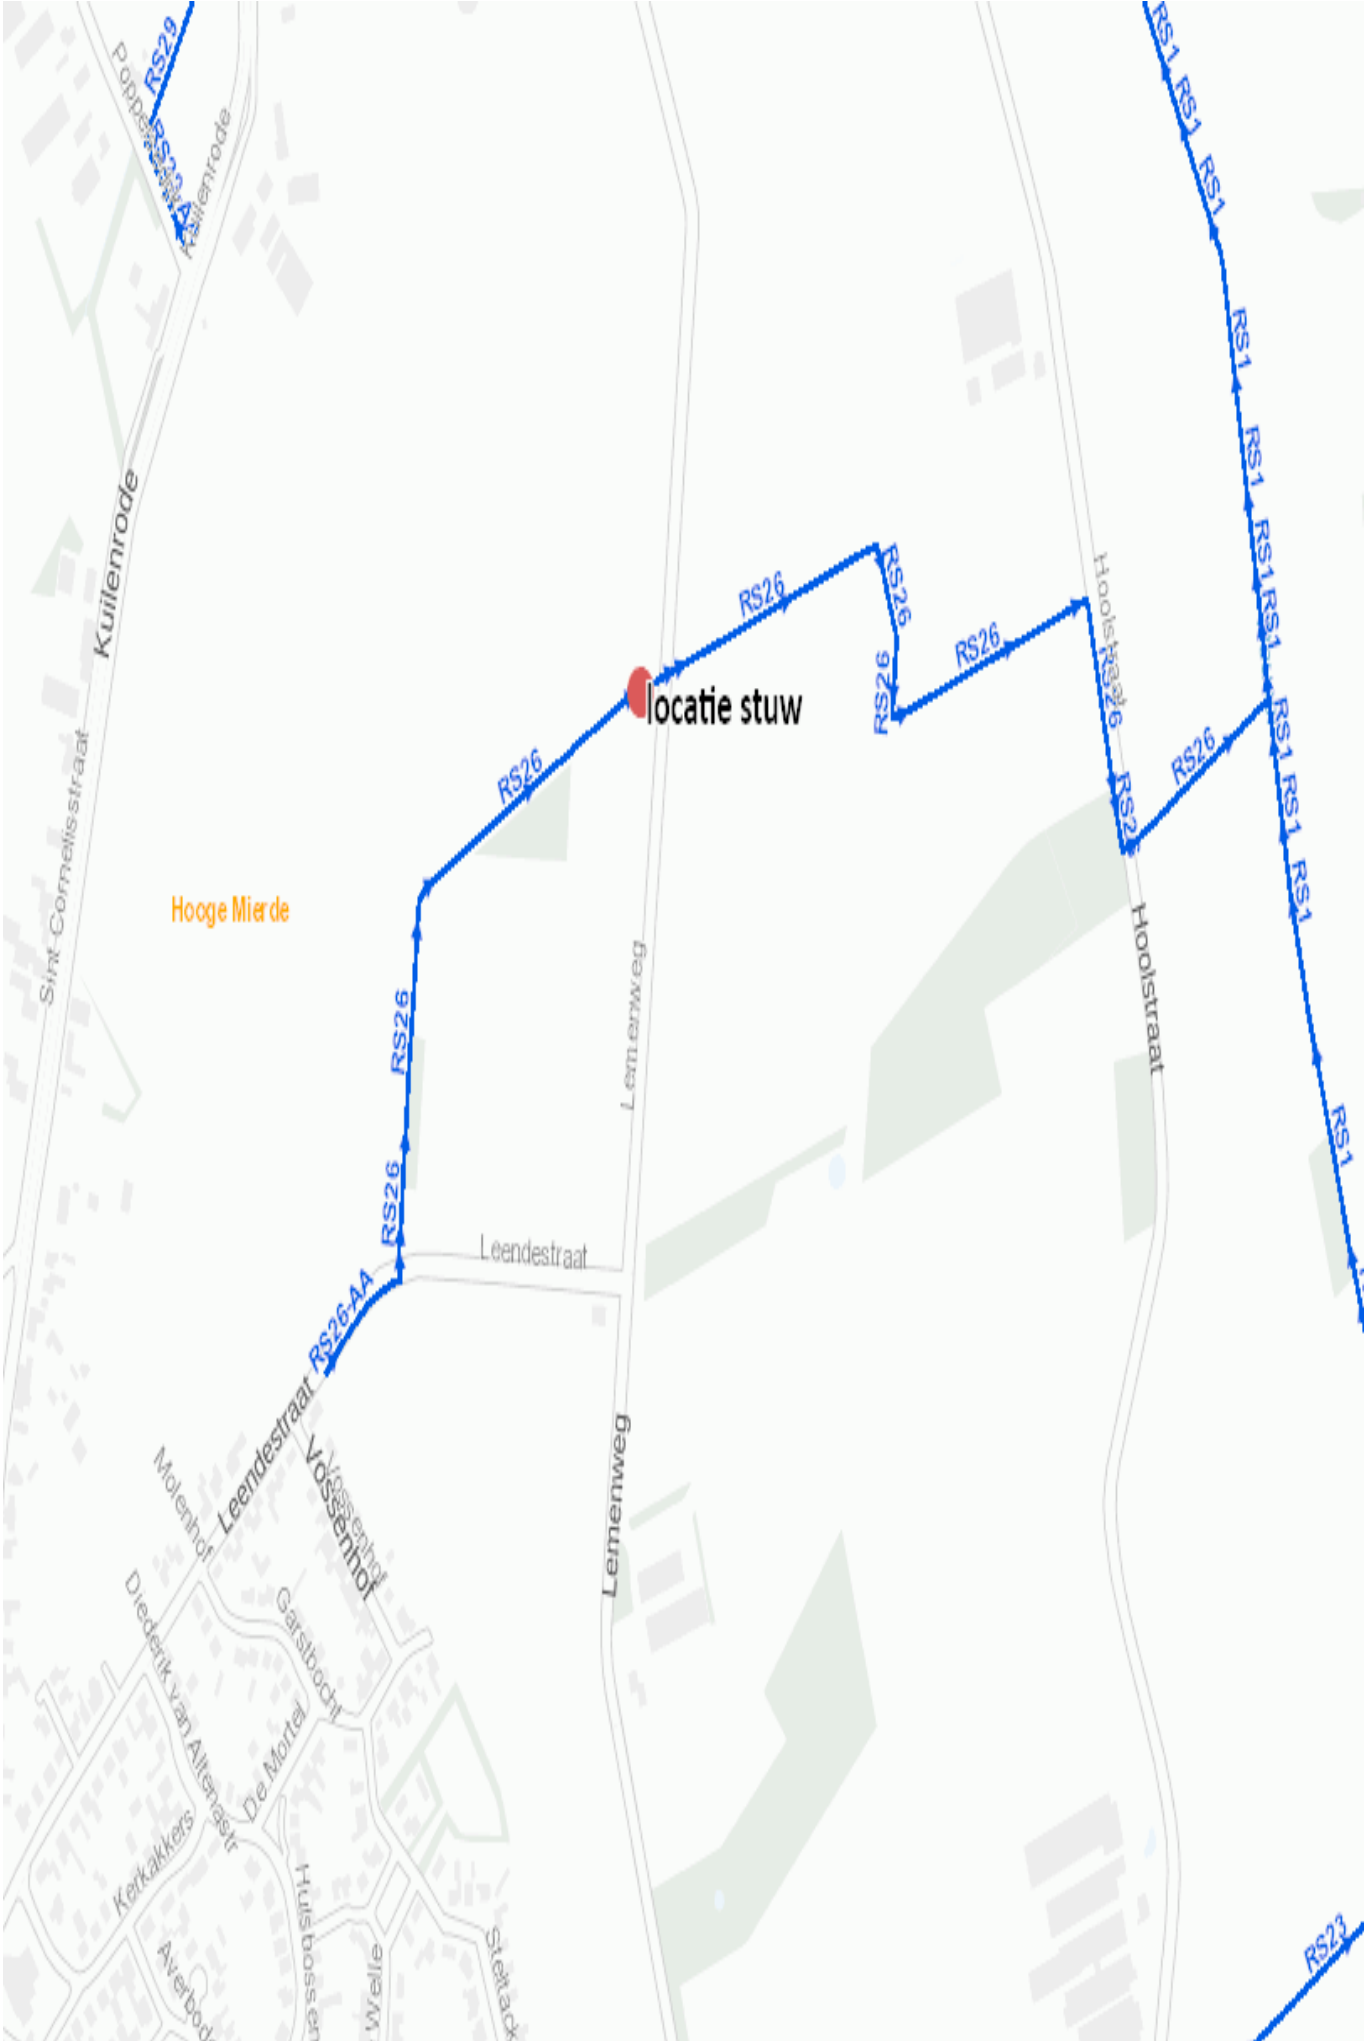

20200303GE-DP012

