


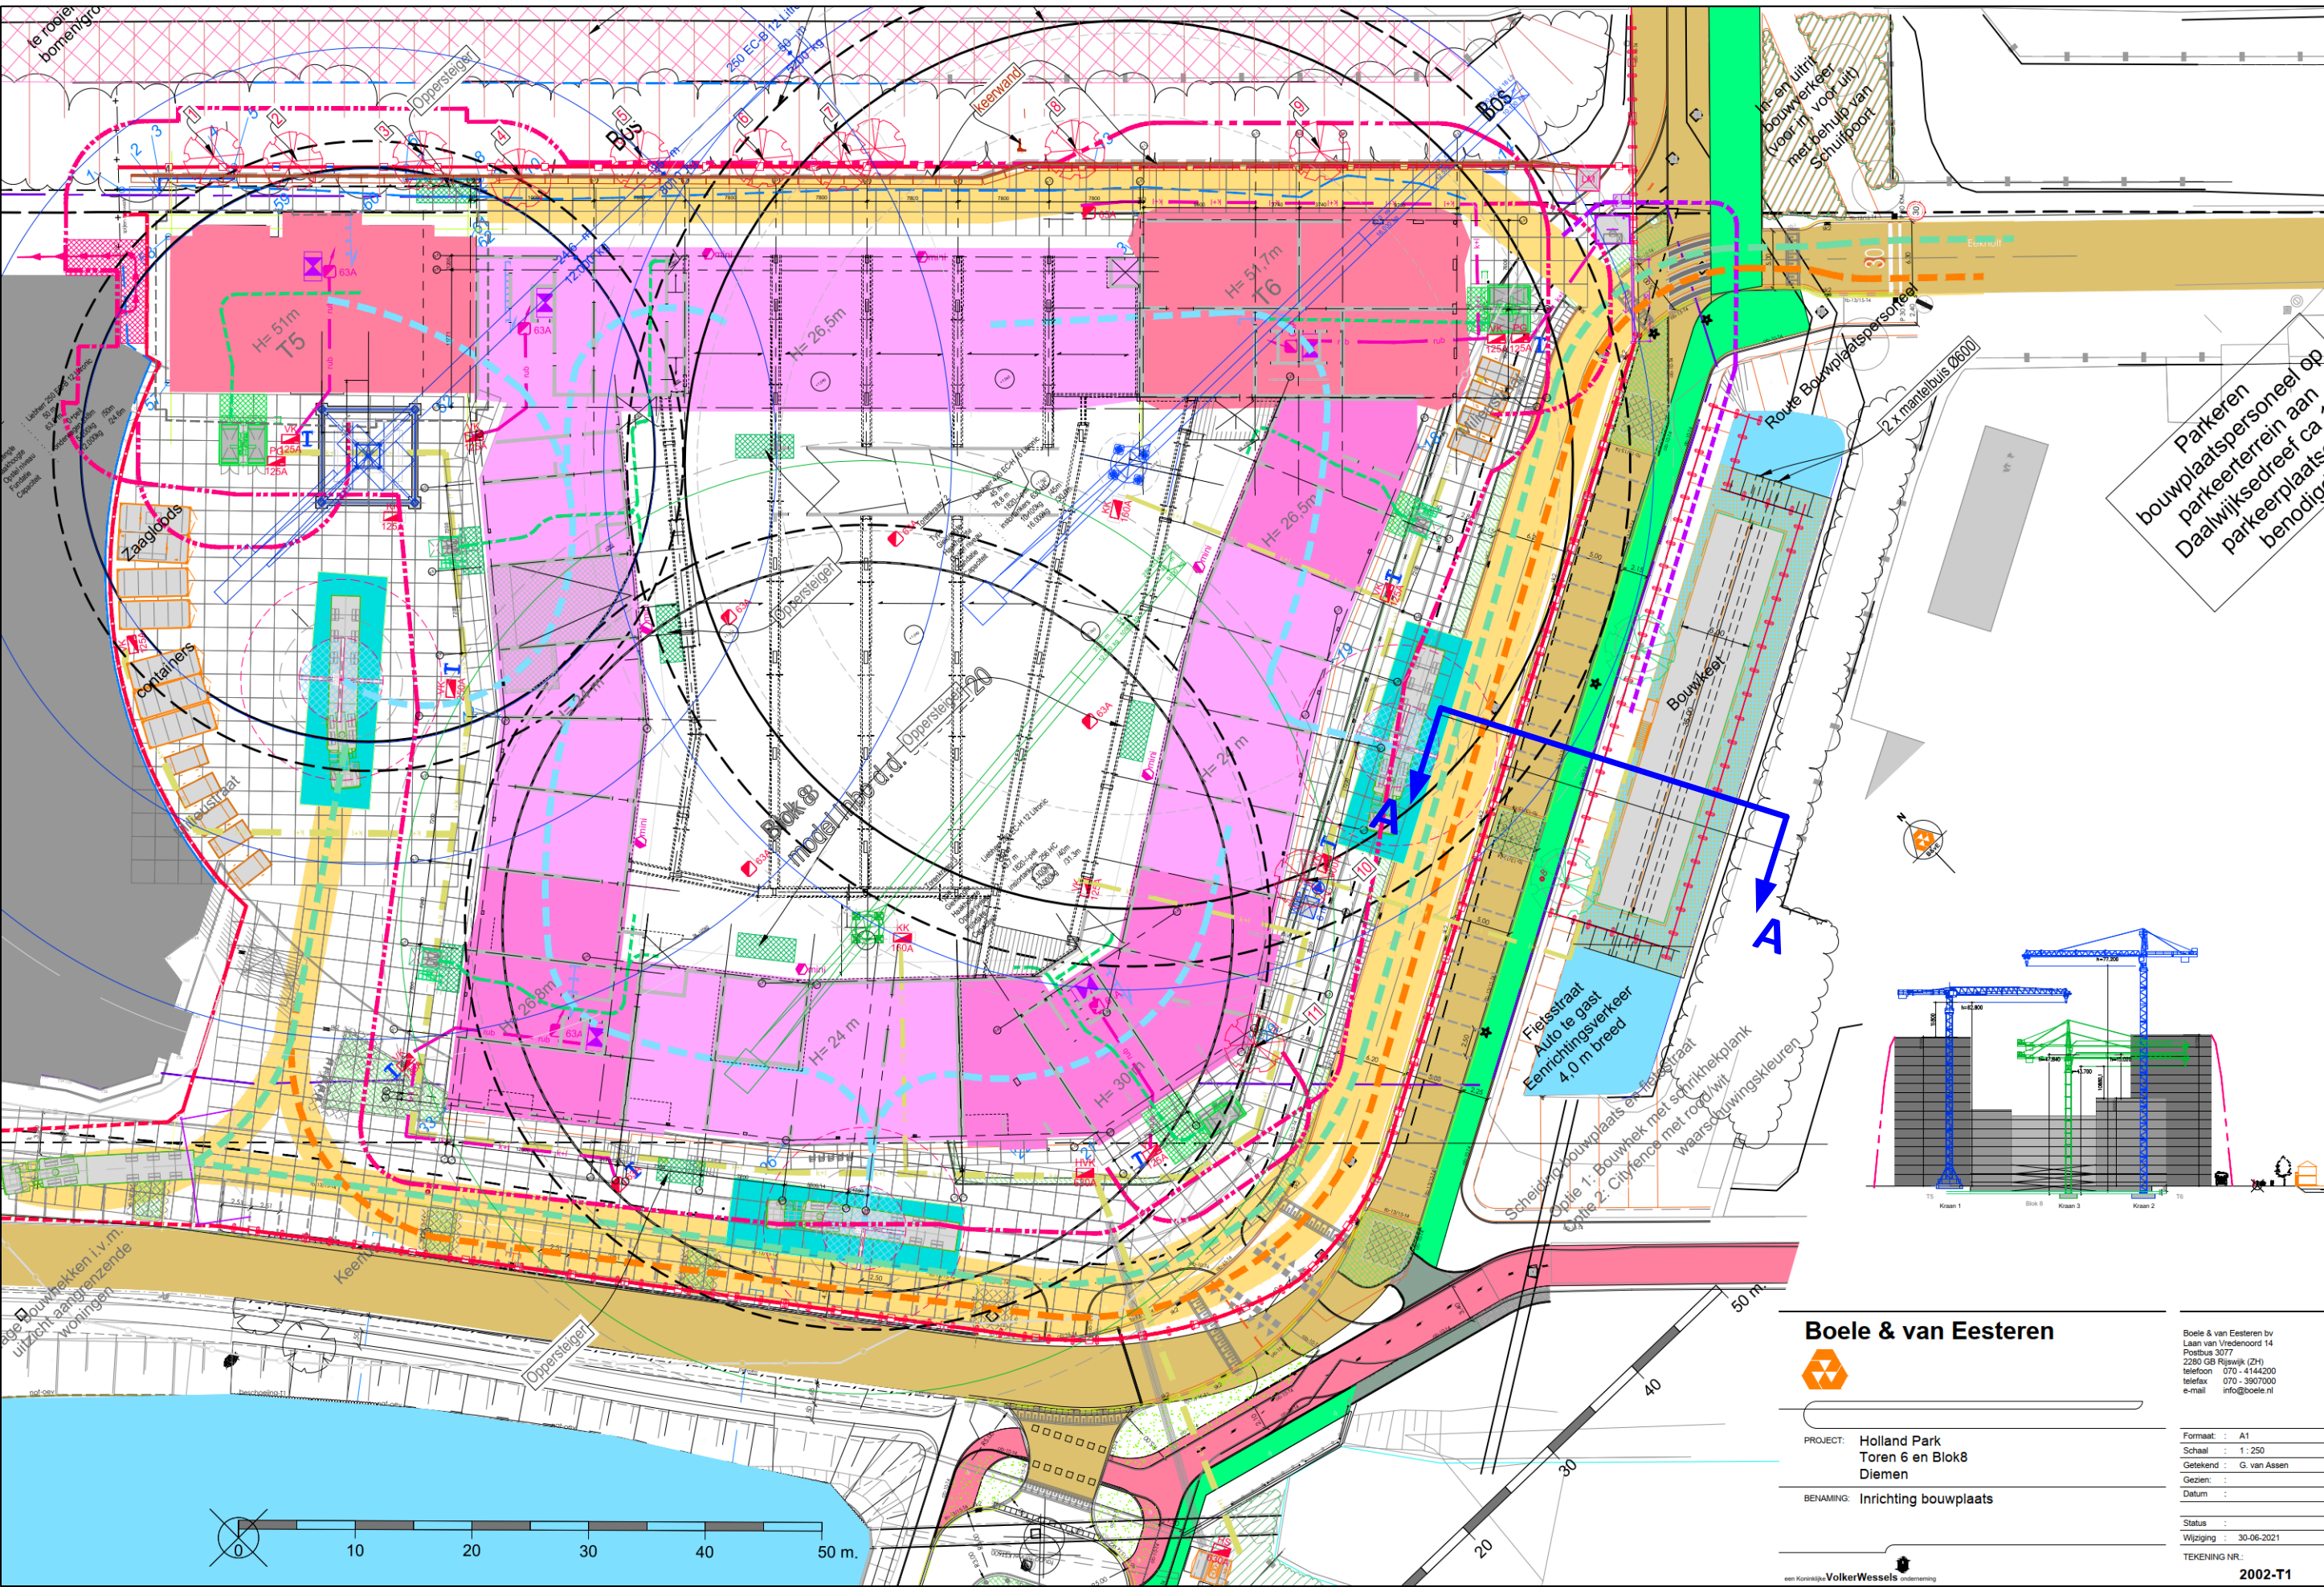


Boele & van Eesteren

PROJECT: Holland Park
Toren 6 en Blok 8
Diemen

REMARK: Inrichting bouwplaats

Formaat: A1
Schaal: 1:100
Getekend: G. van Aken
Gegeven: Diemen
Status: Uitvoering
Uitvoering: 10-08-2021
Versie: 2002-T1

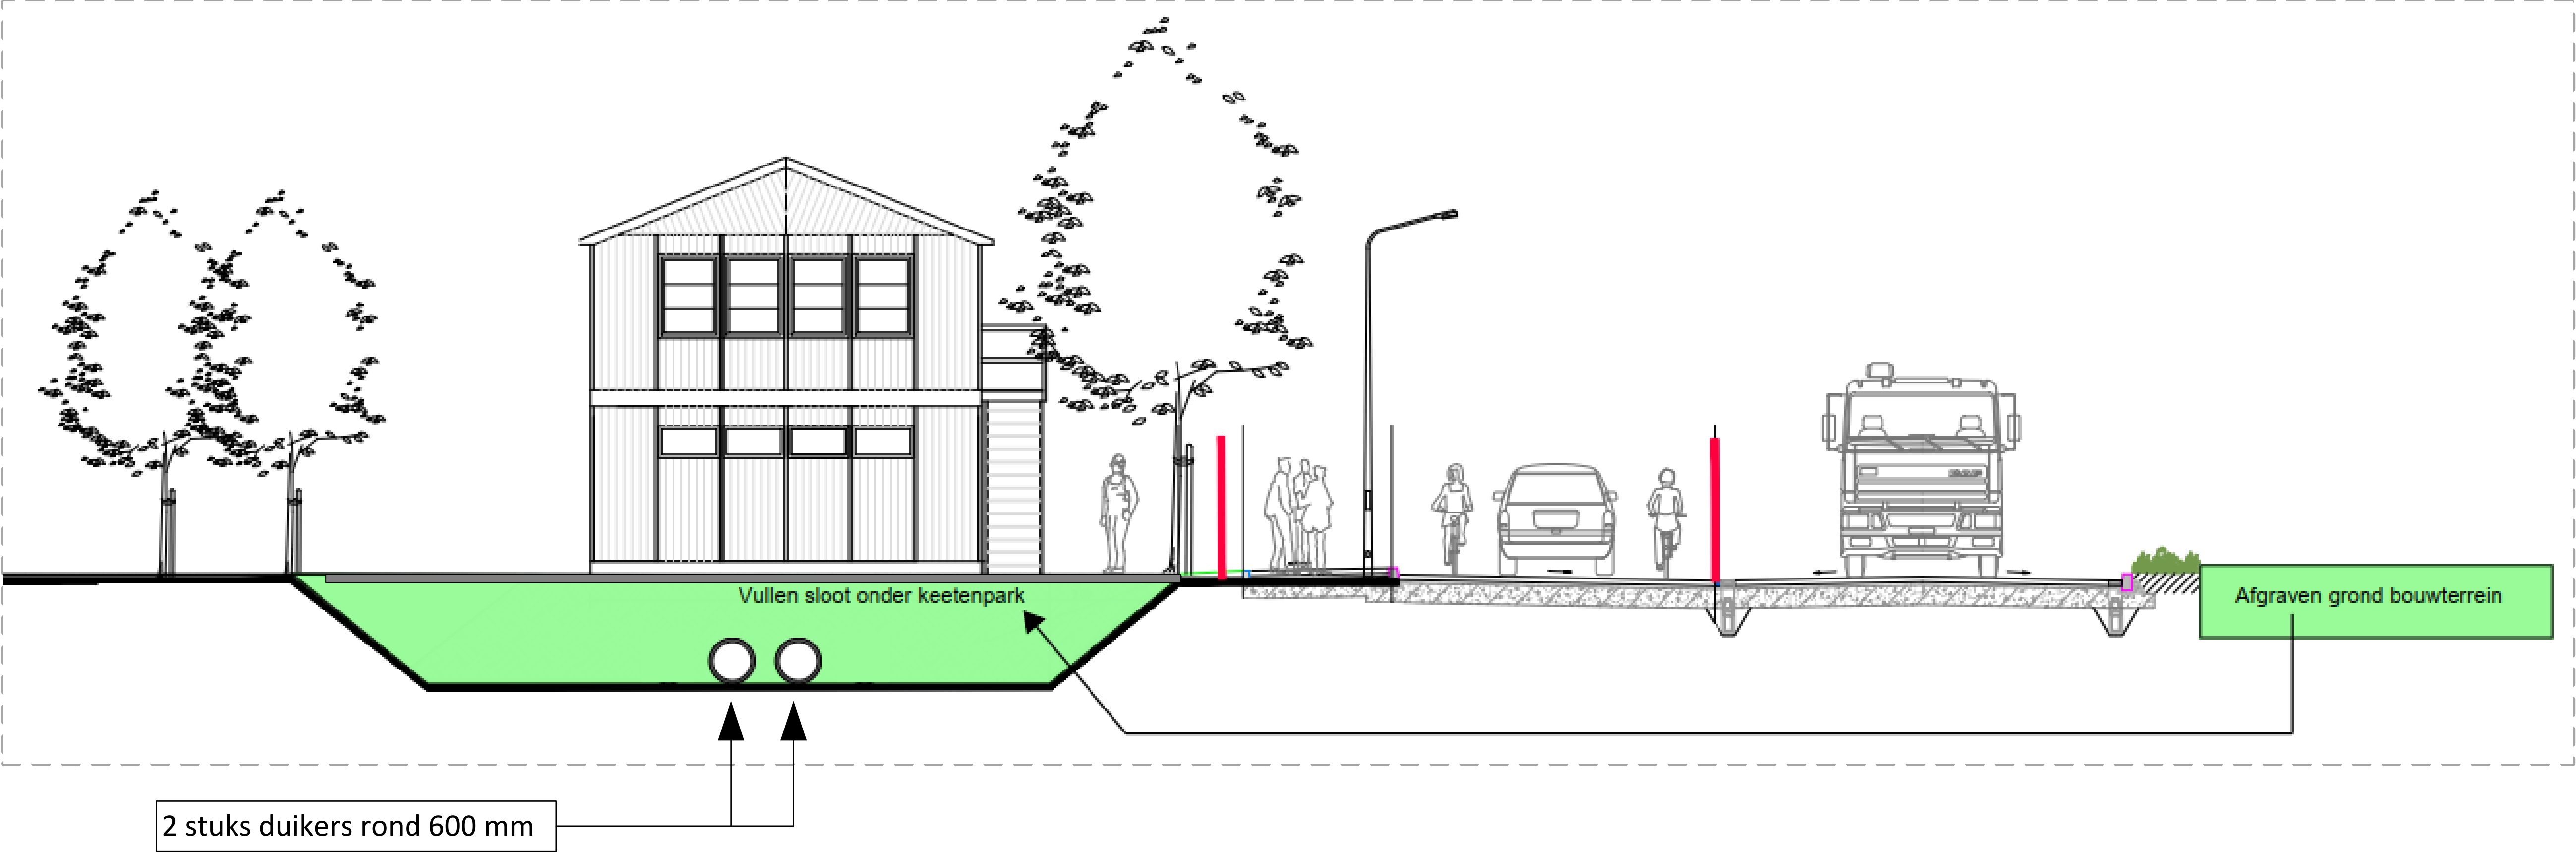

NAP (mm)	Onderdeel	PEIL (mm)
-1.000	PEIL bk vloer begane grond	0
-910	Maaiveld hoog	90
-1.870	Maaiveld laag	-870
-2.090	O.k fundering woonblokken	-1.090
-2.300	GWS hoog	-1.300
-2.500	GWS handhaving polderpeil	-1.500
-3.860	bk vloer parkeerkelder	-2.860
-6.060	ok vloer parkeerkelder + max. liftputten ontgravingniveau ok werkvloer parkeerkelder (o.b.v. 300 mm grondverbetering)	-5.060
-4.460		-3.460
-5.060	ok funderingspoer parkeerkelder GWS laag	-4.060
-27.000	(Parkeergarage) inheinvleau gemiddeld combipaal	-26.000
-25.000	(Blok 8) inheinvleau gemiddeld combipaal	-24.000
-26.000	(Toren 5) inheinvleau gemiddeld combipaal	-25.000
-25.000	(Toren 6) inheinvleau gemiddeld combipaal	-24.000
LET OP!! Dit is een gemiddelde. Voor exacte lengte zie palenpaal.		

- STAPPENPLAN:**
- Grondkering maken in de sloot.
 - Sloot dempen; grond vanaf bouwterrein in de sloot.
 - Verdichten
 - Stelconplaten op zand
 - Plaatsen bouwkeet

DOORSNEDE A-A

Vrijgekomen grond bouwterrein gebruiken voor dempen sloot onder ketenpark

HOLLAND PARK DIEMEN

DOORSNEDE A-A
DEMPEN SLOOT + PLAATSEN KEET

GETEKEND DOOR WESSELS, JOHAN 20-09-2021	FORMAAT A1 SCHAAAL 1:100	Status AANVRAAG BLAD 1 VAN 1	TEKENINGNAAR DRSN A-A_WATERNET REV 0
---	-----------------------------------	---------------------------------------	---
