

# Projectplan

*Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud*

**Naam: 436241 Bergeijk: KS 58 Fressevenweg en KS 29 Vlieterdijk, plaatsen schotbalkstuw**

## **1. Doel**

Waterschap De Dommel staat voor de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren en de waterkwantiteit duurzaam te reguleren. De waterkwaliteit in ons beheergebied is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar voldoet nog niet aan de gestelde kwaliteitsnormen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Van een ecologisch gezond watersysteem is dan ook nog niet overal sprake. Om invulling te geven aan de benoemde opgave dient de inrichting van het watersysteem op orde te zijn. Het waterschap is daarom voornemens om in watergangen KS 58 en KS 29, gelegen in de gemeente Bergeijk ter hoogte van Fressevenweg en de Vlieterdijk, een tweetal schotbalkstuwen te realiseren. Met als doel het structureel maken van de tijdelijke maatregelen, namelijk de stalen schotten vervangen door twee schotbalkstuwen. Deze maatregel levert een bijdrage aan de gestelde doelen in het Waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

## **2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)**

Schotbalkstuw Fressevenweg: betonnen bak met een opening voor een duiker 0.50 m. Aan de voorzijde voorzien van een opening met een U-profiel en voorzien van houten balkjes. Hoogte 1.50 m, breedte 1.00 m, lengte 1.00 m. Op te stuwen peil: 26.95 NAP. Schotbalkstuw Vlieterdijk : betonnen bak met een opening voor een duiker 0.50 m. Aan de voorzijde voorzien van een opening met een U-profiel en voorzien van houten balkjes. Hoogte 1.50 m, breedte 1.00 m, lengte 1.00 m. Op te stuwen peil: 29.05 NAP

## **3. Effecten van het plan**

Omzetten van tijdelijke maatregelen naar vaste structurele kunstwerken. In de zomer van 2020 zijn er op diverse plaatsen in het gebied tijdelijke maatregelen genomen om het water vast te houden, dit is gedaan door te plaatsen van stalen platen in de watergang. Met het plaatsen van deze schotbalkstuwen worden deze schotten vervangen door regelbare kunstwerken. Hierdoor wordt het makkelijker om in de toekomst water te concerveren.

## **4. Omgevingsrecht**

N.v.t.

## **5. Rechtsmiddelen**

Verkorte procedure

Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.


Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.


### 3: KS 58 Fressevenweg



## 4: KS 29 Vlieterdijk Bergeijk

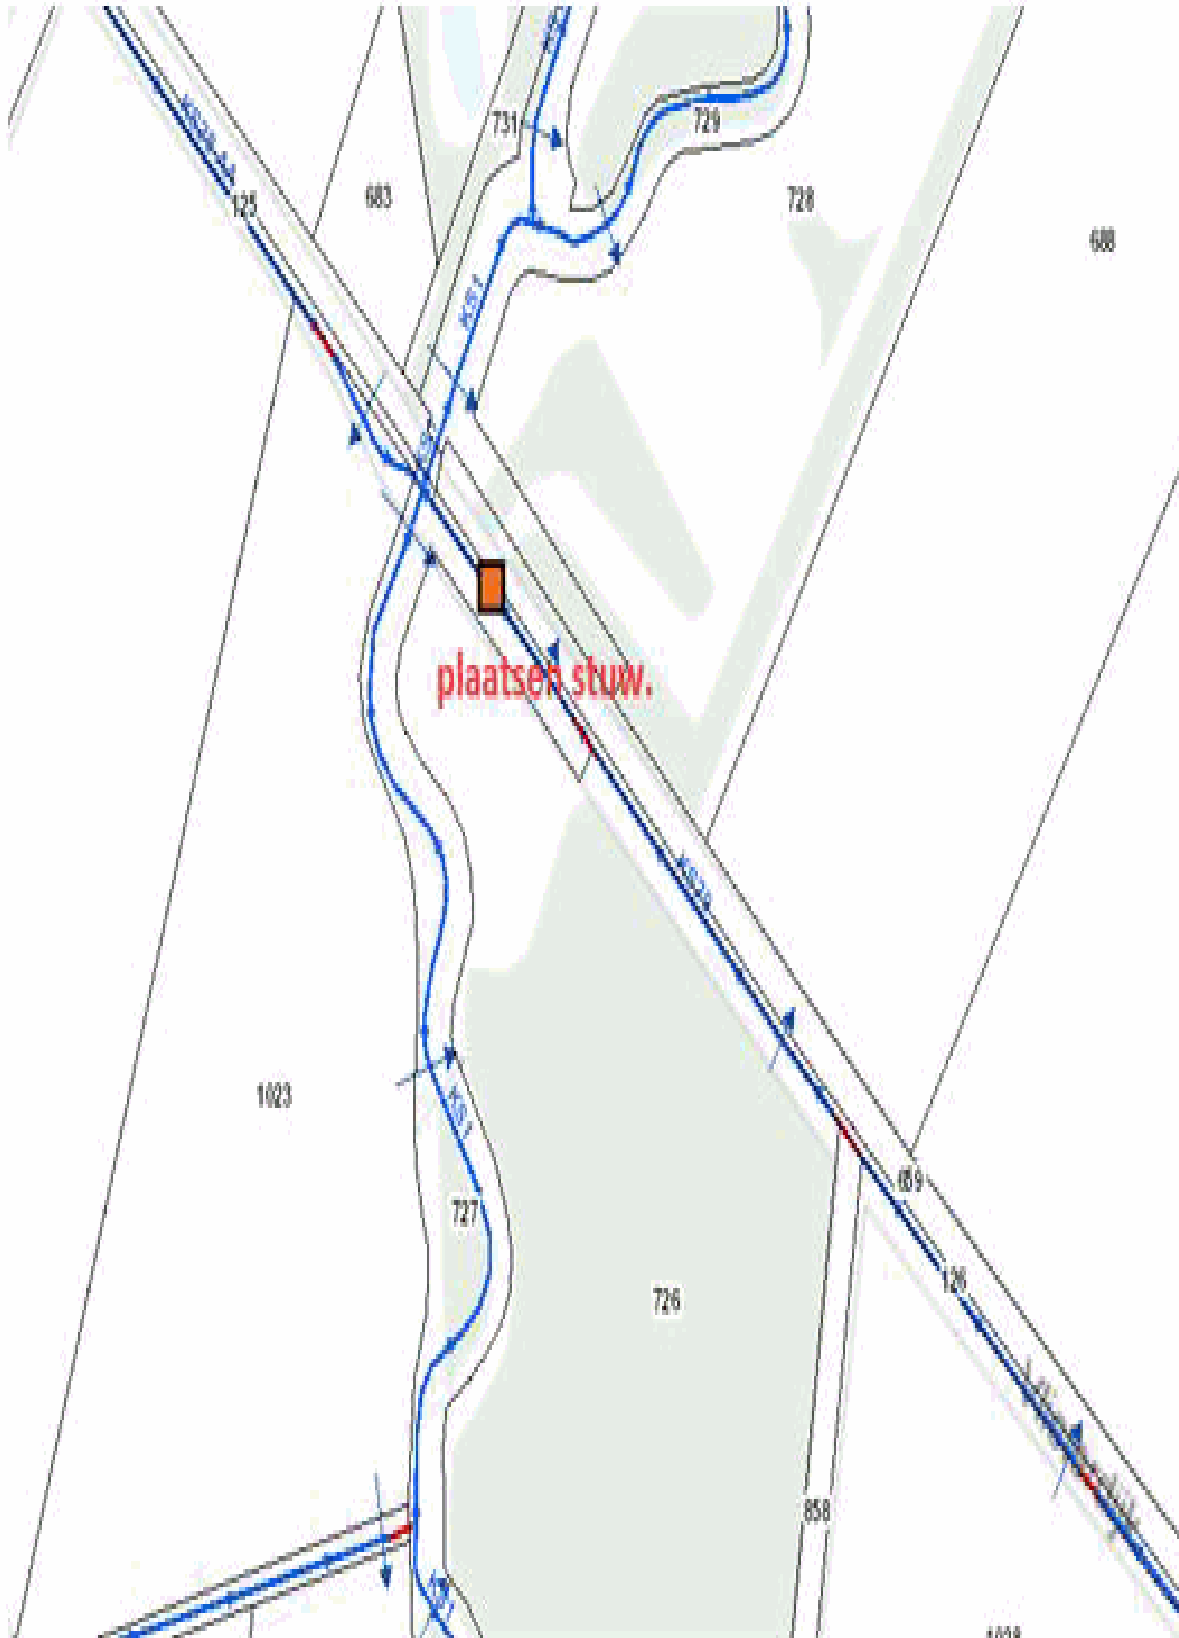

# KS58-DP-502

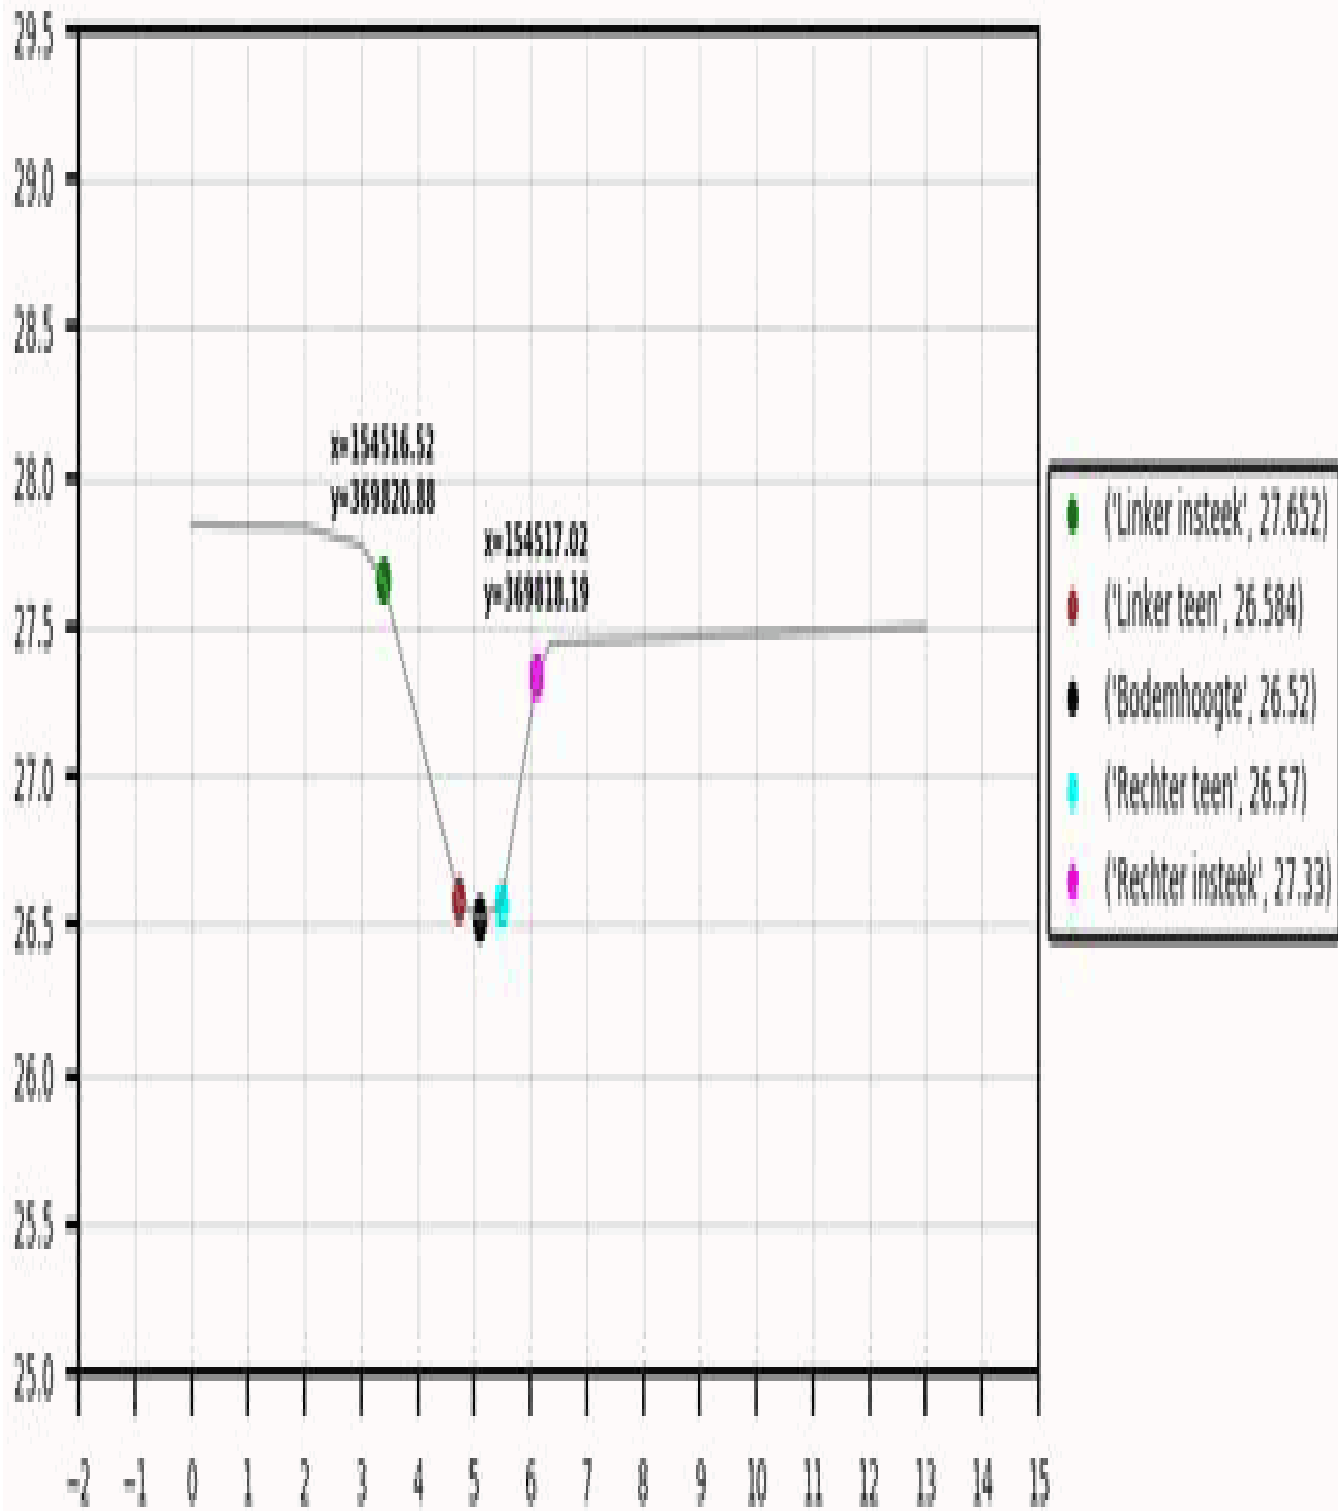

### KS29-DP-965

