

PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet¹

Datum: 10 november 2021
Kenmerk:
Onderwerp: Projectplan voor het effectueren van peilbesluit Kilhaven (Ouddorp)

Het waterschap Hollandse Delta besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot het effectueren van peilbesluit Kilhaven vast te stellen.

Op grond van artikel 5.4 lid 1 Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.

Artikel 5.4 lid 2 Waterwet zegt dat het plan tenminste een beschrijving dient te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet is bedoeld om ruimtelijke en infrastructuurprojecten versneld uit te kunnen voeren en daarmee de economie te stimuleren. De Crisis- en herstelwet geldt onder andere voor projectplannen van de waterschappen op grond van artikel 5.4 Waterwet. In de Crisis- en herstelwet wordt namelijk in Bijlage I "Categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten als bedoeld in [artikel 1.1 eerste lid](#)", onder artikel 7.3 de aanleg of wijziging van waterstaatswerken als bedoeld [artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet](#) genoemd. De crisis- en herstelwet (afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet) is dus op dit projectplan van toepassing.

1. Projectbeschrijving

Beschrijving betrokken werk

Op 6 mei 2020 is door de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta peilbesluit Kilhaven vastgesteld. In dit peilbesluit zijn maatregelen opgenomen om het peilbeheer in het bemalingsgebied Kilhaven te verbeteren.

Deze maatregelen bestaan uit:


- Het realiseren van een nieuwe geautomatiseerde klepstuw (45750ST) met automatische peilregistratie ten oosten van de Groeneweg. De overstortbreedte bedraagt 0,75 m;
- Het afdammen van watergang T13513 waardoor er geen verbinding meer is met hoofdwatergang H27152;
- Het aanbrengen van een handmatig bediende afsluiter op duiker 02812DU gelegen onder het fietspad 'Noordweg';
- Het vervangen van de bestaande stuw Cees Breen (30584ST) door een nieuwe geautomatiseerde klepstuw met automatische peilregistratie. De overstortbreedte bedraagt 1,30 m;


Zie bijlage 1 voor de ontwerptekening van de stuwen.

De nieuw te realiseren klepstuw langs de Groeneweg en de af te dammen watergang T13513 zijn beiden gelegen op kadastraal perceel ODP01H166. Het betreffende perceel is in eigendom van waterschap Hollandse Delta.

¹ Dit model ziet op projectplannen in de zin van artikel 5.4 van de Waterwet (aanleg of wijziging van een waterstaatswerk **niet** zijnde projectplannen tot aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden dienen naastgelegen percelen in eigendom van derden tijdelijk betreden te worden. Betreding van deze percelen vindt plaats in overleg met de perceeleigenaar voor aanvang van de werkzaamheden.



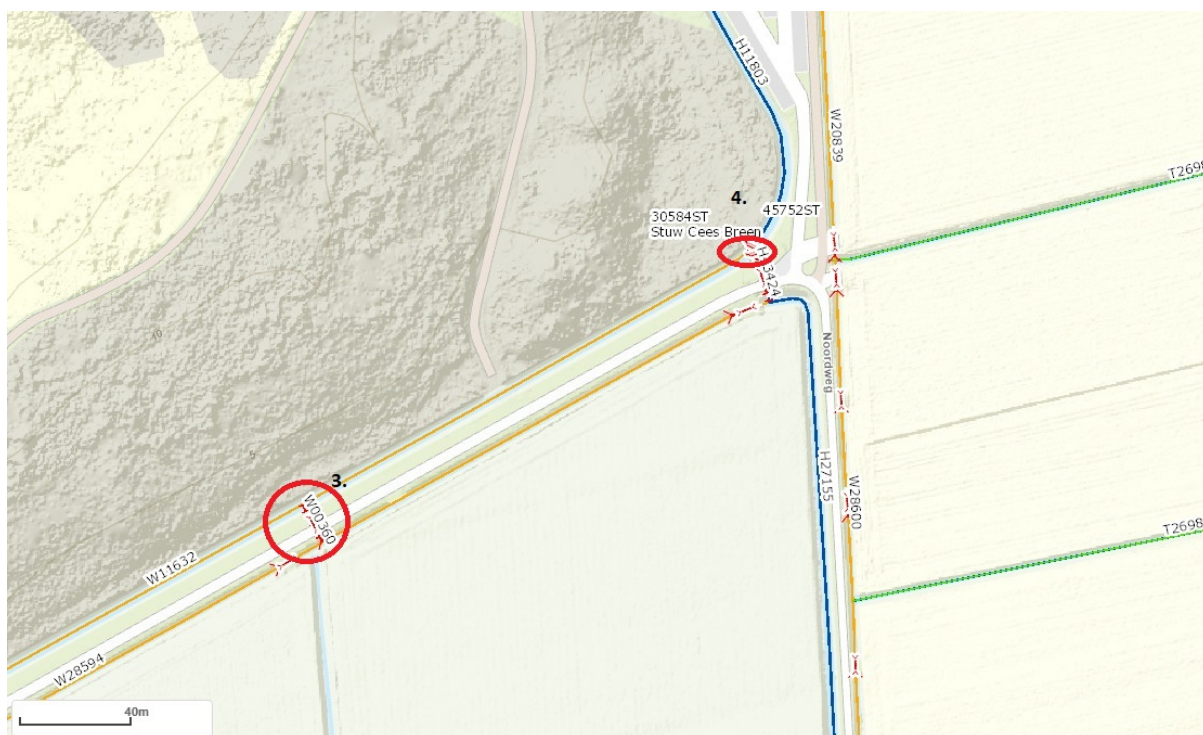

Figuur 2: Maatregelen ter effectivering van peilbesluit Kilhaven: (3) Duiker 02812DU voorzien van afsluiter, (4) Vervangen huidige stuw 45752ST door geautomatiseerde klepstuw.

Wijze van uitvoering

In bijlage 1 is de ontwerptekening met maatvoering van de nieuwe stuwen opgenomen.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer conform de "Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem 2014" en het beleidskader "Peilbesluiten bij Hollandse Delta (2013)". Peilbeheer betekent het beheren van de waterstanden zoals vastgesteld in een peilbesluit.

In de droge zomerperiode is in delen van het bemalingsgebied Kilhaven zoet water schaars. In de huidige situatie kan het peil in peilgebied G11.006 niet worden vastgehouden doordat peilregulerende kunstwerken ontbreken. Hierdoor wordt niet voldaan aan de peilen zoals vastgesteld in het peilbesluit.

Om het peil vast te kunnen houden wordt een nieuwe handbediende stuw gerealiseerd langs de Groeneweg en wordt een bestaande watergang afgedamd. Hiermee kan het peil worden vastgehouden en is er met name in droge perioden meer water beschikbaar. Dit is positief voor zowel de landbouw als voor de ecologie van de watergangen.

De huidige handmatig bediende stuw 'Cees Breen' wordt vervangen omdat deze stuw niet goed bedienbaar is. Het bedienen van de stuw vraagt veel inzet van de medewerkers en door het ontbreken van automatische peilregistratie zijn de actuele peilen bij de stuw niet bekend. Het niet tijdig bedienen van de stuw kan tot gevolg hebben dat de peilen in het nabij gelegen recreatiepark 'Landal Strand Resort Ouddorp Duin' te ver uitzakken met bijvoorbeeld stankklachten tot gevolg. Ook kan een niet tijdige bediening in het geval van hevige neerslag leiden tot wateroverlast in het recreatiepark.

Na de bouw van het recreatiepark 'Landal Strand Resort Ouddorp Duin' is het peil (NAP +0,10 m vast) in het peilgebied hoger dan voorheen. Om dit hogere peil en de bijbehorende beheersmarge te kunnen handhaven conform het peilbesluit, dient duiker 02812DU van een afsluiter te worden voorzien. In de huidige situatie is dit niet mogelijk omdat water weg lekt via deze duiker. In het geval van een calamiteit waarin stuw Cees Breen niet functioneert, kan water worden afgevoerd via deze afsluiter.

2b. Chemische en ecologische kwaliteit

Door uitvoering van de maatregelen kan het peil in peilgebied G11.006 beter worden vastgehouden. Dit heeft als effect dat de watergangen in dit peilgebied meer water kunnen bevatten omdat het water niet meteen afstroomt. Meer waterdiepte heeft naar verwachting een klein positief effect op de ecologie van de watergangen.

Het vervangen van stuw Cees Breen heeft geen effect op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

Door het vervangen van stuw Cees Breen is het peilbeheer binnen o.a. het recreatiepark betrouwbaarder. De kans op overlast binnen het recreatiepark wordt verminderd. Hiermee stijgt het recreatiegenot. De beleving van het water binnen het park wordt beter geborgd met deze maatregel (gezonde doorspoelbare vijverpartijen die niet uit zakken tot modderpoelen en muggenoverlast geven en een niet te hoog peil wat leidt tot wateroverlast bij de aanliggende recreatiewoningen.

Door het peil binnen peilgebied G11.006 beter vast te houden worden de plaatselijke agrariërs beter gefaciliteerd en stijgt de belevingswaarde van de watergangen door een verwacht positief effect op de ecologie.

Conclusie

Realisatie van de maatregelen leidt tot een verbetering van de waterbeheersing. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstellingen van artikel 2.1 lid 1 van de Waterwet.

3. Uitvoerbaarheid

In dit onderdeel van het projectplan moet inzicht worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. Daarbij speelt de toetsing aan het vigerende planologische regime en de vergunbaarheid op grond van andere wetgeving een belangrijke rol.

3a. Planologische inpassing

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd op 4 september 2014 het bestemmingsplan 'Landelijk gebied Goedereede' vastgesteld. Het project past binnen het geldende bestemmingsplan.

Maatregel	Bestemming volgens bestemmingsplan
Realiseren nieuwe stuw bij Groeneweg	Enkelbestemming water
Afdammen watergang T13513	Enkelbestemming verkeer / Dubbelbestemming Waterstaat Waterkering
Vervangen stuw Cees Breen	Enkelbestemming Water / Dubbelbestemming Waterstaat Waterkering
Duiker 02812DU voorzien van afsluiter	Enkelbestemming verkeer / Dubbelbestemming Waterstaat Waterkering

3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

- Leggerwijziging

Na uitvoering van de werkzaamheden worden de afmetingen en de locatie van de nieuwe kunstwerken ingemeten en opgenomen in het beheerregister van het waterschap. Bij de eerst volgende herziening van de legger worden deze nieuwe gegevens daarin opgenomen. Het waterschap wordt onderhoudsplichtig voor de nieuwe kunstwerken.

- *Omgevingsvergunning*

De nieuw te realiseren stuw aan de Groeneweg en de te vervangen stuw Cees Breen aan de Noordweg betreffen bouwwerken ten behoeve van de waterhuishouding. De bouwwerken zijn lager dan 3 meter en in oppervlakte kleiner dan 15 m². Volgens het Besluit Omgevingsrecht is op basis van Bijlage II, Hoofdstuk 2, Artikel 2, lid 18a geen omgevingsvergunning nodig voor het realiseren van het project.

- *Wet Natuurbescherming*

Het project wordt niet gerealiseerd in een Natura 2000 gebied, beschermd natuurmonument of in een wetland. Het project heeft geen invloed op nabijgelegen natuurgebieden.

In 2018 is t.b.v. het uitvoeren van baggerwerkzaamheden een quick scan² uitgevoerd voor het bemalingsgebied Kilhaven. Uit deze quick scan is gebleken dat op de locaties waar de maatregelen worden uitgevoerd of in de directe omgeving daarvan geen beschermde soorten zijn aangetroffen. Voor de rapportage is o.a. de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) gebruikt.

Voor de realisatie van het project is daarom geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming.

3c. Te treffen voorzieningen

Bij de realisatie van het project worden geen nadelige gevolgen verwacht die moeten worden betrokken in de belangenafweging bij dit besluit tot vaststelling van dit projectplan.

3d. Overige uitvoeringsaspecten

- *Archeologie*

De locatie van de te realiseren maatregelen is gelegen in een gebied wat volgens de archeologische beleidskaart Goeree Overflakkee (2009) is aangewezen als een gebied met 'geen waarde'. De uitvoering van archeologisch onderzoek is voor dit project niet nodig.

- *Bodem (incl. PFAS)*

De geringe hoeveelheid grond die ontgraven wordt om de kunstwerken te plaatsen of te vervangen wordt op dezelfde locatie teruggeplaatst. Watergang T13513 wordt met gebiedseigen grond afgedamd. Om deze reden wordt een bodemkwaliteitsonderzoek niet noodzakelijk geacht.

- *Explosieven onderzoek*

Er wordt geen explosievenonderzoek uitgevoerd. Het gebied staat niet bekend als kansrijk voor het aantreffen van niet gesprongen explosieven (NGE's). De hoeveelheid grondverzet is zeer gering. Hiermee is de kans op het aantreffen van explosieven erg klein.

- *Functionaliteit watersysteem*

Om de functionaliteit van het watersysteem tijdens de werkzaamheden te kunnen blijven garanderen wordt met de peilbeheerder van waterschap Hollandse Delta nader afgestemd.

- *Grondverwerving*

Niet van toepassing. Het project wordt gerealiseerd op percelen in eigendom van waterschap Hollandse Delta.

- *Kabels en leidingen*

² Stempfer, W., *Maatregelenrapport soortbescherming Wet Natuurbescherming, Baggeren landelijk gebied 2018 Schouwvak 226*, Arcadis Nederland BV, 2018

Bij de graafwerkzaamheden die nodig zijn om de nieuwe stuw te plaatsen en stuw Cees Breen te vervangen worden kabels en leidingen verwacht. Voor aanvang van de graafwerkzaamheden wordt een KLIC melding aangevraagd, om het risico op het aantreffen van kabels en leidingen tijdens de werkzaamheden zo klein mogelijk te maken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden proefsleuven gegraven om te zien of er kabels en leidingen liggen.

- *Waterkeringen*

De te vervangen stuw Cees Breen en de nieuw te realiseren afsluiter op duiker 02812DU bevinden zich binnen de beschermingszone A van de primaire waterkering. De primaire waterkering zelf bestaat op deze locatie uit een duinenrij. Tussen de duinenrij en de locatie waar de maatregelen worden uitgevoerd bevindt zich nog een sloot.

Het vervangen, beheeren en bedienen van deze stuw heeft geen negatieve invloed op de primaire kering. Voor de veiligheid van de primaire kering hoeven daarom geen aanvullende maatregelen getroffen te worden.

- *Wegafzettingen*

Er kunnen tijdens de werkzaamheden verkeerstechnische maatregelen getroffen worden indien dit nodig is voor de verkeersveiligheid ter plaatse van de Groeneweg en het fietspad 'Noordweg'.

3e Planning

De werkzaamheden zijn naar verwachting het eerste kwartaal van 2022 afgerond.

4. Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

Het projectplan treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval er een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het projectplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.

5. Ondertekening

Namens dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta,
Hoofd afdeling Regie en Assetmanagement,

dhr. H. Kooijman

Bijlagen:

1. Ontwerptekening stuwen
